

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2016 INFORME DE AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE



PAIP 2016

Dirección General de Inversión y Crédito Público
octubre 2016

INTRODUCCIÓN

Durante el presente año, el Gobierno de El Salvador ejecuta diversos proyectos contenidos en el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2016, relacionados con infraestructura sanitaria, educativa, energía eléctrica, conectividad vial, seguridad y justicia entre otros; pertenecientes a los sectores social, económico y seguridad pública y justicia.

El contenido de este informe muestra el comportamiento de la ejecución financiera de los programas y proyectos que forman parte del PAIP 2016 con datos al mes de septiembre, que asciende a \$1,070.62 millones conforme a los registros efectuados en las aplicaciones informáticas correspondientes, por las instituciones del Sector Público pertenecientes al Gobierno Central, Empresas Públicas No Financieras, e Instituciones Descentralizadas No Empresariales, entre otras; y la información se presenta clasificada por tipo de presupuesto y/o programas especiales, sector de actividad, fuentes de financiamiento, estructura del sector público, instituciones y programas/proyectos de cada una de éstas.

I. Información General


1.1 Composición del Programa

El PAIP 2016 vigente al mes de septiembre asciende a \$1,070.62 millones, equivalente al 4.0% del PIB¹, y reporta un incremento de \$8.64 millones con respecto al PAIP correspondiente al mes de agosto, resultante del incremento en los programas institucionales de CEPA, FISDL, MINSAL, MINED, PNC-MJSP y FONAVIPO.

En el Gráfico No.1 se presenta la composición del PAIP por tipo de presupuesto y/o programas especiales.

Gráfico No.1

Composición del PAIP 2016, según tipos de presupuestos y/o programas especiales

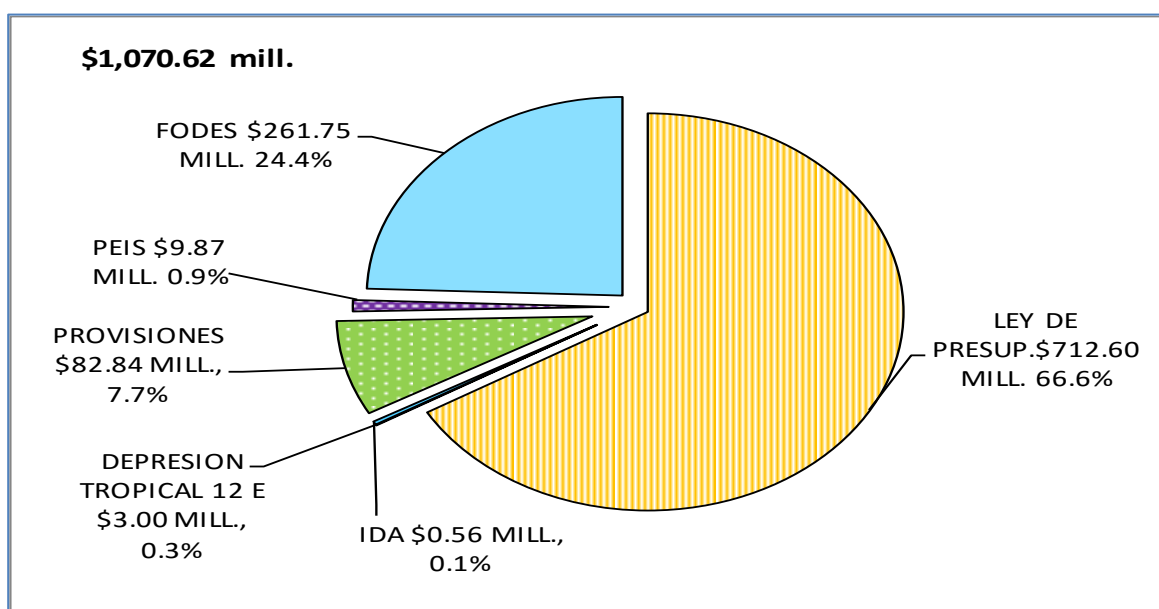


1.2 Distribución del PAIP 2016, por Sector de Actividad

Del monto de \$1,070.62 millones del PAIP 2016 vigente al mes de septiembre, \$522.30 millones (48.8%) están asignados a proyectos del Sector Económico, \$444.97 millones (41.6%) a proyectos del Sector Social, y \$103.35 millones (9.6%) a proyectos del Sector Seguridad Pública y Justicia; y de dicho total, al mes que se informa se programaron \$707.66 millones, de los cuales se reporta una ejecución de \$454.16 millones, correspondientes al 64.2% de lo programado al mes, distribuidos de la siguiente manera: \$225.36 millones en proyectos del Sector Económico, \$203.80 millones del Social, y \$25.00 millones de proyectos de Seguridad y Justicia.

A continuación se presenta de manera gráfica, los montos programados y ejecutados al mes de septiembre.

¹ PIB: US\$26,833.4 millones.

Gráfico No.2
PAIP 2016 por Sector de Actividad, al mes de septiembre
(Millones de US\$)

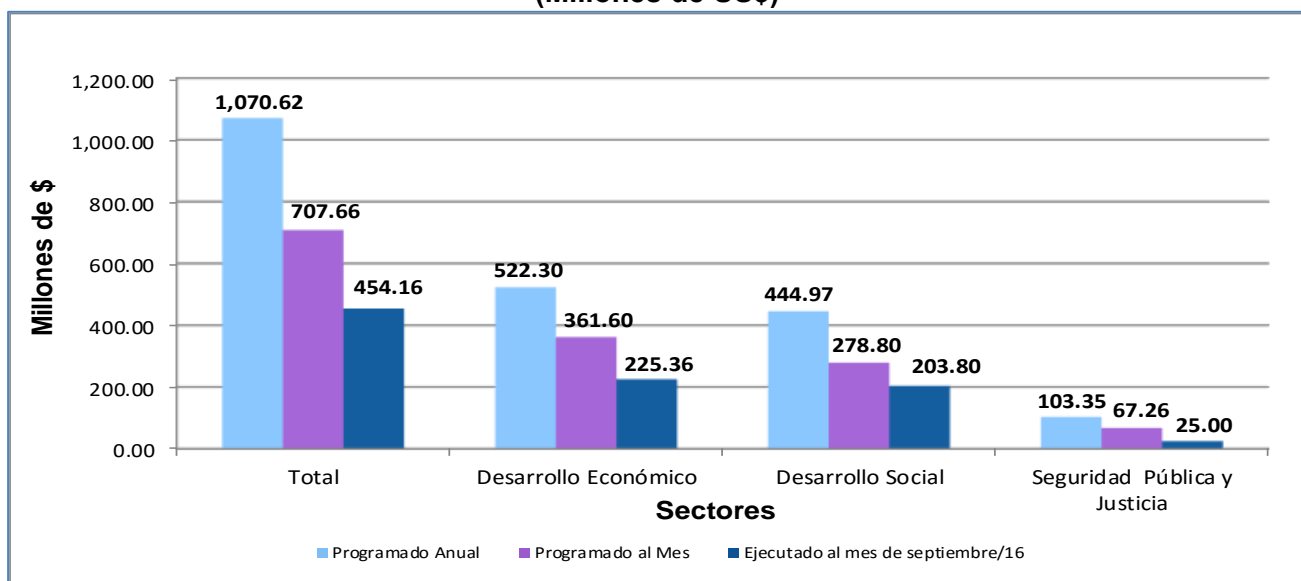


II. Comportamiento del PAIP 2016

2.1 Composición y Avance del PAIP 2016, por Fuente de Financiamiento.

Considerando el origen interno y externo de las fuentes de financiamiento de los proyectos que conforman el PAIP 2016 vigente al mes de septiembre, el 50.9% corresponde a fuentes internas y 49.1% a fuentes externas, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico No.3
Avance PAIP 2016 por Fuente de Financiamiento, al mes de septiembre
(Millones de US\$)

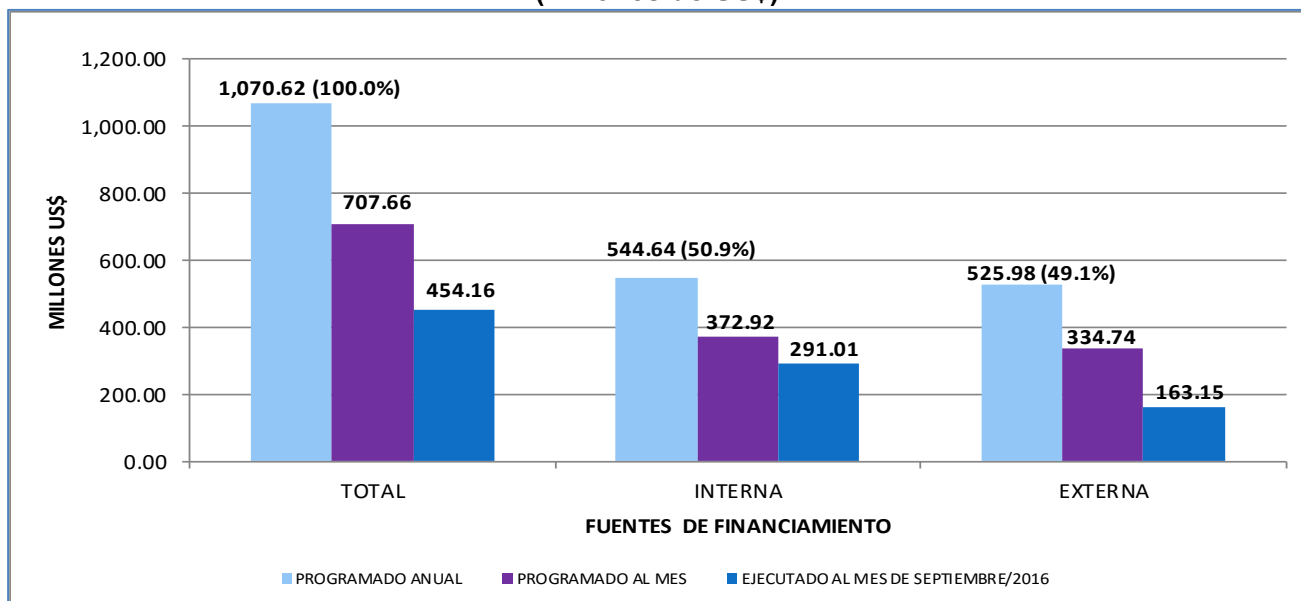


2.2 Composición y Avance del PAIP 2016, por Estructura del Sector Público

Del total de \$1,070.62 millones que conforman el PAIP 2016 vigente al mes de septiembre, el 32.5% de los recursos están asignados a proyectos de instituciones del Gobierno Central, el 25.0% a proyectos de las Empresas Públicas No Financieras, 14.4% a Instituciones Descentralizadas No Empresariales, el 3.6% a otras entidades y el 24.5% son recursos FODES que corresponden a las Municipalidades.

Según la Estructura del Sector Público, al mes de septiembre la inversión se ejecutó de la siguiente manera: Gobierno Central \$107.95 millones (23.8%); Empresas Públicas No Financieras \$86.94 millones (19.1% del total ejecutado); Instituciones Descentralizadas No Empresariales \$61.22 millones (13.5%), FODES y Otras \$198.05 millones (43.6%), tal como se observa en el siguiente gráfico:


Gráfico No.4
Avance del PAIP 2016 por Estructura del Sector Público, al mes de septiembre
(Millones de US\$)

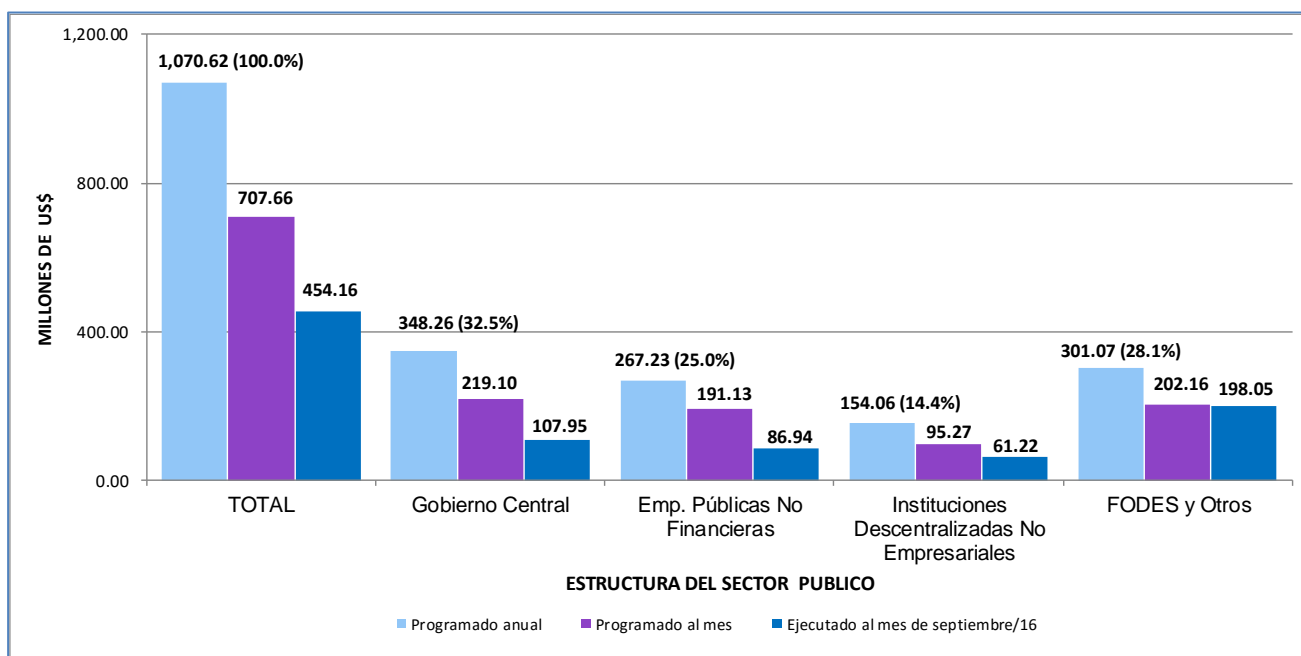

2.3 Avance en el uso de los Recursos del PAIP

De acuerdo a los registros efectuados por las instituciones ejecutoras en los Sistemas de Información, al cierre del mes de septiembre se reporta un monto de fondos comprometidos por valor de \$636.80 millones, equivalente al 59.5% del PAIP vigente (con FODES), lo cual incluye \$454.16 millones ejecutados y \$182.64 millones pendientes de ejecutar.


Gráfico No.5
Avance en el Uso de los Recursos del PAIP 2016 al mes de septiembre*

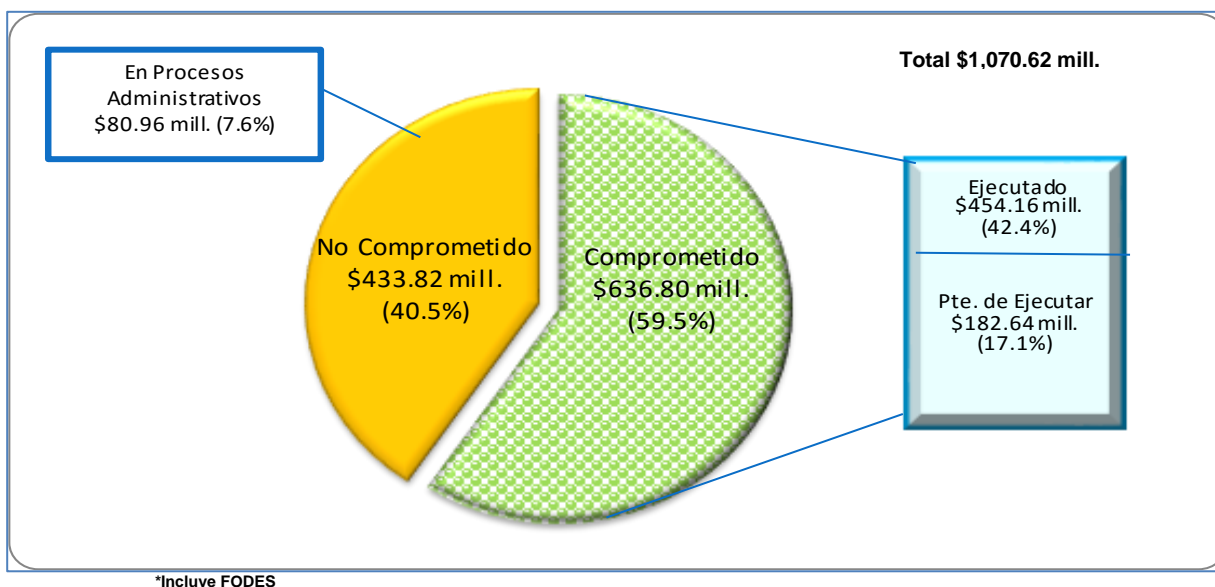

2.4 Comparativo de la Inversión Programada / Ejecutada

En el siguiente gráfico se reportan los montos de inversión programada/ejecutada al mes de septiembre, durante los últimos 6 años (2011 – 2016).

Gráfico No.6
Inversión Programada/Ejecutada, al mes de septiembre 2011 – 2016

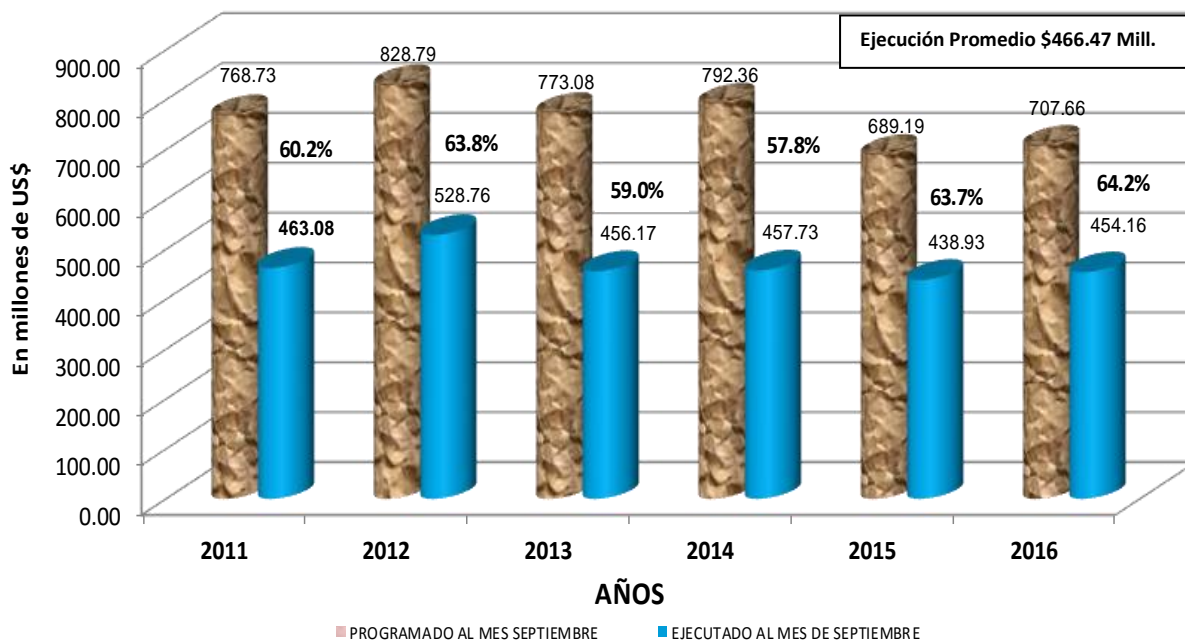

2.5 Inversión Programada / Ejecutada por Institución Ejecutora

A continuación se presenta el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2016, al mes de septiembre, por estructura del Sector Público, destacándose por su ejecución las siguientes instituciones: CEL, FOVIAL, FISDL, MINSAL y MOP.

Cuadro No.1
Programación / Ejecución Financiera del PAIP 2016 al mes de septiembre, por Institución
(Millones de dólares)

INSTITUCIONES	No. de Programas /Proyectos	PROGRAMA VIGENTE ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE SEPTIEMBRE	COMPROMETIDO AL MES DE SEPTIEMBRE		MONTO NO COMPROMETIDO AL MES DE SEPTIEMBRE	
				TOTAL	SUB TOTAL EJECUTADO	TOTAL	SUB TOTAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
GOBIERNO CENTRAL	247	348.26	219.10	180.36	107.96	167.89	52.59
DGCP -MJSP	9	52.90	45.20	17.28	12.95	35.62	8.50
MOP	58	49.48	22.36	22.42	15.40	27.06	5.78
MINSAL	111	43.83	36.27	27.89	16.50	15.93	12.73
MAG	10	36.53	22.13	19.36	13.74	17.17	5.65
VMVDU	5	34.56	19.92	24.39	13.74	10.17	3.67
MINED	11	28.77	15.82	16.27	8.65	12.50	9.64
FGR	3	18.03	0.05	0.05	0.03	17.98	-
PNC - MJSP	5	12.48	5.14	11.18	3.53	1.29	1.28
CSJ	4	12.06	11.96	11.91	5.79	0.15	0.02
MH	5	11.40	9.47	6.72	5.12	4.67	2.00
MARN	4	11.06	9.34	1.50	0.94	9.57	-
MINEC	1	10.01	4.48	6.61	2.51	3.41	1.93
SE - MJSP	4	6.59	3.62	2.76	2.62	3.83	0.90
VMT	1	5.94	5.37	5.94	2.40	-	-
MITUR	1	5.62	1.55	0.79	0.56	4.83	-
SIS CAPRES	5	3.28	1.78	1.81	1.63	1.47	-
MTYPS	3	1.24	0.81	1.16	0.67	0.08	-
INJUVE	1	1.20	0.99	1.00	0.23	0.20	-
AL	1	1.14	0.77	0.80	0.43	0.34	0.38
ILEA	1	1.11	1.11	0.09	0.09	1.02	-
CONAMYPE	3	0.85	0.78	0.43	0.43	0.42	0.11
PGR	1	0.18	0.18	-	-	0.18	-
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	45	267.23	191.13	95.17	86.94	172.07	24.25
CEL	8	189.02	151.91	75.87	75.87	113.15	-
CEPA	28	66.48	30.22	11.18	5.59	55.31	22.29
ANDA	9	11.73	9.00	8.12	5.48	3.61	1.96
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	65	154.06	95.27	97.78	61.21	56.27	4.07
FOVIAL	10	57.22	44.23	43.24	30.49	13.98	-
FISDL	15	51.16	34.15	22.49	21.95	28.66	3.93
ISSS	6	18.84	0.17	16.98	2.55	1.85	-
CNR	1	13.66	4.76	7.11	2.68	6.55	0.06
CENTA	3	4.34	3.78	1.94	2.06	2.40	0.02
UES	18	3.10	3.02	2.45	0.26	0.65	-
INDES	4	1.76	1.66	1.56	0.21	0.20	-
ISNA	1	1.69	1.69	1.63	0.93	0.06	-
ISTU	2	0.91	0.91	0.03	-	0.88	-
CORSATUR	1	0.76	0.52	-	-	0.76	-
ISRI	3	0.47	0.36	0.33	0.06	0.15	0.06
ISDEMU	1	0.15	0.02	0.02	0.02	0.13	-
OTRAS	24	39.32	5.85	1.74	1.74	37.59	0.05
FOMILENIO	10	36.67	4.00	0.64	0.64	36.03	-
FONAVIPO	9	1.27	0.91	0.61	0.63	0.67	0.05
FONAES	4	0.98	0.94	0.49	0.47	0.49	-
FSV	1	0.40	-	-	-	0.40	-
SUB-TOTAL	381	808.87	511.35	375.05	257.85	433.82	80.96
FODES	1	261.75	196.31	261.75	196.31	-	-
TOTAL	382	1,070.62	707.66	636.80	454.16	433.82	80.96

2.6 Avance del PAIP 2016 al mes de septiembre, por Programa y Presupuesto

En el siguiente cuadro se reportan los montos programados del año y al mes de septiembre, así como los montos ejecutados, comprometidos y no comprometidos; y dentro de éste último los recursos que se encuentran en procesos administrativos.

Cuadro No.2
Avance del PAIP 2016 por Programa y Presupuesto al mes de septiembre
(En millones US\$)

PROGRAMA / PRESUPUESTO	Programado vigente anual	Programado al mes de septiembre	Ejecutado al mes de septiembre	COMPROMETIDO			NO COMPROMETIDO		
				TOTAL	EJECUTADO AL MES DE SEPTIEMBRE	PENDIENTE DE EJECUTAR	TOTAL	EN PROCESOS ADMINIST.	SIN INICIAR PROCESOS ADMINIST.
	1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8
PROYECTOS REGULARES	712.60	428.10	196.89	282.78	196.89	85.89	429.81	80.66	349.15
IDA	0.56	0.54	0.39	0.37	0.39	- 0.02	0.20	-	0.20
PEIS	9.87	9.38	4.18	8.43	4.18	4.25	1.43	0.30	1.13
Depresión Tropical 12E	3.00	2.46	0.63	0.63	0.63	-	2.38	-	2.38
PROVISIONES 2015	82.84	70.87	55.76	82.84	55.76	27.08	-	-	-
Subtotal	808.87	511.35	257.85	375.05	257.85	117.20	433.82	80.96	352.86
FODES	261.75	196.31	196.31	261.75	196.31	65.44	-	-	-
TOTAL	1,070.62	707.66	454.16	636.80	454.16	182.64	433.82	80.96	352.86

2.7 Proyectos con mayores montos programados para el 2016

El cuadro N°3 contiene el detalle de los 10 programas/proyectos cuya inversión programada para el año 2016, en forma conjunta concentran el 43.4% del PAIP vigente sin FODES, por valor de \$808.87 millones, con los montos programados y ejecutados al mes de septiembre.

Cuadro No.3
LISTA DE LOS 10 PROYECTOS DEL PAIP 2016, CON MAYOR INVERSION PROGRAMADA
(En millones US\$)

INSTITUCIONES	PROGRAMAS/PROYECTOS	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE SEPTIEMBRE	EJECUTADO AL MES DE SEPTIEMBRE
CEL	Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	97.93	86.99	45.20
CEL	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre	64.80	48.18	29.67
FOVIAL	Mejoramiento de Vías e Intersecciones a Nivel Nacional	34.70	27.08	20.84
FISDL	Programa Sistema de Protección Social Universal	29.89	20.47	12.88
MINSAL	Fortalecimiento del Sistema Público de Salud	26.47	20.24	9.08
CEL	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre	21.38	12.64	0.17
MINED	Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación	21.08	12.25	5.20
CEPA	Ampliación de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	20.73	6.22	-
FGR	Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República de El Salvador.	17.70	-	-
MAG	Programa de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF)	16.48	10.57	3.03
TOTAL		351.16	244.64	126.07

Según la información del cuadro anterior, para los 10 proyectos con mayores montos anuales programados, al mes de septiembre CEL reporta una ejecución de \$75.04 millones, FOVIAL \$20.84 millones, FISDL \$12.88 millones, MINSAL \$9.08 millones, MINED \$5.20 millones y el MAG \$3.03 millones.

A continuación se detallan los programas/proyectos que conforman el PAIP 2016 vigente al mes de septiembre, agrupados por institución ejecutora, según reporte generado el 12 de octubre de 2016, con información registrada por las entidades ejecutoras en los Sistemas SAFI y SIIP.



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2016, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE g/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
GOBIERNO CENTRAL						
DGCP - MJSP		9	52,902,500.33	45,203,015.28	12,949,752.86	28.65
5748	Obras Complementarias para finalización del Complejo Penitenciario de Seguridad Izalco FASE III		9,484,835.39	9,484,835.39	3,866,139.78	40.76
5903	Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco, Departamento de Sonsonate		9,108,499.00	9,108,499.00	2,729,487.04	29.97
6561	Programa de Fortalecimiento del Proceso de Rehabilitación y Reinserción Social - BID 2881/OC-ES		8,285,870.00	1,409,222.03	1,190,435.08	84.47
5897	Ampliación de Centro Penal de Izalco		7,849,297.17	7,849,297.17	2,170,454.06	27.65
5896	Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos		5,654,805.00	5,654,805.00	-	-
5899	Readecuación de Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, Departamento de La Paz		5,101,583.78	5,046,956.47	-	-
5904	Readecuación de Granja Penitenciaria en el Departamento de Santa Ana		3,862,354.99	3,806,314.97	-	-
6560	Fortalecimiento Institucional de la Dirección General de Centros Penales - BID 2881/OC-ES		3,378,490.00	2,827,920.25	2,978,071.90	105.31
6162	Fortalecimiento Institucional Préstamo BCIE 2102		176,765.00	15,165.00	15,165.00	100.00
MOP		58	49,480,808.76	22,358,901.98	15,399,600.40	68.87
5004	CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RÍO LEMPA (KM. 75.5 LIB31N), LA LIBERTAD - CHALATENANGO		8,076,396.60	5,214,499.58	4,196,461.39	80.48
6058	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ESTRATÉGICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE AHUACHAPÁN, SANTA ANA Y LA LIBERTAD.		6,720,000.00	-	-	-
5492	PROGRAMA DE CONECTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO		4,453,522.00	101,388.00	-	-
6061	Programa de Caminos Rurales Progresivos en El Salvador - LAIF		4,399,068.00	1,511,548.75	577,202.30	38.19
5098	PROGRAMA OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS		4,034,837.00	109,394.00	-	-
5806	Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca (USU07S) – Cantón California – San Hilario – Sitio El Corral - Salinas El Zompopero, Municipio de Jiquilisco; Departamento de Usulután.		2,753,982.00	2,273,958.44	1,384,472.24	60.88
3918	DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES		1,856,000.00	1,100,000.00	248,989.79	22.64
5973	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LA PALMA SOBRE RUTA CA04N, TRAMO LA PALMA - CITALÁ, MUNICIPIO DE LA PALMA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO		1,695,765.21	1,695,765.21	1,313,814.93	77.48
5975	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CHAPELTIQUE SOBRE RÍO GRANDE, RUTA SAM07N, TRAMO MONCAGUA - CHAPELTIQUE, MUNICIPIO DE CHAPELTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL		1,625,717.15	1,377,885.01	921,833.48	66.90
5926	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2581		1,303,711.12	1,303,711.12	1,035,545.94	79.43
5043	Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo		1,183,195.00	43,050.00	-	-
5980	CONSTRUCCIÓN DE BY PASS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL		1,130,000.00	-	-	-
5972	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TAMULASCO SOBRE RUTA CHA11S, TRAMO CHA27E - SAN FRANCISCO LEMPA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO		923,664.28	923,664.28	534,155.01	57.83
6163	Mejoramiento Camino Rural CUS18E - CAB18E, Tramo: Suchitoto - Cinquera, Etapa II		895,907.66	895,907.66	894,712.66	99.87
4303	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL MOR15W TRAMO:CA07N – ARAMBALA – JOATECA, MUNICIPIOS DE ARAMBALA Y JOATECA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN		838,103.37	838,103.37	837,603.37	99.94
5974	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA AGUA FRÍA, CARRETERA CA07N, TRAMO SAN CARLOS - SAN FRANCISCO GOTERA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN		724,528.83	724,528.83	251,959.08	34.78
6545	Fortalecimiento Institucional Fondos Yucatán		635,399.00	-	-	-
5915	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CHA08S: TRAMO ET. CHA09S - POTONICO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO		627,934.91	627,934.91	627,934.91	100.00
6489	Construcción de Obras de Mitigación en Cauce del Río Urbina, Comunidad La Isla No. 1, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador.		560,981.18	560,981.18	190,897.37	34.03
5511	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369		511,661.18	395,722.23	316,960.93	80.10
6416	Obras de Protección en Bosques de Prusia, Municipio de Soyapango, San Salvador - Etapa 1		500,000.00	500,000.00	350,000.00	70.00
4566	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DEL CENTRO DE CONFERENCIAS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES (EX FERIA INTERNACIONAL)		403,848.22	403,848.22	400,099.37	99.07
6526	Mejoramiento de Calle El Manzano, Cantón Ocotal, Municipio de Dulce Nombre de María, Departamento de Chalatenango		300,000.00	-	-	-
6442	Fortalecimiento Institucional Convenio JICA - By Pass de San Miguel		265,405.00	118,036.51	81,291.34	68.87
5623	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2067		216,125.67	186,597.32	157,230.00	84.26
6160	Obras de Mitigación en Taludes y Cárcava de Comunidad Santa María, Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador		200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
6580	Construcción de Parada Móvil para Autobuses del SITRAMSS, Ubicada en la 67 Av. Norte, San Salvador.		200,000.00	-	-	-
6505	Construcción de Obras Hidráulicas y de Drenaje en Plaza la Transparencia, Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.		189,362.26	189,362.26	189,362.24	100.00
6422	Reparación de Bordas Sobre Río Grande de San Miguel, en El Municipio de Puerto Parada, Departamento de Usulután		179,425.92	179,425.92	160,333.44	89.36
6533	Recarpeteo de calles en Colonia Metrópolis y Colonia El Escorial de San Ramón, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador		150,000.00	-	-	-
6539	Construcción de tramo de calle de acceso a Colonia Buena Vista, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador		150,000.00	-	-	-
5924	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LOTIFICACIÓN CAMPO AMOR, MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		150,000.00	150,000.00	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2016, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
5914	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CHA09S: SAN MIGUEL DE MERCEDES - SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO		145,131.99	145,131.99	144,067.99	99.27
4640	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO: COMASAGUA HACIA BELLO HORIZONTE, LA LIBERTAD		140,000.00	140,000.00	140,000.00	100.00
5468	Programa de Conectividad Rural en Zonas Norte y Oriente		137,081.00	128,290.00	-	-
6565	Construcción de obras de protección en talud oriente de la urbanización Jardines de Monte Blanco, Soyapango, San Salvador (segunda etapa).		133,000.00	39,900.00	-	-
6531	Pavimentación de tramo de calle del Municipio de Yucuaiquín, Departamento de La Unión, hasta el límite del Municipio de Comacarán, Departamento de San Miguel		100,000.00	-	-	-
6532	Recarpeteo de calle del Barrio San Antonio al Cantón El Obrajuelo, Municipio de Quelepa, Departamento de San Miguel.		90,000.00	-	-	-
6234	Colocación de Carpeta Asfáltica en calle que conduce de Jucuarán al Caserío El Almendro, Municipio de Jucuarán, Departamento de Usulután.		85,305.85	85,305.85	85,305.85	100.00
6537	Construcción de cordón cuneta, adoquinado y fraguado, de calle principal de Colonia El Sunzal, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador		84,831.00	-	-	-
6538	Construcción de cordón cuneta y pavimento asfáltico en prolongación de calle Padre Antonio Ibáñez, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador		75,000.00	-	-	-
6535	Pavimentación de Calle Principal (Calle Julia Parada), Colonia Tierra Virgen 1, Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador		75,000.00	-	-	-
6536	Construcción de cordón cuneta y pavimento asfáltico en calle principal de Colonia El Sunzal, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador		75,000.00	-	-	-
6228	Concreteado Hidráulico en la calle que conduce a Caserío Las Aradas, Cantón San Antonio Las Iglesias, Municipio de San Luis La Reina, Departamento de San Miguel.		63,004.89	63,004.89	63,004.89	100.00
4562	OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA COLONIA LLANO VERDE. (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO, SAN SALVADOR		52,225.03	1,200.00	-	-
6525	Reparación de cancha en El Manzano, Cantón Ocotal, Municipio de Dulce Nombre de María, Departamento de Chalatenango		50,000.00	-	-	-
6527	Reparación de vías principales del Casco Urbano del Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad		45,000.00	-	-	-
6530	Concreteado hidráulico de Calle Principal de Colonia El Milagro Los Tubos, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad		45,000.00	-	-	-
6528	Pavimentación de tramo de 125 mts. en calle de entrada a Polígono A, Col. 7 de Marzo, Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.		40,000.00	-	-	-
6237	Colocación de Carpeta Asfáltica en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador en Santa Ana, Departamento de Santa Ana		36,671.45	36,671.45	36,671.45	100.00
6022	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERCARIO SAV29S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE (RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES)		31,209.56	31,209.56	-	-
6227	Concreteado Hidráulico de calle en Cantón el Jobo, Sector los Romero, Municipio de Moncagua, Departamento de San Miguel.		27,832.90	27,832.90	27,832.90	100.00
6534	Reparación de calle que conduce hacia el Cantón El Jutillo, Municipio de Rosario de Mora, Departamento de San Salvador		25,000.00	-	-	-
6540	Construcción de acceso a intersección de Calle Doble Vía de Colonia Las Margaritas, Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana		24,931.00	-	-	-
5601	RECONSTRUCCIÓN DE LA RUTA CHA07E TRAMO: EST. 13+000 - NUEVA TRINIDAD - ARCATAO, MUNICIPIOS DE NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO		19,558.71	19,558.71	17,535.71	89.66
4559	PROYECTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A FAMILIAS EN ZONAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD NUEVO ISRAEL, SAN SALVADOR		14,321.82	14,321.82	14,321.82	100.00
6529	Pavimentación de pasaje, polígono C, Colonia 7 de Marzo, Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad		10,000.00	0.01	-	-
5462	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MOR13W, TRAMO: MUNICIPIO SAN SIMON - MUNICIPIO SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.		1,162.00	1,162.00	-	-
MINSAL		111	43,823,439.68	36,265,587.63	16,497,134.41	45.49
5209	Fortalecimiento del Sistema Público de Salud		26,472,964.67	20,236,163.17	9,080,305.09	44.87
401	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION		4,341,169.34	4,332,694.34	3,014,125.48	69.57
5128	Programa Integrado de Salud		3,567,852.72	3,491,600.30	2,117,508.96	60.65
5131	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR		3,376,469.67	2,961,469.67	-	-
6015	PROGRAMA SALUD MESOAMÉRICA 2015 - EL SALVADOR		3,207,300.11	2,727,194.31	1,336,893.26	49.02
4921	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Pedro Perulapán, Cuscatlán		874,281.59	533,064.26	3,195.00	0.60
4894	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana		349,321.24	349,321.24	308,915.55	88.43
6135	Remodelación y Equipamiento de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica Boquín, Polorós, La Unión		213,481.90	213,481.90	8,095.70	3.79
4860	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Carmen, La Unión		205,757.71	205,757.71	128,324.67	62.37
6132	Ampliación, Remodelación y Equipamiento de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica UCSF-B El Mozote, Meanguera, Morazán		188,701.90	188,701.90	7,604.50	4.03
6119	Construcción y Equipamiento de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica UCSF-B Cantón San Julián, San Jorge, San Miguel		186,539.60	186,539.60	127,221.42	68.20
4654	Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"		168,211.32	168,211.32	30,254.68	17.99
4655	Remodelación y Equipamiento de la Tercera Planta del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales		166,762.62	166,762.62	165,375.00	99.17
4890	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La Libertad, La Libertad		116,068.26	116,068.26	104,248.13	89.82
4653	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"		71,296.91	71,296.91	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2016, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
4656	Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"		63,568.33	63,568.33	33,905.92	53.34
4929	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilobasco, Cabañas		42,299.61	42,299.61	0.70	0.00
4908	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás Pineda Martínez, Santa Ana		31,774.51	31,774.51	6,745.69	21.23
4853	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martín, San Salvador		12,697.02	12,697.02	3,211.00	25.29
4858	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilopango, San Salvador		8,801.88	8,801.88	3,436.00	39.04
4850	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador		8,046.40	8,046.40	3,892.00	48.37
4839	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes, San Salvador		7,492.65	7,492.65	2,498.00	33.34
4859	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Bobadilla, San Alejo, La Unión		6,163.45	6,163.45	901.04	14.62
4880	Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud El Espino, Jucuarán, Usulután		5,812.83	5,812.83	873.52	15.03
4861	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Faro, Conchagua, La Unión		5,724.61	5,724.61	34.4	0.60
4884	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango		5,451.49	5,451.49	106.32	1.95
4907	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Bárbara, Santa Ana		5,173.37	5,173.37	1,738.20	33.60
3345	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CHALATENANGO		5,024.33	5,024.33	1,077.36	21.44
4867	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Uluzapa, San Miguel		4,343.53	4,343.53	48.16	1.11
4905	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana		3,786.40	3,786.40	8.84	0.23
4893	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Tamanique, La Libertad		3,759.76	3,759.76	230.36	6.13
4876	Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud de Usulután, Usulután		3,451.24	3,451.24	-	-
4881	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Cruz, Usulután		3,255.64	3,255.64	-	-
4852	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador		3,166.98	3,166.98	2,445.00	77.20
4930	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Jutiapa, Cabañas		3,003.12	3,003.12	442.90	14.75
4903	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Juan las Minas, Metapán, Santa Ana		2,737.05	2,737.05	-	-
4897	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana		2,645.30	2,645.30	-	-
4926	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Sensuntepeque, Cabañas		2,544.69	2,544.69	34.40	1.35
4912	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Salcoatitán, Sonsonate		2,529.78	2,529.78	54.04	2.14
4925	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Perulapia, Cuscatlán		2,376.26	2,376.26	-	-
4887	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Ciudad Arce, La Libertad		2,375.77	2,375.77	917.88	38.64
4918	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Candelaria, Cuscatlán		2,335.29	2,335.29	-	-
4913	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Ahuachapán, Ahuachapán		2,297.40	2,297.40	-	-
4871	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Cuco, Chirilagua, San Miguel		2,272.40	2,272.40	33.90	1.49
4904	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Sebastián Salitrillo, Santa Ana		2,203.17	2,203.17	-	-
4920	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de Concepción, Cuscatlán		2,134.58	2,134.58	68.03	3.19
4866	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las Marias, Chinameca, San Miguel		2,089.10	2,089.10	-	-
4882	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Dorado, Chalatenango		2,053.69	2,053.69	53.16	2.59
4933	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía Orcoy, Olocuilta, La Paz		2,020.77	2,020.77	-	-
4888	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Manuel Gallardo, Colón, La Libertad		2,004.79	2,004.79	-	-
3346	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA		1,941.58	1,941.58	0.70	0.04
4868	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel		1,842.46	1,842.46	28.02	1.52
4914	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Lorenzo, Ahuachapán		1,798.73	1,798.73	-	-
4862	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Carlos, La Unión		1,790.00	1,790.00	-	-
4902	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San José Ingenio, Metapán, Santa Ana		1,751.75	1,751.75	13.26	0.76
4863	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Playa, La Unión		1,570.07	1,570.07	10.07	0.64
4910	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio, San Antonio del Monte, Sonsonate		1,554.88	1,554.88	-	-
4938	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guadalupe, San Vicente		1,534.15	1,534.15	46.63	3.04
4891	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Matías, La Libertad		1,443.33	1,443.33	88.60	6.14
4864	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Llano los Patos, Conchagua, La Unión		1,432.00	1,432.00	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2016, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
4934	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz		1,431.06	1,431.06	40.28	2.81
4900	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Congo, Santa Ana		1,384.73	1,384.73	-	-
4909	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio Pajonal, Santa Ana		1,356.73	1,356.73	-	-
4917	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán		1,330.41	1,330.41	18.91	1.42
4865	Ampliación ,Equipamiento Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Piche, El Carmen, La Unión		1,268.12	1,268.12	-	-
4855	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Paisnal, San Salvador		1,195.68	1,195.68	1,050.00	87.82
4924	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán		1,167.20	1,167.20	-	-
4892	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad		1,154.49	1,154.49	-	-
4901	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Belen Guijat, Metapán, Santa Ana		1,153.36	1,153.36	11.30	0.98
4847	Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Ciudad Delgado, San Salvador		1,145.23	1,145.23	-	-
4869	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Comacaran, San Miguel		1,143.09	1,143.09	29.48	2.58
4875	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Primavera, El Tránsito, San Miguel		1,125.87	1,125.87	29.98	2.66
4919	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de El Carmen, Cuscatlán		1,114.04	1,114.04	-	-
4878	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután		1,065.00	1,065.00	-	-
4854	Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Guazapa, San Salvador		1,044.81	1,044.81	-	-
4896	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Planes de la Laguna, Santa Ana		1,023.00	1,023.00	-	-
4915	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Jose Naranjo, Jujutla, Ahuachapán		1,001.13	1,001.13	34.40	3.44
4899	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Sabanetas, Chalchuapa, Santa Ana		924.31	924.31	13.26	1.43
4870	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lolotique, San Miguel		914.73	914.73	-	-
4877	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Triunfo, Usulután		895.98	895.98	24.33	2.72
4872	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Milagro de la Paz, San Miguel		895	895	-	-
4873	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Silva, San Miguel		895	895	-	-
4883	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Palma, Chalatenango		893.33	893.33	-	-
4836	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de Ayutuxtepeque, San Salvador		788.72	788.72	501.50	63.58
4837	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador		695.36	695.36	-	-
4898	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa Ana		663.65	663.65	28.25	4.26
4935	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Juan Talpa, La Paz		633.46	633.46	-	-
4937	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitán, San Vicente		629.8	629.8	-	-
4657	Programa de Extensión de Cobertura en la Zona Rural (periodo 2009-2011)		400	400	-	-
4889	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad		309.66	309.66	53.16	17.17
4936	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Rafael Obrajuelo, La Paz		277.4	277.4	-	-
4916	Ampliación , Equipamiento,Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Chinamas, Ahuachapán		275.86	275.86	20.14	7.30
4851	Ampliación, Equipamiento ,Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Tonacatepeque, San Salvador		255.94	255.94	220.50	86.15
4838	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Monserrat, San Salvador		253.28	253.28	-	-
4846	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Villa Mariona, Cuscatancingo, San Salvador		251.59	251.59	-	-
4845	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Popotlán, Apopa, San Salvador		233.6	233.6	-	-
4874	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Rafael, San Miguel		232.16	232.16	-	-
4842	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Barrios, San Salvador		225.36	225.36	-	-
4849	Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Marcos, San Salvador		207.41	207.41	-	-
4922	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Jose Guayabal, Cuscatlán		199.67	199.67	0.69	0.35
4931	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyultitán, La Paz		166.6	166.6	3.16	1.90
4856	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador		158.23	158.23	25.81	16.31
4840	Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador		150.14	150.14	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2016, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
4886	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Azacualpa, Chalatenango		145.72	145.72	17.72	12.16
4841	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador		119.17	119.17	-	-
4906	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Lucia, Santa Ana		109.5	109.5	-	-
4843	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilares, San Salvador		92.25	92.25	-	-
4932	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Mercedes La Ceiba, La Paz		53.16	53.16	-	-
4857	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador		53.08	53.08	-	-
4848	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador		44.28	44.28	-	-
4844	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador		36.63	36.63	-	-
MAG		10	36,532,002.40	22,131,028.84	13,739,850.65	62.08
5562	Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF)		16,481,796.59	10,570,650.89	3,025,256.02	28.62
5385	PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL RURAL (AMANECER RURAL)		11,044,186.80	6,884,905.40	6,746,464.88	97.99
5540	PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LAS REGIONES CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR CENTRAL) - AMPLIACION		4,958,000.00	2,706,623.92	2,575,095.64	95.14
6473	Instalación de Módulos de Riego para el Incremento de la Producción en los Departamentos de San Miguel y La Unión, afectados por la Sequía		1,410,000.00	450,000.00	183,158.44	40.70
6441	Rehabilitación y Ampliación del Área Bajo Riego en el Distrito de Riego y Avenamiento N°2 Aticooyo Unidad Norte		1,261,430.00	450,000.00	347,579.92	77.24
5725	CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA REGIÓN ORIENTAL CEDAF MORAZAN		1,081,701.34	981,701.34	796,381.46	81.12
6474	Fomento al Desarrollo de la Acuicultura Familiar en los Municipios de Pobreza en El Salvador		200,000.00	-	-	-
4643	Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador		56,925.99	49,185.61	46,876.61	95.31
5764	Fortalecimiento Institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológicas en Sanidad Animal, Análisis de Riesgo de Plagas y Sistema de Inteligencia de Mercados Agropecuarios en El Salvador		23,981.68	23,981.68	5,059.40	21.10
3752	Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO)		13,980.00	13,980.00	13,978.28	99.99
VMVDU		5	34,562,747.29	19,917,295.02	13,741,391.26	68.99
5939	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMMS		10,175,869.92	6,588,780.28	4,875,908.09	74.00
5398	"PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS URBANOS-KFW (MIAPU-KFW) Canje de Deuda entre la República de Alemania y la República de El Salvador"		7,873,084.65	2,817,940.45	2,070,973.60	73.49
5132	PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS		7,684,845.26	7,373,255.23	5,816,732.00	78.89
5100	DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA		4,958,051.46	2,409,653.06	977,777.57	40.58
5397	RESCATE DE LA FUNCION HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE SAN SALVADOR MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA.		3,870,896.00	727,666.00	-	-
MINED		11	28,767,345.34	15,824,099.26	8,652,664.58	54.68
5813	Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.		21,083,021.77	12,250,646.02	5,199,580.50	42.44
5096	Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador		2,092,119.85	914,485.15	523,817.03	57.28
5657	Potenciando la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El Salvador		1,464,155.83	184,351.65	786,817.05	426.80
6458	Fortalecimiento Educativo para docentes de educación básica y media en servicio del sector público, en el marco de la estrategia de SI-EITP, a nivel nacional.		1,067,000.00	200,000.00	199,999.70	100.00
6446	Un Niño Una Computadora, Una Niña Una Computadora.		1,000,000.00	1,000,000.00	679,475.85	67.95
5843	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR EL PEÑÓN DEL MUNICIPIO DE COMASAGUA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.		474,480.00	217,235.00	345,933.67	159.24
5768	Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACES) - Componente Educación.		452,548.39	417,143.39	381,738.39	91.51
6448	Mejoramiento de la Infraestructura de dos Centros Escolares ubicados en los Caseríos El Mozote y El Barrial del Municipio de Meanguera del Departamento de Morazán		369,060.00	-	-	-
6449	Reparaciones menores en 6 Centros Escolares ubicados en el Caserío El Mozote y zonas aledañas de los Municipios de Meanguera y Arambala, Departamento de Morazán		350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00
6468	Construcción de Obras complementarias en 3 Centros Escolares ubicados en los Municipios de Juayúa, Santiago Nonualco y San Vicente, de los Departamentos de Sonsonate, La Paz y San Vicente.		300,000.00	175,278.55	70,342.89	40.13
5268	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO-EDUCA)		114,959.50	114,959.50	114,959.50	100.00
FGR		3	18,030,700.00	48,750.61	27,616.36	56.65
6093	Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República de El Salvador		17,700,000.00	-	-	-
6432	Construcción de vías internas para circulación vehicular en las instalaciones de las oficinas centrales de la Fiscalía General de la Republica		274,700.00	-	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2016, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE g/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
6092	Construcción y Equipamiento del Depósito de Evidencias de la FGR en San Salvador		56,000.00	48,750.61	27,616.36	56.65
PNC - MJSP		5	12,480,182.31	5,135,846.18	3,530,782.12	68.75
5670	Construcción y Equipamiento Básico de la Delegación de la PNC en La Paz		6,105,018.52	2,409,062.41	1,080,837.95	44.87
5673	Reemplazo de la Flota Vehicular de la Policía Nacional Civil		3,882,913.37	1,823,628.37	1,823,628.37	100.00
4766	Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil		1,588,657.00	329,169.08	329,169.08	100.00
4747	Construcción y Equipamiento Básico Delegación Centro PNC		899,943.42	570,336.32	293,496.72	51.46
5938	Fortalecimiento de las Capacidades de la Subdirección de Administración y Finanzas de la Policía Nacional Civil de El Salvador.		3,650.00	3,650.00	3,650.00	100.00
CSJ		4	12,061,721.16	11,961,721.16	5,786,528.97	48.38
4344	Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador		6,212,909.07	6,212,909.07	1,962,058.55	31.58
3243	Construcción Centro Judicial Integrado de Santa Tecla		3,636,312.09	3,636,312.09	3,420,395.64	94.06
6456	REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL, A NIVEL NACIONAL. AÑO 2016		2,112,500.00	2,112,500.00	404,074.78	19.13
4225	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR		100,000.00	-	-	-
MH		5	11,400,000.00	9,470,250.34	5,122,262.58	54.09
4958	Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV.		9,400,000.00	9,373,005.40	5,122,004.41	54.65
4204	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TRIBUTARIA		1,005,375.00	-	-	-
6590	Construcción de Vías de Acceso y Parques en la Aduana Terrestre Metalío, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate		741,625.00	-	-	-
6563	Construcción de tapial perimetral y obras complementarias en Aduana Metalío, municipio de Acajutla, Sonsonate.		128,000.00	97,244.94	258.17	0.27
6466	Reparación de losa de concreto del parqueo superior de Edificios Tres Torres del Ministerio de Hacienda, San Salvador.		125,000.00	-	-	-
MARN		4	11,061,965.03	9,338,234.46	937,642.72	10.04
5391	Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Solidos en El Salvador		8,277,476.58	7,123,229.04	481,915.82	6.77
6164	Preparación de propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. (a nivel nacional)		1,821,258.50	1,407,521.47	360,441.69	25.61
6515	Reforzamiento Estructural del Edificio No. 1 de la Sede Central del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales		877,319.74	721,573.74	9,375.00	1.30
5102	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL		85,910.21	85,910.21	85,910.21	100.00
MINEC		1	10,012,772.23	4,483,000.77	2,512,553.40	56.05
6025	PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- COMPONENTES I, III, y V (BID 2583/OC-ESL1057)		10,012,772.23	4,483,000.77	2,512,553.40	56.05
SE - MJSP		4	6,585,030.00	3,620,957.01	2,617,168.68	72.28
6451	Fortalecimiento de capacidades institucionales para la seguridad ciudadana, el desarrollo de competencias y la remoción de tatuajes		2,500,000.00	2,176,900.00	1,673,872.10	76.89
6557	Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública - BID 2881/OC-ES		2,138,990.00	1,081,455.06	847,996.39	78.41
6558	Programa de Prevención de la violencia juvenil a nivel local - MJSP - BID 2881/OC-ES		1,784,290.00	303,214.60	41,988.72	13.85
6559	Administración y gestión del Programa BID - 2881/OC-ES		161,750.00	59,387.35	53,311.47	89.77
VMT		1	5,940,056.63	5,369,151.81	2,396,698.27	44.64
5478	Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador		5,940,056.63	5,369,151.81	2,396,698.27	44.64
MITUR		1	5,620,309.44	1,553,315.84	559,979.21	36.05
5833	Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero-Marina		5,620,309.44	1,553,315.84	559,979.21	36.05
SIS - CAPRES		5	3,275,341.67	1,783,702.69	1,630,082.05	91.39
5785	Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer Usulután, Santa Ana y San Martín		1,320,217.96	83,703.25	82,731.25	98.84
6195	Promoción de los Derechos de las Mujeres a través del fomento de la Autonomía Económica y la atención a la Salud Integral		787,078.74	703,432.43	599,392.48	85.21
6196	Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer a Nivel Nacional.		580,820.76	452,977.66	443,309.97	97.87
5644	PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL, PROMOCION COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CIUDAD MUJER		545,855.21	502,220.35	485,008.35	96.57
6206	Fortalecimiento de las Sedes de Ciudad Mujer en municipios de Comunidades Solidarias.		41,369.00	41,369.00	19,640.00	47.48
MTYPS		3	1,238,846.85	810,920.26	670,942.87	82.74
6032	Protección de Ingresos y Empleabilidad, Parte B Fortalecimiento de los Sistemas de Intermediación, Información y Formación Profesional.		611,611.64	611,611.64	597,722.10	97.73
6333	Reparaciones en Infraestructura y Equipamiento Básico Centros de Recreación a Trabajadores, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Fase III		500,000.00	72,073.41	73,220.77	101.59
6438	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN OFICINA CENTRAL, MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.		127,235.21	127,235.21	-	-
INJUVE		1	1,203,127.62	991,935.95	230,899.83	23.28



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2016, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
5770	Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias - FOCAP		1,203,127.62	991,935.95	230,899.83	23.28
AL		1	1,142,845.24	768,974.33	431,912.18	56.17
5222	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO II		1,142,845.24	768,974.33	431,912.18	56.17
ILEA		1	1,105,007.80	1,105,007.80	88,682.69	8.03
4493	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, ILEA SAN SALVADOR"		1,105,007.80	1,105,007.80	88,682.69	8.03
CONAMYPE		3	850,368.13	779,524.04	425,342.72	54.56
6075	Desarrollo de Un Modelo de empresarialidad Femenina en El Salvador(ES-M 1043)		550,505.00	519,668.00	237,692.87	45.74
5834	Fortalecimiento y Promoción del Emprendedurismo Social en Municipios de Pobreza Extrema a nivel nacional		184,588.58	174,343.58	123,612.56	70.90
5780	Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa productores de Calzado, Uniformes y Utiles Escolares a Nivel Nacional.		115,274.55	85,512.46	64,037.29	74.89
PGR		1	180,000.00	180,000.00	-	-
6437	Readecuación y Equipamiento Informático de las 17 Procuradurías Auxiliares de la Procuraduría General de la República de El Salvador		180,000.00	180,000.00	-	-
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS						
CEL		8	189,015,695.00	151,911,285.00	75,870,496.98	49.94
3119	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL		97,926,795.00	86,987,455.00	45,201,913.14	51.96
4400	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.		64,795,195.00	48,179,500.00	29,670,680.91	61.58
5821	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre		21,381,955.00	12,635,580.00	166,551.98	1.32
6178	Reparación y Mantenimiento de Bordas en el Bajo Lempa, Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente y Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután. Etapa I		3,000,000.00	2,457,180.00	624,749.45	25.43
5570	Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana.		1,379,520.00	1,169,795.00	206,601.50	17.66
5801	Programa de eficiencia energética en instalaciones de CEL		528,230.00	480,525.00	-	-
373	3A. UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CERRON GRANDE (MUNICIPIO DE JUTIAPA)		2,000.00	-	-	-
622	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON		2,000.00	1,250.00	-	-
CEPA		28	66,485,120.00	30,212,036.75	5,593,639.40	18.51
6487	Ampliación de Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.		20,729,915.00	6,218,974.50	-	-
5790	Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional El Salvador		8,023,580.00	5,023,580.00	1,292,576.25	25.73
6471	Construcción de 4 salas de espera para atención a pasajeros en el Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez		7,500,000.00	5,400,000.00	-	-
6470	Construcción de 4 posiciones de estacionamiento para aeronaves en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez		7,279,000.00	4,527,180.00	781,849.24	17.27
6478	Remodelación del estacionamiento de vehículos del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez		6,500,000.00	3,542,500.00	3,250,000.00	91.74
6593	Rehabilitación de los pavimentos de concreto hidráulico alrededor de las bodegas del Puerto de Acajutla, Fase 1/ colindancia entre Patio de Contenedores y bodegas 3 y 4		3,096,200.00	-	-	-
4342	Construcción de obras complementarias para el emplazamiento del Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) de la cabecera 25 del Aeropuerto Internacional El Salvador		2,000,000.00	600,000.00	-	-
6493	Suministro e instalación de Radioayudas en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		1,750,000.00	1,000,000.00	-	-
6592	Rehabilitación de la Bodega No.1 del Puerto de Acajutla		1,695,000.00	-	-	-
3947	AMPLIACION DEL ACCESO 1 DEL RECINTO PORTUARIO DE ACAJUTLA		1,491,500.00	580,000.00	-	-
6492	Suministro e instalación de Equipo de Rayos X para inspección de carga paletizada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		1,000,000.00	620,000.00	-	-
6475	Construcción de Tres Hangares y Plataformas de Estacionamiento para Aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Ilopango		966,425.00	729,652.25	-	-
6497	Rehabilitación de pavimento asfáltico en la plataforma internacional del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		825,000.00	511,500.00	88,858.45	17.37
6476	Suministro e Instalación de Sistemas de Detección y Combate de Incendios en las Bodegas 1 y 3 del Puerto de Acajutla, Sonsonate		770,000.00	154,000.00	-	-
6479	Adquisición de Equipo para el manejo de productos a granel en el Puerto de Acajutla, Sonsonate		645,000.00	466,875.00	180,355.46	38.63
6594	Modernización del Sistema de Iluminación de Muelles, Patios, Bodegas y Vías de Circulación Internas y Externas del Puerto de Acajutla		508,500.00	-	-	-
6481	Construcción de estacionamiento y área de almacenamiento de carga en el Puerto de Acajutla, Sonsonate - Etapa I		485,000.00	230,375.00	-	-
6477	Adquisición, Instalación y Configuración de Radar en el Puerto de Acajutla, Sonsonate		350,000.00	70,000.00	-	-



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2016, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE g/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
6482	Modernización y ampliación del sistema de video vigilancia del Puerto de Acajutla, Sonsonate-		200,000.00	154,000.00	-	-
6480	Construcción de dos puentes de acceso hacia la futura área de patio y parqueo, al oriente de las bodegas 1 y 3 del Puerto de Acajutla, Sonsonate.		200,000.00	74,000.00	-	-
6491	Construcción de tapial perimetral en la plataforma norte del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		120,000.00	74,400.00	-	-
6483	Construcción de Cancha de Fútbol Playa para el Malecón Acaxual, en el Puerto de Acajutla, Sonsonate.		100,000.00	20,000.00	-	-
6496	Remodelación de Cuadra de Seguridad del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		70,000.00	70,000.00	-	-
6498	Recarpeteo de calle perimetral en la rampa de la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		70,000.00	49,000.00	-	-
6499	Construcción de salón para capacitaciones AVSEC/FAL en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		50,000.00	50,000.00	-	-
6494	Construcción y acondicionamiento de bodega para mercancías peligrosas en la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		30,000.00	30,000.00	-	-
6495	Construcción de hangar para taller automotriz en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		20,000.00	6,000.00	-	-
6490	Construcción de bodegas en el Centro Recreativo Cuscatlán del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		10,000.00	10,000.00	-	-
ANDA		9	11,732,551.78	9,002,942.70	5,473,830.94	60.80
6353	Programa de Mejoramiento de la Red de Acueducto y Alcantarillado del Área Metropolitana de San Salvador - AMSS		4,171,040.57	3,744,963.35	1,503,260.54	40.14
5134	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.		2,400,799.72	1,636,096.23	1,302,628.15	79.62
5584	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.		2,235,560.60	1,489,019.23	918,975.55	61.72
5034	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR.		1,466,538.17	811,251.17	556,161.13	68.56
6357	Proyectos Condominiales de Agua Potable y Saneamiento en El Salvador		1,208,586.01	1,146,586.01	1,037,944.31	90.52
6541	Mejoramiento del sistema de agua potable en Potrero Seco y La China, Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel		90,000.00	15,000.00	-	-
6217	Introducción de Agua Potable en las Comunidades San Joaquín, Galicia, La Paz, Villas del Rosario y El Rosario, del Municipio de San Sebastián Salitrillo, Departamento de Santa Ana		85,686.48	85,686.48	81,611.32	95.24
6221	Reparación de Tuberías de Aguas Negras en Comunidad Acaxual I, Los Morritos, Casco Urbano de Acajutla del Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate		54,540.23	54,540.23	53,449.94	98.00
6218	Construcción de Tanque en Casco Urbano del Municipio de San José Las Flores, Departamento de Chalatenango		19,800.00	19,800.00	19,800.00	100.00
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES						
FOVIAL		10	57,223,657.76	44,226,555.41	30,489,973.06	68.94
5960	MEJORAMIENTO DE VIAS E INTERSECCIONES A NIVEL NACIONAL		34,699,317.02	27,081,327.42	20,840,753.24	76.96
6197	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO AÑO 2015		13,500,640.80	13,500,640.80	7,814,570.73	57.88
6341	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO AÑO 2016		4,327,954.57	403,185.00	33,261.67	8.25
6343	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2016		1,305,600.00	537,275.93	95,180.91	17.72
6501	REMDELACIÓN DEL SISTEMA VIAL DE LA ADUANA TERRESTRE LA HACHADURA		876,987.30	876,987.30	686,996.38	78.34
6198	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2015		821,507.54	821,507.54	547,433.90	66.64
6342	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2016		806,400.00	165,300.00	11,357.60	6.87
6199	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2015		598,780.53	598,780.53	455,337.74	76.04
4488	Administración del Programa (Unidad Ejecutora)		236,470.00	236,470.00	-	-
6433	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE FOVIAL		50,000.00	5,080.89	5,080.89	28.65
FISDL		15	51,154,292.27	34,147,141.73	21,949,994.63	64.28
4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL		29,892,120.23	20,471,376.90	12,880,712.64	62.92
5627	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR, COMPONENTE I		8,733,642.07	4,137,607.08	2,446,398.24	59.13
5384	PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS		5,000,000.00	4,250,978.21	2,936,643.27	69.08
2660	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL.		2,439,660.00	1,809,660.00	1,379,153.69	76.21
5629	PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y EMPLEABILIDAD		1,010,090.00	1,010,090.00	758,812.54	75.12
6452	Programa de apoyo integral a la estrategia de prevención de la violencia en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador		1,000,000.00	419,305.00	85,900.00	20.49
6454	Programa de inclusión productiva en el marco de programas sociales en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
4472	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV		889,009.84	570,219.41	295,651.85	51.85
6398	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIOS LOS ZELAYA, LOS AMATES, LA TRINIDAD, PAPALONES, ALTOS DEL LLANO Y EL RODEO, MUNICIPIO DE CHAPELTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL		642,530.00	212,035.00	105,000.00	49.52
6453	Programa de mejoramiento de espacios seguros de convivencia para jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)		339,000.00	57,630.00	-	-
6521	Concreteado hidráulico de la calle principal frente a Centro Escolar Caserío el Tablón, Cantón Río de Vargas, Municipio de Uluzapa, Departamento de San Miguel		90,000.00	90,000.00	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2016, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
6523	Introducción de energía eléctrica en Cantón el Zarzal, Caserío Los Vásquez y García, Municipio de Santo Domingo de Guzmán, Departamento de Sonsonate		50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
6522	Reparación de Escuela de Candelaria La Frontera, Municipio de Candelaria La Frontera, Departamento de Santa Ana		49,900.00	49,900.00	-	-
4460	FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNANZA (FISDL / KFW IV)		11,077.28	11,077.28	11,077.28	100.00
5630	COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN EDUCACIÓN		7,262.85	7,262.85	645.12	8.88
ISSS		6	18,840,165.00	172,945.00	2,554,159.20	1,476.86
4174	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN MIGUEL		10,065,635.00	-	1,612,175.00	-
3585	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE APOPA		6,919,730.00	-	941,984.20	-
5739	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ISSS, PARA ATENCIÓN DE ESPECIALIDADES, SAN SALVADOR.		820,325.00	-	-	-
4198	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ANA.		576,475.00	172,945.00	-	-
6587	Readecuación de infraestructura y equipamiento para atención pediátrica en centros de atención del ISSS, de los departamentos de San Salvador, Sonsonate y Santa Ana		391,000.00	-	-	-
6551	Readecuación y Equipamiento de la Clínica de Atención Inmediata de Oncología (CAI) del Hospital de Oncología del ISSS, San Salvador.		67,000.00	-	-	-
CNR		1	13,663,331.08	4,761,682.20	2,679,003.98	56.26
3541	PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II		13,663,331.08	4,761,682.20	2,679,003.98	56.26
CENTA		3	4,336,852.43	3,782,771.53	2,058,133.08	54.41
5868	Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologías Sostenibles Ante el Cambio Climático en El Salvador		2,340,065.00	1,987,228.34	1,484,257.36	74.69
6566	Desarrollo Tecnológico y Fortalecimiento de la Base Productiva y Agroindustrial para la Cacaocultura con enfoque Agroecológico en El Salvador		1,457,881.88	1,376,658.21	181,238.23	13.17
6520	Biofertilizantes en cultivo de maíz, frijol y café como alternativa agroecológica para una producción sostenible en El Salvador.		538,905.55	418,884.98	392,637.49	93.73
UES		18	3,099,401.92	3,018,846.54	262,864.87	8.71
3762	CONSTRUCCION DE BOVEDA		2,356,286.09	2,356,286.09	218,909.74	9.29
5012	Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente		434,755.57	380,000.00	-	-
5025	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA JÓVENES TALENTO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR		183,063.65	165,000.00	-	-
5013	Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias Economicas		52,159.47	52,159.47	14,055.00	26.95
5016	Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias y Humanidades.		34,831.51	34,831.51	11,717.70	33.64
5014	Construcción de Edificio de Usos Múltiples para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.		15,508.10	15,508.10	4,503.48	29.04
5015	Construcción de Edificio para instituto de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas		15,061.37	15,061.37	13,678.95	90.82
5017	Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la Facultad de Medicina.		3,031.64	-	-	-
5024	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES GENERANDO OPORTUNIDADES DE ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CON PERSPECTIVAS HACIA EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL		2,573.10	-	-	-
5020	Modernización de el Sistema de Energía Eléctrica en el Campus Central		1,762.49	-	-	-
5009	Fortalecimiento de los Laboratorios del area Básica de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas		204.32	-	-	-
5021	Modernización de los Laboratorios del Departamento de Química de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.		65.75	-	-	-
5023	Modernización de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.		48.91	-	-	-
5026	Fortalecimiento de la Radio Universitaria		34	-	-	-
5027	Modernización de la Administración Académica		12.38	-	-	-
5010	Fortalecimiento de Infraestructura en la Facultad de Odontología.		2.08	-	-	-
5022	Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia.		1.48	-	-	-
5011	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL		0.01	-	-	-
INDES		4	1,760,960.84	1,660,960.84	205,520.46	12.37
6503	Rehabilitación y Mejoramiento del Estadio de Fútbol Juan Francisco Barraza, Departamento de San Miguel, Fase I		1,500,000.00	1,400,000.00	205,520.46	14.68
6239	Construcción de polideportivo en el municipio de San Luis La Herradura, departamento de La Paz		99,308.20	99,308.20	-	-
6244	Construcción de graderías y muro perimetral del Estadio de Pasaquina, del departamento de La Unión		85,806.30	85,806.30	-	-
6243	Mejoramiento de la cancha municipal del Caserío El Salitre, Municipio de Anamorós, departamento de La Unión		75,846.34	75,846.34	-	-
ISNA		1	1,690,000.00	1,690,000.00	933,506.07	55.24
6436	Readecuación y Equipamiento de las instalaciones físicas de Ciudad de la Niñez y Adolescencia, Departamento de Santa Ana		1,690,000.00	1,690,000.00	933,506.07	55.24
ISTU		2	908,481.57	908,481.57	-	-
5624	MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS RECREATIVOS DEL ISTU A NIVEL NACIONAL		515,071.57	515,071.57	-	-
6280	Mejoramiento y acondicionamiento del Centro Recreativo Puerta del Diablo, Cantón Planes de Renderos, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador		393,410.00	393,410.00	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2016, EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
CORSATUR		1	755,000.00	523,460.00	-	-
6502	Reparación y Mejoramiento de las Instalaciones del Hotel de Montaña Cerro Verde, Cantón Las Lomas, Municipio de El Congo, Departamento de Santa Ana		755,000.00	523,460.00	-	-
ISRI		3	473,415.00	356,001.09	61,636.25	17.31
5886	Remodelación del Centro de Rehabilitación Profesional del ISRI, San Salvador		254,258.15	162,575.38	23,405.16	14.40
4765	Mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia, San Salvador		154,386.85	128,655.71	38,231.09	29.72
4102	DIAGNOSTICO Y SUSTITUCION DE LINEAS HIDROSANITARIAS EN EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION DE INVALIDOS, ETAPA I, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.		64,770.00	64,770.00	-	-
ISDEMU		1	150,000.00	21,524.09	21,524.08	100.00
6275	Adquisición e instalación de generadores de energía fotovoltaica en la Oficina Central del ISDEMU, ubicada en San Salvador		150,000.00	21,524.09	21,524.08	100.00
OTRAS						
FOMILENIO		10	36,669,817.63	4,001,173.23	641,430.08	16.03
50098	Proyecto De Infraestructura Logística - Contrapartida De Infraestructura Logística		9,953,258.80	150,192.81	843.87	0.56
40761	Proyecto de Capital Humano - Actividad Secundaria para la Ejecución del Modelo Inclusivo de Tiempo Completo - FASE DE EJECUCION		6,901,407.70	1,255,135.00	108,595.00	8.65
40760	Proyecto de Capital Humano - Actividad Secundaria para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación - FASE DE EJECUCION		5,832,087.26	2,076,246.30	13,199.00	0.64
50096	Proyecto de Administración del Programa - Contrapartida para pago de impuestos del Programa		5,648,268.82	172,869.18	172,641.36	99.87
50097	Proyecto de Clima de Inversión - Contrapartida de Clima de Inversión		3,325,867.61	128,316.35	127,965.35	99.73
40758	Proyecto de Clima de Inversión - Actividad Secundaria de los Asocios Públicos-Privados-FASE DE EJECUCION		1,749,600.17	51,496.77	51,457.18	99.92
50099	Proyecto de Capital Humano - Contrapartida de Capital Humano		943,459.36	56,735.48	56,546.98	99.67
40759	Proyecto de Clima de Inversión - Actividad Secundaria de Apuesta Por InversionES - FASE DE EJECUCION		906,273.09	59,975.60	59,975.60	100.00
40757	Proyecto de Clima de Inversión - Actividad Secundaria de Mejora Regulatoria-FASE DE EJECUCION		862,100.00	36,569.77	36,569.77	100.00
40762	Proyecto de Capital Humano -Actividad Secundaria de Gobernanza Del Sistema Integrado FCTP - FASE DE EJECUCION.		547,494.82	13,635.97	13,635.97	100.00
FONAVIPO		9	1,274,168.52	912,324.59	625,338.67	68.54
5085	CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		434,152.57	203,306.78	159,686.43	78.54
5371	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de San Vicente		379,136.20	361,372.87	257,582.46	71.28
5192	CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION PROCAVIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		245,285.72	182,921.69	96,664.34	52.84
5503	CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		99,386.14	82,215.36	82,044.36	99.79
5744	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PROYECTO HABITACIONAL DOS QUEBRADAS, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE		50,934.64	50,934.64	29,023.85	56.98
6579	Construcción de Módulos Sanitarios en Proyecto Habitacional Vista al Volcán, Municipio de Guadalupe, Departamento de San Vicente		40,000.00	10,500.00	-	-
5372	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Villas de San Pedro, Municipio de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz		16,800.00	12,600.00	-	-
5245	CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.		8,180.00	8,180.00	337.23	4.12
5370	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Nuevo Verapaz, Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente		293.25	293.25	-	-
FONAES		4	983,435.06	934,677.59	473,520.56	50.66
6390	Programa Techo y Agua, Fase 2015		515,631.20	491,977.70	246,795.93	50.16
5050	PROGRAMA TECHO Y AGUA 2014		236,650.66	236,650.66	134,747.63	56.94
6506	Aprovechamiento del recurso hídrico mediante la captación de agua lluvia para el consumo humano en el municipio de Juayúa, Sonsonate		191,103.97	166,000.00	61,017.00	36.76
5777	Programa Techo y Agua 2012-2013		40,049.23	40,049.23	30,960.00	77.30
FSV		1	396,000.00	-	-	-
6027	AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA , SAN SALVADOR		396,000.00	-	-	-
SUBTOTAL		381	808,869,463.77	511,346,031.12	257,844,061.12	50.42
FODES			261,749,478.78	196,312,109.85	196,312,109.85*	100.00
6406	Inversión Municipal a través del FODES 2016		261,749,478.78	196,312,109.85	196,312,109.85	100.00
TOTAL GENERAL			1,070,618,942.55	707,658,140.97	454,156,170.97	64.18

a/ Información registrada por las Ejecutoras en los Sistemas SAFI y SIIP, reporte generado el 12 de octubre de 2016.

* Información acorde a los registros efectuados por el ISDEM en el Sistema SAFI.
