

MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO DE

**EL SALVADOR**

UNÁMONOS PARA CRECER

# PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2017 INFORME DE AVANCE AL MES DE OCTUBRE



# PAIP 2017

Dirección General de Inversión y Crédito Público  
noviembre 2017

## INTRODUCCIÓN

Durante el presente año, el Gobierno de El Salvador ejecuta diversos proyectos contenidos en el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2017, relacionados con infraestructura sanitaria, educativa, energía eléctrica, conectividad vial, seguridad y justicia entre otros; pertenecientes a los sectores social, económico y seguridad pública y justicia.

El informe reporta el comportamiento de la ejecución financiera de los programas y proyectos que forman parte del PAIP 2017, con datos al mes de octubre, cuyo total asciende a \$1,063.95 millones conforme a los registros efectuados en las aplicaciones informáticas correspondientes por las instituciones del Sector Público pertenecientes al Gobierno Central, Empresas Públicas No Financieras, e Instituciones Descentralizadas No Empresariales, entre otras; y la información se presenta clasificada por tipo de presupuesto y/o programas especiales, sector de actividad, fuentes de financiamiento, estructura del sector público, instituciones y programas/proyectos de cada una de éstas.


## I. Información General

### 1.1 Composición del Programa

El PAIP 2017 vigente al mes de octubre asciende a \$1,063.95 millones, equivalente al 3.8% del PIB<sup>1</sup>, y reporta un incremento de \$0.17 millones con respecto al PAIP correspondiente al mes de septiembre, por efecto neto del aumento en los programas institucionales de CEPA, FISDL y MARN y disminución en el MOP.

En el Gráfico No.1 se presenta la composición del PAIP 2017 vigente al mes de octubre, por tipo de presupuesto y/o programas especiales.

**Gráfico No.1**  
**Composición del PAIP 2017, según tipos de presupuestos y/o programas especiales**

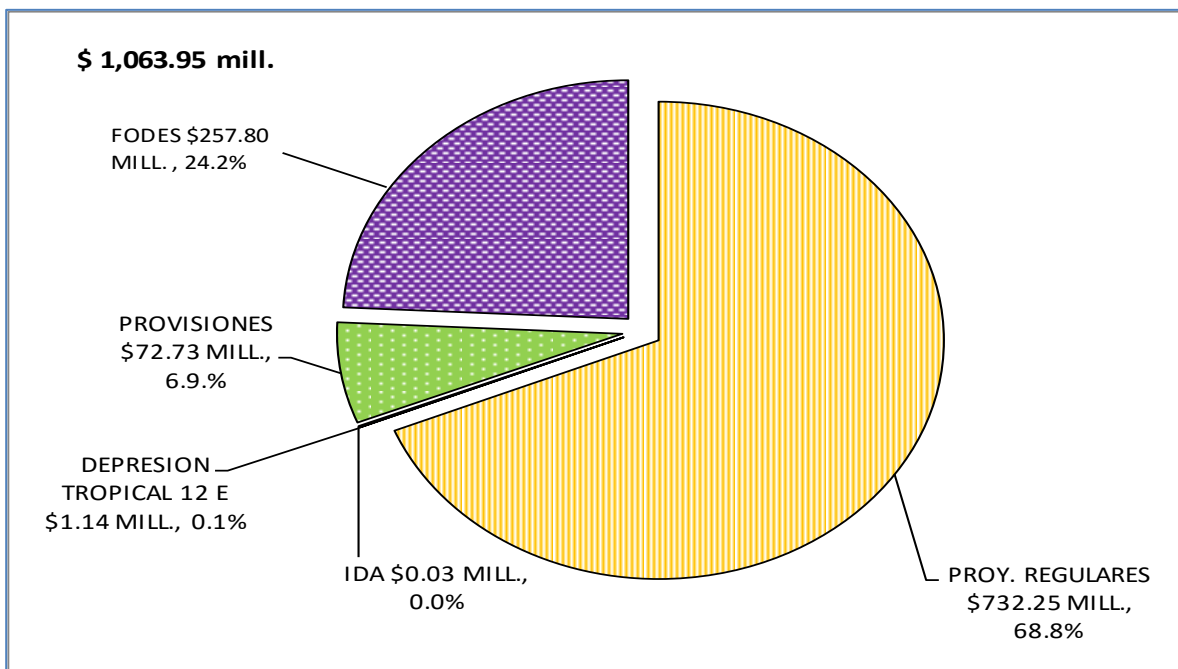


### 1.2 Distribución del PAIP 2017, por Sector de Actividad

Del monto de \$1,063.95 millones del PAIP 2017 vigente al mes de octubre, \$487.22 millones (45.8%) están asignados a proyectos del Sector Económico, \$460.38 millones (43.3%) a proyectos del Sector Social, y \$116.35 millones (10.9%) a proyectos del Sector Seguridad Pública y Justicia; y de dicho total, se reporta una ejecución de \$396.25 millones, correspondientes al 58.4% de lo programado al mes, distribuidos de la siguiente manera: \$214.66 millones del Sector Social, \$161.97 millones en proyectos del Sector Económico, y \$19.62 millones a proyectos de Seguridad y Justicia.

<sup>1</sup>PIB: US\$27,925.4 millones.

A continuación se presenta de manera gráfica, los montos programados y ejecutados al mes de octubre, por sector de actividad.

**Gráfico No.2**  
**PAIP 2017 por Sector de Actividad, al mes de octubre**

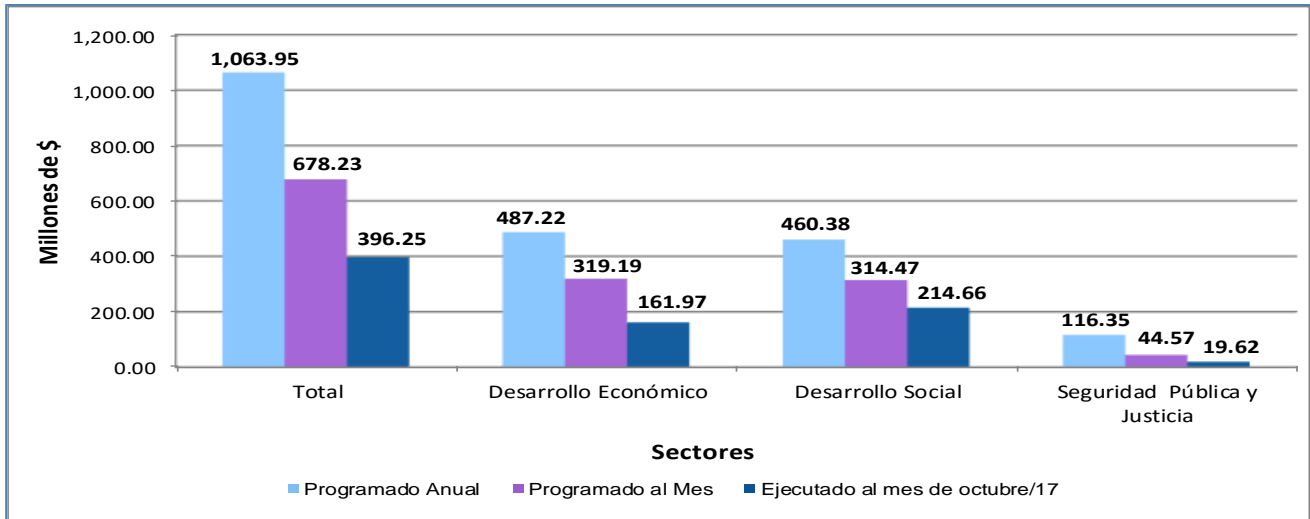


**II. Comportamiento del PAIP 2017**

**2.1 Composición del PAIP 2017, por Fuente de Financiamiento.**

Considerando el origen interno y externo de las fuentes de financiamiento de los proyectos que conforman el PAIP 2017 vigente al mes de octubre, el 55.4% corresponden a fuentes internas y 44.6% a fuentes externas, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

**Gráfico No.3**  
**PAIP 2017 por Fuente de Financiamiento, al mes de octubre**

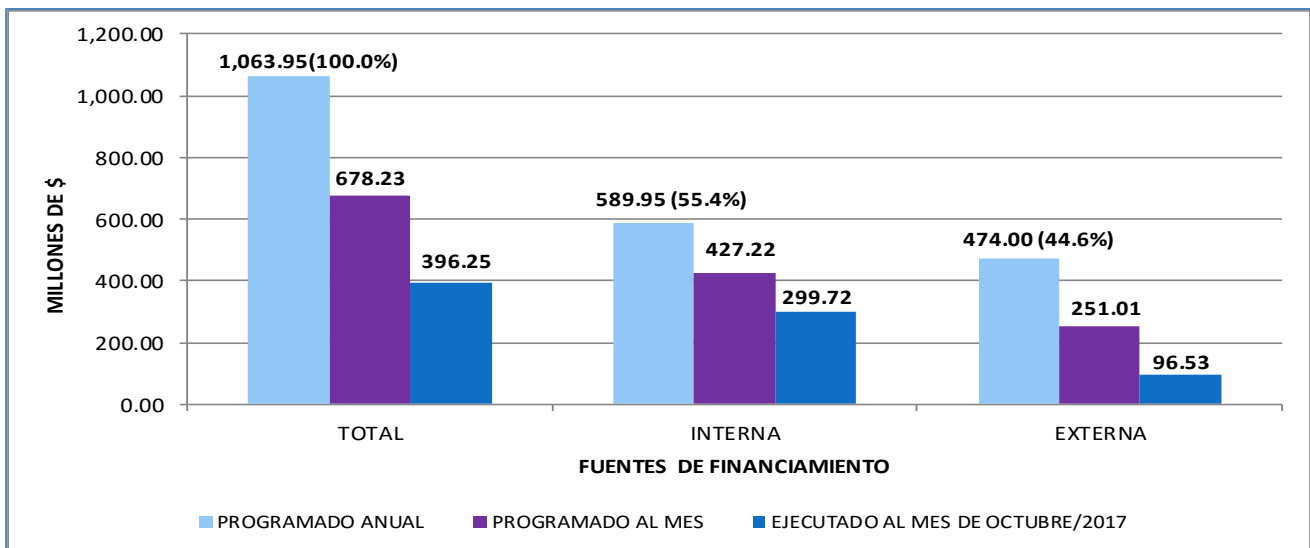


**2.2 Composición del PAIP 2017, por Estructura del Sector Público**

Del total de \$1,063.95 millones que conforman el PAIP 2017 al mes de octubre, el 34.6% de los recursos están asignados a proyectos de instituciones del Gobierno Central, el 20.9% a proyectos de las Empresas Públicas No Financieras, 17.8% a Instituciones Descentralizadas No Empresariales, y el 26.7% son recursos FODES y proyectos de otras entidades.

Según la estructura del Sector Público, al mes de octubre la inversión se ejecutó de la siguiente manera: Gobierno Central \$95.47 millones (24.1% del total ejecutado); Instituciones Descentralizadas No Empresariales \$67.67 millones (17.1%), Empresas Públicas No Financieras \$14.06 millones (3.5%), FODES y Otras \$219.05 millones (55.3%), tal como se observa en el siguiente gráfico:


**Gráfico No.4**  
**PAIP 2017 por Estructura del Sector Público, al mes de octubre**  
**(Millones de US\$)**

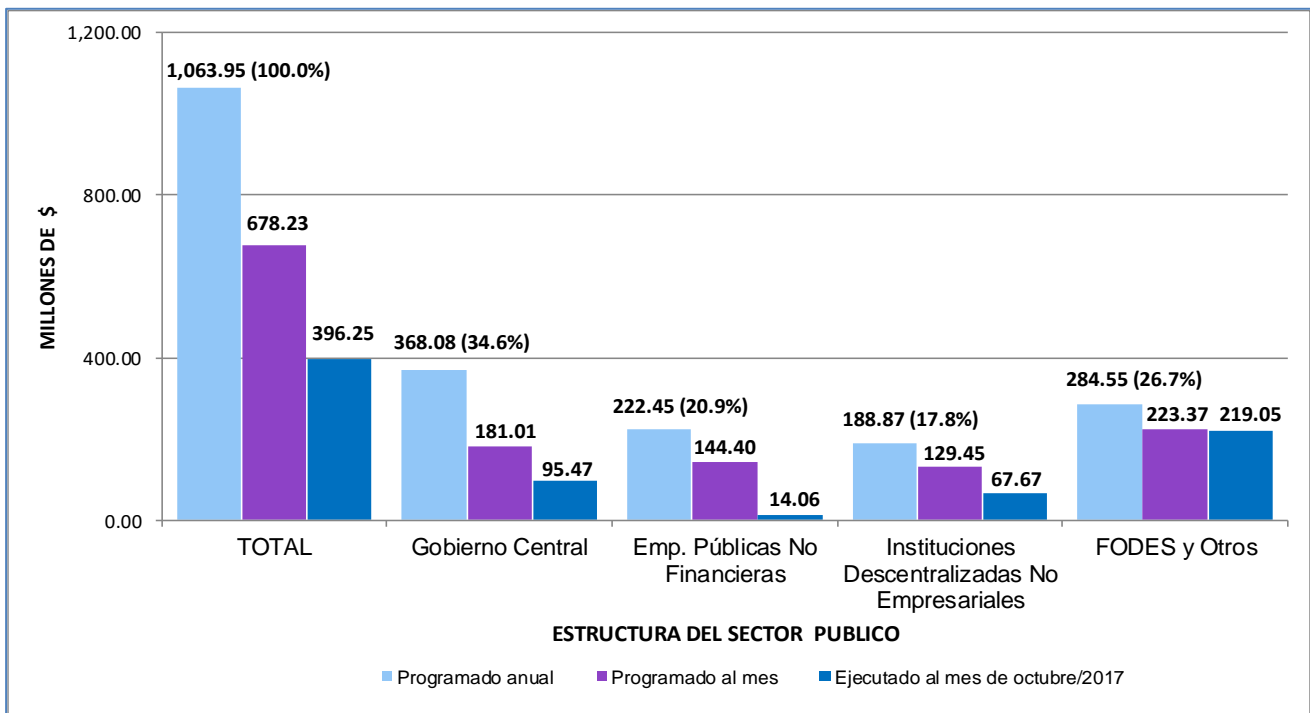

**2.3 Avance en el uso de los Recursos del PAIP**

De acuerdo a los registros efectuados por las instituciones ejecutoras en los Sistemas Informáticos correspondientes, al cierre del mes de octubre se reportó un monto comprometido por valor de \$632.53 millones, equivalente al 59.5% del PAIP vigente (con FODES), lo cual incluye \$396.25 millones ejecutados y \$236.28 millones pendientes de ejecutar.


**Gráfico No.5**  
**Avance en el uso de los Recursos del PAIP 2017 al mes de octubre**

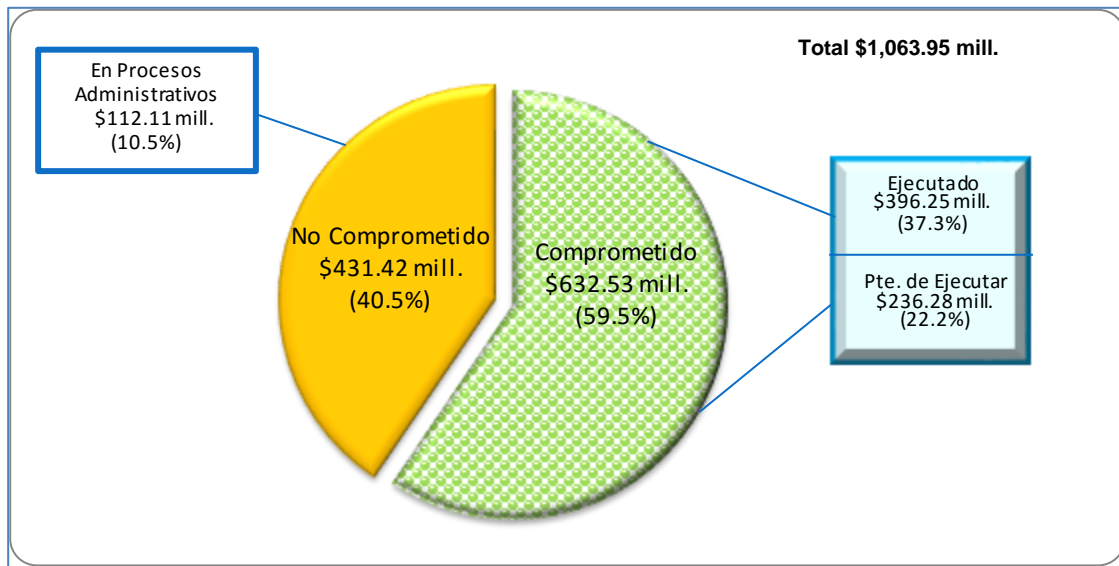

**2.4 Comparativo de la Inversión Programada / Ejecutada**

En el siguiente gráfico se reportan los montos de inversión programada/ejecutada al mes de octubre, durante los últimos 6 años (2012 – 2017).

**Gráfico No.6**  
**Inversión Programada/Ejecutada, al mes de octubre 2012 – 2017**

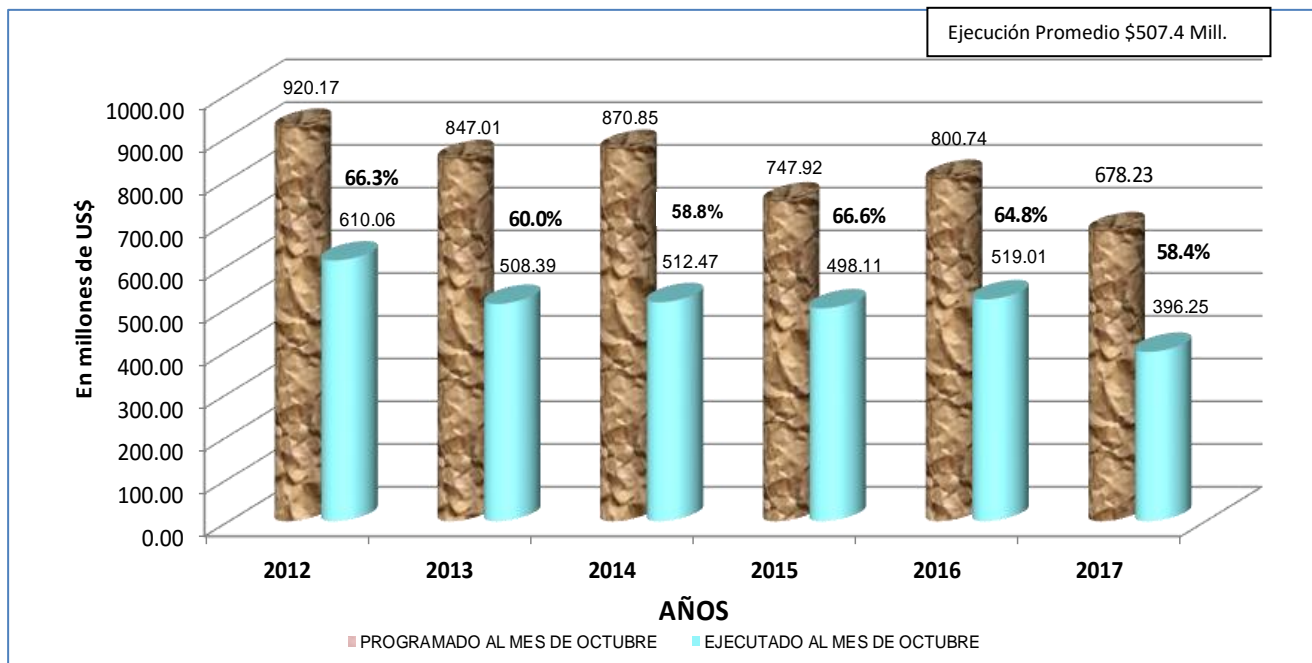

## 2.5 Inversión Programada / Ejecutada por Institución Ejecutora

**Cuadro No.1**  
**Programación / Ejecución Financiera del PAIP 2017, al mes de octubre, por Institución**  
 (Millones de dólares)

INSTITUCIONES	No. de Programas /Proyectos	PROGRAMA VIGENTE ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE OCTUBRE	COMPROMETIDO AL MES DE OCTUBRE		MONTO NO COMPROMETIDO AL MES DE OCTUBRE	
				TOTAL	SUB TOTAL EJECUTADO	TOTAL	SUB TOTAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
<b>GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>253</b>	<b>368.07</b>	<b>181.01</b>	<b>210.03</b>	<b>95.46</b>	<b>158.05</b>	<b>69.68</b>
DGCP -MJSP	14	69.83	26.64	28.30	14.76	41.54	20.39
MOP	57	62.99	10.97	36.72	6.76	26.27	21.28
MINSAL	104	54.67	37.84	47.82	19.65	6.85	6.07
MINED	11	39.81	28.81	32.14	19.33	7.67	4.79
MAG	13	32.02	21.47	14.99	12.65	17.03	2.70
FGR	2	22.01	-	-	-	22.01	-
MARN	3	20.52	12.41	12.25	6.34	8.27	6.47
VMVDU	9	19.18	13.96	9.91	6.90	9.27	5.94
MINEC	2	9.97	5.02	6.41	1.44	3.55	1.18
SE - MJSP	5	8.75	4.14	3.29	1.93	5.46	0.43
PNC - MJSP	4	8.72	7.69	8.71	1.95	0.01	-
MITUR	1	7.30	4.00	1.95	1.19	5.35	-
CSJ	8	6.07	5.14	4.77	0.37	1.30	0.40
SIS CAPRES	3	1.63	0.39	0.39	0.30	1.24	-
MH	7	1.50	0.20	0.20	0.20	1.30	-
ILEA	1	0.96	0.96	0.61	0.61	0.35	0.03
INJUVE	1	0.96	0.84	0.86	0.81	0.10	-
MTYPS	2	0.70	0.27	0.50	0.06	0.20	-
CONAMYPE	2	0.26	0.26	0.21	0.21	0.06	-
MIGOBDET	4	0.22	-	-	-	0.22	-
<b>EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</b>	<b>48</b>	<b>222.45</b>	<b>144.40</b>	<b>35.83</b>	<b>14.06</b>	<b>186.62</b>	<b>33.85</b>
CEL	5	129.14	112.01	5.95	5.95	123.19	-
CEPA	34	69.40	27.09	26.70	5.34	42.70	15.83
ANDA	9	23.91	5.30	3.18	2.77	20.73	18.02
<b>INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>48</b>	<b>188.88</b>	<b>129.45</b>	<b>124.65</b>	<b>67.68</b>	<b>64.22</b>	<b>8.58</b>
FOVIAL	10	71.80	49.78	63.63	40.84	8.17	6.86
ISSS	6	48.50	33.64	31.37	1.48	17.13	-
FISDL	9	45.49	30.28	18.89	17.85	26.60	0.72
CNR	1	12.35	6.33	3.03	2.82	9.32	0.21
UES	4	2.84	2.46	2.78	0.80	0.06	-
CENTA	4	2.80	2.73	2.26	2.08	0.54	0.01
CORSATUR	2	2.07	1.91	0.52	0.52	1.54	-
ENA	1	0.92	0.50	0.92	0.33	0.00	-
INDES	1	0.61	0.61	0.61	0.40	-	-
ISTU	4	0.53	0.53	0.53	0.52	0.00	-
ISRI	3	0.46	0.29	-	-	0.46	0.45
ISBM	1	0.33	0.33	-	-	0.33	0.33
ISDEMU	2	0.18	0.06	0.11	0.04	0.07	-
<b>OTRAS</b>	<b>31</b>	<b>26.75</b>	<b>8.53</b>	<b>4.22</b>	<b>4.21</b>	<b>22.53</b>	<b>0.00</b>
FOMILENIO	15	23.84	6.44	3.29	3.29	20.55	-
FSV	1	1.32	0.73	-	-	1.32	-
FONAES	7	1.05	0.95	0.56	0.56	0.49	-
FONAVIPO	8	0.54	0.41	0.37	0.36	0.17	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>380</b>	<b>806.15</b>	<b>463.39</b>	<b>374.73</b>	<b>181.41</b>	<b>431.42</b>	<b>112.11</b>
<b>FODES</b>	<b>1</b>	<b>257.80</b>	<b>214.84</b>	<b>257.80</b>	<b>214.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>381</b>	<b>1,063.95</b>	<b>678.23</b>	<b>632.53</b>	<b>396.25</b>	<b>431.42</b>	<b>112.11</b>

## 2.6 Avance del PAIP 2017 al mes de octubre, por Programa y Presupuesto

En el siguiente cuadro se reportan los montos programados del año y al mes de octubre, así como los montos ejecutados, comprometidos y no comprometidos; y dentro de éstos últimos los recursos que se encuentran en procesos administrativos.

**Cuadro No.2**  
**PAIP 2017 por Programa y Presupuesto al mes de octubre**  
**(En millones US\$)**

PROGRAMA / PRESUPUESTO	Programado vigente anual	Programado al mes de octubre	Ejecutado al mes de octubre	COMPROMETIDO			NO COMPROMETIDO		
				TOTAL	EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE	PENDIENTE DE EJECUTAR	TOTAL	EN PROCESOS ADMINIST.	SIN INICIAR PROCESOS ADMINIST.
	1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8
PROYECTOS REGULARES	732.25	396.15	136.87	301.49	136.87	121.32	430.76	112.11	318.65
IDA	0.03	0.02	0.001	0.001	0.001	-	0.03	-	0.03
Depresión Tropical 12E	1.14	1.01	0.51	0.51	0.51	-	0.63	-	0.63
PROVISIONES 2016	72.73	66.21	44.03	72.73	44.03	28.70	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>806.15</b>	<b>463.39</b>	<b>181.41</b>	<b>374.73</b>	<b>181.41</b>	<b>193.32</b>	<b>431.42</b>	<b>112.11</b>	<b>319.31</b>
FODES	257.80	214.84	214.84	257.80	214.84	42.96	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,063.95</b>	<b>678.23</b>	<b>396.25</b>	<b>632.53</b>	<b>396.25</b>	<b>236.28</b>	<b>431.42</b>	<b>112.11</b>	<b>319.31</b>

## 2.7 Proyectos con mayores montos programados para el 2017

El cuadro N°3 contiene el detalle de los 10 programas/proyectos cuya inversión programada para el año 2017 de forma conjunta asciende a \$371.71 millones y concentran el 46.1% del PAIP vigente sin FODES, por valor de \$806.15 millones, con los montos programados y ejecutados al mes de octubre.

**Cuadro No.3**  
**LISTA DE LOS 10 PROYECTOS DEL PAIP 2017, CON MAYOR INVERSION PROGRAMADA**  
**(En millones US\$)**

INSTITUCIONES	PROGRAMAS/PROYECTOS	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE OCTUBRE	EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE
CEL	Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	110.00	95.15	2.33
MINSAL	Fortalecimiento del Sistema Público de Salud	46.72	30.29	16.65
CEPA	Ampliación de Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.	34.28	6.63	-
MINED	Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación	33.98	25.06	17.39
FOVIAL	Programa de Mantenimiento Rutinario de Vías Pavimentadas a Nivel Nacional 2017, Componente de Inversión.	31.54	23.92	22.39
ISSS	Construcción y Equipamiento del Hospital Regional de San Miguel	28.63	18.32	1.17
FISDL	Programa Sistema de Protección Social Universal	27.05	16.87	11.76
FGR	Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República	21.73	-	-
MOP	Ampliación de la Carretera CAO4s, Tramo II: entre Km.22.36 (salida Sur de Zaragoza)- Km.31.86 (inicio By Pass de La Libertad), Departamento de La Libertad.	18.93	0.24	0.04
MOP	Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Vial Estratégica en los Departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y La Libertad.	18.85	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>371.71</b>	<b>216.48</b>	<b>71.73</b>



Según la información del cuadro anterior, la CEL es la institución que tiene el mayor monto programado al mes de octubre, destinado a ampliar la capacidad de generación de energía eléctrica; le sigue el MINSAL con el Programa Fortalecimiento del Sistema Público de Salud, y MOP con proyectos de ampliación de carreteras y mantenimiento de la infraestructura vial. Complementan el listado de proyectos los correspondientes a CEPA, MINED, FOVIAL, ISSS, FISDL y FGR.

A continuación se detallan los programas/proyectos que conforman el PAIP 2017 vigente al mes de octubre, agrupados por institución ejecutora, según reporte generado el 24 de noviembre de 2017, con información registrada por las entidades ejecutoras en los Sistemas SAFI y SIIP.



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2017, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE a/  
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
<b>GOBIERNO CENTRAL</b>						
<b>DGCP - MJSP</b>		<b>14</b>	<b>69,833,985.97</b>	<b>26,636,725.41</b>	<b>14,758,545.31</b>	<b>55.41</b>
5898	Construcción de Complejo Penitenciario Ordinario en Morazán.		16,085,585.00	-	-	-
6561	Programa de Fortalecimiento del Proceso de Rehabilitación y Reinserción Social - BID 2881/OC-ES		8,020,959.79	1,925,509.53	1,893,993.29	98.36
5899	Readecuación de Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, Departamento de La Paz		6,462,815.95	4,579,496.46	3,595,674.71	78.52
5896	Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos		6,403,200.00	472,249.21	472,249.21	100.00
5904	Readecuación de Granja Penitenciaria en el Departamento de Santa Ana		5,488,835.39	5,171,326.39	1,316,842.98	25.46
6583	Construcción y equipamiento de centro de reclusión temporal para privados de libertad de baja peligrosidad en el cantón Los Llanitos, municipio de Ayutuxtepeque, San Salvador		4,500,000.00	3,387,003.78	2,802,126.87	82.73
6585	Construcción y equipamiento de centro de reclusión temporal para privados de libertad de baja peligrosidad en el municipio de Izalco, Sonsonate		4,500,000.00	661,883.07	2,370.00	0.36
6737	Construcción y equipamiento de centro de reclusión temporal para privados de libertad de baja peligrosidad en el municipio y departamento de Santa Ana		4,500,000.00	-	-	-
5897	Ampliación de Centro Penal de Izalco		4,024,468.32	3,836,118.86	1,587,224.40	41.38
5748	Obras Complementarias para finalización del Complejo Penitenciario de Seguridad Izalco FASE III		3,270,569.18	2,975,647.87	480,538.58	16.15
6586	Readecuación de infraestructura y equipamiento para implementar disposiciones especiales, transitorias y extraordinarias en centros penales		2,432,117.49	1,341,895.60	1,255,555.16	93.57
6560	Fortalecimiento Institucional de la Dirección General de Centros Penales - BID 2881/OC-ES		2,135,994.99	536,116.69	524,564.69	97.85
5903	Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco, Departamento de Sonsonate		1,767,034.86	1,647,157.95	722,685.42	43.87
6162	Fortalecimiento Institucional Préstamo BCIE 2102		242,405.00	102,320.00	104,720.00	102.35
<b>MOP</b>		<b>57</b>	<b>62,985,965.67</b>	<b>10,971,373.12</b>	<b>6,762,125.37</b>	<b>61.63</b>
4424	Ampliación de la carretera CA04S, Tramo II: entre Km. 22.36 (Salida Sur de Zaragoza) - Km. 31.86 (Inicio By Pass de La Libertad), Departamento de La Libertad		18,929,274.00	238,760.53	43,517.96	18.23
6058	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ESTRATÉGICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE AHUACHAPÁN, SANTA ANA Y LA LIBERTAD.		18,848,656.00	-	-	-
4758	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO ANGUIATÚ, FRONTERA TERRESTRE ANGUIATÚ, MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		3,485,130.00	211,351.77	145,077.98	68.64
6633	Rehabilitación de la Carretera CA04N, Tramo DV de Amayo - DV Tejutla, Departamento de Chalatenango		2,991,280.00	101,682.67	-	-
5980	CONSTRUCCIÓN DE BY PASS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL		2,972,921.00	2,040,386.77	-	-
3918	DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES		2,495,068.20	1,245,654.48	640,865.46	51.45
6061	Programa de Caminos Rurales Progresivos en El Salvador - LAIF		1,360,280.86	868,937.92	844,772.94	97.22
6589	PAVIMENTACIÓN TRAMO: CASERÍO EL MOZOTE - CASERÍO ALTOMIRO, MUNICIPIO DE MEANGUERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.		1,158,275.00	361,189.31	218,723.41	60.56
5098	PROGRAMA OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS		1,133,576.00	-	-	-
6611	Programa de Corredores Productivos - Componente II: Inversiones productivas y logísticas para la competitividad (BID 3170/OC-ES)		1,101,185.00	-	-	-
6545	Fortalecimiento Institucional Fondos Yucatán		796,199.70	293,130.90	267,030.90	91.10
6084	Mejoramiento del Camino Terciario CAB19N, Tramo: Victoria - Desvío El Zapote - Caserío Santa Marta, Municipio de Victoria, Departamento de Cabañas		752,075.24	752,075.24	752,075.17	100.00
6663	Construcción de Puente Agua Caliente, Sobre Río Acelhuate, Ruta RN02E, Municipio de San Salvador		714,096.00	-	-	-
6676	Obras de Mitigación en Cauce del Río Sumpa, Comunidad Las Pilitas, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador		646,740.81	646,740.81	422,876.14	65.39
6085	Mejoramiento Camino Rural, MOR18N Tramo: CA07N - Cantón Caserío Tejera - Paso El Mono, Municipio de Arambala, Departamento de Morazán		549,584.12	549,584.12	549,583.23	100.00
6588	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL MOR15W, TRAMO: ARAMBALA - DV. EL MOZOTE Y CAMINO VECINAL TRAMO: MOR15W - LIMITE MUNICIPAL ARAMBALA/MEANGUERA, MUNICIPIO DE ARAMBALA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.		528,400.00	451,882.10	280,059.02	61.98
6740	Obras de mitigación en bóveda de Calle Principal de la residencial Brisas de San Francisco y Senda Ocho, municipio y departamento de San Salvador		445,108.33	445,108.33	333,034.61	74.82
6601	Construcción de Obras de Protección en Quebrada La Lechuza, en Zona Contigua al Edificio DIDOP (VMOP), Municipio y Departamento de San Salvador.		352,890.00	108,866.93	153,133.58	140.66
5806	Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca (USU07S) – Cantón California – San Hilario – Sitio El Corral - Salinas El Zompopero, Municipio de Jiquilisco; Departamento de Usulután.		339,451.29	339,451.29	336,822.22	99.23
5004	CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RÍO LEMPA (KM. 75.5 LIB31N), LA LIBERTAD - CHALATENANGO		323,829.19	323,829.19	304,264.62	93.96
5492	PROGRAMA DE CONECTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO		296,363.00	20,239.74	-	-
6722	Pavimentación de un tramo de calle en cantón Hormiguero, municipio de Comacarán, y colocación de carpeta asfáltica sobre 2a Calle Oriente, municipio de San Rafael Oriente, departamento de San Miguel		260,000.00	200.38	200.38	100.00
6442	Fortalecimiento Institucional Convenio JICA - By Pass de San Miguel		253,245.30	185,744.00	158,851.28	85.52
6526	Mejoramiento de Calle El Manzano, Cantón Ocotol, Municipio de Dulce Nombre de María, Departamento de Chalatenango		207,108.80	207,108.80	207,108.80	100.00
5623	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2067		193,248.35	16,462.35	16,462.35	100.00
6564	Construcción de Puente en Colonia Los Almendros, Ciudad Delgado, San Salvador.		166,757.00	166,757.00	-	-
5511	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369		155,500.00	155,500.00	155,500.00	100.00



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2017, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE a/  
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
6580	Construcción de Parada Móvil para Autobuses del SITRAMSS, Ubicada en la 67 Av. Norte, San Salvador.		148,876.61	148,876.61	131,727.83	88.48
6533	Recarpeteo de calles en Colonia Metrópolis y Colonia El Escorial de San Ramón, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador		112,147.50	112,147.50	112,147.50	100.00
6539	Construcción de tramo de calle de acceso a Colonia Buena Vista, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador		108,804.50	108,804.50	108,804.50	100.00
6721	Pavimentación de tramo de calle desde caserío Las Hojas hasta cantón Candelaria, municipio de Yucuaiquín, departamento de La Unión		100,000.00	100,000.00	-	-
6756	Fortalecimiento Institucional - Componente II (BID 3170/OC-ES)		97,170.00	12,550.00	12,550.00	100.00
5975	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CHAPELTIQUE SOBRE RÍO GRANDE, RUTA SAM07N, TRAMO MONCAGUA - CHAPELTIQUE, MUNICIPIO DE CHAPELTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL		94,277.96	94,277.96	93,767.57	99.46
6565	Construcción de obras de protección en talud oriente de la urbanización Jardines de Monte Blanco, Soyapango, San Salvador (segunda etapa).		93,100.00	93,100.00	-	-
6531	Pavimentación de tramo de calle del Municipio de Yucuaiquín, Departamento de La Unión, hasta el límite del Municipio de Comacarán, Departamento de San Miguel		79,662.00	79,662.00	79,662.00	100.00
6532	Recarpeteo de calle del Barrio San Antonio al Cantón El Obrajuelo, Municipio de Quelepa, Departamento de San Miguel.		67,402.65	67,402.65	67,402.65	100.00
6730	Const. UCSF comunidad Las Noventa, Tecoluca; Prog. Infr. Comunit en: Crío Los Almendros, Ctón Sn Pablo Cañales, Sn Ildelfonso; Sn Jerónimo, Sta Clara; Parque Ctral Guadalupe; Casa Comunal Sn Esteban Catarina; y parqueo turicentro Tepetitán, Sn Vicente		64,000.00	64,000.00	-	-
6535	Pavimentación de Calle Principal (Calle Julia Parada), Colonia Tierra Virgen 1, Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador		54,195.65	54,195.65	54,195.65	100.00
6536	Construcción de cordón cuneta y pavimento asfáltico en calle principal de Colonia El Sunzal, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador		52,276.12	52,276.12	52,276.12	100.00
6538	Construcción de cordón cuneta y pavimento asfáltico en prolongación de calle Padre Antonio Ibáñez, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador		50,215.24	50,215.24	50,215.24	100.00
6725	Mejoramiento de Calles Principales de la Colonia Nueva Suchitoto No.1, municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán		50,000.00	505.05	505.05	100.00
6728	Pavimentación de tramo de calle frente a Centro Escolar del Cantón Las Higueras hasta Casa de Educación Inicial (CEDIN), municipio de Izalco, departamento de Sonsonate		43,224.00	1,786.00	1,786.00	100.00
6530	Concreteado hidráulico de Calle Principal de Colonia El Milagro Los Tubos, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad		37,277.00	37,277.00	37,277.00	100.00
6723	Construcción de empedrado fraguado en calle del caserío Los Llanitos, cantón La Puerta, municipio de Mercedes Umaña, departamento de Usulután		34,923.00	2,897.20	995.20	34.35
6528	Pavimentación de tramo de 125 mts. en calle de entrada a Polígono A, Col. 7 de Marzo, Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.		32,093.02	32,093.02	32,093.02	100.00
6537	Construcción de cordón cuneta, adoquinado y fraguado, de calle principal de Colonia El Sunzal, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador		30,079.50	30,079.50	30,079.50	100.00
6726	Construcción de obras de mitigación en quebrada Guarumo de la urbanización Alpes Suizos II, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad		30,000.00	30,000.00	-	-
6727	Mejoramiento de calle que conduce a caserío Los Pérez y Los Rivera, cantón El Caulote, municipio de Santo Domingo de Guzmán, departamento de Sonsonate		30,000.00	278.90	278.90	100.00
6729	Colocación de pavimento asfáltico en callejón El Nance No.1 del cantón El Almendro, municipio de Sonzacate, departamento de Sonsonate		28,448.00	2,467.00	565.00	22.90
6724	Construcción de obras de mitigación en canaleta del caserío La Ira, cantón Santa Anita, municipio de Mercedes Umaña, departamento de Usulután		27,838.00	2,678.07	2,678.07	100.00
6525	Reparación de cancha en El Manzano, Cantón Ocotal, Municipio de Dulce Nombre de María, Departamento de Chalatenango		21,437.60	21,437.60	21,437.60	100.00
6534	Reparación de calle que conduce hacia el Cantón El Jutillo, Municipio de Rosario de Mora, Departamento de San Salvador		17,885.60	17,885.60	17,885.60	100.00
6527	Reparación de vías principales del Casco Urbano del Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad		11,566.00	11,566.00	11,566.00	100.00
6540	Construcción de acceso a intersección de Calle Doble Via de Colonia Las Margaritas, Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana		7,026.60	7,026.60	7,026.60	100.00
6529	Pavimentación de pasaje, polígono C, Colonia 7 de Marzo, Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad		5,242.72	5,242.72	5,242.72	100.00
5462	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MOR13W, TRAMO: MUNICIPIO SAN SIMON - MUNICIPIO SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.		356.52	-	-	-
6163	Mejoramiento Camino Rural CUS18E - CAB18E, Tramo: Suchitoto - Cinquera, Etapa II		196.69	-	-	-
<b>MINSAL</b>		<b>104</b>	<b>54,665,398.16</b>	<b>37,842,898.47</b>	<b>19,650,162.16</b>	<b>51.93</b>
5209	Fortalecimiento del Sistema Público de Salud		46,715,406.07	30,288,584.99	16,645,823.77	54.96
5131	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR		3,168,697.77	3,168,697.77	189,699.70	5.99
6015	PROGRAMA SALUD MESOAMÉRICA 2015 - EL SALVADOR		1,814,868.71	1,803,507.75	1,508,385.29	83.64
6615	Levantamiento y actualización de Fichas Familiares para los Equipos Comunitarios de Salud Familiar en 125 Comunidades Solidarias		950,000.00	950,000.00	26,616.00	2.80
4921	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Pedro Perulapán, Cuscatlán		552,253.75	400,000.00	517,163.92	129.29
401	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION		483,013.90	361,000.00	481,290.32	133.32
6135	Remodelación y Equipamiento de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica Boquín, Polorós, La Unión		286,945.00	286,945.00	8,982.00	3.13
6132	Ampliación, Remodelación y Equipamiento de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica UCSF-B El Mozote, Meanguera, Morazán		264,700.00	264,700.00	199,098.17	75.22
6546	Mejoramiento de Infraestructura de Establecimientos de Salud en el Departamento de Morazán		233,495.00	123,445.00	20,687.40	16.76
4860	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Carmen, La Unión		24,663.53	24,663.53	24,532.39	99.47



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2017, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE a/  
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
4653	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"		20,498.00	20,498.00	-	-
4908	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás Pineda Martínez, Santa Ana		13,377.09	13,377.09	1,042.10	7.79
4654	Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"		10,408.50	10,408.50	10,408.50	100.00
4853	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martín, San Salvador		9,004.30	9,004.30	-	-
4890	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La Libertad, La Libertad		6,893.32	6,893.32	-	-
4858	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilopango, San Salvador		5,365.88	5,365.88	-	-
4894	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana		5,185.19	5,185.19	-	-
4884	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango		4,345.17	4,345.17	-	-
4839	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes, San Salvador		3,991.65	3,991.65	-	-
4929	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilobasco, Cabañas		3,738.00	3,738.00	3,610.00	96.58
4859	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Bobadilla, San Alejo, La Unión		3,723.29	3,723.29	1,090.20	29.28
4850	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador		3,677.90	3,677.90	192.00	5.22
4876	Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud de Usulután, Usulután		3,249.20	3,249.20	962.00	29.61
4881	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Cruz, Usulután		3,043.00	3,043.00	-	-
4867	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Uluazapa, San Miguel		2,952.03	2,952.03	625.30	21.18
4905	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana		2,536.68	2,536.68	-	-
4893	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Tamanique, La Libertad		2,403.10	2,403.10	1,090.20	45.37
4871	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Cuco, Chirilagua, San Miguel		2,185.34	2,185.34	-	-
4904	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Sebastián Saltrillo, Santa Ana		2,167.73	2,167.73	-	-
4925	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Perulapia, Cuscatlán		1,988.39	1,988.39	608.00	30.58
4866	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las Marías, Chinameca, San Miguel		1,926.40	1,926.40	673.40	34.96
4862	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Carlos, La Unión		1,790.00	1,790.00	-	-
4868	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel		1,779.00	1,779.00	-	-
3346	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA		1,747.40	1,747.40	673.40	38.54
4914	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Lorenzo, Ahuachapán		1,732.43	1,732.43	817.70	47.20
4903	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Juan las Minas, Metapán, Santa Ana		1,630.73	1,630.73	-	-
4863	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Playa, La Unión		1,560.00	1,560.00	-	-
4910	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio, San Antonio del Monte, Sonsonate		1,480.10	1,480.10	48.10	3.25
4913	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Ahuachapán, Ahuachapán		1,432.00	1,432.00	-	-
4864	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Llano los Patos, Conchagua, La Unión		1,432.00	1,432.00	-	-
4926	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Sensuntepeque, Cabañas		1,367.99	1,367.99	96.20	7.03
4891	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Matías, La Libertad		1,354.73	1,354.73	-	-
4909	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio Pajonal, Santa Ana		1,331.53	1,331.53	416.80	31.30
4897	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana		1,312.98	1,312.98	-	-
4917	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán		1,311.50	1,311.50	-	-
4930	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Jutiapa, Cabañas		1,311.09	1,311.09	128.20	9.78
4938	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guadalupe, San Vicente		1,212.73	1,212.73	-	-
4865	Ampliación, Equipamiento Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Piche, El Carmen, La Unión		1,204.40	1,204.40	32.00	2.66
4907	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Bárbara, Santa Ana		1,180.69	1,180.69	144.30	12.22
4912	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Salcoatitán, Sonsonate		1,174.50	1,174.50	-	-
3345	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CHALATENANGO		1,132.94	1,132.94	1,090.20	96.23
4892	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad		1,098.99	1,098.99	192.40	17.51
4934	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz		1,074.73	1,074.73	32.00	2.98
4878	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután		1,065.00	1,065.00	-	-
4887	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Ciudad Arce, La Libertad		1,064.64	1,064.64	-	-
4847	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Ciudad Delgado, San Salvador		1,059.43	1,059.43	704.00	66.45



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2017, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE a/  
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
4854	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Guazapa, San Salvador		1,044.81	1,044.81	-	-
4875	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Primavera, El Tránsito, San Miguel		1,042.73	1,042.73	-	-
4869	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Comacaran, San Miguel		1,042.73	1,042.73	-	-
4902	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Jose Ingenio, Metapán, Santa Ana		1,042.73	1,042.73	-	-
4896	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Planes de la Laguna, Santa Ana		1,023.00	1,023.00	-	-
4888	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Manuel Gallardo, Colón, La Libertad		1,004.79	1,004.79	-	-
4915	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Jose Naranjo, Jujutla, Ahuachapán		962.83	962.83	48.10	5.00
4919	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de El Carmen, Cuscatlán		962.00	962.00	962.00	100.00
4924	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán		962.00	962.00	962.00	100.00
4920	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de Concepción, Cuscatlán		924.79	924.79	-	-
4900	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Congo, Santa Ana		914.73	914.73	-	-
4901	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Belen Guijat, Metapán, Santa Ana		914.73	914.73	-	-
4870	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lolotique, San Miguel		914.73	914.73	-	-
4872	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Milagro de la Paz, San Miguel		895.00	895.00	-	-
4873	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Silva, San Miguel		895.00	895.00	-	-
4899	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Sabanetas, Chalchuapa, Santa Ana		893.33	893.33	-	-
4883	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Palma, Chalatenango		893.33	893.33	-	-
4882	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Dorado, Chalatenango		789.40	789.40	-	-
4877	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Triunfo, Usulután		765.33	765.33	-	-
4880	Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud El Espino, Jucuarán, Usulután		709.60	709.60	320.60	45.18
4837	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador		695.36	695.36	-	-
4898	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa Ana		635.40	635.40	-	-
4935	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Juan Talpa, La Paz		481.00	481.00	481.00	100.00
4937	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitán, San Vicente		400.50	400.50	272.50	68.04
4657	Programa de Extensión de Cobertura en la Zona Rural (período 2009-2011)		400.00	400.00	-	-
4852	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador		368.98	368.98	-	-
4836	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de Ayutuxtepeque, San Salvador		277.56	277.56	160.00	57.65
4936	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Rafael Obrajuelo, La Paz		277.40	277.40	-	-
4846	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Villa Mariona, Cuscatancingo, San Salvador		251.59	251.59	-	-
4845	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Popotlán, Apopa, San Salvador		233.60	233.60	-	-
4842	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Barrios, San Salvador		225.36	225.36	-	-
4849	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Marcos, San Salvador		207.41	207.41	-	-
4874	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Rafael, San Miguel		179.00	179.00	-	-
4889	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad		170.00	170.00	-	-
4840	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador		150.14	150.14	-	-
4916	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Chinamas, Ahuachapán		149.40	149.40	-	-
4855	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Paisnal, San Salvador		145.68	145.68	-	-
4856	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador		132.42	132.42	-	-
4922	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Jose Guayabal, Cuscatlán		128.00	128.00	-	-
4931	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyultitán, La Paz		128.00	128.00	-	-
4933	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía Orcoyo, Olocuilta, La Paz		128.00	128.00	-	-
4841	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador		119.17	119.17	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2017, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE a/  
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
4906	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Lucia, Santa Ana		109.50	109.50	-	-
4843	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilares, San Salvador		92.25	92.25	-	-
4857	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador		53.08	53.08	-	-
4848	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador		44.28	44.28	-	-
4844	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador		36.63	36.63	-	-
4851	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Toncatepeque, San Salvador		35.44	35.44	-	-
<b>MINED</b>		<b>11</b>	<b>39,813,029.99</b>	<b>28,808,072.38</b>	<b>19,328,991.82</b>	<b>67.10</b>
5813	Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.		33,983,098.20	25,061,584.07	17,391,175.48	69.39
6738	Una Niña, Un Niño, Una Computadora, en los departamentos de La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión		2,000,000.00	1,995,343.01	562,611.84	28.20
5657	Potenciando la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El Salvador		1,373,088.72	149,295.05	251,330.73	168.34
6448	Mejoramiento de la Infraestructura de dos Centros Escolares ubicados en los Caseríos El Mozote y El Barrial del Municipio de Meanguera del Departamento de Morazán		800,000.00	445,007.18	-	-
6458	Fortalecimiento Educativo para docentes de educación básica y media en servicio del sector público, en el marco de la estrategia de SI-EITP, a nivel nacional.		717,032.39	467,032.39	434,063.09	92.94
5096	Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador		674,363.42	674,363.42	674,363.42	100.00
6715	Construcción y equipamiento de infraestructura comunitaria para la seguridad y recuperación de espacios públicos, en el municipio de San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana		80,000.00	-	-	-
6716	Techado de cancha de básquetbol y mejoramiento de áreas de acceso al Centro Escolar Doctor Francisco Antonio Reyes, municipio de Nahuizalco, departamento de Sonsonate		80,000.00	-	-	-
6713	Construcción de cancha de fútbol rápido en casco urbano del municipio de San José Cancasque, y Mejoramiento de calle de los municipios de San Francisco Lempa y San Ignacio, departamento de Chalatenango		60,000.00	-	-	-
6714	Ampliación del segundo nivel del Instituto Católico San Francisco de Asís y Techado de Aulas del Instituto Nacional de La Libertad, municipio y departamento de La Libertad		30,000.00	-	-	-
6468	Construcción de Obras complementarias en 3 Centros Escolares ubicados en los Municipios de Juayúa, Santiago Nonualco y San Vicente, de los Departamentos de Sonsonate, La Paz y San Vicente.		15,447.26	15,447.26	15,447.26	100.00
<b>MAG</b>		<b>13</b>	<b>32,014,064.48</b>	<b>21,475,538.09</b>	<b>12,652,172.31</b>	<b>58.91</b>
5385	PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL RURAL (AMANECER RURAL)		13,814,549.89	7,741,259.75	7,066,647.83	91.29
5562	Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF)		8,828,846.13	6,861,511.13	1,209,830.29	17.63
5540	PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LAS REGIONES CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR CENTRAL) - AMPLIACION		3,820,506.94	3,376,399.94	2,659,448.99	78.77
6710	Fortalecimiento Institucional para apoyar a los subsectores café, acuícola y ganadero a través de los servicios de asistencia técnica y capacitación a usuarios del MAG, en El Salvador		1,874,800.93	1,139,507.54	649,185.56	56.97
6473	Instalación de Módulos de Riego para el Incremento de la Producción en los Departamentos de San Miguel y La Unión, afectados por la Sequía		900,000.00	672,281.71	646,966.30	96.23
6441	Rehabilitación y Ampliación del Área Bajo Riego en el Distrito de Riego y Avenamiento N°2 Atiocoyo Unidad Norte		850,520.00	346,717.54	221,722.61	63.95
6706	Desarrollo de tecnología de alimentos no convencionales para apoyar la acuicultura familiar y mejorar la cadena de valor de la producción acuícola en El Salvador		622,881.00	202,185.00	-	-
6739	Rehabilitación y Adecuación de Infraestructura para el Establecimiento del Centro de Desarrollo de Acuicultura en Santa Cruz Porrillo, Tecoluca, San Vicente		522,600.00	518,000.00	-	-
6474	Fomento al Desarrollo de la Acuicultura Familiar en los Municipios de Pobreza en El Salvador		295,000.00	295,000.00	60,067.56	20.36
6748	Desarrollo del Sistema de Riego para el Incremento de la Producción Agrícola en Cantón Lomas de Alarcón, Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán.		250,000.00	125,000.00	-	-
5725	CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA REGIÓN ORIENTAL CEDAF MORAZAN		147,328.83	147,328.83	130,449.67	88.54
6664	Innovaciones Tecnológicas para el Fomento de la Agricultura Bajo Riego Beneficiando a las Mujeres Rurales de la Zona Oriental		78,195.36	41,511.25	-	-
5764	Fortalecimiento Institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológicas en Sanidad Animal, Análisis de Riesgo de Plagas y Sistema de Inteligencia de Mercados Agropecuarios en El Salvador		8,835.40	8,835.40	7,853.50	88.89
<b>FGR</b>		<b>2</b>	<b>22,005,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6093	Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República de El Salvador		21,730,700.00	-	-	-
6432	Construcción de vías internas para circulación vehicular en las instalaciones de las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República		274,700.00	-	-	-
<b>MARN</b>		<b>3</b>	<b>20,523,694.73</b>	<b>12,413,435.96</b>	<b>6,336,533.60</b>	<b>51.05</b>
5391	Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Solidos en El Salvador		16,135,438.03	10,197,099.52	4,579,087.57	44.91



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2017, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE a/  
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
6164	Preparación de propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. (a nivel nacional)		3,649,033.24	1,609,075.63	1,150,185.22	71.48
6515	Reforzamiento Estructural del Edificio No. 1 de la Sede Central del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales		739,223.46	607,260.81	607,260.81	100.00
<b>VMVDU</b>		<b>9</b>	<b>19,180,383.73</b>	<b>13,966,745.25</b>	<b>6,897,927.43</b>	<b>49.39</b>
5939	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMMS		11,118,803.18	7,060,191.56	2,859,835.71	40.51
5398	"PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS URBANOS-KFW (MIAPU-KFW) Canje de Deuda entre la República de Alemania y la República de El Salvador"		3,257,749.70	2,692,827.96	2,254,678.67	83.73
5397	RESCATE DE LA FUNCION HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE SAN SALVADOR MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA.		1,319,300.00	945,403.00	5,040.76	0.53
5100	DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA		1,023,203.58	902,451.13	962,255.43	106.63
5132	PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS		954,735.27	954,735.27	816,116.86	85.48
6612	Programa de Desarrollo Habitacional en el Caserío El Mozote y lugares aledaños, Departamento de Morazán		725,000.00	725,000.00	-	-
6203	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL PROYECTO MIAUP LA GRAN MANZANA, SANTA TECLA, LA LIBERTAD.		600,000.00	600,000.00	-	-
5769	Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios- PACSES, a nivel Nacional.		114,540.00	84,770.00	-	-
6711	Construcción de ocho viviendas de interés social en barrio Concepción, municipio de Mercedes Umaña, departamento de Usulután		67,052.00	1,366.33	-	-
<b>MINEC</b>		<b>2</b>	<b>9,965,745.73</b>	<b>5,019,817.85</b>	<b>1,442,001.19</b>	<b>28.73</b>
6025	PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- COMPONENTES I, III, y V (BID 2583/OC-ESL1057)		6,465,745.73	3,054,426.75	1,278,517.09	41.86
6613	Programa de Corredores Productivos - Componentes I, III y IV (BID 3170/OC-ES)		3,500,000.00	1,965,391.10	163,484.10	8.32
<b>SE - MJSP</b>		<b>5</b>	<b>8,753,318.35</b>	<b>4,139,941.03</b>	<b>1,933,174.51</b>	<b>46.70</b>
6558	Programa de Prevención de la violencia juvenil a nivel local - MJSP - BID 2881/OC-ES		6,596,113.62	2,629,750.51	1,039,309.91	39.52
6557	Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública - BID 2881/OC-ES		1,273,209.15	942,859.15	449,059.15	47.63
6451	Fortalecimiento de capacidades institucionales para la seguridad ciudadana, el desarrollo de competencias y la remoción de tatuajes		336,971.34	336,971.34	336,913.42	99.98
6559	Administración y gestión del Programa BID - 2881/OC-ES		305,889.24	206,263.11	107,892.03	52.31
6709	Construcción de canchas de fútbol sala y áreas de juegos infantiles en final de calle principal Reparto La Campanera, Soyapango, San Salvador		241,135.00	24,096.92	-	-
<b>PNC - MJSP</b>		<b>4</b>	<b>8,725,841.99</b>	<b>7,688,828.12</b>	<b>1,949,201.47</b>	<b>25.35</b>
5670	Construcción y Equipamiento Básico de la Delegación de la PNC en La Paz		8,298,007.09	7,260,993.22	1,521,366.57	20.95
5673	Reemplazo de la Flota Vehicular de la Policía Nacional Civil		368,320.00	368,320.00	368,320.00	100.00
4766	Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil		35,995.39	35,995.39	35,995.39	100.00
4747	Construcción y Equipamiento Básico Delegación Centro PNC		23,519.51	23,519.51	23,519.51	100.00
<b>MITUR</b>		<b>1</b>	<b>7,300,000.00</b>	<b>3,998,280.46</b>	<b>1,189,010.05</b>	<b>29.74</b>
5833	Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero-Marina		7,300,000.00	3,998,280.46	1,189,010.05	29.74
<b>CSJ</b>		<b>8</b>	<b>6,073,567.18</b>	<b>5,141,417.18</b>	<b>370,608.22</b>	<b>7.21</b>
4344	Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador		3,826,750.00	3,000,000.00	-	-
6456	REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL, A NIVEL NACIONAL. AÑO 2016		831,071.44	831,071.44	287,416.66	34.58
6616	REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, AÑO 2017		404,500.00	389,100.00	-	-
6634	Construcción del Instituto de Medicina Legal, Región Oriental III, Departamento de La Unión.		300,000.00	300,000.00	-	-
6635	Construcción del Instituto de Medicina Legal, Región Occidental I, Departamento de Santa Ana.		300,000.00	300,000.00	-	-
6632	Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Usulután, Departamento de Usulután		168,750.00	112,500.00	-	-
6631	Construcción del Centro Judicial en Materia Penal, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana		146,250.00	112,500.00	-	-
3243	Construcción Centro Judicial Integrado de Santa Tecla		96,245.74	96,245.74	83,191.56	86.44
<b>SIS - CAPRES</b>		<b>3</b>	<b>1,632,539.10</b>	<b>388,268.46</b>	<b>297,398.08</b>	<b>76.60</b>
6196	Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer a Nivel Nacional.		1,020,437.50	37,535.42	35,525.78	94.65
5785	Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer Usulután, Santa Ana y San Martín		601,230.60	339,862.04	251,001.30	73.85
6195	Promoción de los Derechos de las Mujeres a través del fomento de la Autonomía Económica y la atención a la Salud Integral		10,871.00	10,871.00	10,871.00	100.00
<b>MH</b>		<b>7</b>	<b>1,499,775.49</b>	<b>197,635.09</b>	<b>197,635.09</b>	<b>100.00</b>
6590	Construcción de Vías de Acceso y Parqueos en la Aduana Terrestre Metalío, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate		741,625.00	-	-	-
6465	Suministro e instalación de Sistemas Eléctrico, Mecánico y de Seguridad en ascensores de edificios Tres Torres del Ministerio de Hacienda, San Salvador		300,000.00	-	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2017, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE a/  
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
4204	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TRIBUTARIA		257,938.00	-	-	-
6466	Reparación de losa de concreto del parqueo superior de Edificios Tres Torres del Ministerio de Hacienda, San Salvador.		121,729.19	121,729.17	121,729.17	100.00
6734	Mejoramiento de iluminación, señalización, parqueo de Vehículos Pesados y vías de circulación Interna en el Centro Regional de Occidente, municipio y departamento de Santa Ana.		50,477.00	47,899.62	47,899.62	100.00
6464	Ampliación de las oficinas del Departamento Jurídico de la División de Cobranzas, de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, San Salvador.		23,011.70	23,011.70	23,011.70	100.00
4958	Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV.		4,994.60	4,994.60	4,994.60	100.00
<b>ILEA</b>		<b>1</b>	<b>960,904.89</b>	<b>960,904.89</b>	<b>612,758.41</b>	<b>63.77</b>
4493	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, ILEA SAN SALVADOR"		960,904.89	960,904.89	612,758.41	63.77
<b>INJUVE</b>		<b>1</b>	<b>960,084.81</b>	<b>836,218.05</b>	<b>814,959.13</b>	<b>97.46</b>
5770	Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias - FOCAP		960,084.81	836,218.05	814,959.13	97.46
<b>MTYPS</b>		<b>2</b>	<b>700,000.00</b>	<b>267,156.88</b>	<b>63,995.81</b>	<b>23.95</b>
6337	REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, FASE IV		500,000.00	225,156.88	21,995.81	9.77
6608	PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y EMPLEABILIDAD, JÓVENES CON TODO		200,000.00	42,000.00	42,000.00	100.00
<b>CONAMYPE</b>		<b>2</b>	<b>262,800.00</b>	<b>259,555.45</b>	<b>206,087.15</b>	
6075	Desarrollo de Un Modelo de empresariedad Femenina en El Salvador( ES-M 1043)		238,905.00	238,905.00	185,804.04	77.77
5780	Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa productores de Calzado, Uniformes y Utiles Escolares a Nivel Nacional.		23,895.00	20,650.45	20,283.11	98.22
<b>MIGOBDET</b>		<b>4</b>	<b>215,184.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
6717	Construcción y equipamiento de infraestructura para atención y rehabilitación a Veteranos de Guerra, del departamento de Morazán		100,000.00	-	-	-
6719	Techado de cancha de básquetbol del Centro Escolar Jesús Obrero del municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador		50,000.00	-	-	-
6718	Construcción de Salón de Usos Múltiples, departamento de Sonsonate		45,184.00	-	-	-
6720	Introducción de Energía Eléctrica en la Comunidad La Bendición, departamento de Chalatenango		20,000.00	-	-	-
<b>EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</b>						
<b>CEL</b>		<b>5</b>	<b>129,141,820.00</b>	<b>112,011,735.00</b>	<b>5,953,379.08</b>	<b>5.31</b>
3119	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL		110,000,000.00	95,154,895.00	2,330,081.51	2.45
5821	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre		15,000,000.00	12,840,440.00	162,513.11	1.27
4400	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.		2,955,195.00	2,952,525.00	2,955,195.00	100.09
6178	Reparación y Mantenimiento de Bordas en el Bajo Lempa, Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente y Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután. Etapa I		1,136,625.00	1,013,875.00	505,589.46	49.87
622	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON		50,000.00	50,000.00	-	-
<b>CEPA</b>		<b>34</b>	<b>69,401,429.22</b>	<b>27,086,367.02</b>	<b>5,344,720.83</b>	<b>19.73</b>
6487	Ampliación de Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.		34,275,165.00	6,633,572.80	-	-
6471	Construcción de 4 salas de espera para atención a pasajeros en el Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez		6,658,578.55	6,658,578.55	2,692,568.24	40.44
6617	Modernización del sistema de bandas transportadoras de equipajes en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, fase I		3,892,000.00	500,000.00	-	-
6637	Mejoramiento de las plataformas de acceso al aeródromo del Aeropuerto Internacional de El Salvador		3,500,000.00	-	-	-
6623	Adquisición de equipo porta contenedores para el Puerto de Acajutla, Sonsonate		3,400,000.00	680,000.00	-	-
6591	Modernización de la Infraestructura de Recepción y Despacho de Carga en la Zona del Acceso 1 y Bulevar Óscar Osorio del Puerto de Acajutla		3,000,000.00	-	-	-
6593	Rehabilitación de los pavimentos de concreto hidráulico alrededor de las bodegas del Puerto de Acajutla, Fase 1/ colindancia entre Patio de Contenedores y bodegas 3 y 4		2,340,000.00	2,340,000.00	681,589.61	29.13
6626	Suministro e instalación de Sistema de Comunicaciones Aeronáuticas, con estación remota en el volcán de San Salvador, para el Aeropuerto Internacional de El Salvador		1,800,000.00	1,260,000.00	-	-
6592	Rehabilitación de la Bodega No.1 del Puerto de Acajutla		1,695,000.00	825,000.00	-	-
6625	Adquisición de sistemas tecnológicos para gestión y prevención de riesgos en las operaciones del Aeropuerto Internacional de El Salvador		1,500,000.00	1,200,000.00	59,653.63	4.97
6207	Instalación de un nuevo Sistema Contra Incendio para el Aeropuerto Internacional El Salvador		1,300,000.00	1,040,000.00	-	-
5790	Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional El Salvador		1,298,158.92	1,298,158.92	520,911.64	40.13





**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2017, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE a/  
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
6470	Construcción de 4 posiciones de estacionamiento para aeronaves en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez		998,680.47	998,680.47	327,130.88	32.76
6476	Suministro e Instalación de Sistemas de Detección y Combate de Incendios en las Bodegas 1 y 3 del Puerto de Acajutla, Sonsonate		770,000.00	739,200.00	-	-
6594	Modernización del Sistema de Iluminación de Muelles, Patios, Bodegas y Vías de Circulación Internas y Externas del Puerto de Acajutla		509,000.00	509,000.00	355,896.89	69.92
6618	Construcción de base de soporte para la instalación de un Sistema de Aterrizaje por Instrumentos en cabecera 25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador		500,000.00	500,000.00	-	-
6622	Perforación y Equipamiento de Pozo No. 3 del Puerto de Acajutla, Sonsonate		400,000.00	353,330.00	-	-
6477	Adquisición, Instalación y Configuración de Radar en el Puerto de Acajutla, Sonsonate		306,645.51	306,645.51	306,645.51	100.00
6480	Construcción de dos puentes de acceso hacia la futura área de patio y parqueo, al oriente de las bodegas 1 y 3 del Puerto de Acajutla, Sonsonate.		209,200.00	209,200.00	108,576.18	51.90
6624	Modernización del sistema de control, medición y monitoreo de la red eléctrica del Aeropuerto Internacional de El Salvador		197,750.00	197,750.00	-	-
6479	Adquisición de Equipo para el manejo de productos a granel en el Puerto de Acajutla, Sonsonate		163,285.00	163,285.00	-	-
6482	Modernización y ampliación del sistema de video vigilancia del Puerto de Acajutla, Sonsonate-		132,935.44	132,935.44	105,151.94	79.10
6491	Construcción de tapial perimetral en la plataforma norte del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		84,362.99	84,362.99	71,497.63	84.75
6644	Construcción de techo operacional en acceso a mantenimiento y ampliación de caseta en acceso No.1 del Aeropuerto Internacional de El Salvador		80,435.00	80,435.00	-	-
6639	Construcción de muro de concreto en el sector del acceso 7 del Aeropuerto Internacional de El Salvador		80,000.00	80,000.00	-	-
6640	Construcción de cerco perimetral en estacionamientos de carga y pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador		80,000.00	80,000.00	-	-
6645	Construcción de comedor y vestidero para personal de jardinería en el Aeropuerto Internacional de El Salvador		45,000.00	45,000.00	-	-
6498	Recarpeteo de calle perimetral en la rampa de la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		39,990.89	39,990.89	38,869.60	97.20
6499	Construcción de salón para capacitaciones AVSEC/FAL en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		38,796.96	38,796.96	33,416.63	86.13
6620	Construcción de obra de paso en calle perimetral oriente en el Aeropuerto Internacional de El Salvador		35,000.00	21,000.00	-	-
6497	Rehabilitación de pavimento asfáltico en la plataforma internacional del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		33,511.13	33,511.13	25,133.34	75.00
6641	Construcción de salón de usos múltiples en el Centro Recreativo Cuscatlán del Aeropuerto Internacional de El Salvador		20,000.00	20,000.00	-	-
6495	Construcción de hangar para taller automotriz en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		10,439.20	10,439.20	10,439.20	100.00
6490	Construcción de bodegas en el Centro Recreativo Cuscatlán del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		7,494.16	7,494.16	7,239.91	96.61
<b>ANDA</b>		<b>9</b>	<b>23,904,850.08</b>	<b>5,302,387.43</b>	<b>2,766,559.50</b>	<b>52.18</b>
5817	REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR.		17,951,100.00	-	-	-
5584	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.		2,585,860.00	2,504,422.00	789,804.55	31.54
5134	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.		1,524,071.26	1,184,661.69	612,591.14	51.71
5034	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR.		669,627.28	496,683.44	474,649.68	95.56
6353	Programa de Mejoramiento de la Red de Acueducto y Alcantarillado del Área Metropolitana de San Salvador - AMSS		555,321.48	497,750.24	408,057.82	81.98
6582	Mejoramiento del sistema de agua potable del sector nor-poniente del Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador, Etapa 1		351,362.83	351,362.83	337,233.27	95.98
6357	Proyectos Condominiales de Agua Potable y Saneamiento en El Salvador		95,925.00	95,925.00	22,275.00	23.22
6571	Mejoramiento del Acceso al Agua en el Norte del Departamento de La Unión		89,477.99	89,477.99	39,843.80	44.53
6541	Mejoramiento del sistema de agua potable en Potrero Seco y La China, Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel		82,104.24	82,104.24	82,104.24	100.00
<b>INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>						
<b>FOVIAL</b>		<b>10</b>	<b>71,799,198.33</b>	<b>49,777,255.08</b>	<b>40,841,117.49</b>	<b>82.05</b>
6603	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS PAVIMENTADAS A NIVEL NACIONAL 2017 - COMPONENTE DE INVERSIÓN		31,540,662.72	23,917,120.58	22,389,571.19	93.61
5960	MEJORAMIENTO DE VIAS E INTERSECCIONES A NIVEL NACIONAL		15,175,152.70	9,813,736.31	7,066,521.81	72.01
6344	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO AÑO 2017		10,321,317.26	5,034,410.06	3,462,495.47	68.78
6341	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO AÑO 2016		5,278,210.76	2,991,494.74	1,360,638.57	45.48
6595	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS PAVIMENTADAS A NIVEL NACIONAL 2016 - COMPONENTE DE INVERSIÓN		4,065,540.52	4,065,540.52	4,036,053.68	99.27
6346	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2017		3,298,361.50	1,920,000.00	1,372,120.02	71.46
6345	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2017		1,278,400.00	1,193,400.00	339,685.46	28.46
6342	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2016		527,518.20	527,518.20	527,518.20	100.00
6343	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2016		310,933.47	310,933.47	283,411.89	91.15
6199	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2015		3,101.20	3,101.20	3,101.20	100.00



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2017, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE a/  
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
<b>ISSS</b>		<b>6</b>	<b>48,499,110.00</b>	<b>33,636,191.90</b>	<b>1,475,038.61</b>	<b>4.39</b>
4174	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN MIGUEL		28,629,460.00	18,322,854.40	1,168,859.05	6.38
6602	Adecuación de infraestructura y equipamiento, para implementar Policlínico Pediátrico del ISSS, San Salvador		15,200,000.00	12,160,000.00	-	-
4198	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ANA.		1,800,000.00	1,152,000.00	119,953.16	10.41
5739	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ISSS, PARA ATENCIÓN DE ESPECIALIDADES, SAN SALVADOR.		1,408,325.00	901,328.00	11,666.44	1.29
6550	Rehabilitación de Infraestructura de Oficinas Administrativas de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del ISSS, San Salvador.		770,820.00	616,656.00	-	-
6587	Readecuación de infraestructura y equipamiento para atención pediátrica en centros de atención del ISSS, de los departamentos de San Salvador, Sonsonate y Santa Ana		690,505.00	483,353.50	174,559.96	36.11
<b>FISDL</b>		<b>9</b>	<b>45,487,924.61</b>	<b>30,282,992.10</b>	<b>17,854,848.05</b>	<b>58.96</b>
4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL		27,045,937.99	16,873,246.46	11,758,433.75	69.69
6452	Programa de apoyo integral a la estrategia de prevención de la violencia en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador		5,457,109.49	4,821,801.49	1,219,290.02	25.29
5627	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR, COMPONENTE I		4,802,618.13	3,724,789.15	2,021,172.39	54.26
6453	Programa de mejoramiento de espacios seguros de convivencia para jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)		3,668,615.00	909,675.00	19,581.10	2.15
2660	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL.		2,887,814.00	2,508,200.00	1,894,230.73	75.52
6454	Programa de inclusión productiva en el marco de programas sociales en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador		700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00
6398	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIOS LOS ZELAYA, LOS AMATES, LA TRINIDAD, PAPALONES, ALTOS DEL LLANO Y EL RODEO, MUNICIPIO DE CHAPELTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL		478,765.00	328,765.00	178,765.00	54.37
6614	Introducción de agua potable y saneamiento básico en El Mozote y lugares aledaños, Departamento de Morazán		300,000.00	300,000.00	-	-
4472	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV		147,065.00	116,515.00	63,375.06	54.39
<b>CNR</b>		<b>1</b>	<b>12,356,512.60</b>	<b>6,327,313.39</b>	<b>2,815,234.36</b>	<b>44.49</b>
3541	PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II		12,356,512.60	6,327,313.39	2,815,234.36	44.49
<b>UES</b>		<b>4</b>	<b>2,836,483.97</b>	<b>2,464,156.01</b>	<b>796,040.04</b>	
3762	CONSTRUCCION DE BOVEDA		2,132,327.96	1,800,000.00	796,040.04	44.22
5012	Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente		461,092.36	461,092.36	-	-
5025	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA JÓVENES TALENTO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR		183,063.65	183,063.65	-	-
6712	Ampliación de las instalaciones para aulas y cubículos para los docentes de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente de la Universidad de El Salvador, Departamento de San Miguel		60,000.00	20,000.00	-	-
<b>CENTA</b>		<b>4</b>	<b>2,798,627.37</b>	<b>2,731,004.71</b>	<b>2,081,462.30</b>	<b>76.22</b>
6566	Desarrollo Tecnológico y Fortalecimiento de la Base Productiva y Agroindustrial para la Cacaocultura con enfoque Agroecológico en El Salvador		1,118,214.28	1,086,769.62	760,503.74	69.98
5868	Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologías Sostenibles Ante el Cambio Climático en El Salvador		1,018,620.00	1,009,080.00	752,747.81	74.60
6520	Biofertilizantes en cultivo de maíz, frijol y café como alternativa agroecológica para una producción sostenible en El Salvador.		498,525.07	473,187.07	445,272.80	94.10
6662	Apoyo a la producción de semilla, a la investigación en granos básicos y a manejo de jardín clonal de cacao en estación experimental de Santa Cruz Porrillo		163,268.02	161,968.02	122,937.95	75.90
<b>CORSATUR</b>		<b>2</b>	<b>2,068,319.94</b>	<b>1,913,319.94</b>	<b>523,319.81</b>	<b>27.35</b>
6502	Reparación y Mejoramiento de las Instalaciones del Hotel de Montaña Cerro Verde, Cantón Las Lomas, Municipio de El Congo, Departamento de Santa Ana		1,868,319.94	1,748,319.94	523,319.81	29.93
5967	Mejoramiento de la Imagen Urbanística del Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán.		200,000.00	165,000.00	-	-
<b>ENA</b>		<b>1</b>	<b>915,197.87</b>	<b>503,513.50</b>	<b>325,143.89</b>	<b>64.58</b>
6736	RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE AUDITORIO LOS PRÓCERES DE LA ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA ROBERTO QUIÑÓNEZ, MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		915,197.87	503,513.50	325,143.89	64.58
<b>INDES</b>		<b>1</b>	<b>610,420.96</b>	<b>610,420.96</b>	<b>401,822.59</b>	<b>65.83</b>
6503	Rehabilitación y Mejoramiento del Estadio de Fútbol Juan Francisco Barraza, Departamento de San Miguel, Fase I		610,420.96	610,420.96	401,822.59	65.83
<b>ISTU</b>		<b>4</b>	<b>532,100.29</b>	<b>532,100.29</b>	<b>515,165.49</b>	<b>96.82</b>
6575	Mejoramiento del Sistema Hidráulico y Piscinas del Centro Recreativo Altos de la Cueva, Final 2° Av. Norte y Calle a Cantón Agua Zarca, Departamento de San Miguel		180,898.15	180,898.15	180,898.15	100.00
6578	Construcción y Equipamiento de Planta de Tratamiento en Centro Recreativo Toma de Quezaltepeque, Municipio de Quezaltepeque, La Libertad		151,542.55	151,542.55	140,187.75	92.51
6607	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREATIVO ICHANMICHEN, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ		122,219.56	122,219.56	116,639.56	95.43



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2017, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE a/  
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
6606	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CANCHA DE FUTBOL EN EL PARQUE NATURAL BALBOA, PLANES DE RENDEROS, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		77,440.03	77,440.03	77,440.03	100.00
<b>ISRI</b>		<b>3</b>	<b>458,985.00</b>	<b>288,034.00</b>	-	-
4763	Construcción y remodelación de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Occidente, Santa Ana		278,090.00	253,209.00	-	-
5886	Remodelación del Centro de Rehabilitación Profesional del ISRI, San Salvador		99,355.00	19,871.00	-	-
4102	DIAGNOSTICO Y SUSTITUCION DE LINEAS HIDROSANITARIAS EN EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION DE INVALIDOS, ETAPA I, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.		81,540.00	14,954.00	-	-
<b>ISBM</b>		<b>1</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	-	-
6619	Adecuación de infraestructura y equipamiento para el Centro de Datos del ISBM, San Salvador		330,000.00	330,000.00	-	-
<b>ISDEMU</b>		<b>2</b>	<b>180,000.00</b>	<b>56,405.64</b>	<b>44,154.18</b>	<b>78.28</b>
6065	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAÑOS Y CASETA DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER- ISDEMU- ESTABLECIDAS EN EL DEPTO. SAN SALVADOR		115,000.00	47,252.64	35,001.18	74.07
6555	Rehabilitación del salón de usos múltiples y oficina anexa en la Rectoría Departamental de ISDEMU, San Miguel.		65,000.00	9,153.00	9,153.00	100.00
<b>OTRAS</b>						
<b>FOMILENIO</b>		<b>15</b>	<b>23,841,259.00</b>	<b>6,444,720.42</b>	<b>3,286,066.64</b>	<b>50.99</b>
40778	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria Construcción de Expansión de Carretera del Litoral.		15,361,248.00	-	-	-
50096	Proyecto de Administración del Programa - Contrapartida para pago de impuestos del Programa		2,052,620.00	2,052,620.00	331,126.02	16.13
50098	Proyecto De Infraestructura Logística - Contrapartida De Infraestructura Logística		1,308,665.00	1,308,665.00	866,117.60	66.18
50097	Proyecto de Clima de Inversión - Contrapartida de Clima de Inversión		1,109,605.00	1,109,605.00	287,295.95	25.89
40761	Proyecto de Capital Humano - Actividad Secundaria para la Ejecución del Modelo Inclusivo de Tiempo Completo - FASE DE EJECUCION		965,812.00	328,206.78	545,219.96	166.12
40758	Proyecto de Clima de Inversión - Actividad Secundaria de los Asocios Públicos-Privados-FASE DE EJECUCION		748,075.00	456,891.13	467,179.13	102.25
40757	Proyecto de Clima de Inversión - Actividad Secundaria de Mejora Regulatoria-FASE DE EJECUCION		569,054.00	369,054.00	354,905.11	96.17
50099	Proyecto de Capital Humano - Contrapartida de Capital Humano		478,630.00	478,630.00	27,165.67	5.68
40759	Proyecto de Clima de Inversión - Actividad Secundaria de Apuesta Por InversionES - FASE DE EJECUCION		441,843.00	104,236.53	122,755.41	117.77
40780	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria Plan de Acción de Reasentamientos de Expansión de la Carretera del Litoral.		335,900.00	119,940.00	119,940.00	100.00
40760	Proyecto de Capital Humano - Actividad Secundaria para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación - FASE DE EJECUCION		302,933.00	83,471.99	124,463.01	149.11
40785	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria de Apoyo a la Implementación del proyecto Infraestructura en el Cruce Fronterizo.		81,274.00	24,032.37	29,152.52	121.31
40762	Proyecto de Capital Humano -Actividad Secundaria de Gobernanza Del Sistema Integrado FCTP - FASE DE EJECUCION.		67,044.00	8,182.94	9,183.29	112.22
40781	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria Apoyo a la Implementación del proyecto Expansión de la Carretera del Litoral		17,556.00	1,184.68	1,562.97	131.93
40784	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria de Plan de Acción de Reasentamientos del proyecto Infraestructura en el Cruce Fronterizo.		1,000.00	-	-	-
<b>FSV</b>		<b>1</b>	<b>1,320,000.00</b>	<b>726,000.00</b>	-	-
6027	AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA , SAN SALVADOR		1,320,000.00	726,000.00	-	-
<b>FONAES</b>		<b>7</b>	<b>1,051,999.46</b>	<b>950,699.46</b>	<b>560,978.74</b>	-
6391	Programa Techo y Agua, Fase 2016		300,000.00	298,700.00	135,810.84	45.47
6390	Programa Techo y Agua, Fase 2015		211,756.51	211,756.51	179,564.06	84.80
6392	Programa Techo y Agua, Fase 2017		200,000.00	100,000.00	-	-
6506	Aprovechamiento del recurso hídrico mediante la captación de agua lluvia para el consumo humano en el municipio de Juayúa, Sonsonate		126,263.78	126,263.78	96,118.14	76.12
6574	Aprovechamiento del recurso hídrico mediante la captación de agua lluvia para el consumo humano en los Caseríos El Ciprés, La Trilla y El Rosario, Cantón Copinol Segundo, Chinameca, San Miguel		109,000.00	109,000.00	83,093.07	76.23
5050	PROGRAMA TECHO Y AGUA 2014		95,889.94	95,889.94	66,392.63	69.24
5777	Programa Techo y Agua 2012-2013		9,089.23	9,089.23	-	-
<b>FONAVIPO</b>		<b>8</b>	<b>538,698.82</b>	<b>409,843.36</b>	<b>360,792.02</b>	<b>88.03</b>
5085	CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		364,658.77	281,020.78	260,536.17	92.71
5192	CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION PROCAVIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		79,929.90	71,288.04	65,968.28	92.54
5503	CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		45,258.29	17,246.12	17,186.46	99.65



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2017, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE a/  
(MONTOS EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO</b>	<b>No. Prog. y Proyec.</b>	<b>PROGRAMADO ANUAL</b>	<b>PROGRAMADO AL MES</b>	<b>EJECUTADO AL MES</b>	<b>% EJEC. FINANC.</b>
5371	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de San Vicente		28,529.50	24,279.50	14,529.50	59.84
5372	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Villas de San Pedro, Municipio de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz		16,800.00	12,550.00	176.69	1.41
6579	Construcción de Módulos Sanitarios en Proyecto Habitacional Vista al Volcán, Municipio de Guadalupe, Departamento de San Vicente		2,932.36	2,932.36	2,050.00	69.91
5245	CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.		300.00	236.56	236.56	100.00
5370	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Nuevo Verapaz, Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente		290.00	290.00	108.36	37.37
<b>SUB TOTAL</b>		<b>380</b>	<b>806,144,621.79</b>	<b>463,397,272.35</b>	<b>181,409,130.73</b>	<b>39.15</b>
<b>FODES</b>			<b>257,802,660.00</b>	<b>214,835,550.80</b>	<b>214,835,550.80</b>	<b>100.00</b>
6407	Inversión Municipal a través del FODES 2017		257,802,660.00	214,835,550.80	214,835,550.80	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,063,947,281.79</b>	<b>678,232,823.15</b>	<b>396,244,681.53</b>	<b>58.42</b>

a/ Información registrada por las Ejecutoras en los Sistemas SAFI y SIIP, reporte generado el 24 de noviembre de 2017.
