

Programa Anual de Inversión Pública 2020

Informe de Avance al mes de marzo

INVERSIÓN
PÚBLICA

PAIP
2020



Abril 2020

INTRODUCCIÓN

El Gobierno de El Salvador en el año 2020 tiene previsto ejecutar diversos proyectos que integran el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2020, correspondientes a los sectores social, económico y seguridad pública y justicia.

En este informe se presenta el comportamiento de la ejecución financiera al mes de marzo de los proyectos contenidos en el PAIP 2020, con datos registrados en las aplicaciones informáticas del Sistema de Administración Financiero Integrado (SAFI) y del Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP), por las diferentes Instituciones del Sector Público pertenecientes al Gobierno Central, Empresas Públicas No Financieras, e Instituciones Descentralizadas No Empresariales, entre otras; así como información consolidada del PAIP por presupuesto vigente y provisiones 2019, sector de actividad, fuentes de financiamiento, y estructura del sector público, con base a la información de dichos proyectos.


El PAIP 2020 vigente al mes de marzo ascendió a \$1,380.96 millones, distribuidos en 42 Instituciones ejecutoras y 371 programas y proyectos, (incluyendo FODES).

I. Información General

1.1 Composición del Programa

El PAIP 2020 vigente al mes de marzo totaliza \$1,380.96 millones, (5.0% del PIB¹), reportando una disminución de \$6.76 millones respecto al monto registrado al mes de febrero, como efecto neto de incrementos en los programas institucionales de la ANDA y de la Secretaria de Estado del MJSP, y disminuciones de los programas del MH y FISDL; y el mismo está compuesto por 371 programas y/o proyectos contenidos en diferentes tipos de presupuesto y/o programas especiales, incluyendo recursos del FODES, como se detalla en el Gráfico No.1.

Gráfico No.1
Composición del PAIP 2020
(En millones de dólares y %)

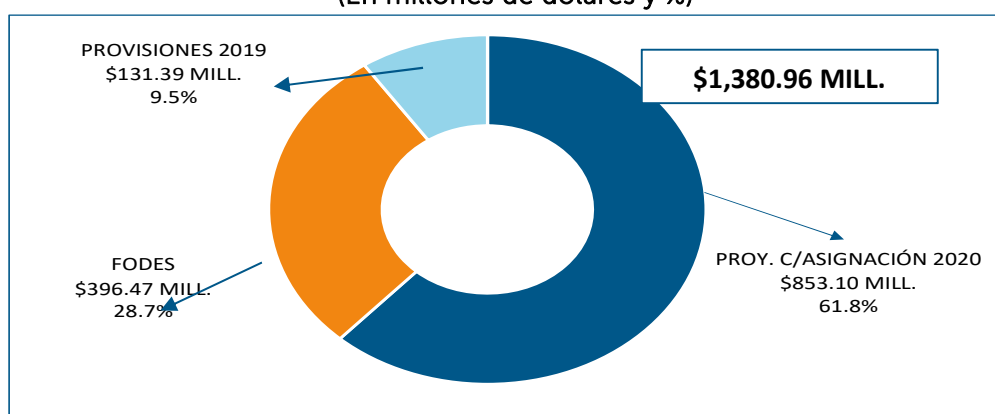

1.2 Avance del PAIP 2020 al mes de marzo

En el siguiente cuadro se reportan en forma consolidada los montos programados y ejecutados del año y al mes de marzo, según asignación 2020 y provisiones 2019. Además, presenta los montos comprometidos y no comprometidos; y de éstos últimos los recursos asignados a proyectos cuya contratación está en procesos administrativos.

Cuadro No.1
PAIP 2020 por Presupuesto al mes de marzo
(En millones de dólares)

PRESUPUESTO	Programado vigente anual	Programado al mes de marzo	Ejecutado al mes de marzo	% de Avance	COMPROMETIDO			% DE LO COMPROMETIDO RESPECTO A LO PROGRAMADO	NO COMPROMETIDO		
					TOTAL	EJECUTADO AL MES DE MARZO	PENDIENTE DE EJECUTAR		TOTAL	EN PROCESOS ADMINISTR.	SIN INICIAR PROCESOS ADMINISTR.
	1	2	3	4=(3/2)	5	6	7=5-6	8=5/1	9	10	11=9-10
PROYECTOS C/ASIGNACION 2020	853.10	172.53	73.11	42.37	163.93	73.11	90.82	19.2	689.17	69.61	619.56
PROVISIONES FINANCIERAS 2019*	131.39	51.06	33.49	65.6	131.39	33.49	97.90	100.0	-	-	-
Subtotal	984.49	223.59	106.59	47.67	295.32	106.59	188.72	30.0	689.17	69.61	619.56
FODES	396.47	99.12	99.12	100.0	396.47	99.12	297.36	100.0	-	-	-
TOTAL	1,380.96	322.71	205.71	63.7	691.79	205.71	486.08	50.1	689.17	69.61	619.56


* Corresponde a recursos comprometidos en el ejercicio fiscal 2019, que se ejecutarán en el año 2020.

¹ PIB: US\$27,556.6 millones.

1.3 Ejecución de los Recursos del PAIP 2020 al mes de marzo

Conforme los registros efectuados por las instituciones ejecutoras en los Sistemas Informáticos correspondientes, al cierre del mes de marzo se reportó un monto comprometido por valor de \$691.79 millones, equivalente al 50.1% del PAIP vigente (con FODES), de los cuales se ejecutaron \$205.71 millones y están pendientes de ejecutar \$486.08 millones. Asimismo, se reportan \$689.17 millones no comprometidos, que incluye \$69.61 millones para proyectos que su contratación está en procesos administrativos.


Gráfico No.2
Ejecución de los Recursos del PAIP 2020 al mes de marzo
(En millones de dólares y %)

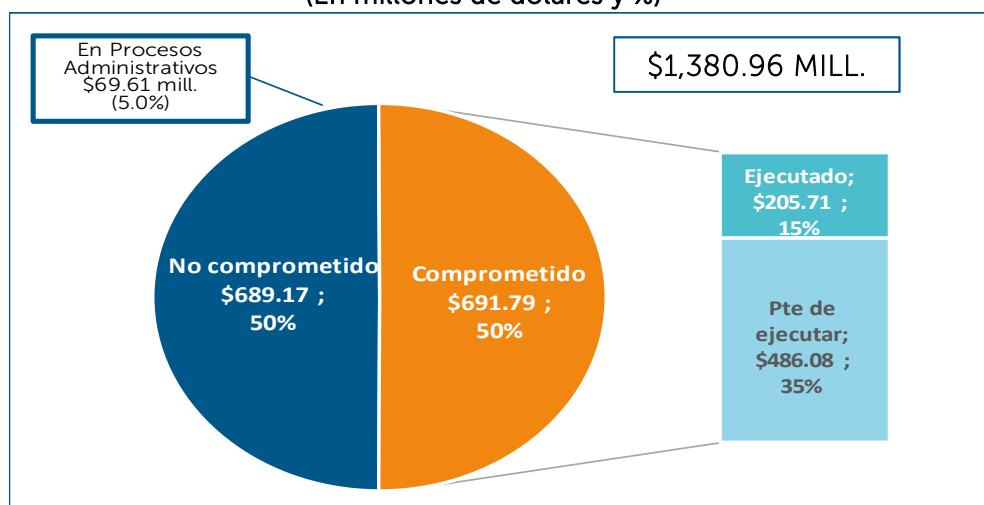

1.4 Comparativo de la Inversión Programada/Ejecutada

En el siguiente gráfico se reportan los montos de inversión programada/ejecutada al mes de marzo, durante los últimos 6 años (2015 – 2020), siendo el promedio de ejecución de dicho período de \$138.26 millones; observándose que la mayor ejecución se reporta en el presente año.

Gráfico No.3
Inversión Programada/Ejecutada, al mes de marzo 2015 – 2020
(En millones de dólares y %)

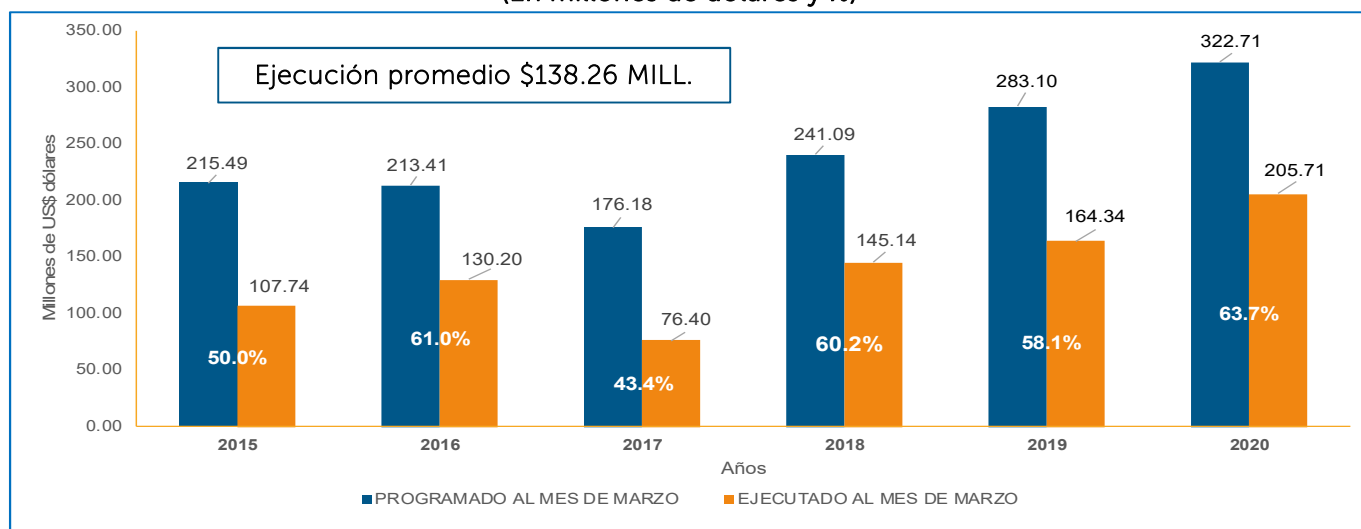

1.5 Inversión Programada / Ejecutada por Institución

Cuadro No.2
Programación/Ejecución Financiera del PAIP 2020, al mes de marzo, por Institución
(En millones de dólares)

INSTITUCIONES	No. de Prog./ Proy.	PROGRAMA VIGENTE ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE MARZO	EJECUTADO AL MES DE MARZO	% DE AVANCE	COMPROMETIDO			% DE LO COMPROMETIDO RESPECTO A LO PROGRAMADO	PENDIENTE DE COMPROMETER		
						TOTAL	EJECUTADO AL MES DE MARZO	PENDIENTE DE EJECUTAR		TOTAL	EN PROCESOS ADMINIST.	SIN INICIAR PROCESOS ADMINIST.
		1	2	3	4=3/2	5	6	7=5-6	8=5/1	9	10	11=9-10
GOBIERNO CENTRAL	253	363.51	48.86	25.74	52.7	102.73	25.74	76.99	28.3	260.77	49.27	211.51
MOPT	92	131.19	10.47	8.45	80.7	45.94	8.45	37.49	35.0	85.25	-	85.25
MINEDUCYT	8	42.00	1.50	2.75	+100	7.57	2.75	4.82	18.0	34.43	30.27	4.16
SE - MJSP	16	39.95	21.37	7.42	34.7	21.01	7.42	13.58	52.6	18.95	-	18.95
MINSAL	9	29.75	0.82	0.55	67.0	3.65	0.55	3.10	12.3	26.10	17.52	8.57
FGR	2	23.35	-	-	-	0.41	-	0.41	1.8	22.94	-	22.94
DGCP-MJSP	13	22.47	1.97	0.63	32.0	2.64	0.63	2.01	11.7	19.83	-	19.83
MVI	6	13.15	0.59	0.76	+100	2.92	0.76	2.16	22.2	10.24	-	10.24
MH	6	11.77	0.23	0.10	44.4	0.58	0.10	0.48	4.9	11.19	-	11.19
CSJ	15	10.05	5.11	0.50	9.8	4.97	0.50	4.48	49.5	5.07	-	5.07
MITUR	1	9.05	3.84	1.05	27.4	5.34	1.05	4.29	59.0	3.71	-	3.71
PNC-MJSP	6	8.31	-	0.24	+100	2.24	0.24	1.99	26.9	6.07	-	6.07
MINEC	1	5.91	1.52	1.18	77.7	1.91	1.18	0.73	32.3	4.00	0.36	3.64
MAG	7	5.54	0.63	1.70	+100	2.03	1.70	0.34	20.2	3.51	1.11	2.39
MIGOBDET	59	4.35	-	-	-	-	-	-	0.0	4.35	-	4.35
MICULTURA	5	2.21	0.41	-	0.0	0.95	-	0.95	42.9	1.26	-	1.26
MARN	3	1.90	-	-	-	0.02	-	0.02	0.0	1.88	-	1.88
MTYPS	2	1.30	0.15	0.16	105.1	0.30	0.16	0.14	23.2	1.00	-	1.00
PGR	1	1.00	0.00	-	0.0	0.00	-	0.00	0.0	1.00	-	1.00
INJUVE	1	0.25	0.25	0.25	100.0	0.25	0.25	0.00	100.0	-	-	-
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	56	77.07	13.11	1.06	8.1	9.25	1.06	8.19	12.0	67.82	-	67.82
FISDL	11	35.89	7.61	0.83	11.0	5.30	0.83	4.46	14.8	30.60	-	30.60
ISSS	7	22.56	-	-	-	-	-	-	0.0	22.56	-	22.56
CORSATUR	3	3.57	1.36	0.01	0.0	2.53	0.01	2.51	70.9	1.04	-	1.04
INDES	11	2.52	0.25	0.06	25.1	0.25	0.06	0.18	9.7	2.28	-	2.28
INSAFORP	2	2.52	-	-	-	-	-	-	0.0	2.52	-	2.52
ISTU	5	2.49	0.99	0.07	6.9	0.69	0.07	0.63	27.8	1.80	-	1.80
ISBM	4	2.08	-	-	-	-	-	-	0.0	2.08	-	2.08
CNR	3	2.05	1.03	-	0.0	-	-	-	0.0	2.05	-	2.05
UES	1	1.56	1.56	-	0.0	-	-	-	0.0	1.56	-	1.56
ISRI	3	0.78	0.10	0.04	42.7	0.13	0.04	0.09	16.6	0.65	-	0.65
ANSP - MJSP	2	0.73	0.01	0.00	42.5	0.23	0.00	0.23	31.4	0.50	-	0.50
ISDEMU	2	0.21	0.11	0.03	0.0	0.13	0.03	0.10	63.6	0.08	-	0.08
ISNA	2	0.11	0.11	-	0.0	-	-	-	0.0	0.11	-	0.11
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	16	270.57	85.31	37.86	44.4	77.62	37.86	39.77	28.7	192.95	20.35	172.60
CEL	4	170.66	73.17	30.36	41.5	30.36	30.36	-	17.8	140.30	-	140.30
CEPA	8	54.96	8.93	7.39	82.7	26.46	7.39	19.07	48.1	28.50	9.00	19.50
ANDA	4	44.95	3.20	0.11	3.3	20.80	0.11	20.69	46.3	24.15	11.35	12.81
OTRAS	45	273.33	76.31	41.94	55.0	105.71	41.94	63.77	38.7	167.63	-	167.63
FOMILENIO	19	135.25	49.28	26.65	54.1	32.08	26.65	5.42	23.7	103.17	-	103.17
FOVIAL	8	134.44	23.63	15.20	64.3	73.48	15.20	58.29	54.7	60.96	-	60.96
FSV	2	2.22	2.22	-	-	-	-	-	0.0	2.22	-	2.22
CEFAFA	1	1.06	1.06	-	0.0	-	-	-	0.0	1.06	-	1.06
FONAVIPO	7	0.29	0.09	0.06	65.5	0.12	0.06	0.06	41.6	0.17	-	0.17
FONAES	8	0.08	0.03	0.03	0.0	0.03	0.03	-	33.5	0.05	-	0.05
SUBTOTAL	370	984.49	223.59	106.59	47.7	295.32	106.59	188.72	30.0	689.17	69.61	619.56
FODES	1	396.47	99.12	99.12	100.0	396.47	99.12	297.36	100.0	-	-	-
TOTAL	371	1,380.96	322.71	205.71	63.7	691.79	205.71	486.08	50.1	689.17	69.61	619.56

II. Estructura y Comportamiento del PAIP 2020

2.1 Instituciones y Proyectos con mayores montos programados para el año 2020

El siguiente cuadro muestra las diez instituciones con mayores montos programados en el PAIP 2020, que totalizan \$819.04 millones, equivalentes al 59.3% del Programa, siendo el monto programado al mes de marzo de las mismas de \$199.98 millones y su ejecución de \$99.71 millones.

Cuadro No.3
Instituciones con mayor inversión anual programada y su avance al mes de marzo/20
(En millones de dólares)

INSTITUCIONES	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE MARZO	EJECUTADO AL MES DE MARZO
CEL	170.66	73.17	30.36
FOMILENIO	135.25	49.28	26.65
FOVIAL	134.44	23.63	15.20
MOPT	131.19	10.47	8.45
CEPA	54.96	8.93	7.39
ANDA	44.95	3.20	0.11
MINEDUCYT	42.00	1.50	2.75
SE - MJSP	39.95	21.37	7.42
FISDL	35.89	7.61	0.83
MINSAL	29.75	0.82	0.55
TOTAL	819.04	199.98	99.71

A continuación, se presentan los 10 programas/proyectos con mayores montos de inversión programada y ejecutada, cuya suma conjunta asciende a \$478.02 millones y concentran el 48.6% del PAIP vigente sin FODES por valor de \$984.49 millones.


Cuadro No.4
Programas/Proyectos del PAIP 2020, con mayor Inversión Programada y Ejecutada
(En millones de dólares)

INSTITUCIONES	PROGRAMAS / PROYECTOS	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE MARZO	EJECUTADO AL MES DE MARZO	EFICACIA FINANCIERA AL MES
CEL	Proyecto hidroeléctrico El Chaparral	149.73	68.06	30.36	44.6%
MOPT	Construcción de by pass en la ciudad de San Miguel	56.75	3.15	1.29	40.9%
FOVIAL	Programa de mantenimiento rutinario de vías pavimentadas a nivel nacional 2020 - componente de inversión	50.45	4.87	4.33	88.9%
FOVIAL	Programa de mantenimiento periódico 2020	45.28	1.52	0.02	1.3%
ANDA	Rehabilitación de las obras de captación, potabilización y electromecánicas de la planta potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador.	37.52	2.98	0.10	3.5%
MINEDUCYT	Programa de mejoramiento de ambientes educativos para la formación integral y aprendizajes, a nivel nacional	28.77	0.01	1.50	+100%
FOMILENIO	Proyecto de capital humano - actividad secundaria para la ejecución del modelo inclusivo de tiempo completo - fase de ejecución	28.27	9.42	7.02	74.4%
MINSAL	Programa Integrado de Salud II	27.88	0.80	0.54	67.6%
FOMILENIO	Proyecto de infraestructura logística - actividad secundaria construcción de expansión de carretera del Litoral.	27.06	9.02	5.37	59.6%
CEPA	Ampliación de terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.	26.30	7.27	6.26	86.1%
TOTAL		478.02	107.10	56.80	53.0%

2.2 Composición del PAIP 2020, por Estructura del Sector Público

Del total de \$1,380.96 millones que conforman el PAIP 2020 vigente al mes de marzo, el 26.3% de los recursos están asignados a proyectos del Gobierno Central, el 19.6% a proyectos de las Empresas Públicas No Financieras, 5.6% a Instituciones Descentralizadas No Empresariales, y el 48.5% son recursos del FODES y asignaciones a otras entidades (FOMILENIO, FOVIAL, FSV, CEFAFA, FONAVIPO y FONAES), cuyos montos se presentan en el siguiente gráfico, que además incluye las cantidades programadas y ejecutadas al mes que se reporta, según dicha estructura.

Gráfico No.4
PAIP 2020 por Estructura del Sector Público, al mes de marzo
(En millones de dólares y %)

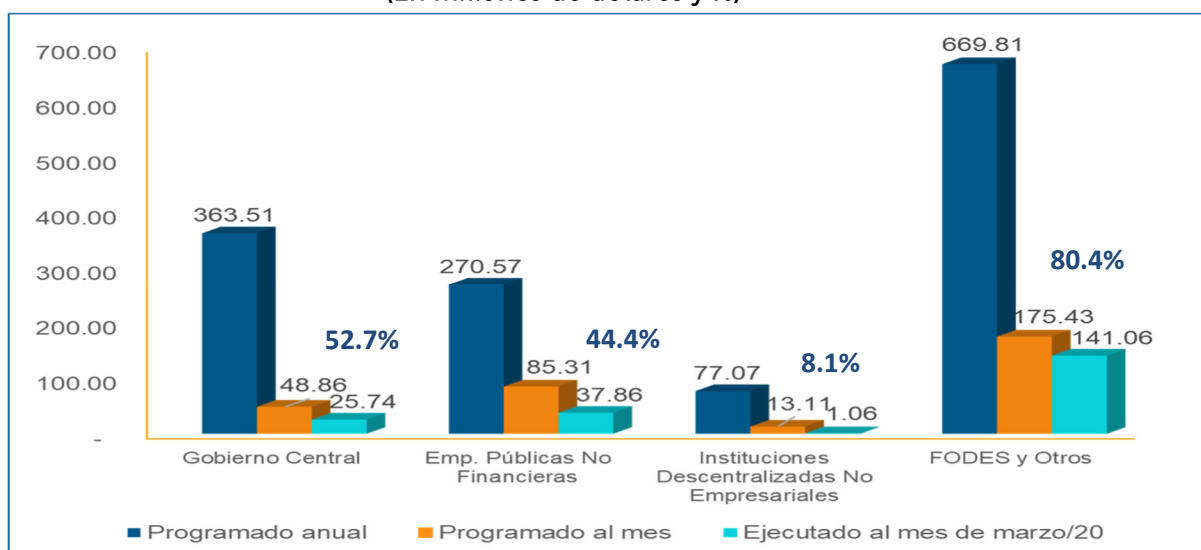

2.3 Composición del PAIP 2020, por Fuente de Financiamiento.

El 66.3% del PAIP/2020 vigente al mes de marzo lo financian fuentes internas y el 33.7% fuentes externas, tal como se muestra en el siguiente cuadro, el cual incluye el monto programado y ejecutado al mes de marzo de dichas fuentes.


Cuadro No.5
PAIP 2020 por Fuente de Financiamiento al mes de marzo
(Millones de dólares)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES DE MARZO	% DE EJEUCIÓN
	1	2	3	4=3/2
FONDO GENERAL	709.03	158.52	128.52	81.1%
FONDOS PROPIOS	201.44	53.76	21.63	40.2%
OTROS*	5.78	1.39	0.99	71.3%
TOTAL INTERNO	916.25	213.67	151.14	70.7%
PRESTAMOS EXTERNOS	319.80	55.60	29.50	53.1%
DONACIONES	144.91	53.43	25.07	46.9%
TOTAL EXTERNO	464.71	109.04	54.57	50.0%
TOTAL GENERAL	1,380.96	322.71	205.71	63.7%

*Otros: Incluye FANTEL, FINET, Fideicomisos, FCA y FSJDA.

Según el cuadro anterior, al mes de marzo, las mayores ejecuciones se reportan, en las fuentes internas, en el Fondo General con \$128.52 millones, equivalente al 85.0% del total interno ejecutado, (incluye \$99.12 millones de la transferencia del FODES); y en las fuentes externas, los préstamos con \$29.50 millones, representando el 54.1% del total externo ejecutado.

Gráfico No.5
PAIP 2020 por Fuente de Financiamiento, al mes de marzo
 (En millones de dólares)

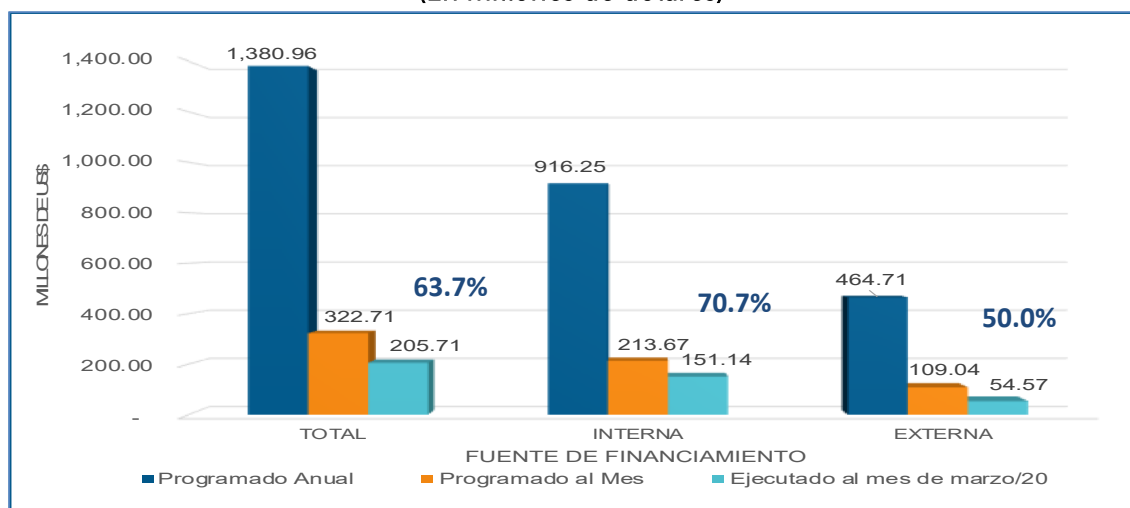


2.4 Composición del PAIP 2020, por Sector de Actividad

Del monto de \$1,380.96 millones del PAIP 2020 vigente al mes de marzo, \$720.79 millones (52.2%) están asignados a proyectos del Sector Económico, \$553.24 millones (40.1%) a proyectos del Sector Social, y \$106.93 millones (7.7%) a proyectos del Sector Seguridad Pública y Justicia. De dicho total se reporta una ejecución de \$205.71 millones, correspondientes al 63.7% de lo programado al mes, distribuidos de la siguiente manera: \$114.36 millones en proyectos del Sector Económico, \$82.55 millones del Sector Social y \$8.80 millones a proyectos de Seguridad Pública y Justicia.

A continuación, en el gráfico No.6, se presentan los montos programados y ejecutados al mes de marzo, por Sector de Actividad.

Gráfico No.6
PAIP 2020 por Sector de Actividad, al mes de marzo
 (En millones de dólares y %)

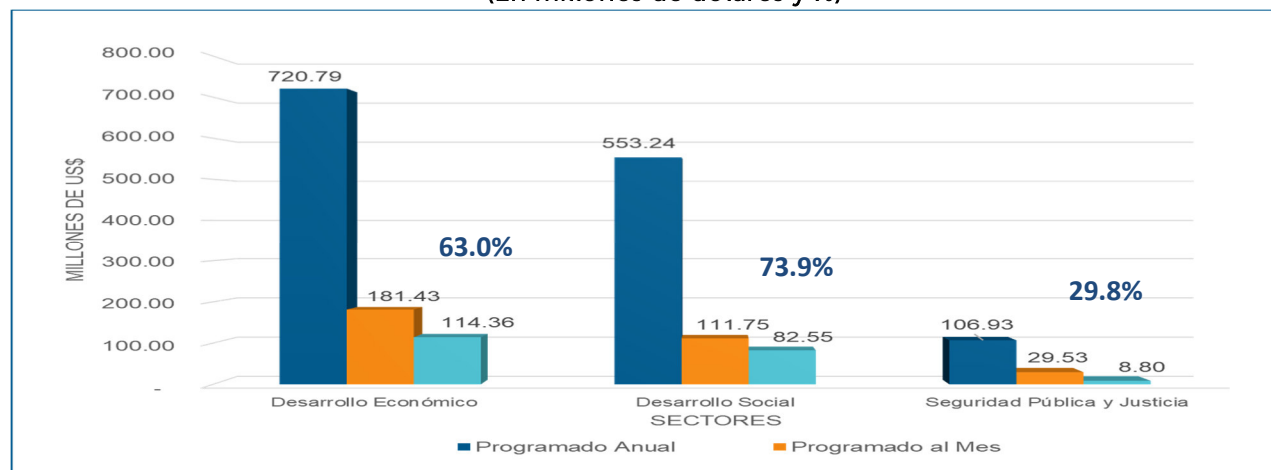

El detalle de los programas y proyectos que conforman el Programa Anual de Inversión Pública 2020 vigente al mes de marzo, se presenta en anexo, agrupados por institución ejecutora, según reporte generado el 20 de abril de 2020, con información registrada por dichas entidades en los Sistemas SAFI y SIIP.

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2020, EJECUCION AL MES DE MARZO a/
(Montos en dólares)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO	No. DE PROG/PROY	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJCUC. FINANC.
GOBIERNO CENTRAL		253	363,508,502.75	48,856,717.25	25,742,932.76	52.7%
MOPT		92	131,188,509.27	10,465,446.61	8,450,065.28	80.7%
5980	CONSTRUCCIÓN DE BY PASS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL		56,747,064.36	3,145,648.48	1,287,190.10	40.9%
4425	Ampliación de la carretera CA04S, Tramo III: Construcción By Pass de La Libertad, Entre Km. 31.86 (Carretera CA04S) - Km. 35 (Carretera CA02W), Departamento de La Libertad		21,994,105.43	4,694,298.47	5,312,427.49	113.2%
5964	CONSTRUCCIÓN PUENTE GENERAL MANUEL JOSÉ ARCE, FRONTERA LA HACHADURA-PEDRO DE ALVARADO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN		16,914,551.55	558,515.50	131,097.81	23.5%
6611	Programa de Corredores Productivos - Componente II: Inversiones productivas y logísticas para la competitividad (BID 3170/OC-ES)		5,234,835.00	-	-	-
7514	Construcción de Hospital de Especialidades para atención de la emergencia por COVID-19, San Salvador		4,151,031.00	-	-	-
5460	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAM33, TRAMO: CANTON SAN ANTONIO - CANTON EL CARRIZAL, DEPARTAMENTOS DE SAN MIGUEL Y MORAZAN.		2,851,652.45	-	-	-
5462	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MOR13W, TRAMO: MUNICIPIO SAN SIMON - MUNICIPIO SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.		2,821,430.57	-	-	-
3918	DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES		2,351,987.65	83,835.00	-	0.0%
7065	Mejoramiento de Camino Rural CHA09S, San Miguel de Mercedes - San Antonio Los Ranchos, departamento de Chalatenango. Fase II		1,989,958.39	-	-	-
4067	Mejoramiento Camino Rural CHA08S, Tramo: Entre San Isidro Labrador -San José Cancasque. Chalatenango		1,824,214.32	-	-	-
5913	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAZ18W, TRAMO: VERAPAZ - JERUSALÉN - MERCEDES LA CEIBA Y RAMAL SAV21S, TRAMO: SAV18W - JERUSALÉN, DEPARTAMENTOS DE SAN VICENTE Y LA PAZ		1,605,092.53	-	-	-
6030	Mejoramiento de Camino Terciario UNI08S, Tramo CORSAIN-Las Playitas, Municipio de La Unión, Departamento de La Unión.		1,425,070.50	914,282.34	712,795.60	78.0%
6058	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ESTRATÉGICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE AHUACHAPÁN, SANTA ANA Y LA LIBERTAD		887,475.00	-	-	-
6880	Mejoramiento del camino rural USU08S, tramo CA02E (desvío San Marcos Lempa) - desvío El Zamorán, municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután		598,428.19	-	22,918.75	-
7411	Mejoramiento de Cancha España, municipio de San Sebastián, San Vicente		500,000.00	-	-	-
7412	Pavimentación de 13.5 km de carretera, de Teotepeque al desvío de Chiltiupán (La Cumbre), municipio de Chiltiupán, La Libertad		500,000.00	-	-	-
7413	Construcción de Puente de doble carril en entrada principal a la Ciudad de Chilanga, Morazán		500,000.00	-	-	-
7414	Pavimentación de 7 km de calle, desde cantón Garita Palmera hasta cantón El Zapote, municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán		500,000.00	-	-	-
7415	Pavimentación de 2 km de calle, desde el kilómetro 39 1/2 de la CA-1 hasta el cantón El Tinteral, municipio de Coatepeque, Santa Ana		500,000.00	-	-	-
6934	Fortalecimiento Institucional – Programa FONPRODE		485,724.58	143,258.58	36,599.37	25.5%
7416	Pavimentación asfáltica en tramo desde Arrocería San Francisco hasta cantón El Cerro, municipio de El Rosario, La Paz		400,000.00	-	-	-
6545	Fortalecimiento Institucional Fondos Yucatán		397,500.00	138,910.00	71,800.00	51.7%
6442	Fortalecimiento Institucional Convenio JICA - By Pass de San Miguel		356,619.25	64,175.00	29,636.00	46.2%
7417	Mejoramiento de red vial primaria en caserío Tihuilococho, cantón Las Guarumas, municipio de Santiago Nonualco, La Paz		350,000.00	-	-	-
7077	Mejoramiento de calles principales en Colonia Helen 2, municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas		311,532.40	235,350.00	310,018.76	131.7%
7418	Construcción de 3.65 km de calle, desde la Ciudad de La Unión hasta el cantón Amapalita, municipio y departamento de La Unión		250,000.00	-	-	-

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2020, EJECUCION AL MES DE MARZO a/
(Montos en dólares)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO	No. DE PROG/PROY	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEUC. FINANC.
7419	Pavimentación de tramo de calle desde Cuisnahuat hacia la carretera del Litoral, municipio y departamento de Sonsonate		250,000.00	-	-	-
7420	Pavimentación de tramo de calle desde Caluco hasta cantón El Bebedero, municipio y departamento de Sonsonate		250,000.00	-	-	-
6663	Construcción de Puente Agua Caliente, Sobre Río Acelhuate, Ruta RN02E, Municipio de San Salvador		241,989.05	-	-	-
7421	Recarpeteo de calle que conduce a playa El Pimental, cantón El Pimental, municipio de San Luis Talpa, La Paz		200,000.00	-	-	-
7422	Pavimentación asfáltica de calle desde Establo Amatecampo hacia el caserío La Esmeralda, municipio de San Luis Talpa, La Paz		200,000.00	-	-	-
7423	Pavimentación de tramo de carretera, desde los cantones Ojos de Agua y Los Sitios hasta cantón San Rafael, municipio y departamento de Chalatenango		200,000.00	-	-	-
7424	Pavimentación de tramos de calles en municipio de Sensuntepeque, Cabañas		200,000.00	-	-	-
6756	Fortalecimiento Institucional - Componente II (BID 3170/OC-ES)		196,872.92	52,872.92	47,582.60	90.0%
7425	Construcción de pavimento en tramo de calle del caserío La Pista de Monteca, municipio de Nueva Esparta, La Unión		150,000.00	-	-	-
7426	Pavimentación asfáltica y construcción de cuneta en calle a cantón Santa Irene, Tramo 2, municipio de Zacatecoluca, La Paz		139,842.00	-	-	-
7150	Construcción de puente en Camino Municipal sobre Río Torola, Cantones El Rosario y Chiquirí, municipios de San Isidro y Torola, departamento de Morazán		139,061.17	-	-	-
7427	Reconstrucción de calle Olomega, hacia entrada del parque del ex Teleférico, tramo entre colonias Amatepec y Ciudad Credisa, municipio de Soyapango, San Salvador		132,800.00	-	-	-
7428	Construcción de puente en Sector 10 de la Comunidad Nueva Israel, municipio y departamento de San Salvador		100,000.00	-	-	-
7429	Construcción de Centro de Vida Independiente para personas con discapacidad, municipio y departamento de San Salvador		100,000.00	-	-	-
7430	Adoquinado de calle a La Cumbre, cantón San Marcos, municipio y departamento de La Libertad		100,000.00	-	-	-
6062	Programa de Caminos Rurales Progresivos y Mejoramiento de Caminos a Nivel Nacional		91,135.00	-	-	-
7015	Mejoramiento de Calle Antigua a Panchimalco, municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador		82,857.79	82,857.79	82,857.79	100.0%
7019	Mejoramiento de Calles de Zona Urbana del municipio de Nuevo Edén de San Juan, departamento de San Miguel		78,112.77	65,902.77	78,112.77	118.5%
7431	Pavimentación de calle central de la Colonia Pampas 2, municipio de Aguilares, San Salvador		75,000.00	-	-	-
7020	Mejoramiento de Calles de Colonia Ciudad Pacífica, municipio y departamento de San Miguel		74,474.23	74,474.23	74,474.23	100.0%
7018	Mejoramiento de Calle Principal de Caserío Garcitas, municipio de El Paisnal, departamento de San Salvador		73,729.66	63,129.33	73,729.66	116.8%
7432	Mejoramiento de calle rural del cantón Hacienda Nueva, municipio de Concepción Batres, Usulután		60,000.00	-	-	-
4424	Ampliación de la carretera CA04S, Tramo II: entre Km. 22.36 (Salida Sur de Zaragoza) - Km. 31.86 (Inicio By Pass de La Libertad), Departamento de La Libertad		59,337.16	7,500.00	-	0.0%
7433	Mejoramiento de tramo de calle del cantón Los Chilamates, municipio de Nueva Concepción, Chalatenango		55,000.00	-	-	-
7434	Pavimentación de calles del Área Urbana y calle principal hacia San Francisco, municipio de San Lorenzo, San Vicente		50,000.00	-	-	-
7435	Pavimentación de calles del Área Urbana y calle a cantón Las Ánimas, municipio de San Lorenzo, San Vicente		50,000.00	-	-	-
7436	Pavimentación de 4.5 kms de calle a Ojos de Agua, a la altura del KM 85, en caserío Las Cristalinillas, cantón El Jute, municipio Candelaria de la Frontera, Santa Ana		50,000.00	-	-	-
7437	Mejoramiento de calle rural del cantón Escarbadero, municipio de Estanzuelas, Usulután		50,000.00	-	-	-
7438	Colocación de carpeta asfáltica en 3a Av. Norte-Sur, municipio de Apaneca, Ahuachapán		50,000.00	-	-	-
7439	Pavimentación de calle principal de la colonia 3 de Mayo, municipio Santa Cruz Michapa, Cuscatlán		50,000.00	-	-	-

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2020, EJECUCION AL MES DE MARZO a/
(Montos en dólares)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO	No. DE PROG/PROY	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJECC. FINANC.
7440	Pavimentación de calle en cantón Copinol, municipio de San Rafael Cedros, Cuscatlán		50,000.00	-	-	-
7441	Mejoramiento de calle principal del cantón El Triunfo, municipio de San Bartolomé Perulapía, Cuscatlán		50,000.00	-	-	-
7442	Pavimentación de calle del Sector La Peñona, cantón San Nicolás, municipio de Monte San Juan, Cuscatlán		50,000.00	-	-	-
7443	Pavimentación con concreto hidráulico de calle al Rancho, caserío Soriano, cantón El Manzanal, municipio Santa Elena, Usulután		45,000.00	-	-	-
7048	Construcción de huellas vehiculares en Colonia San Antonio No.1, municipio de San Marcos, departamento de San Salvador		42,049.37	26,620.00	42,049.37	158.0%
7021	Mejoramiento de tramo de Calle en ruta SAM16N, Tramo: Yucuaiquín, departamento de La Unión - Uluazapa, departamento de San Miguel		40,631.75	40,631.75	40,631.75	100.0%
7022	Mejoramiento de Calle Principal del Caserío Ojo de Agua, Cantón Guaripe, municipio Concepción de Oriente, departamento de La Unión		40,565.70	37,000.00	40,565.70	109.6%
7014	Mejoramiento de Calle y Construcción de Portón de Acceso al Caserío Guachipilín, municipio de Rosario de Mora, San Salvador		40,528.83	29,430.00	40,528.83	137.7%
7444	Pavimentación de 4 pasajes de colonia Santa María, pasaje Montecarlo norte y sur y El Rosal norte y sur, municipio y departamento de Santa Ana		40,000.00	-	-	-
7445	Pavimentación de calle principal en barrio El Carmen, municipio El Triunfo, Usulután		40,000.00	-	-	-
7446	Mejoramiento de calle del cantón El Tigre, municipio de La Reina, Chalatenango		40,000.00	-	-	-
7447	Pavimentación en calle principal del municipio de Comalapa, Chalatenango		40,000.00	-	-	-
7448	Pavimentación de calle principal del municipio de San Juan Tepezontes, La Paz		40,000.00	-	-	-
7449	Mejoramiento de calle El Bálsamo, Casco Urbano, municipio de Huizúcar, La Libertad		40,000.00	-	-	-
7450	Pavimentación de tramos de calles de colonia El Sol, municipio de Santa Rita, Chalatenango		35,000.00	-	-	-
7451	Mejoramiento de calle hacia el cantón El Socorro, municipio de Zacatecoluca, La Paz		35,000.00	-	-	-
7452	Mejoramiento de calle hacia cantón Santa Lucía y San Lucas, municipio de Zacatecoluca, La Paz		35,000.00	-	-	-
7453	Recarpeteo con mezcla asfáltica de calle principal del caserío Valle Nuevo, cantón Aguaje Escondido, municipio de Tejutla, Chalatenango		30,000.00	-	-	-
7454	Recarpeteo profundo en calle principal de Bosques de la Paz, tramos de la 1ª a la 15ª Calle Oriente, municipio de Ilopango, San Salvador		30,000.00	-	-	-
7455	Pavimentación de tramo en avenida Morazán y calle Panamericana, frente al Mercado Municipal Tineco, municipio de San Martín, San Salvador		30,000.00	-	-	-
7456	Pavimentación de tramo de calle, desde la salida del municipio de Citalá hasta el municipio de Metapán, Chalatenango		30,000.00	-	-	-
7457	Pavimentación de calles principales en Casco Urbano del municipio de Concepción Quezaltepeque, Chalatenango		30,000.00	-	-	-
7458	Pavimentación de calle principal de caserío San Sebastián Las Lomas, cantón San Antonio, municipio de Santa María Ostuma, La Paz		30,000.00	-	-	-
7459	Mejoramiento de tramo de calle, desde cantón Zacatillo hacia Hacienda Escuintla, municipio de Zacatecoluca, La Paz		30,000.00	-	-	-
7460	Mejoramiento de calles internas de Residencial Libertad y Cimas de San Bartolo, municipio de Santiago Tonacatepeque, San Salvador		29,610.00	-	-	-
7461	Pavimentación con concreto hidráulico en calle empedrada del cantón San José Nº 2, municipio de San Martín, San Salvador		26,000.00	-	-	-
7462	Mejoramiento de calle principal de Urbanización Las Jacarandas, municipio de Apopa, San Salvador		25,590.00	-	-	-

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2020, EJECUCION AL MES DE MARZO a/
(Montos en dólares)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO	No. DE PROG/PROY	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJCUC. FINAN.
7463	Pavimentación de tramo de calle desde La Puertona hasta el cantón Ojos de Agua, municipio de San Rafael, Chalatenango		25,000.00	-	-	-
7464	Pavimentación de tramo de calle desde Casco Urbano hacia cantón Los Sirios, municipio San Rafael, Chalatenango		25,000.00	-	-	-
7465	Pavimentación de tramo de calle, desde Potonico hasta la Presa del Cerrón Grande, municipio de Potonico, Chalatenango		25,000.00	-	-	-
7466	Pavimentación de calle rural del caserío La Hoja de Sal, cantón El Copinol, municipio Paraíso de Osorio, La Paz		25,000.00	-	-	-
7467	Pavimentación y cordoneado de calle a Las Mulas, Barrio San Rafael, municipio San Antonio Los Ranchos, Chalatenango		20,000.00	-	-	-
7468	Pavimentación de calle y construcción de cuneta en pasaje Rosales Olivo, cantón El Ciprés, municipio de Santo Tomás, San Salvador		20,000.00	-	-	-
7469	Pavimentación con concreto hidráulico de 65 mts lineales en Pasaje Nº 5 de Colonia Palmacia #2, municipio de Santiago Texacuangos, San Salvador		20,000.00	-	-	-
7470	Pavimentación de Pasajes A, B, C y D de la Colonia 27 de septiembre, municipio de Zacatecoluca, La Paz		20,000.00	-	-	-
7016	Mejoramiento y construcción de obras de drenaje en tramo de calle del Cantón Calle Vieja, municipio de Nejapa, San Salvador		15,048.70	6,754.45	15,048.70	222.8%
MINEDUCYT		8	41,998,443.01	1,502,203.13	2,749,132.63	183.0%
7240	Programa de mejoramiento de ambientes educativos para la formación integral y aprendizajes, a nivel nacional		28,770,000.00	14,750.00	1,500,000.00	10169.5%
6910	Programa de Becas FANTEL a nivel nacional, para realizar estudios de Educación Superior, 2018-2022		5,215,460.00	1,299,631.00	962,882.80	74.1%
7239	Programa de equipamiento y capacitación docente en tecnología e innovación al servicio de los aprendizajes, a nivel nacional		5,000,000.00	-	-	-
6998	Construcción de Centro Escolar en Cantón El Piche, municipio de El Carmen, departamento de La Unión		1,478,628.21	-	-	-
7238	Programa de formación docente al servicio de los aprendizajes, a nivel nacional		1,000,000.00	-	-	-
6958	Programa de Becas Integrales a Familiares de Víctimas de la Masacre en Caserío El Mozote en Meanguera y zonas aledañas, departamento de Morazán		400,000.00	109,090.00	223,407.12	204.8%
6956	Mejoramiento de Centros Escolares en los municipios de Comasagua y Santa Tecla, departamento de La Libertad y en el municipio y departamento de San Salvador		88,956.45	62,842.71	62,842.71	100.0%
5657	Potenciando la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El Salvador		45,398.35	15,889.42	-	0.0%
SE - MJSP		16	39,952,851.93	21,372,657.18	7,423,627.20	34.7%
6963	Programa de Infraestructura para la recuperación y dinamización de espacios públicos 2019 - LA/2017/40-134		11,479,379.41	4,275,677.24	1,069,989.26	25.0%
6961	Fortalecimiento al sistema de Educación Pública para la prevención de la violencia y la Convivencia LA/2017/40-134		10,626,800.00	10,626,800.00	4,626,800.00	43.5%
7278	Programa de Mejoramiento de Instalaciones Deportivas, Casa de la Juventud y obras adicionales en municipios priorizados a Nivel Nacional, 2019		5,243,038.88	1,572,911.66	-	0.0%
7277	Programa de Construcción de Instalaciones Deportivas, Casas Comunes, Centros Integrales, Anfiteatro y obras adicionales en municipios priorizados a Nivel Nacional, 2019		3,593,709.12	1,078,112.73	-	0.0%
6558	Programa de Prevención de la violencia juvenil a nivel local - MJSP - BID 2881/OC-ES		2,778,029.49	1,705,741.03	885,987.49	51.9%
6967	Fortalecimiento de Comités Municipales de Prevención de la Violencia en municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro - LA/2017/40-134		1,192,639.25	210,638.53	92,219.25	43.8%
6962	Programa de Fortalecimiento de atención a víctimas - LA/2017/40-134		1,169,096.42	301,338.14	4,654.42	1.5%
7221	Construcción de Puesto Policial en comunidad El Zamorano, cantón San Marcos Lempa, municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután		641,729.43	182,607.03	156,346.93	85.6%
7224	Construcción de Puesto Policial contiguo a Alcaldía Municipal, municipio de Corinto, departamento de Morazán		619,628.45	276,468.72	207,111.60	74.9%
6968	Fortalecimiento Institucional - LA/2017/40-134		593,200.00	115,960.00	18,000.00	15.5%

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2020, EJECUCION AL MES DE MARZO a/
(Montos en dólares)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO	No. DE PROG/PROY	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJCUC. FINANC.
7220	Construcción de Sub Delegación Policial en Barrio El Centro, municipio de Verapaz, departamento de San Vicente		537,483.55	167,889.12	133,101.48	79.3%
7223	Mejoramiento y ampliación de Puesto Policial en Barrio El Centro, municipio de San Luis La Reina, departamento de San Miguel		419,714.55	237,769.60	130,086.68	54.7%
6557	Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública - BID 2881/OC-ES		394,967.72	134,167.72	316.40	0.2%
6559	Administración y gestión del Programa BID - 2881/OC-ES		330,738.89	153,878.89	19,168.09	12.5%
7219	Mejoramiento y ampliación de Puesto Policial en Ciudad Obrera, municipio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad		232,696.77	232,696.77	79,845.60	34.3%
7410	Suministro e instalación de Sistema de Videovigilancia, municipio de Atiquizaya, Ahuachapán		100,000.00	100,000.00	-	0.0%
MINSAL		9	29,748,662.00	816,197.35	546,512.83	67.0%
6300	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II		27,884,010.00	802,397.35	542,428.96	67.6%
7140	Construcción y equipamiento de edificio para la Unidad Hospitalaria de Salud Mental y Atención Especializada a Víctimas de Violencia, en el Hospital Nacional San Rafael, Santa Tecla, La Libertad		750,000.00	-	-	-
6015	PROGRAMA SALUD MESOAMÉRICA 2015 - EL SALVADOR		688,475.00	13,800.00	4,083.87	29.6%
7141	Readecuación del Área Administrativa del Hospital Nacional de San Francisco Gotera, Morazán		149,690.00	-	-	-
7056	Mejoramiento del Laboratorio Clínico del Hospital Nacional de San Francisco Gotera, departamento de Morazán		104,680.00	-	-	-
7142	Readecuación y Ampliación del Área de Arsenal del Hospital Nacional de San Francisco Gotera, departamento de Morazán		79,790.00	-	-	-
7407	Suministro e Instalación de Estación de Trabajo Drager Babylog VN500, para cuidado neonatal, San Salvador		63,000.00	-	-	-
7408	Suministro e instalación de Equipo de Ultrasonido Mindray TE7-UCI sin impresor, para sala de operación, anestesia, cuidados críticos y emergencia con un transductor, San Salvador		28,000.00	-	-	-
7409	Suministro e instalación de Carro de Paro KY30301 BC:1402420, San Salvador		1,017.00	-	-	-
FGR		2	23,353,714.00	-	-	-
6093	Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República de El Salvador		22,443,750.00	-	-	-
6091	Actualización de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General de la República, a Nivel Nacional		909,964.00	-	-	-
DGCP - MJSP		13	22,471,938.24	1,973,151.39	630,738.36	32.0%
6920	Ampliación de Centro Penal de Izalco - Segunda Etapa, Departamento de Sonsonate		13,373,710.00	-	-	-
5896	Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos		3,883,670.00	-	-	-
6561	Programa de Fortalecimiento del Proceso de Rehabilitación y Reinserción Social - BID 2881/OC-ES		2,176,171.47	568,652.81	453,872.19	79.8%
6560	Fortalecimiento Institucional de la Dirección General de Centros Penales - BID 2881/OC-ES		747,070.00	114,381.81	83,356.81	72.9%
6609	Ampliación y equipamiento del Centro Penal La Esperanza, Ayutuxtepeque, San Salvador. Fase II		727,800.15	128,960.15	62,774.13	48.7%
6307	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro Penitenciario de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel		397,830.68	397,830.68	-	0.0%
6973	Mejoramiento y Equipamiento de Cuadras para Agentes de Seguridad en Centros Penitenciarios de El Salvador		367,546.19	367,546.19	-	0.0%
5903	Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco, Departamento de Sonsonate		253,710.00	-	-	-
6308	Conexión de Colector de Descarga de Aguas Negras en Centro Penal de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas		206,651.23	206,651.23	-	0.0%
6162	Fortalecimiento Institucional Préstamo BCIE 2102		162,050.00	13,400.00	11,000.00	82.1%
6309	Conexión de Colector de Descarga de Aguas Negras en Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, San Salvador		83,191.40	83,191.40	-	0.0%
7113	Ampliación del sistema de drenaje de aguas negras en el Centro Penitenciario de La Unión		49,024.40	49,024.40	19,735.23	40.3%
6941	Ampliación y equipamiento de clínica médica del Centro Penal de Ilopango, San Salvador		43,512.72	43,512.72	-	0.0%

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2020, EJECUCIÓN AL MES DE MARZO a/
(Montos en dólares)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO	No. DE PROG/PROY	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJCUC. FINANC.
MIVI		6	13,152,640.69	592,637.29	759,395.60	128.1%
5939	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMMS		5,836,249.64	511,875.24	690,391.65	134.9%
5397	RESCATE DE LA FUNCION HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE SAN SALVADOR MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA.		4,794,433.35	64,094.35	52,336.25	81.7%
6873	Construcción de Obras Complementarias del Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios, a Nivel Nacional		1,000,000.00	-	-	-
6612	Programa de Desarrollo Habitacional en el Caserio El Mozote y lugares aledaños, Departamento de Morazán		766,667.70	16,667.70	16,667.70	100.0%
6903	Programa de Mejoramiento de Viviendas para familias de escasos recursos, a nivel nacional		750,000.00	-	-	-
5398	"PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS URBANOS-KFW (MIAPU-KFW) Canje de Deuda entre la República de Alemania y la República de El Salvador"		5,290.00	-	-	-
MH		6	11,772,221.54	227,310.43	100,955.58	44.4%
7116	Programa de Mejora de la Gestión de los Tributos Internos - BID 3852/OC-ES		5,941,350.00	117,600.00	25,600.00	21.8%
4204	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TRIBUTARIA		1,825,000.00	-	-	-
7118	Programa de Mejora de la Gestión de Información y Fortalecimiento Estratégico del Viceministerio de Ingresos y sus Recursos Humanos - BID 3852/OC-ES		1,610,000.00	6,000.00	6,000.00	100.0%
7117	Programa de Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros - BID 3852/OC-ES		1,575,000.00	-	-	-
7119	Fortalecimiento Institucional - BID 3852/OC-ES		752,930.00	35,768.89	35,384.81	98.9%
6472	Mejoramiento de las instalaciones de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Tesorería, en Oficina Regional de Oriente del Ministerio de Hacienda, municipio y departamento de San Miguel		67,941.54	67,941.54	33,970.77	50.0%
CSJ		15	10,047,902.33	5,111,509.75	498,536.67	9.8%
4344	Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador		3,800,000.00	3,800,000.00	-	0.0%
6635	Construcción del Instituto de Medicina Legal, Región Occidental I, Departamento de Santa Ana		800,000.00	-	-	-
6946	Remodelaciones, ampliaciones y mejoras de la infraestructura institucional del Órgano Judicial a nivel nacional, año 2019		773,786.57	552,039.38	275,387.74	49.9%
7216	Construcción de Almacén Regional Occidental DACI, Archivo Judicial y de Notariado y otras Dependencias del Órgano Judicial, Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana		750,000.00	-	-	-
7144	Remodelaciones, ampliaciones y mejoras de la infraestructura institucional del Órgano Judicial a nivel nacional, año 2020		570,500.00	-	-	-
7237	Construcción de Centro de Desarrollo Formativo y Atención Social del personal del Órgano Judicial		500,000.00	-	-	-
6684	Construcción de Centro Judicial en el Municipio y Departamento de Ahuachapán		497,537.00	100,000.00	94,926.00	94.9%
6630	Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango		461,941.52	90,000.00	66,116.95	73.5%
6628	Construcción de Bodegas para Archivo Judicial, Regional Occidental, Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana		431,467.68	212,346.01	28,105.88	13.2%
6627	Construcción de Bodegas para Archivo Judicial, Regional Paracentral, Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente		400,000.00	128,500.00	-	0.0%
6685	Construcción de Centro Judicial en el Municipio y Departamento de San Miguel		395,000.00	-	-	-
6542	Construcción del Juzgado de Paz de Santo Tomás, San Salvador		238,484.24	149,579.20	34,000.10	22.7%
6629	Ampliación y Readequación de Centro Judicial, Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana		180,000.00	79,045.16	-	0.0%
4225	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR		150,000.00	-	-	-

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2020, EJECUCION AL MES DE MARZO a/
(Montos en dólares)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO	No. DE PROG/PROY	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJCUC. FINANC.
6631	Constucción del Centro Judicial en Materia Penal, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana		99,185.32	-	-	-
MITUR		1	9,050,000.00	3,835,026.97	1,052,059.47	27.4%
5833	Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero-Marina		9,050,000.00	3,835,026.97	1,052,059.47	27.4%
PNC - MJSP		6	8,310,558.89	-	242,205.90	-
5673	Reemplazo de la Flota Vehicular de la Policía Nacional Civil		3,988,299.87	-	242,205.90	-
5437	Fortalecimiento de las Dependencias de la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil		2,074,330.00	-	-	-
6547	Fortalecimiento del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil.		1,000,000.00	-	-	-
6915	Rehabilitación y Adecuación de la Delegación de la PNC, en La Unión		675,025.00	-	-	-
6886	Equipamiento Tecnológico de la División Central de Investigaciones de la PNC, en San Salvador		324,980.00	-	-	-
5670	Construcción y Equipamiento Básico de la Delegación de la PNC en La Paz		247,924.02	-	-	-
MINEC		1	5,912,495.00	1,521,101.57	1,181,745.03	77.7%
6613	Programa de Corredores Productivos - Componentes I, III y IV (BID 3170/OC-ES)		5,912,495.00	1,521,101.57	1,181,745.03	77.7%
MAG		7	5,539,132.18	626,877.98	1,698,161.65	270.9%
6400	Programa Nacional de Transformación Económica Rural para el Buen Vivir - Rural Adelante		3,236,800.00	127,505.00	1,228,925.00	963.8%
7302	Apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el Proceso de Admisibilidad de Productos Avícolas y de Productos que Contengan más del 2% de Carne de Aves, al Mercado de los Estados Unidos de América, Mediante la Equivalencia de Sistemas		781,981.72	84,748.40	-	0.0%
6473	Instalación de Módulos de Riego para el Incremento de la Producción en los Departamentos de San Miguel y La Unión, afectados por la Sequía		481,271.94	184,095.00	136,511.42	74.2%
5562	Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF)		427,701.57	107,191.42	266,880.57	249.0%
7062	Fomento de Sistema Tecnológico de Insumos Agroecológicos en Cultivos de Café, Aguacate, Repollo, Papa, Lechuga, Maíz y Frijol, en la Región Trifinio		400,000.00	57,493.50	-	0.0%
6739	Rehabilitación y Adecuación de Infraestructura para el Establecimiento del Centro de Desarrollo de Acuicultura en Santa Cruz Porcillo, Tecoluca, San Vicente		204,151.77	61,194.66	61,194.66	100.0%
6710	Fortalecimiento Institucional para apoyar a los subsectores café, acuícola y ganadero a través de los servicios de asistencia técnica y capacitación a usuarios del MAG, en El Salvador		7,225.18	4,650.00	4,650.00	100.0%
MIGOBDET		59	4,349,010.00	-	-	-
7347	Construcción y equipamiento del Centro Municipal de Convenciones del municipio de Ilobasco, Cabañas		700,000.00	-	-	-
7348	Programa de pequeñas y grandes Obras Públicas y Sociales para los departamentos de Santa Ana y San Salvador		600,000.00	-	-	-
7349	Mejoramiento del Mercado Municipal de Izalco, municipio de Izalco, Sonsonate		300,000.00	-	-	-
7350	Mejoramiento de Complejo Deportivo La Sierpe, Chalatenango		200,000.00	-	-	-
7351	Ampliación y mejora de Cancha de Fútbol en cantón El Portillo, municipio Ojos de Agua, Chalatenango		150,000.00	-	-	-
7352	Mejoramiento del Parque Municipal en zona urbana del municipio de San Jorge, San Miguel		150,000.00	-	-	-
7353	Mejoramiento de Polideportivo en Colonia Gerardo Barrios, municipio de Ciudad Barrios, San Miguel		150,000.00	-	-	-
7354	Mejoramiento de Complejo Deportivo de la Colonia San Carlos, municipio de Ilobasco, Cabañas		100,000.00	-	-	-
7355	Construcción de cancha deportiva en caserío Las Quebradas, municipio de Arambala, Morazán		100,000.00	-	-	-
7356	Construcción de cancha en caserío El Pinalito, municipio de Arambala, Morazán		100,000.00	-	-	-
7357	Construcción de cancha múltiple en municipio de Arambala, Morazán		100,000.00	-	-	-
7359	Mejoramiento del Edificio Municipal del municipio de San Pedro Perulapán, Cuscatlán		100,000.00	-	-	-

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2020, EJECUCION AL MES DE MARZO a/
(Montos en dólares)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO	No. DE PROG/PROY	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJCUC. FINANC.
7360	Mejoramiento de Cancha de Futbol en cantón San Isidro, municipio de Verapáz, San Vicente		93,810.00	-	-	-
7361	Mejoramiento del Parque Infantil del municipio y departamento de Usulután		65,000.00	-	-	-
7362	Ampliación y mejoramiento de Mercado Municipal de Zapotitán, Ciudad Arce, La Libertad		65,000.00	-	-	-
7363	Construcción de cancha de futbol rápido en municipio de Sacacoyo, La Libertad		63,000.00	-	-	-
7364	Construcción de Complejo Deportivo Jardines de San Bartolo en Ilopango, San Salvador		55,000.00	-	-	-
7365	Construcción de Complejo Deportivo en Colonia Altavista, Ilopango, Polígono A y B, San Salvador		55,000.00	-	-	-
7366	Construcción de cancha de fútbol rápido en municipio de Jicalapa, La Libertad		55,000.00	-	-	-
7367	Mejoramiento de Infraestructura del Complejo Educativo Católico Pío XII, municipio de Ilobasco, Cabañas		50,000.00	-	-	-
7368	Mejoramiento de infraestructura del Complejo Educativo Católico Santa Teresita, municipio de Sensuntepeque, Cabañas		50,000.00	-	-	-
7369	Construcción de cancha de futbol sala en colonia Miramar, municipio de San Pedro Puxtla, Ahuachapán		50,000.00	-	-	-
7370	Iluminación de cancha de futbol y basketball en colonia Rio Bajo, cantón San José Los Sitios, municipio de Talnique, La Libertad		50,000.00	-	-	-
7371	Mejoramiento de Guardería Infantil Santa Teresita, municipio de Cojutepeque, Cuscatlán		50,000.00	-	-	-
7372	Construcción de cancha de futbol de cantón El Carmen, municipio El Carmen, Cuscatlán		50,000.00	-	-	-
7373	Construcción de cancha de futbol rápido en comunidad Villa Tzu Chi, cantón Chanmico, municipio de San Juan Opico, La Libertad		42,000.00	-	-	-
7374	Techado de cancha de basketball del Centro Escolar San José de la Fuente, municipio y departamento de La Unión		40,000.00	-	-	-
7375	Techado de Cancha de Basketball de la Escuela Prof. Saúl Flores, cantón Güisquil, municipio de Conchagua, La Unión		40,000.00	-	-	-
7376	Construcción de Cancha de Fútbol Rápido en cantón El Portillo, municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión		40,000.00	-	-	-
7377	Construcción de malla perimetral y remodelación de cancha del Centro Escolar Caserio Las Mesas, cantón Ayuta, municipio y departamento de Santa Ana		40,000.00	-	-	-
7378	Instalación de techos y ventanas de Iglesia Católica Cristo Rey de Ciudad Real, municipio de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana		40,000.00	-	-	-
7379	Construcción de cancha de Fútbol Rápido en municipio de La Laguna, Chalatenango		40,000.00	-	-	-
7380	Construcción de salón de usos múltiples en zona de cancha de basketball, en colonia Montelimar, municipio de Olocuilta, La Paz		40,000.00	-	-	-
7381	Mejoramiento de cancha de caserio Huisilapa, cantón Obraje Nuevo, municipio de San Pablo Tacachico, La Libertad		35,000.00	-	-	-
7382	Construcción de Complejo Deportivo, cancha de fútbol y básquetbol de la Colonia Amatepec, municipio de Soyapango, San Salvador		31,000.00	-	-	-
7383	Construcción de cancha y área recreativa en colonia Modelo, municipio de Ilopango, San Salvador		30,000.00	-	-	-
7384	Mejoramiento de fachada de Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe (sustitución y montaje de vitrales) en colonia IVU, municipio y departamento de Santa Ana		30,000.00	-	-	-
7385	Mejoramiento de 2 parques de bolsillo (juegos para niños) en municipio y departamento de Sonsonate		27,000.00	-	-	-
7386	Remodelación de cancha y construcción de área recreativa en comunidad El Arenal, municipio de Ilopango, San Salvador		25,000.00	-	-	-
7387	Construcción de cancha de fútbol rápido en el municipio de San Antonio de La Cruz, Chalatenango		25,000.00	-	-	-
7388	Construcción de cancha de fútbol sala en municipio de San Juan Talpa, La Paz		25,000.00	-	-	-

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2020, EJECUCION AL MES DE MARZO a/
(Montos en dólares)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO	No. DE PROG/PROY	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJCUC. FINANC.
7389	Construcción de enmallado para cancha de fútbol en colonia Esperanza, cantón La Empalizada, municipio y departamento de Santa Ana		24,000.00	-	-	-
7390	Mejoramiento de 2 parques de bolsillo (juegos para niños) en municipio de Acajutla, Sonsonate		24,000.00	-	-	-
7391	Mejoramiento de parques de bolsillo (juegos para niños) en municipio de Juayúa, Sonsonate		24,000.00	-	-	-
7392	Mejoramiento de cancha de basketball en municipio y departamento de Sonsonate		22,000.00	-	-	-
7393	Mejoramiento de cancha de basketball, municipio de Acajutla, Sonsonate		22,000.00	-	-	-
7394	Construcción de Casa Comunal de colonia El Pedregal, municipio de Chalchuapa, Santa Ana		20,000.00	-	-	-
7395	Construcción de graderíos para la cancha de fútbol del caserío Guarnecia, municipio de Texistepeque, Santa Ana		20,000.00	-	-	-
7396	Mejoramiento de zona de juegos infantiles en Parque Municipal Tomás Saldaña, municipio de Acajutla, Sonsonate		16,000.00	-	-	-
7397	Construcción de enmallado de cancha de fútbol en colonia Vuelta Grande, cantón Planes de La Laguna, municipio y departamento de Santa Ana		15,869.00	-	-	-
7398	Construcción de letrinas en área urbana y cantón El Gramal, municipio San Antonio Los Ranchos, Chalatenango		15,000.00	-	-	-
7399	Mejoramiento de Parque San Isidro, municipio de Izalco, Sonsonate		15,000.00	-	-	-
7400	Mejoramiento de Casa Comunal de la comunidad El Manantial (sector de las cocinas), cantón Cutumay Camones, municipio y departamento de Santa Ana		12,778.00	-	-	-
7401	Construcción de cerca perimetral en cancha de fútbol del caserío Los Peñas, cantón Acachapa, municipio de Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate		12,500.00	-	-	-
7402	Construcción de cerca perimetral en cancha de fútbol del caserío La Florida, cantón Paso de Canoas, municipio de Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate		12,500.00	-	-	-
7403	Mejoramiento de zona de recreación de Pasaje 4 de la Colonia Sensunapán, municipio y departamento de Sonsonate		12,500.00	-	-	-
7404	Mejoramiento de Casa Comunal y reparación de cerca perimetral de cancha en colonia Sensunapán, municipio y departamento de Sonsonate		12,500.00	-	-	-
7405	Mejoramiento de cancha de fútbol de colonia Esperanza N°2 y equipamiento de guardería de la ONG Luz Esperanza, municipio de Zacatecoluca, La Paz		10,000.00	-	-	-
7406	Construcción de enmallado de cancha Multi-juegos de colonia Esperanza, cantón La Empalizada, municipio y departamento de Santa Ana		6,553.00	-	-	-
MICULTURA		5	2,210,409.72	407,538.19	-	0.0%
6845	Construcción de obras de protección y mejoramiento del Parque Arqueológico Joya de Cerén, municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad.		1,060,234.72	407,538.19	-	0.0%
7269	Programa de Mejoramiento y Equipamiento de Infraestructura Cultural y Arqueológica a Nivel Nacional		1,000,000.00	-	-	-
7334	Construcción de Casa de Cultura en San Cayetano Istepeque, San Vicente		70,175.00	-	-	-
7335	Mejoramiento de Iglesia Católica Parroquia Santa Catarina, municipio y departamento de Usulután		50,000.00	-	-	-
7336	Mejoramiento de instalaciones de la Asociación Rafael Garibay Gutiérrez (antes Sociedad de Empleados y Artesanos), departamento de Cabañas		30,000.00	-	-	-
MARN		3	1,900,000.00	-	-	-
7242	Fortalecimiento de la Dirección General del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, para la Prevención y Reducción de Riesgos a nivel nacional		945,805.00	-	-	-
7243	Fortalecimiento de las Capacidades del MARN para la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y Vida Silvestre		854,195.00	-	-	-

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2020, EJECUCION AL MES DE MARZO a/
(Montos en dólares)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO	No. DE PROG/PROY	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEUC. FINANC.
7346	Implementación de acciones para la reducción y/o eliminación de fuentes de contaminación que afectan la calidad del agua del Río Santa Rosa, en la Cuenca del Río Goascorán		100,000.00	-	-	-
MTYPS		2	1,301,982.61	153,983.85	161,765.24	105.1%
7206	Mejoramiento de infraestructura y equipamiento básico en Oficinas Centrales y Regionales del MTYPS, para atención de personas retornadas y grupos vulnerables		1,000,000.00	-	-	-
6338	REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, FASE V.		301,982.61	153,983.85	161,765.24	105.1%
PGR		1	1,000,000.00	3,044.22	-	0.0%
6698	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL		1,000,000.00	3,044.22	-	0.0%
INJUVE		1	248,031.34	248,031.34	248,031.32	100.0%
5770	Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias - FOCAP		248,031.34	248,031.34	248,031.32	100.0%
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS		16	270,574,996.40	85,306,142.04	37,856,570.92	44.4%
CEL		4	170,660,365.00	73,172,885.00	30,363,130.05	41.5%
3119	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL		149,730,320.00	68,061,330.00	30,363,130.05	44.6%
5821	Construcción de la Planta Fotovoltáica 15 de Septiembre		18,500,000.00	4,590,850.00	-	0.0%
5570	Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana.		2,254,760.00	514,475.00	-	0.0%
5801	Programa de eficiencia energética en instalaciones de CEL		175,285.00	6,230.00	-	0.0%
CEPA		8	54,961,790.79	8,929,940.89	7,387,135.49	82.7%
6487	Ampliación de Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.		26,301,228.11	7,269,378.21	6,260,998.09	86.1%
6996	Mejoramiento de Instalaciones en el Puerto de La Unión		10,000,000.00	-	-	-
7176	Construcción de la calle de rodaje Foxtrot en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		6,000,000.00	-	-	-
7177	Ampliación del área de registro de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		5,650,000.00	-	-	-
7182	Ampliación del Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla, Etapa II		3,000,000.00	-	-	-
6592	Rehabilitación de la Bodega No.1 del Puerto de Acajutla		2,000,000.00	-	-	-
6591	Modernización de la Infraestructura de Recepción y Despacho de Carga en la Zona del Acceso 1 y Bulevar Óscar Osorio del Puerto de Acajutla		1,660,562.68	1,660,562.68	1,126,137.40	67.8%
6872	Perforación y equipamiento de pozo No 5 en planta de tratamiento de agua potable del Aeropuerto Internacional de El Salvador		350,000.00	-	-	-
ANDA		4	44,952,840.61	3,203,316.15	106,305.38	3.3%
5817	REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR.		37,524,097.01	2,977,606.64	103,381.30	3.5%
6933	Programa de perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional. Primera Etapa		4,500,000.00	-	-	-
7136	Programa de construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del Sub Sector de agua potable y saneamiento. Fase I		2,309,330.00	219,367.17	-	0.0%
5584	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.		619,413.60	6,342.34	2,924.08	46.1%
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES		56	77,068,880.58	13,112,659.32	1,058,258.47	8.1%
FISDL		11	35,892,989.11	7,611,521.67	834,894.17	11.0%
4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL		22,760,078.88	3,222,302.82	327,263.33	10.2%
6453	Programa de mejoramiento de espacios seguros de convivencia para jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)		7,426,136.09	2,694,990.87	18,520.27	0.7%
6452	Programa de apoyo integral a la estrategia de prevención de la violencia en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador		2,871,077.14	996,955.98	181,838.57	18.2%

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2020, EJECUCION AL MES DE MARZO a/
(Montos en dólares)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO	No. DE PROG/PROY	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJCUC. FINANC.
6857	Apoyo a la Estrategia de Erradicación de la Pobreza en El Salvador (2017-2019)		2,366,992.00	307,272.00	307,272.00	100.0%
7337	Introducción y ampliación de energía eléctrica en varios caseríos y cantones del municipio de Chilanga, Morazán		150,000.00	150,000.00	-	0.0%
7338	Introducción de agua potable en cantón San Antonio Enmedio, municipio de Jujutla, Ahuachapán		100,000.00	100,000.00	-	0.0%
7339	Introducción de agua potable en caserío Los Marines Agua Zarca, cantón Metalío, municipio de Acajutla, Sonsonate		90,000.00	90,000.00	-	0.0%
4472	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV		78,705.00	-	-	-
7340	Perforación de pozo de agua potable, cantón El Zapotal, municipio de Yucuaiquín, La Unión		30,000.00	30,000.00	-	0.0%
7341	Mejoramiento de sistema de aguas lluvias en caserío Buenos Aires, municipio de Acajutla, Sonsonate		10,000.00	10,000.00	-	0.0%
7342	Iluminación de calle a caserío Santa Irene, cantón Penitente Abajo, municipio de Zacatecoluca, La Paz		10,000.00	10,000.00	-	0.0%
ISSS		7	22,562,000.00	-	-	-
4491	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL POLICLÍNICO DE SANTA TECLA		10,000,000.00	-	-	-
7218	Adecuación de infraestructura y equipamiento para Centro de Cuidados Paliativos y Enfermedades Crónicas Complejas y Avanzadas del ISSS, San Salvador		6,300,000.00	-	-	-
6754	Construcción y equipamiento de edificio de estacionamientos en el Hospital General del ISSS, San Salvador		2,490,000.00	-	-	-
6550	Rehabilitación de Infraestructura de Oficinas Administrativas de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del ISSS, San Salvador		1,608,000.00	-	-	-
5363	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL POLICLINICO PLANES DE RENDERO, SAN SALVADOR		1,000,000.00	-	-	-
6974	Ampliación y mejoramiento del Almacén del ISSS para la Zona Oriental, departamento de Usulután		814,000.00	-	-	-
4198	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ANA.		350,000.00	-	-	-
CORSATUR		3	3,567,848.40	1,361,355.80	13,806.44	1.0%
7229	Mejoramiento de la infraestructura física del Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, departamento de La Libertad		1,820,492.60	414,000.00	8,634.61	2.1%
6502	Reparación y Mejoramiento de las Instalaciones del Hotel de Montaña Cerro Verde, Cantón Las Lomas, Municipio de El Congo, Departamento de Santa Ana		1,547,355.80	947,355.80	5,171.83	0.5%
7228	Instalación de sistema automatizado de cobro en estacionamientos del Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, departamento de La Libertad		200,000.00	-	-	-
INDES		11	2,520,511.31	245,511.31	61,523.77	25.1%
7231	Mejoramiento de Piscinas Olímpica, Clavados y Calentamiento del Complejo Acuático El Polvorín y Remodelación del Gimnasio de Bádminton, departamento de San Salvador		1,500,000.00	-	-	-
7232	Remodelación de Velódromo y Pista de Patinaje en Complejo Deportivo El Polvorín, departamento de San Salvador		500,000.00	-	-	-
7343	Mejoramiento del Estadio de Béisbol Saturnino Bengoa, municipio y departamento de San Salvador		200,000.00	-	-	-
7344	Construcción de Estadio Municipal de Santo Domingo, San Vicente		75,000.00	-	-	-
7273	Mejoramiento de Cancha de Baseball de la Colonia Zacamil, municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador		49,651.39	49,651.39	-	0.0%
7270	Mejoramiento de Canchas y Oficinas Administrativas del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, San Salvador		48,228.28	48,228.28	17,473.56	36.2%
7272	Mejoramiento y equipamiento de Hotel en Polideportivo de Ciudad Merliot, departamento de La Libertad		47,521.35	47,521.35	19,139.80	40.3%
7271	Mejoramiento del sistema eléctrico, cableado de red y habilitación de espacios para Oficinas de Administración en el Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, San Salvador		46,012.19	46,012.19	8,977.74	19.5%
7285	Mejoramiento de Graderíos Sector Oriente, Clínica y Bodegas de la Federación Salvadoreña de Atletismo en Estadio Jorge Mágico González, San Salvador		20,669.11	20,669.11	8,273.85	40.0%

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2020, EJECUCIÓN AL MES DE MARZO a/
(Montos en dólares)**

CODIGO	INSTITUCIÓN / NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO	No. DE PROG/PROY	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJCUC. FINAN.
6972	REMEDIACIÓN DE PISCINA Y ÁREA DE VESTIDORES EN COMPLEJO DEPORTIVO EX FINCA MODELO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		17,182.16	17,182.16	1,209.36	7.0%
6999	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE SQUASH PARA JUEGO INDIVIDUAL EN POLIDEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT, LA LIBERTAD		16,246.83	16,246.83	6,449.46	39.7%
INSAFORP		2	2,518,320.00	-	-	-
6681	Readecuación de instalaciones del Centro de Formación Profesional del INSAFORP en San Bartolo, Ilopango, S.S., para el establecimiento y equipamiento del Centro de Excelencia en Tecnologías de Autotónica (CETA)		2,244,160.00	-	-	-
6854	Suministro e Instalación de sistema de paneles solares en el techo del Edificio de Estacionamiento y Oficinas Administrativas de INSAFORP, Santa Elena, municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad		274,160.00	-	-	-
ISTU		5	2,493,647.08	985,500.00	67,889.38	6.9%
6280	Mejoramiento y acondicionamiento del Centro Recreativo Puerta del Diablo, Cantón Planes de Renderos, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador		1,230,395.66	560,000.00	-	0.0%
7345	Construcción de Centro Recreativo en Laguna de Apastepeque, San Vicente		500,000.00	100,000.00	-	0.0%
7226	Construcción de Obras de Protección en zonas susceptibles de la cuenca del río Amayo en el Parque Walter Thilo Deininger, municipio y departamento de La Libertad		390,000.00	175,500.00	-	0.0%
7183	Mejoramiento de la Infraestructura en Centros Recreativos del ISTU a Nivel Nacional, 2019		263,251.42	150,000.00	67,889.38	45.3%
7151	Mejoramiento de la Infraestructura en Centros Recreativos del ISTU a Nivel Nacional, 2020		110,000.00	-	-	-
ISBM		4	2,082,000.00	-	-	-
6674	Construcción y equipamiento de Policlínico Magisterial de La Unión, municipio y departamento de La Unión		900,000.00	-	-	-
6673	Construcción y equipamiento de Consultorio Magisterial de Santa Elena, departamento de Usulután		500,000.00	-	-	-
7137	Mejoramiento y equipamiento de edificio para Bodega de Medicamentos y oficinas varias del ISBM, departamento de San Salvador		470,000.00	-	-	-
7138	Mejoramiento de áreas para servicios médicos y complementarias en Policlínico Magisterial de Santa Tecla, departamento de La Libertad		212,000.00	-	-	-
CNR		3	2,050,000.00	1,025,000.00	-	0.0%
7235	Construcción y equipamiento del Centro de Datos Alternativo para resguardo de información del CNR en el municipio y departamento de Santa Ana		1,600,000.00	800,000.00	-	0.0%
6562	Suministro e instalación de Sistema Generador de Energía Fotovoltaica para las oficinas del Centro Nacional de Registros, Etapa I.		400,000.00	200,000.00	-	0.0%
7236	Mejoramiento y equipamiento de instalaciones para el Centro de Contacto del CNR, municipio y departamento de San Salvador		50,000.00	25,000.00	-	0.0%
UES		1	1,560,000.00	1,560,000.00	-	0.0%
6813	Construcción y equipamiento de la Biblioteca y Auditorio de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador		1,560,000.00	1,560,000.00	-	0.0%
ISRI		3	781,497.72	103,578.18	44,208.79	42.7%
6695	Mejoramiento de infraestructura en áreas física, técnica y administrativa, del Centro de Rehabilitación de Oriente del ISRI, San Miguel		279,472.72	103,578.18	44,208.79	42.7%
4763	Construcción y remodelación de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Occidente, Santa Ana		260,000.00	-	-	-
6693	Mejoramiento de infraestructura en áreas administrativa y de capacitación técnico-educativa, del Centro de Rehabilitación Profesional del ISRI, San Salvador		242,025.00	-	-	-
ANSP - MJSP		2	729,169.40	8,700.00	3,700.00	42.5%
7147	Renovación de flota vehicular de la ANSP, sede San Luis Talpa, departamento de La Paz		500,000.00	-	-	-

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2020, EJECUCION AL MES DE MARZO a/
(Montos en dólares)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO	No. DE PROG/PROY	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJCUC. FINANC.
6952	Mejoramiento de la Red de Agua potable y Aguas negras, e Instalación de Paneles Fotovoltaicos en la ANSP Sede Comalapa, San Luis Talpa, Dpto. de La Paz		229,169.40	8,700.00	3,700.00	42.5%
ISDEMU		2	205,897.56	106,492.36	32,235.92	30.3%
6517	Readecuación de Centro de Datos de la Oficina Central del ISDEMU, San Salvador		130,897.56	106,492.36	32,235.92	30.3%
6741	Fortalecimiento de la estrategia de formación para la igualdad sustantiva del ISDEMU, a nivel nacional		75,000.00	-	-	-
ISNA		2	105,000.00	105,000.00	-	0.0%
7204	Reconstrucción de tramo de muro tapial en sector norte y sur; mejoramiento del Sistema de Descarga de Aguas Negras y Aguas Lluvias en Centro para la Inserción Social de Ilobasco, departamento Cabañas		75,000.00	75,000.00	-	0.0%
7203	Reconstrucción de tramo de muro en sector norponiente y mejoramiento de sistema de descarga de aguas lluvias en Centro de Acogimiento CISNA, municipio de San Martin, San Salvador		30,000.00	30,000.00	-	0.0%
OTRAS		45	273,336,264.98	76,314,810.28	41,936,446.35	55.0%
FOMILENIO		19	135,245,207.66	49,275,744.33	26,653,178.15	54.1%
40761	Proyecto de Capital Humano - Actividad Secundaria para la Ejecución del Modelo Inclusivo de Tiempo Completo - FASE DE EJECUCION		28,272,170.00	9,424,056.67	7,015,644.75	74.4%
40778	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria Construcción de Expansión de Carretera del Litoral.		27,061,720.00	9,020,573.33	5,373,871.47	59.6%
40782	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria de Construcción de Infraestructura en el Cruce Fronterizo.		16,230,555.00	5,410,185.00	3,156,182.34	58.3%
50097	Proyecto de Clima de Inversión - Contrapartida de Clima de Inversión		13,349,205.61	6,528,625.61	3,958,953.06	60.6%
40759	Proyecto de Clima de Inversión - Actividad Secundaria de Apuesta Por InversionES - FASE DE EJECUCION		11,691,590.00	3,897,196.67	1,402,027.70	36.0%
40762	Proyecto de Capital Humano -Actividad Secundaria de Gobernanza Del Sistema Integrado FCTP - FASE DE EJECUCION.		7,469,795.00	2,489,931.67	119,755.69	4.8%
40760	Proyecto de Capital Humano - Actividad Secundaria para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación - FASE DE EJECUCION		7,030,540.00	2,343,513.33	531,674.04	22.7%
50096	Proyecto de Administración del Programa - Contrapartida para pago de impuestos del Programa		5,949,379.61	2,516,569.61	3,339,331.02	132.7%
50099	Proyecto de Capital Humano - Contrapartida de Capital Humano		4,219,964.74	2,565,274.74	569,604.34	22.2%
50098	Proyecto De Infraestructura Logística - Contrapartida De Infraestructura Logística		3,292,032.32	921,302.32	61,839.45	6.7%
40758	Proyecto de Clima de Inversión - Actividad Secundaria de los Asocios Públicos-Privados- FASE DE EJECUCION		2,679,095.00	893,031.67	104,978.93	11.8%
40779	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria Supervisión de la Construcción de Expansión de la Carretera del Litoral		2,368,895.00	789,631.67	331,645.46	42.0%
40757	Proyecto de Clima de Inversión - Actividad Secundaria de Mejora Regulatoria-FASE DE EJECUCION		1,833,935.00	611,311.67	69,444.25	11.4%
40783	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria de Supervisión de Infraestructura en el Cruce Fronterizo.		1,223,775.00	407,925.00	192,979.10	47.3%
40785	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria de Apoyo a la Implementación del proyecto Infraestructura en el Cruce Fronterizo.		1,079,305.00	359,768.33	173,919.94	48.3%
50095	Proyecto de Administración del Programa - Contrapartida de Administración del Programa		898,645.38	898,645.38	236,469.08	26.3%
40781	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria Apoyo a la Implementación del proyecto Expansión de la Carretera del Litoral		380,890.00	126,963.33	10,566.00	8.3%
40780	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria Plan de Acción de Reasentamientos de Expansión de la Carretera del Litoral.		198,540.00	66,180.00	4,291.53	6.5%
40784	Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria de Plan de Acción de Reasentamientos del proyecto Infraestructura en el Cruce Fronterizo.		15,175.00	5,058.33	-	0.0%

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2020, EJECUCION AL MES DE MARZO a/
(Montos en dólares)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO	No. DE PROG/PROY	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJCUC. FINANC.
FOVIAL		8	134,442,230.00	23,630,998.83	15,195,176.14	64.3%
6691	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS PAVIMENTADAS A NIVEL NACIONAL 2020 - COMPONENTE DE INVERSIÓN		50,451,075.00	4,870,733.16	4,328,699.09	88.9%
6692	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO 2020		45,276,605.00	1,518,495.00	19,839.65	1.3%
6350	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO AÑO 2019		19,443,030.00	9,167,390.67	7,526,725.07	82.1%
6687	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO 2020		6,468,085.00	-	-	-
6352	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2019		5,418,570.00	3,462,930.00	912,089.54	26.3%
6688	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 2020		2,587,235.00	200,000.00	-	0.0%
6690	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS PAVIMENTADAS A NIVEL NACIONAL 2019 - COMPONENTE DE INVERSIÓN		2,414,110.00	2,414,110.00	1,374,726.09	56.9%
6351	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2019		2,383,520.00	1,997,340.00	1,033,096.70	51.7%
FSV		2	2,220,000.00	2,220,000.00	-	0.0%
7245	Construcción de Oficinas de Atención al Público y Fachada del FSV, municipio y departamento de San Salvador		1,670,000.00	1,670,000.00	-	0.0%
7244	Ampliación de Bodegas y Oficina de mantenimiento del FSV, municipio y departamento de San Salvador		550,000.00	550,000.00	-	0.0%
CEFAFA		1	1,062,270.00	1,062,270.00	-	0.0%
7069	Construcción y equipamiento de Planta de Producción Farmacéutica del CEFAFA, municipio y departamento de San Salvador		1,062,270.00	1,062,270.00	-	0.0%
FONAVIPO		7	288,923.13	94,798.93	62,093.86	65.5%
5085	CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		268,922.13	80,962.93	61,698.27	76.2%
5371	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de San Vicente		14,000.00	9,000.00	-	0.0%
5503	CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		2,626.00	1,751.00	271.76	15.5%
5372	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Villas de San Pedro, Municipio de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz		1,500.00	1,500.00	85.65	5.7%
5192	CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION PROCAVIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		1,400.00	1,400.00	-	0.0%
5245	CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.		400.00	110.00	38.18	34.7%
5370	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Nuevo Verapaz, Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente		75.00	75.00	-	0.0%
FONAES		8	77,634.19	30,998.19	25,998.20	83.9%
7247	Restauración de bosque y fortalecimiento de capacidades para la conservación de Zonas Críticas del Parque Walter Thilo Deininger, municipio Puerto de La Libertad, departamento de La Libertad		30,000.00	-	-	-
7127	Restauración ambiental y mejoramiento de la gestión ambiental en Sistemas Rurales de Administración de Agua Potable en territorios priorizados en La Paz, Usulután y La Unión		17,999.49	12,999.99	8,000.00	61.5%
7121	Conservación y Sostenibilidad del Área Natural Manglar El Amatal en el Cantón San Diego, municipio y departamento de La Libertad		17,998.20	17,998.20	17,998.20	100.0%
6948	Plan de Restauración Ambiental en la Cuenca del Río Jiboa, departamento de La Paz		5,198.00	-	-	-
7128	Restauración ambiental en colonia Casa Blanca, municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana		3,166.50	-	-	-
7131	Restauración ambiental en los márgenes del río Chiquihuat, municipio de San Julián, departamento de Sonsonate		2,064.00	-	-	-

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2020, EJECUCION AL MES DE MARZO a/
(Montos en dólares)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO	No. DE PROG/PROY	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJCUC. FINANC.
7130	Restauración ambiental en los márgenes del Río Amolunca, municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán		728.00	-	-	-
7129	Restauración ambiental en la Reserva de la Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, cantón Las Lagunetas, municipio de Citalá, departamento de Chalatenango		480.00	-	-	-
SUBTOTAL		370	984,488,644.71	223,590,328.89	106,594,208.50	47.7%
FODES		1	396,474,845.93	99,118,711.56	99,118,711.56	100.0%
7094	Inversión Municipal a través del FODES 2020		396,474,845.93	99,118,711.56	99,118,711.56	100.0%
TOTAL GENERAL		371	1,380,963,490.64	322,709,040.45	205,712,920.06	63.7%

a/ Información registrada por las Ejecutoras en los Sistemas SAFI y SIIP, reporte generado el 20 de abril de 2020.
