



MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General de
Inversión y Crédito Público

PROGRAMA ANUAL DE **INVERSIÓN** **PÚBLICA 2022**

Informe de Ejecución
al mes de mayo

Junio 2022


INTRODUCCIÓN

El Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2022, vigente al mes de mayo asciende a \$2,134.09 millones y está conformado por 332 proyectos, correspondientes a 45 Entidades Ejecutoras pertenecientes al Gobierno Central, Empresas Públicas No Financieras, Instituciones Descentralizadas No Empresariales, y Otras; según detalle anexo de dicho Programa, las cuales al mes que se reporta, ejecutaron un total de \$168.73 millones, del monto programado de \$470.72 millones para el periodo enero – mayo.

I. Composición del Programa

El PAIP 2022 al mes de mayo por valor de \$2,134.09 millones, que representa el 7.0% del PIB¹, contempla asignaciones del año 2022 provenientes de diferentes presupuestos, y provisiones financieras 2021, como se detalla en el Gráfico No. 1; y en comparación con el mes de abril, dicho PAIP tiene un incremento de \$57.12 millones, correspondientes a modificativas presupuestarias aprobadas hasta la fecha de generación de los reportes para este Informe con registros SAFI/SIIP, así como provisiones financieras aprobadas y que no habían sido registradas por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT).

Gráfico No.1
Composición del PAIP 2022 al mes de mayo

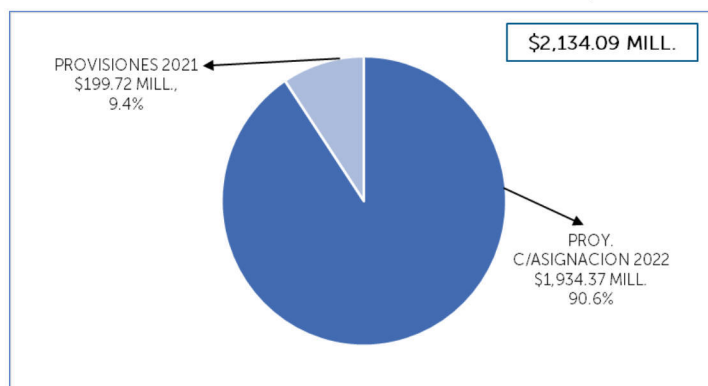

II. Ejecución de los recursos del PAIP 2022 al mes de mayo

El Cuadro No. 1 y Gráfico No. 2 muestran los montos del PAIP programados para el año 2022, la inversión programada y ejecutada al mes de mayo, con aplicación a las asignaciones vigentes provenientes de diferentes presupuestos y de las provisiones financieras 2021; así como los montos comprometidos y no comprometidos al mes que se informa.


Cuadro No.1
PAIP 2022 por Presupuesto al mes de mayo
(En millones US\$)

PRESUPUESTO	PROGRAMADO VIGENTE ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE MAYO	EJECUTADO AL MES DE MAYO	% DE AVANCE	COMPROMETIDO			% DE LO COMPROMETIDO RESPECTO A LO PROGRAMADO	NO COMPROMETIDO		
					TOTAL	EJECUTADO AL MES DE MAYO	PENDIENTE DE EJECUTAR		TOTAL	EN PROCESOS ADMINIST.	SIN INICIAR PROCESOS ADMINIST.
	1	2	3	4=(3/2)	5	6	7=5-6	8=5/1	9	10	11=9-10
PROYECTOS C/ASIGNACION 2022	1,934.37	354.05	81.71	23.1	383.37	81.71	301.66	19.8	1,551.00	655.44	895.56
PROVISIONES FINANCIERAS 2021*	199.72	116.67	87.02	74.6	199.72	87.02	112.70	100.0	-	-	-
TOTAL	2,134.09	470.72	168.73	35.8	583.09	168.73	414.36	27.3	1,551.00	655.44	895.56

* Corresponde a recursos comprometidos en el ejercicio fiscal 2021, que financieramente se ejecutarán en el año 2022.

¹PIB: US\$30,429.8 millones.

Gráfico No.2
Situación de los Recursos del PAIP 2022 al mes de mayo
(En millones de US\$)

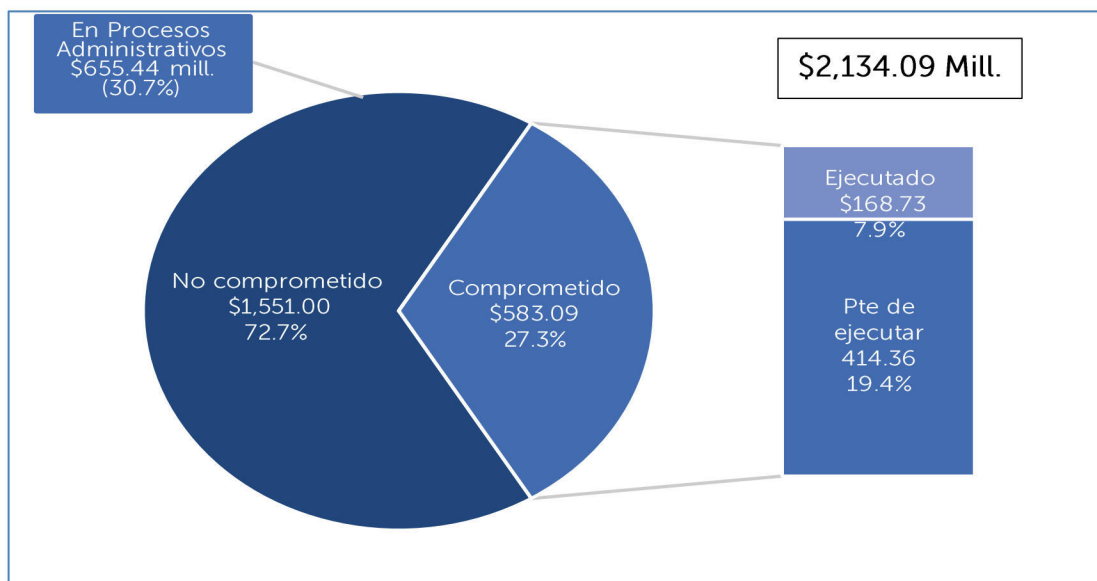

En relación a los recursos no comprometidos, en los Cuadros Nos. 2 y 3, se presentan los datos correspondientes de éstos asociados a proyectos que al mes de mayo se encontraban en diferentes fases del proceso administrativo, por valor de \$655.44 millones, y el detalle por Entidad con sus respectivos montos.

Cuadro No.2
Recursos del PAIP 2022 en Procesos Administrativos al
mes de mayo
En millones de US\$

PROCESO ADMINISTRATIVO	MONTO	%
Elaboración de Términos de Referencia	323.61	49.2%
Elaboración Bases de Licitación	78.06	11.9%
Evaluación de Ofertas	79.20	12.1%
Publicación	74.86	11.4%
Adjudicación	18.83	3.1%
Elaboración de Ofertas	2.42	0.4%
Proceso de Contratación	71.65	10.9%
Apertura de Ofertas	0.20	0.0%
Declaratoria de Desierto	6.61	1.0%
TOTAL	655.44	100.0%


Cuadro No.3
Recursos del PAIP 2022 en Procesos Administrativos por
institución al mes de mayo
En millones de US\$

INSTITUCION	PROCESO ADMINISTRATIVO	MONTO	TOTAL
ANDA	Elaboración Bases de Licitación	0.48	0.48
ANSP - MJSP	Elaboración de Términos de Referencia	1.09	1.53
	Elaboración Bases de Licitación	0.44	
CEPA	Elaboración de Términos de Referencia	15.35	15.35
CONNA	Elaboración Bases de Licitación	0.40	0.43
	Evaluación de Ofertas	0.03	
DGCP-MJSP	Elaboración de Términos de Referencia	19.90	19.90
FOVIAL	Elaboración de Términos de Referencia	28.85	181.26
	Elaboración Bases de Licitación	14.89	
	Publicación	57.13	
	Evaluación de Ofertas	62.32	
	Proceso de Contratación	18.07	
ISBM	Elaboración de Términos de Referencia	0.90	1.61
	Elaboración Bases de Licitación	0.71	
ISSS	Elaboración Bases de Licitación	4.72	5.15
	Apertura de Ofertas	0.19	
	Adjudicación	0.24	
MAG	Elaboración de Términos de Referencia	0.27	1.72
	Elaboración Bases de Licitación	0.92	
	Publicación	0.09	
	Elaboración de Ofertas	0.16	
	Evaluación de Ofertas	0.12	
	Adjudicación	0.16	
MARN	Elaboración de Términos de Referencia	0.51	0.89
	Publicación	0.13	
	Apertura de Ofertas	0.01	
	Adjudicación	0.15	
	Proceso de Contratación	0.09	
MINEC	Elaboración de Términos de Referencia	0.19	0.43
	Evaluación de Ofertas	0.13	
	Proceso de Contratación	0.11	
MINEDUCYT	Elaboración de Términos de Referencia	243.81	277.44
	Elaboración Bases de Licitación	8.94	
	Publicación	4.06	
	Evaluación de Ofertas	1.49	
	Adjudicación	4.97	
	Declaratoria de Desierto	0.25	
	Proceso de Contratación	13.92	
MINSAL	Elaboración de Términos de Referencia	9.48	63.87
	Elaboración Bases de Licitación	14.55	
	Publicación	11.07	
	Evaluación de Ofertas	14.95	
	Adjudicación	13.06	
	Declaratoria de Desierto	0.71	
	Proceso de Contratación	0.05	
MIVI	Elaboración de Términos de Referencia	0.10	2.25
	Publicación	1.89	
	Adjudicación	0.26	
MOPT	Elaboración de Términos de Referencia	2.00	41.47
	Elaboración Bases de Licitación	2.00	
	Elaboración de Ofertas	2.26	
	Evaluación de Ofertas	0.17	
	Declaratoria de Desierto	5.65	
	Proceso de Contratación	29.39	
PNC-MJSP	Elaboración de Términos de Referencia	1.16	41.66
	Elaboración Bases de Licitación	30.00	
	Publicación	0.50	
	Proceso de Contratación	10.00	
TOTAL			655.44

III. Comparativo Inversión Programada/Ejecutada al mes de mayo 2017-2022

En el Gráfico No.3 se presenta un comparativo de los montos programados y ejecutados al mes de mayo de los años 2017 al 2022; así como los montos del PAIP total de cada año y el porcentaje con respecto al PIB.


Gráfico No.3
Inversión Programada/Ejecutada, al mes de mayo 2017 – 2022

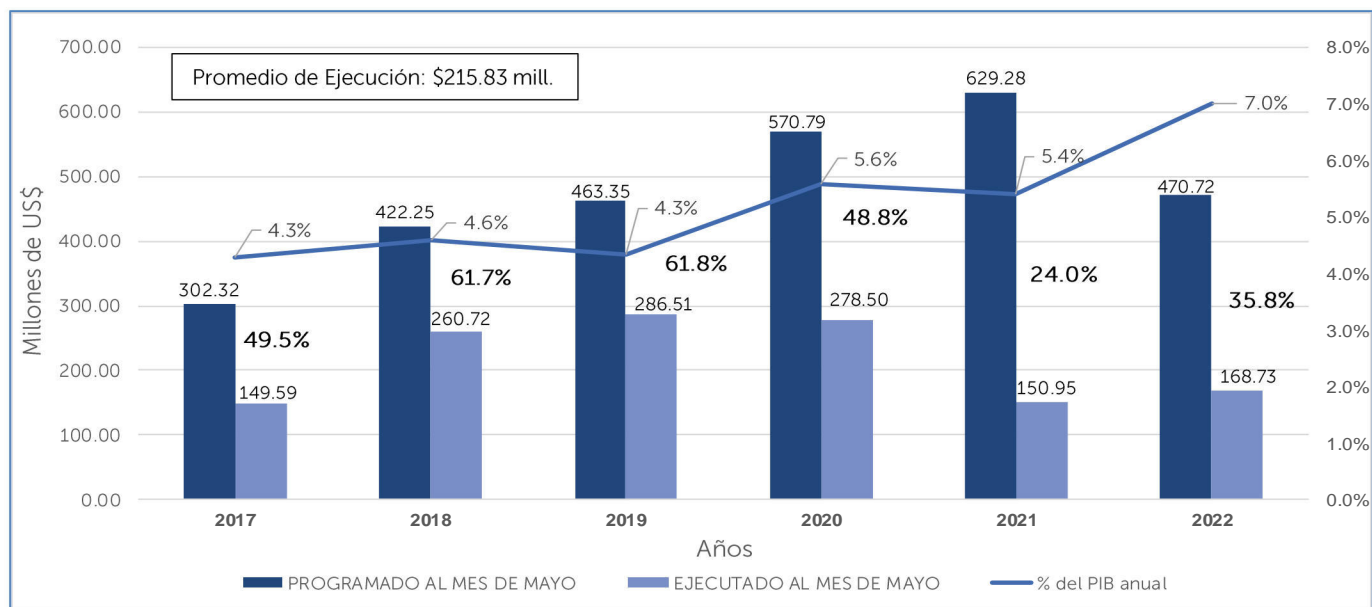

IV. Ejecución del PAIP 2022 al mes de mayo, por Fuente de Financiamiento

El Gráfico No. 4 muestra la conformación del PAIP 2022 por fuente de financiamiento interna y externa, así como su avance al mes de mayo; y el Cuadro No. 4 contiene el detalle de la distribución de dicho Programa por cada una de las fuentes de financiamiento, con su correspondiente programación y ejecución al período que se informa.

Gráfico No.4
PAIP 2022 por Fuente de Financiamiento al mes de mayo
(En millones US\$)

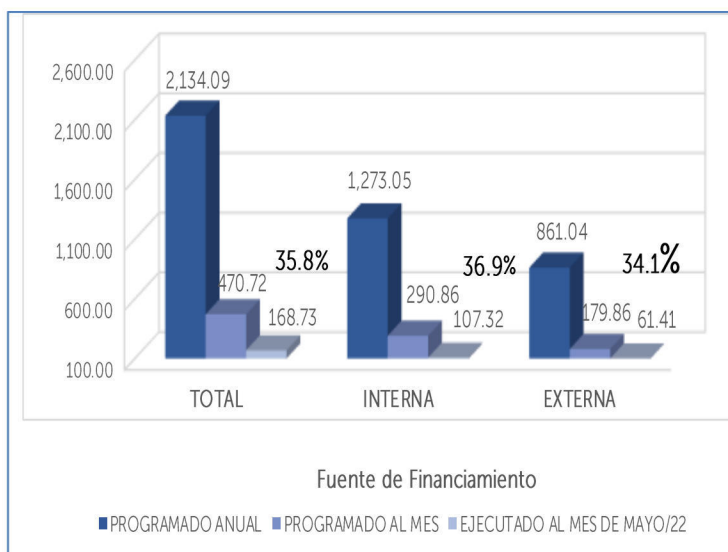

Cuadro No.4
PAIP 2022 por Fuente de Financiamiento al mes de mayo
(En millones US\$)


FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES DE MAYO	% DE EJECUCION
	1	2	3	4=3/2
FONDO GENERAL	954.41	205.21	69.14	33.7
RECURSOS PROPIOS	197.69	81.54	35.88	44.0
PREST. INTERNOS	111.14	2.00	0.90	45.0
OTROS*	9.81	2.11	1.40	66.4
TOTAL INTERNO	1,273.05	290.86	107.32	36.9
PREST. EXTERNOS	815.08	152.70	53.91	35.3
DONACIONES	45.96	27.16	7.50	27.6
TOTAL EXTERNO	861.04	179.86	61.41	34.1
TOTAL GENERAL	2,134.09	470.72	168.73	35.8

*Otros: Incluye FANTEL, FINET, Fondos de Compensación (FCA), y Fondos de Sentencia Judicial por daños ambientales (FSJDA)

V. Avance del PAIP 2022, por Estructura del Sector Público, al mes de mayo

El Gráfico No.5 muestra el PAIP 2022 por Estructura del Sector Público, detallándose además de lo programado al año, el monto programado y ejecutado al mes de mayo, para el conjunto de instituciones del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas No Empresariales, Empresas Públicas y Otro grupo de Entidades.


Gráfico No.5
PAIP 2022 por Estructura del Sector Público al mes de mayo
(En millones US\$)

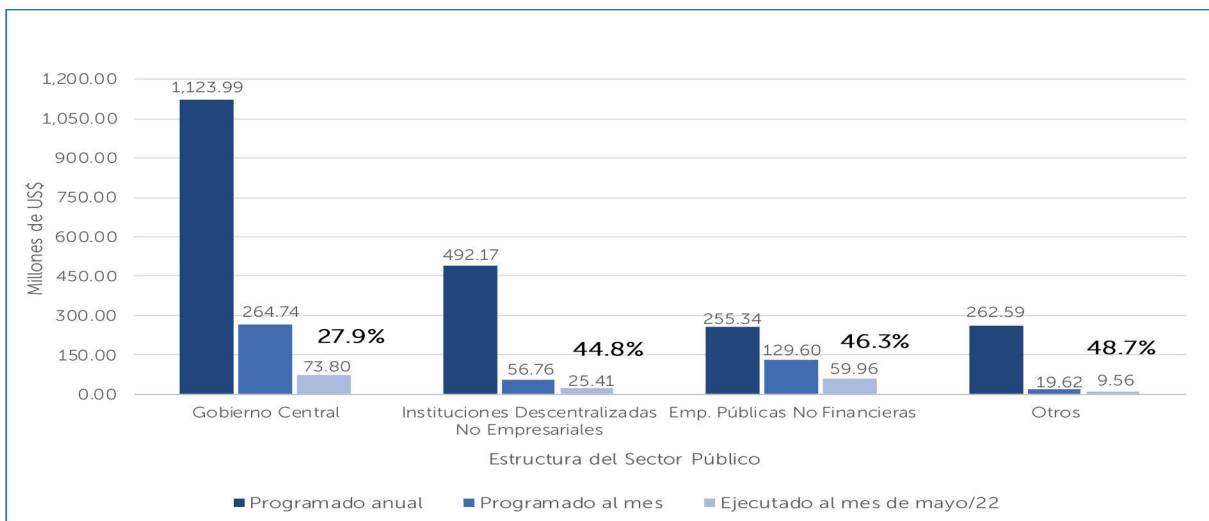

VI. PAIP 2022 al mes de mayo, por Sector de Actividad

El PAIP 2022 contiene proyectos vinculados a los Sectores Social, Económico y de Seguridad y Justicia, mostrándose en el Gráfico No. 6, los montos que corresponden a cada uno de ellos; así como lo programado y ejecutado al mes de mayo; encontrándose en el Sector Social, entre otros programas de apoyo a la modernización del Sistema Educativo, y de salud, cuyo propósito es garantizar una mejor cobertura de servicios, permitiendo el acceso a la población vulnerable; en el caso del Sector Económico se tienen proyectos relacionados con la infraestructura vial, que permitirán mejorar la interconexión de movilidad del país, de desarrollo portuario, de generación de energía y de fomento a la producción agrícola; y en el Sector Seguridad y Justicia están incluidos proyectos vinculados al Plan Control Territorial, y de construcción y equipamiento de oficinas centrales de la FGR.

Gráfico No.6
PAIP 2022 por Sector de Actividad al mes de mayo
(En millones US\$)

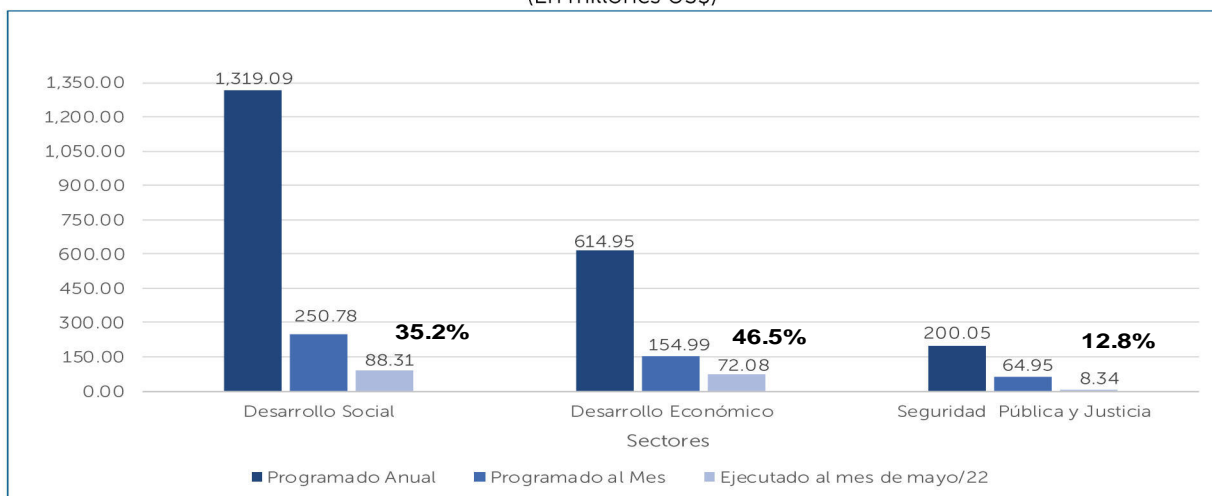

El Cuadro No. 5 contiene el detalle de los Subsectores que conforman cada uno de los Sectores de Actividad antes relacionados, con sus respectivos montos programados al año y al mes de mayo, así como su ejecución a dicho mes.

Cuadro No.5
Programación/Ejecución Financiera del PAIP 2022 al mes de mayo
(Millones de US\$)

SECTOR/SUBSECTOR	MONTO ANUAL PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO AL MES DE MAYO	MONTO EJECUTADO AL MES DE MAYO	%
DESARROLLO SOCIAL	1,319.09	250.78	88.31	35.2
Educación y Cultura	525.89	93.71	7.65	8.2
Desarrollo Urbano y Comunal	349.48	29.71	27.16	91.4
Salud	206.22	51.00	23.34	45.8
Deporte y Recreación	99.08	23.93	0.19	0.8
Agua Potable y Alcantarillado	50.45	34.70	19.96	57.5
Multisectorial	42.06	5.82	3.66	62.9
Asistencia social	22.43	5.88	2.80	47.6
Medio Ambiente	12.13	2.91	1.30	44.7
Vivienda	10.57	2.92	2.12	72.6
Previsión Social	0.78	0.20	0.13	65.0
DESARROLLO ECONOMICO	614.95	154.99	72.08	46.5
Transporte y Almacenaje	435.87	66.64	31.22	46.8
Energía	160.34	82.12	36.32	44.2
Industria, Comercio y Turismo	9.80	3.53	1.85	52.4
Silvoagropecuario	7.69	2.70	2.69	+100.0
Comunicación	1.25	-	-	-
SEGURIDAD Y JUSTICIA	200.05	64.95	8.34	12.8
Seguridad	115.42	21.92	5.35	24.4
Justicia	84.63	43.03	2.99	6.9
TOTAL	2,134.09	470.72	168.73	35.8

VII. Avance de la Inversión Ejecutada por Institución, al mes de mayo 2022

A continuación, en el Cuadro No.6 se detalla el Avance del PAIP 2022 al mes de mayo por institución/entidad ejecutora, distribuidas por Estructura del Sector Público.

Cuadro No.6
Programación/Ejecución Financiera del PAIP 2022, al mes de mayo por Institución Ejecutora
(Millones de dólares)

INSTITUCIONES / ENTIDADES	No. de Programas/ Proyectos	PROGRAMA VIGENTE ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE MAYO	EJECUTADO AL MES DE MAYO	COMPROMETIDO			PENDIENTE DE COMPROMETER		
		1	2	3	TOTAL	EJECUTADO AL MES DE MAYO	PENDIENTE DE EJECUTAR	TOTAL	EN PROCESOS ADMINIST.	SIN INICIAR PROCESOS ADMINIST.
		1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8
GOBIERNO CENTRAL	204	1,123.99	264.76	73.80	340.53	73.80	266.73	783.45	449.60	333.85
MINEDUCYT	17	455.41	89.99	7.20	156.54	7.20	149.34	298.86	277.43	21.43
MINSAL	15	173.95	45.59	22.82	54.72	22.82	31.90	119.23	63.86	55.37
MOPT	48	168.18	45.45	23.39	84.88	23.39	61.49	83.30	41.47	41.83
PNC - MJSP	9	50.18	1.00	-	1.00	-	1.00	49.18	41.67	7.51
CSJ	19	46.19	23.01	1.22	4.94	1.22	3.72	41.25	-	41.25
FGR	2	35.87	19.94	0.12	0.25	0.12	0.13	35.62	-	35.62
SE - MJSP	11	29.69	20.57	5.00	12.73	5.00	7.73	16.96	-	16.96
DRTS - MJSP	4	27.88	-	-	-	-	-	27.88	-	27.88
MINDEF	6	23.89	-	-	-	-	-	23.89	-	23.89
MH	9	22.23	1.66	0.77	3.45	0.77	2.68	18.78	-	18.78
DGCP - MJSP	6	19.91	0.01	0.01	0.01	0.01	-	19.90	19.90	-
MAG	10	16.54	4.52	3.15	4.24	3.15	1.09	12.30	1.71	10.59
MINDEL	5	12.27	0.08	-	-	-	-	12.27	-	12.27
MIVI	5	10.46	2.87	2.10	2.87	2.10	0.77	7.60	2.25	5.35
MINEC	5	9.90	3.67	2.76	6.91	2.76	4.15	2.99	0.42	2.57
MIGOBDET	7	8.42	4.67	2.45	4.67	2.45	2.22	3.75	-	3.75
MICULTURA	10	6.13	0.19	0.08	0.19	0.08	0.11	5.94	-	5.94
MARN	7	2.49	0.63	0.48	0.68	0.48	0.20	1.81	0.89	0.92
PGR	3	2.31	0.07	1.63	1.63	1.63	-	0.68	-	0.68
MTYPS	5	1.15	0.11	0.07	0.15	0.07	0.08	1.00	-	1.00
MITUR	1	0.94	0.73	0.55	0.67	0.55	0.12	0.26	-	0.26
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	25	255.34	129.59	59.96	77.90	59.96	17.94	177.45	15.84	161.61
CEL	4	160.26	82.04	36.32	36.32	36.32	-	123.95	-	123.95
ANDA	12	50.45	34.70	19.96	31.25	19.96	11.29	19.20	0.49	18.71
CEPA	9	44.63	12.85	3.68	10.33	3.68	6.65	34.30	15.35	18.95
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	70	492.17	56.76	25.40	93.51	25.40	68.11	398.66	8.73	389.93
DOM	9	343.25	23.63	22.95	52.22	22.95	29.27	291.03	-	291.03
INDES	18	94.17	22.33	-	23.52	-	23.52	70.65	-	70.65
ISSS	6	17.70	2.20	0.03	8.35	0.03	8.32	9.35	5.16	4.19
CNR	1	10.00	0.90	0.90	3.36	0.90	2.46	6.64	-	6.64
ISNA	9	8.46	1.15	0.48	1.18	0.48	0.70	7.28	-	7.28
ENA	2	3.83	1.26	0.12	0.83	0.12	0.71	3.00	-	3.00
INSAFORP	1	3.40	1.02	-	-	-	-	3.40	-	3.40
ISBM	4	2.90	0.62	-	1.18	-	1.18	1.71	1.61	0.10
ISTU	2	2.11	1.07	0.29	1.25	0.29	0.96	0.86	-	0.86
ANSP - MJSP	4	1.89	0.36	0.36	0.36	0.36	-	1.53	1.53	-
CONNA	6	1.29	0.32	0.13	0.35	0.13	0.22	0.94	0.43	0.51
ISRI	3	1.25	0.52	0.08	0.55	0.08	0.47	0.70	-	0.70
UES	1	1.00	1.00	-	-	-	-	1.00	-	1.00
ISDEMU	2	0.60	0.06	0.06	0.06	0.06	-	0.55	-	0.55
CORSATUR	1	0.30	0.30	-	0.28	-	0.28	0.02	-	0.02
INJUVE	1	0.02	0.02	-	0.02	-	0.02	-	-	-
OTRAS	33	262.59	19.61	9.57	71.15	9.57	61.58	191.44	181.27	10.17
FOVIAL	7	254.44	16.46	8.76	70.03	8.76	61.27	184.41	181.27	3.14
CEFAFA	6	4.03	2.07	0.42	0.71	0.42	0.29	3.32	-	3.32
FSV	1	2.22	0.44	-	-	-	-	2.22	-	2.22
FONAES	14	1.79	0.59	0.36	0.36	0.36	-	1.43	-	1.43
FONAVIPO	5	0.11	0.05	0.03	0.05	0.03	0.02	0.06	-	0.06
TOTAL	332	2,134.09	470.72	168.73	583.09	168.73	414.36	1,551.00	655.44	895.56

Del conjunto de entidades e instituciones detalladas en el cuadro anterior, a continuación se presentan en el cuadro No. 7, las 10 ejecutoras que concentran los mayores montos programados para el año, cuyo total equivale al 84.2% del PAIP vigente por \$2,134.09 millones, e incluye además, la programación y ejecución al mes que se reporta.

Cuadro No.7
Instituciones con mayor inversión anual programada y su ejecución a mayo/2022
(En millones US\$)

INSTITUCIONES / ENTIDADES	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE MAYO	EJECUTADO AL MES DE MAYO
MINEDUCYT	455.41	89.99	7.20
DOM	343.25	23.63	22.95
FOVIAL	254.44	16.46	8.76
MINSAL	173.95	45.59	22.81
MOPT	168.18	45.45	23.39
CEL	160.26	82.04	36.32
INDES	94.17	22.33	-
ANDA	50.45	34.70	19.96
PNC- MJSP	50.18	1.00	-
CSJ	46.19	23.01	1.22
TOTAL	1,796.48	384.20	142.61

VIII. Proyectos con mayores montos programados para el año 2022 y su avance al mes de mayo

Los 10 proyectos contenidos en el PAIP 2022, que tienen los mayores montos de inversión programada, y cuya suma conjunta conforme al Programa vigente asciende a \$1,031.14 millones (48.3% del total), se presentan en el Cuadro No. 8, con su respectiva programación y ejecución financiera al mes de mayo.

Cuadro No.8
Avance Financiero al mes de mayo, de los 10 proyectos con mayores montos programados en el PAIP 2022
(En millones US\$)

INSTITUCIONES / ENTIDADES	PROGRAMAS/PROYECTOS	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE MAYO	EJECUTADO AL MES DE MAYO	EFICACIA FINANCIERA AL MES
DOM	Programa de Obras Municipales para Infraestructura Vial a Nivel Nacional, año 2022.	201.68	6.00	6.00	100.0%
MINEDUCYT	Programa de Reducción de Brecha Digital en Centros Escolares de El Salvador	169.69	77.75	2.18	2.8%
CEL	Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	157.81	81.43	36.30	44.6%
FOVIAL	Programa de Inversiones Adicionales al Mantenimiento	101.14	0.21	0.08	38.1%
FOVIAL	Programa de Inversiones Adicionales al Mantenimiento, Fase II	100.04	-	-	0.0%
MINEDUCYT	Programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador.	75.00	-	-	-
MINEDUCYT	Programa "Mi Nueva Escuela" de El Salvador.	70.00	-	-	-
MOPT	Construcción de By Pass en la Ciudad de San Miguel	55.40	18.93	15.97	84.4%
MINEDUCYT	Programa de Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa: Nacer, Crecer, Aprender.	50.95	0.02	0.01	50.0%
MINSAL	Programa de Respuesta de El Salvador ante el COVID-19.	49.43	16.05	11.81	73.6%
TOTAL		1,031.14	200.39	72.35	36.1%

IX. Detalle de los proyectos del PAIP 2022

En anexo se presenta el detalle de los proyectos del PAIP vigente al mes de mayo/2022 y el avance en la ejecución financiera de los mismos a dicho mes, agrupados por institución, según reporte generado del SIIP, con base a lo registrado por las diferentes entidades e instituciones ejecutoras, en las aplicaciones informáticas del SAFI y SIIP, al 9 de junio,

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
GOBIERNO CENTRAL						
MINEDUCYT		17	455,406,313.48	89,988,386.46	7,196,606.10	8.00
7731	Programa de Reducción de Brecha Digital en Centros Escolares de El Salvador		169,687,133.00	77,754,016.70	2,179,965.64	2.80
7495	Programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador		75,000,000.00	-	-	-
7800	Programa "Mi Nueva Escuela" de El Salvador		70,000,000.00	-	-	-
7521	Programa de Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa: Nacer, Crecer, Aprender		50,950,000.00	17,840.00	8,920.00	50.00
7240	Programa de mejoramiento de ambientes educativos para la formación integral y aprendizajes, a nivel nacional		36,568,198.42	4,746,318.19	1,381,416.88	29.11
7728	Rehabilitación de infraestructura en Centros Educativos que presentan riesgo sísmico y vulnerabilidad ambiental, a nivel nacional		18,000,000.00	37,880.00	-	0.00
7726	Reconstrucción de infraestructura de Centros Escolares, dañados por las tormentas Amanda y Cristóbal, a nivel nacional		10,443,170.00	28,665.00	-	0.00
6910	Programa de Becas FANTEL a nivel nacional, para realizar estudios de Educación Superior, 2018-2022		8,099,240.00	1,558,664.51	1,149,385.10	73.74
7239	Programa de equipamiento y capacitación docente en tecnología e innovación al servicio de los aprendizajes, a nivel nacional		5,372,102.52	3,067,977.52	1,200,880.56	39.14
7725	Suministro e instalación de sistemas de higienización y bioseguridad en Centros Escolares, a nivel nacional		3,409,294.65	399,294.65	365,909.37	91.64
7729	Implementación del Plan Multimodal en educación básica, media y media técnica, en el marco de recuperación de la emergencia por Covid 19, a nivel nacional		2,855,875.00	-	-	-
7723	Implementación de nuevas modalidades de aprendizaje, a través del apoyo de aulas móviles, a nivel nacional		1,632,960.00	808,125.00	-	0.00
7730	Construcción, equipamiento y mejoramiento de infraestructura en Instituciones de educación media técnica y técnica superior, a nivel nacional		1,399,680.00	522,180.00	-	0.00
7238	Programa de formación docente al servicio de los aprendizajes, a nivel nacional		1,000,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00
6958	Programa de Becas Integrales a Familiares de Víctimas de la Masacre en Caserio El Mozote en Meanguera y zonas aledañas, departamento de Morazán		400,000.00	198,260.00	211,430.22	106.64
7733	Mejoramiento y equipamiento de Centros de Educación Especial, a nivel nacional		349,000.00	9,505.00	-	0.00
6998	Construcción de Centro Escolar en Cantón El Piche, municipio de El Carmen, departamento de La Unión		239,659.89	239,659.89	98,698.33	41.18
MINSAL		15	173,951,107.06	45,587,810.74	22,814,959.05	50.05
7500	Programa de Respuesta de El Salvador ante el COVID-19		49,426,780.02	16,052,370.95	11,809,454.90	73.57
6300	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II		41,064,775.00	6,947,891.86	2,381,075.11	34.27
7518	Programa de Respuesta de Salud Pública para contener y controlar el Coronavirus y mitigar su efecto en El Salvador		25,398,190.62	5,343,301.21	789,024.09	14.77
7496	Programa Creciendo Saludables Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador		20,639,740.00	3,684,150.50	184,143.77	5.00
7836	Mejoramiento de Infraestructura y equipamiento de la Red Nacional de Hospitales		12,405,735.03	4,332,867.50	2,208,568.45	50.97
8126	Reubicación, adecuación, traslado y equipamiento del Laboratorio Nacional de Salud Pública de El Salvador - SLV-C-MOH / SLV-H-MOH		11,491,759.00	3,398,935.59	-	0.00
7837	Mejoramiento de Infraestructura y equipamiento de Unidades de Salud de Primer Nivel, a nivel nacional		8,200,428.36	3,420,257.02	3,077,914.36	89.99
7833	Equipamiento y dotación de suministros para Establecimientos de Salud a nivel Hospitalario y Comunitario, para atención Materna y de Primera Infancia, a nivel nacional		1,693,518.80	508,055.64	1,305,179.80	256.90
7924	Habilitación de Laboratorio de Cateterismo Cardíaco en Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom, San Salvador		1,500,000.00	600,000.00	348,000.00	58.00
8024	Construcción, mejoramiento y equipamiento para la puesta en marcha de Unidades de Terapia Dialítica en Hospitales priorizados del MINSAL, a nivel nacional		993,093.64	744,820.23	204,363.22	27.44
7838	Equipamiento de Unidades de Terapia Dialítica del MINSAL, a nivel nacional		500,000.00	-	-	-
7284	Equipamiento de la Red Hospitalaria nacional y Establecimientos de Salud del Primer Nivel, para la atención preventiva y curativa de Primera Infancia		261,254.49	182,878.14	181,717.49	99.37
6015	PROGRAMA SALUD MESOAMÉRICA 2015 - EL SALVADOR		218,322.40	214,772.40	176,638.40	82.24
6546	Mejoramiento de Infraestructura de Establecimientos de Salud en el Departamento de Morazán		155,009.70	155,009.70	148,879.46	96.05
6107	CONSTRUCCIÓN DEL TAPIAL PERIMETRAL DEL HOSPITAL NACIONAL MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO GALDAMEZ DE CIUDAD BARRIOS, SAN MIGUEL		2,500.00	2,500.00	-	0.00
MOPT		48	168,184,202.21	45,447,660.89	23,392,071.18	51.47
5980	CONSTRUCCIÓN DE BY PASS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL		55,400,820.66	18,927,170.42	15,966,475.93	84.36

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
7215	Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramo Los Chorros), entre Autopista Monseñor Romero y CA01W; municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, departamento de La Libertad		22,000,000.00	1,500,000.00	-	0.00
5964	CONSTRUCCIÓN PUENTE GENERAL MANUEL JOSÉ ARCE, FRONTERA LA HACHADURA- PEDRO DE ALVARADO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN		15,029,329.19	1,307,528.53	545,903.77	41.75
6062	Programa de Caminos Rurales Progresivos y Mejoramiento de Caminos a Nivel Nacional		14,102,403.00	4,216,709.00	-	0.00
6611	Programa de Corredores Productivos - Componente II: Inversiones productivas y logísticas para la competitividad (BID 3170/OC-ES)		7,722,430.00	242,905.00	-	0.00
7904	Modernización Integral del Puesto Fronterizo de Anguiatú, municipio de Metapán, departamento de Santa Ana. (MOPT-FGEN)		4,485,036.29	3,532,699.91	1,054,749.71	29.86
7844	Reconstrucción de descarga de aguas lluvias del sistema denominado: Valle Nuevo, Comunidad Belén, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador		4,241,291.77	625,258.96	1,432,917.65	229.17
7952	Construcción de obras de mitigación y colector para descarga de aguas lluvias en colonia El Matazano, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador		3,702,165.99	405,756.04	1,083,432.25	267.02
7975	Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático en Centroamérica - Componente El Salvador - MOPT		2,856,630.00	-	-	-
7940	Construcción de Complejo Turístico y miradores en camino a Surf City, municipio y departamento de La Libertad		2,574,128.00	592,049.44	-	0.00
7903	Construcción de By Pass entre Carretera a Sonsonate y Carretera a Santa Ana (CA01W - CA08W), municipios de Colón, Ciudad Arce y Sacacoyo, departamento de La Libertad. (MOPT-FGEN)		2,173,747.57	2,173,747.57	-	0.00
7882	Construcción de sistema de drenaje de aguas lluvias en Avenida Morazán, municipio y departamento de Sonsonate		2,000,000.00	107,400.00	-	0.00
7756	Construcción de obras de mitigación de cárcava en Colonia La Campanera, municipio de Soyapango, San Salvador		2,000,000.00	-	-	-
7719	Construcción de obras de mitigación de cárcava en Colonia Brisas de San Bartolo, municipio de Ilopango, San Salvador		2,000,000.00	118,075.00	-	0.00
7734	Reconstrucción de colector de aguas lluvias en Residencial Lomas de Miramonte, San Salvador		2,000,000.00	1,282,980.00	-	0.00
8180	Adquisición de equipo para el mejoramiento de calles de acceso a comunidades, centros culturales, deportivos y técnicos, a nivel nacional - PCT II		2,000,000.00	-	-	-
7635	Construcción de puente Caserio San Felipe y El Tablón en Cantón El Molino, municipio de Concepción de Oriente, La Unión		1,704,745.00	281,400.00	-	0.00
7001	Mejoramiento y tramo de apertura de Camino Rural SAN16N, tramo: Cantón la Magdalena - El Coco - Frontera con Guatemala, municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, subtramo de estacionamiento 6+750 al 8+550		1,552,603.75	1,531,400.66	-	0.00
7693	Construcción de Obras de Mitigación en margen derecho del río Acelhuate, Comunidad Santa Carlota, municipio y departamento de San Salvador		1,500,000.00	167,150.00	-	0.00
7623	Mejoramiento de camino rural AHU17S, San José El Naranjo - ET. CA02W (El Ceibillo) y AHU20N, ET. AHU17S - San José El Naranjo, municipio de Jujutla, departamento de Ahuachapán		1,500,000.00	-	-	-
6318	Construcción de Muelle Artesanal Isla Conchaguita, municipio de Meanguera del Golfo, departamento de La Unión		1,434,835.00	224,285.00	-	0.00
7638	Construcción de Puente Apancoyito, Carretera RN11S, Tramo: Isabel Ishuatán-CA02W, municipio de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate		1,300,000.00	366,070.00	-	0.00
5462	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MOR13W, TRAMO: MUNICIPIO SAN SIMON - MUNICIPIO SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.		1,282,868.18	63,365.15	38,964.65	61.49
4067	Mejoramiento Camino Rural CHA08S, Tramo: Entre San Isidro Labrador -San José Cancasque. Chalatenango		1,061,911.50	1,061,911.50	50,202.09	4.73
7714	Construcción de obras de mitigación de cárcava en Colonia Bosques de La Paz, municipio de Ilopango, San Salvador		1,000,000.00	63,130.00	-	0.00
7738	Construcción de obras de mitigación en margen del Río Acelhuate, en zona colindante a Comunidad 10 de Octubre, colonia Santa Marta, municipio y departamento de San Salvador		1,000,000.00	-	-	-
7928	Construcción de Parque de Diversiones en el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, municipio y departamento de La Libertad		938,216.41	938,216.41	190,733.59	20.33
8131	Mejoramiento de interconexión urbana para movilidad ciclista y peatonal, entre av. El Espino y av. Jerusalén en Bulevar Monseñor Romero, municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad		797,900.25	387,288.84	239,370.08	61.81
7758	Construcción de obras de mitigación de cárcava en Colonia Jardines del Boulevard, municipio de Soyapango, San Salvador		790,655.92	318,620.92	183,399.72	57.56
7905	Construcción del Recinto Fronterizo El Amatillo, municipio de Pasaquina, departamento de La Unión. (MOPT-FGEN)		775,504.78	775,504.78	-	0.00
7003	Mejoramiento de Camino Rural USU14N (Antigua calle a Santa Elena), tramo: By Pass de Usulután - municipio Santa Elena, departamento de Usulután		762,790.51	343,255.74	317,276.34	92.43
8149	Construcción de obras de protección en zona del malecón del Puerto de La Libertad, municipio y departamento de La Libertad		761,014.00	-	-	-
7684	Construcción de Puente sobre Río Ceniza, ruta Pedro Oidor Ramírez de Quiñónez, CA08W, tramo desde By Pass Norte hasta By Pass Sur, Limite Intermunicipal de Sonzacate e Izalco, departamento de Sonsonate		759,278.06	759,278.06	513,100.68	67.58

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
7902	Construcción de Sistema de Riego en los cantones San Rafael, Potrero Grande, La Cabaña y San Diego, municipio de El Paisnal, departamento de San Salvador. (MOPT-FGEN)		733,815.59	72,518.81	-	0.00
5939	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMMS		689,049.97	581,545.67	581,545.67	100.00
7947	Construcción de retorno de ingreso y salida sobre Bulevar Monseñor Romero (RN21W) hacia la calle al Volcán (LIB10N), municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad		643,694.63	289,662.58	193,108.39	66.67
8150	Adecuación de edificio para el funcionamiento del Instituto de Bienestar Animal (IBA) del MAG, municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad		598,171.44	598,171.44	491,075.32	82.10
3918	DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES		496,292.07	425,887.64	54,356.26	12.76
6442	Fortalecimiento Institucional Convenio JICA - By Pass de San Miguel		365,775.64	106,501.14	84,644.14	79.48
6934	Fortalecimiento Institucional – Programa FONPRODE		359,924.69	188,219.69	160,534.39	85.29
6756	Fortalecimiento Institucional - Componente II (BID 3170/OC-ES)		227,834.00	137,834.00	122,934.00	89.19
6545	Fortalecimiento Institucional Fondos Yucatán		224,900.00	114,025.00	82,900.00	72.70
7413	Construcción de Puente de doble carril en entrada principal a la Ciudad de Chilanga, Morazán		207,465.62	196,473.64	-	0.00
7411	Mejoramiento de Cancha España, municipio de San Sebastián, San Vicente		171,884.15	168,575.77	-	0.00
5913	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAZ18W, TRAMO: VERAPAZ - JERUSALÉN - MERCEDES LA CEIBA Y RAMAL SAV21S, TRAMO: SAV18W - JERUSALÉN, DEPARTAMENTOS DE SAN VICENTE Y LA PAZ		105,932.00	105,932.00	-	0.00
7832	Construcción de ciclovía y obras complementarias en Avenida Jerusalén; Tramo: Redondel de las Naciones Unidas - Et. calle Las Jacarandas, departamentos de San Salvador y La Libertad		76,482.26	76,482.26	-	0.00
7505	Rehabilitación del puente de arcos sobre Rio Quezalapa, ruta CUS11N, tramo Tenancingo-Tenango - Et. CUS18N, municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán		68,227.77	68,227.77	-	0.00
7514	Construcción de Hospital de Especialidades para atención de la emergencia por COVID-19, San Salvador		4,446.55	4,446.55	4,446.55	100.00
PNC - MJSP		9	50,178,718.80	998,848.80	-	0.00
8011	Equipamiento táctico, estratégico, tecnológico y de video vigilancia de la Policía Nacional Civil, a nivel nacional - PCT III		30,000,000.00	-	-	-
8173	Suministro e instalación de Sistema de Información de Operadores de Redes Móviles de Telecomunicaciones, para investigación y control de calidad de servicios de la PNC, San Salvador		10,000,000.00	-	-	-
8009	Mejoramiento y equipamiento médico para Clínicas, Policlínico y Laboratorios de la Policía Nacional Civil, a nivel nacional PCT III		5,730,200.00	-	-	-
7531	Remodelación y Equipamiento del Edificio Central de la PNC, municipio y departamento de San Salvador		1,163,935.00	-	-	-
8128	Suministro e instalación de generadores atmosféricos de agua potable para las dependencias de la PNC, a nivel nacional		998,848.80	998,848.80	-	0.00
7925	Construcción y equipamiento de puesto policial caserio El Mozote, cantón Guacamaya, municipio de Meanguera, departamento de Morazán		748,015.00	-	-	-
7532	Adecuación y Equipamiento Básico del Centro de Desarrollo Integral de la PNC, Edificio Central, San Salvador		537,720.00	-	-	-
7658	Construcción y equipamiento de Centros Integrales de Seguridad Turística para Policía de Turismo, a nivel nacional		500,000.00	-	-	-
5673	Reemplazo de la Flota Vehicular de la Policía Nacional Civil		500,000.00	-	-	-
CSJ		19	46,194,327.39	23,006,611.31	1,221,652.86	5.31
6631	Construcción del Centro Judicial en Materia Penal, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana		10,429,000.00	8,035,833.34	-	0.00
6630	Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango		7,949,435.00	-	-	-
6632	Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Usulután, Departamento de Usulután		6,608,500.00	4,982,083.34	-	0.00
7237	Construcción de Centro de Desarrollo Formativo y Atención Social del personal del Órgano Judicial		3,950,000.00	3,200,000.00	-	0.00
7848	Ampliación de estacionamiento a doble nivel en el Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador		3,880,000.00	1,517,500.00	55,000.00	3.62
8109	Construcción de cubierta de techo y readecuación de espacios arquitectónicos en azotea del Palacio Judicial, municipio y departamento de San Salvador		2,100,000.00	812,500.00	-	0.00
8003	Remodelaciones, ampliaciones y mejoras de la infraestructura institucional del Órgano Judicial a nivel nacional, año 2022		1,929,215.00	504,400.00	-	0.00
7216	Construcción de Almacén Regional Occidental DACI, Archivo Judicial y de Notariado y otras Dependencias del Órgano Judicial, Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana		1,725,625.00	962,500.00	-	0.00
6635	Construcción del Instituto de Medicina Legal, Región Occidental I, Departamento de Santa Ana		1,400,624.60	774,999.60	399,999.60	51.61
7533	Remodelaciones, ampliaciones y mejoras de la infraestructura institucional del Órgano Judicial a nivel nacional, año 2021		1,226,302.79	709,022.08	766,653.26	108.13

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
6634	Construcción del Instituto de Medicina Legal, Región Oriental III, Departamento de La Unión		1,000,625.00	375,000.00	-	0.00
6703	Construcción de Centro Judicial en el Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador		633,750.00	316,875.00	-	0.00
7159	Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán		625,000.00	-	-	-
7064	Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz		600,000.00	-	-	-
6627	Construcción de Bodegas para Archivo Judicial, Regional Paracentral, Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente		595,000.00	415,897.95	-	0.00
7158	Construcción de Centro Judicial en el Municipio y Departamento de San Vicente		575,000.00	-	-	-
8062	Construcción de Centro Judicial en el municipio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad		500,000.00	180,000.00	-	0.00
6685	Construcción de Centro Judicial en el Municipio y Departamento de San Miguel		316,250.00	220,000.00	-	0.00
4225	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR		150,000.00	-	-	-
FGR		2	35,865,976.50	19,937,971.50	118,756.50	0.60
6093	Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República de El Salvador		35,113,045.00	19,689,635.00	-	0.00
6091	Actualización de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General de la República, a Nivel Nacional		752,931.50	248,336.50	118,756.50	47.82
SE - MJSP		11	29,687,355.67	20,566,343.61	4,996,638.38	24.30
6963	Programa de Infraestructura para la recuperación y dinamización de espacios públicos 2019 - LA/2017/40-134		15,527,059.46	13,053,881.28	4,420,160.26	33.86
6453	Programa de mejoramiento de espacios seguros de convivencia para jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)		3,667,915.00	-	-	-
6961	Fortalecimiento al sistema de Educación Pública para la prevención de la violencia y la Convivencia LA/2017/40-134		2,891,750.00	2,891,750.00	-	0.00
7910	Dotación de Flota Vehicular para apoyar labores de Seguridad Pública, a nivel nacional		2,067,472.60	162,591.78	-	0.00
6962	Programa de Fortalecimiento de atención a víctimas - LA/2017/40-134		1,488,481.12	1,462,108.06	114,146.12	7.81
6967	Fortalecimiento de Comités Municipales de Prevención de la Violencia en municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro - LA/2017/40-134		1,377,965.00	1,377,965.00	-	0.00
6968	Fortalecimiento Institucional - LA/2017/40-134		1,198,200.00	1,198,200.00	161,600.00	13.49
7927	Readecuación, ampliación y equipamiento de Base Rural, cantón San Antonio Silva, municipio y departamento de San Miguel		662,015.00	-	-	-
8074	Fortalecimiento Institucional - PCT III		500,000.00	213,350.00	-	0.00
8111	Construcción y equipamiento de Sede Policial en cantón El Zonte, municipio de Chiltiupán, departamento de La Libertad		300,732.00	200,732.00	300,732.00	149.82
7222	Construcción de Sub Delegación Policial en Calle Principal del municipio de Olocuilta, departamento de La Paz		5,765.49	5,765.49	-	0.00
DRTS - MJSP		4	27,880,950.00	-	-	-
8066	Construcción y equipamiento de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidad (CUBOS) en municipios priorizados, a nivel nacional - PCT II		15,486,680.00	-	-	-
8069	Construcción de infraestructura y equipamiento del Instituto Técnico Digital (ITD) en Sonsonate - PCT II		10,392,795.00	-	-	-
8067	Construcción de Skateparks e infraestructura para actividades deportivas en comunidades priorizadas, a nivel nacional - PCT II		1,325,020.00	-	-	-
8072	Fortalecimiento Institucional - PCT II		676,455.00	-	-	-
MINDEF		6	23,894,070.00	-	-	-
8014	Equipamiento de movilidad estratégica, táctico y de vigilancia del Ministerio de Defensa, a nivel nacional, PCT III		17,500,000.00	-	-	-
8015	Mejoramiento y equipamiento médico del Hospital Militar Central, municipio y departamento de San Salvador, PCT III		3,500,000.00	-	-	-
8084	Mejoramiento de Infraestructura de Clínicas de las Unidades Militares, a nivel nacional		1,000,000.00	-	-	-
8085	Equipamiento de Clínicas de las Unidades Militares, a nivel nacional		750,000.00	-	-	-
8017	Equipamiento médico y odontológico para las clínicas de las Unidades Militares, a nivel nacional, PCT III		607,570.00	-	-	-
8016	Equipamiento médico para el Hospital Militar Regional (HMR), municipio y departamento de San Miguel, PCT III		536,500.00	-	-	-
MH		9	22,228,947.24	1,657,406.84	768,252.15	46.35
7116	Programa de Mejora de la Gestión de los Tributos Internos - BID 3852/OC-ES		7,477,737.24	1,317,471.93	481,171.56	36.52
8051	Rehabilitación, remodelación y equipamiento del edificio Tres Torres del Ministerio de Hacienda, San Salvador		5,000,000.00	-	-	-
7118	Programa de Mejora de la Gestión de Información y Fortalecimiento Estratégico del Viceministerio de Ingresos y sus Recursos Humanos - BID 3852/OC-ES		3,773,500.00	108,825.92	84,943.58	78.05

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
7117	Programa de Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros - BID 3852/OC-ES		1,938,310.00	47,380.34	17,978.78	37.95
6916	Rehabilitación y Equipamiento de Edificio del Ministerio de Hacienda ubicado en intersección de Calle San Antonio Abad y Avenida Santa Mónica, Municipio y Departamento de San Salvador		1,150,000.00	-	-	-
7639	Construcción y Equipamiento del nuevo Centro de Datos de la Dirección General de Aduanas, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador		1,000,000.00	-	-	-
7520	Mejoras a la Infraestructura Tecnológica de Recintos Administrados por la Dirección General de Aduanas a Nivel Nacional, para la Plena Incorporación de El Salvador al Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Personas y Mercancías		750,000.00	-	-	-
7119	Fortalecimiento Institucional - BID 3852/OC-ES		639,400.00	183,728.65	184,158.23	100.23
4204	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TRIBUTARIA		500,000.00	-	-	-
DGCP - MJSP			19,914,635.00	14,100.00	14,100.00	100.00
7555	Construcción y Equipamiento de Cocinas Industriales en Centros Penales priorizados a nivel nacional		9,138,900.00	-	-	-
7556	Ampliación y Equipamiento del Centro Penal de Izalco, Fase II, departamento de Sonsonate		8,961,635.00	-	-	-
8055	Construcción y equipamiento de taller de servicio automotriz en el Centro de Detención Menor La Esperanza, municipio de Ayutuxtepeque, San Salvador		750,000.00	-	-	-
8056	Ampliación y equipamiento de taller de confección textil en el Centro Preventivo y de cumplimiento de Penas La Esperanza, municipio de Ayutuxtepeque, San Salvador		500,000.00	-	-	-
8057	Fortalecimiento de la estrategia de apoyo interinstitucional y comunitario de la Dirección General de Centros Penales, a nivel nacional		300,000.00	-	-	-
6162	Fortalecimiento Institucional Préstamo BCIE 2102		264,100.00	14,100.00	14,100.00	100.00
MAG		10	16,540,997.65	4,524,642.65	3,149,884.46	69.62
7200	Programa de Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros en El Salvador		7,850,000.00	1,686,575.00	455,150.10	26.99
6400	Programa Nacional de Transformación Económica Rural para el Buen Vivir - Rural Adelante		4,750,000.00	1,248,070.00	1,248,070.00	100.00
8022	Programa de Modernización y Fortalecimiento del MAG, Fase I		1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	100.00
7580	Mejoramiento de la Infraestructura Informática y Sistemas del MAG y de Puntos Fronterizos para Facilitar el Comercio en El Salvador		1,000,000.00	135,000.00	-	0.00
7297	Rehabilitación de Pozos y Estaciones de Bombeo para el Incremento de la Capacidad Productiva del Distrito de Riego y Avenamiento No.1 Zapotitán.		1,000,000.00	-	-	-
7578	Construcción de Módulos para Cultivo de Tilapia, en fomento al desarrollo de la Acuicultura Familiar, a nivel nacional		246,000.00	-	-	-
7577	Construcción y Equipamiento de Pozo Industrial en la Estación Acuicola de Santa Cruz Porrillo, municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente		235,000.00	-	-	-
7302	Apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el Proceso de Admisibilidad de Productos Avícolas y de Productos que Contengan más del 2% de Carne de Aves, al Mercado de los Estados Unidos de América, Mediante la Equivalencia de Sistemas		200,197.65	200,197.65	198,864.36	99.33
5562	Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF)		76,800.00	76,800.00	76,800.00	100.00
8169	Reactivación de Vivero Forestal Estatal en el Centro de Desarrollo Forestal (CEDEFOR)		12,000.00	7,000.00	-	0.00
MINDEL		5	12,266,830.00	78,705.00	-	0.00
8163	Programa para la Erradicación de la Pobreza, a nivel nacional: Componente Desarrollo y Protección Social		5,780,335.00	-	-	-
7612	Construcción y Equipamiento de edificaciones para la Facultad Multidisciplinaria de la Universidad de El Salvador, municipio y departamento de Chalatenango		2,500,000.00	-	-	-
7613	Construcción y Equipamiento de edificaciones para la Facultad Multidisciplinaria de la Universidad de El Salvador, municipio de San Francisco Gotera, departamento de Morazán		2,500,000.00	-	-	-
6454	Programa de inclusión productiva en el marco de programas sociales en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador		1,407,790.00	-	-	-
4472	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV		78,705.00	78,705.00	-	0.00
MIVI		5	10,461,416.67	2,866,422.79	2,095,391.53	73.10
5397	RESCATE DE LA FUNCION HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE SAN SALVADOR MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA.		5,691,050.00	108,932.36	65,482.36	60.11
7841	Programa de construcción y dotación de vivienda social para familias en condiciones de vulnerabilidad, a nivel nacional		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
8147	Construcción de Complejo Habitacional La Breaña, municipio de San Martín, departamento de San Salvador		2,000,000.00	417.94	-	0.00
6903	Programa de Mejoramiento de Viviendas para familias de escasos recursos, a nivel nacional		767,700.00	754,405.82	27,242.50	3.61

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
6612	Programa de Desarrollo Habitacional en el Caserio El Mozote y lugares aledaños, Departamento de Morazán		2,666.67	2,666.67	2,666.67	100.00
MINEC		5	9,900,492.74	3,666,869.08	2,761,089.15	75.30
8148	Fortalecimiento para implementar el proceso de simplificación de trámites y servicios asociados al comercio e inversiones en El Salvador		5,608,293.01	2,683,333.00	1,992,397.52	74.25
6613	Programa de Corredores Productivos - Componentes I, III y IV (BID 3170/OC-ES)		3,092,199.73	983,536.08	768,691.63	78.16
8020	Capacitación y certificación en habilidades digitales e idioma inglés para promover la competitividad, a nivel nacional		500,000.00	-	-	-
8077	Fortalecimiento de capacidades técnicas para el fomento de la competitividad empresarial en sectores industriales priorizados, a nivel nacional		500,000.00	-	-	-
8076	Fortalecimiento de capacidades técnicas para la gestión sistémica de la innovación al interior de las PYMES, a nivel nacional		200,000.00	-	-	-
MIGOBDET		7	8,422,215.37	4,672,215.37	2,453,962.99	52.52
7594	Dotación de equipo de protección para personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador		3,274,992.70	1,774,992.70	1,764,402.70	99.40
7948	Equipamiento del Sistema Nacional de Protección Civil para prevención ante emergencias, a nivel nacional		2,669,050.38	2,669,050.38	461,388.00	17.29
7590	Construcción de sucursales, mejoramiento de edificaciones existentes y renovación de flota vehicular de Correos de El Salvador, a nivel nacional		750,000.00	-	-	-
7591	Mejoramiento de la Infraestructura Informática de Correos de El Salvador, a nivel nacional		500,000.00	-	-	-
7596	Suministro e instalación de sistema de video vigilancia de quebradas y afluentes de mayor riesgo del AMSS		500,000.00	-	-	-
7598	Equipamiento y dotación de suministros para nueva Planta de Operaciones de la Imprenta Nacional, municipio y departamento de San Salvador		500,000.00	-	-	-
8002	Adquisición de Impresora Rotativa para la modernización de la Imprenta Nacional, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador - Fase II		228,172.29	228,172.29	228,172.29	100.00
MICULTURA		10	6,128,547.42	187,670.42	75,805.94	40.39
8050	Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la Escuela Nacional de Danza Morena Celarié y del Centro Nacional de Artes, municipio y departamento de San Salvador - PCT II		1,200,000.00	-	-	-
8094	Programa de conservación, restauración, mejoramiento, construcción y equipamiento de espacios patrimoniales, culturales y sitios arqueológicos, a nivel nacional		1,000,000.00	-	-	-
7984	Mejoramiento y equipamiento de Casas de la Cultura, a nivel nacional - PCT II		891,645.00	-	-	-
7269	Programa de Mejoramiento y Equipamiento de Infraestructura Cultural y Arqueológica a Nivel Nacional		650,175.00	-	-	-
7644	Ampliación, mejoramiento y equipamiento de la red de museos y salas de exposición a nivel nacional, y adecuación de instalaciones para la puesta en funcionamiento del Museo Nacional de Artes Visuales de El Salvador		500,000.00	-	-	-
7654	Actualización de inventario de Bienes Culturales Inmuebles para contribuir en los procesos de revitalización de Centros Históricos, a nivel nacional		500,000.00	-	-	-
7796	Mejoramiento, rehabilitación y restauración del Palacio Nacional de El Salvador y sus bienes culturales muebles - PCT II		500,000.00	-	-	-
8049	Mejoramiento y equipamiento de los Teatros Nacionales de los departamentos de San Salvador, Santa Ana y San Miguel - PCT II		445,000.00	-	-	-
7648	Programa de mejoramiento de infraestructura y equipamiento de Casas de la Cultura y Cubos, a nivel nacional, enmarcado en el Plan Control Territorial fase 2		231,727.42	187,670.42	75,805.94	40.39
7985	Adecuación y equipamiento de Bibliotecas Móviles, a nivel nacional - PCT II		210,000.00	-	-	-
MARN		7	2,488,214.69	630,073.60	480,995.86	76.34
7566	Construcción y equipamiento de cabañas y casetas, y adquisición de equipo de vigilancia para Áreas Naturales Protegidas, a nivel nacional		842,000.00	47,708.70	47,708.70	100.00
7243	Fortalecimiento de las Capacidades del MARN para la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y Vida Silvestre		534,614.85	229,135.16	225,576.86	98.45
7611	Renovación de redes de monitoreo del Observatorio Nacional de Amenazas y de los Recursos Naturales, a nivel nacional		500,000.00	2,409.90	2,409.90	100.00
7242	Fortalecimiento de la Dirección General del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, para la Prevención y Reducción de Riesgos a nivel nacional		337,724.99	90,694.99	88,294.99	97.35
7560	Construcción de obras de mitigación y reparación de bodegas de almacenamiento de elementos contaminados por plomo en ex fábrica Baterías de El Salvador, municipio de San Juan Opico, La Libertad		143,119.44	143,119.44	-	0.00
7346	Implementación de acciones para la reducción y/o eliminación de fuentes de contaminación que afectan la calidad del agua del Río Santa Rosa, en la Cuenca del Río Goascorán		91,772.19	86,672.19	86,672.19	100.00
7561	Construcción de obras para tratamiento de drenaje ácido en ex mina San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión		38,983.22	30,333.22	30,333.22	100.00

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
PGR		3	2,308,492.17	67,176.20	1,631,558.37	2,428.77
6698	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL		2,089,544.77	67,176.20	1,571,690.97	2,339.65
7870	Mejoramiento y equipamiento de la PGR, para brindar servicios virtuales por la pandemia Covid-19, a nivel nacional		159,080.00	-	-	-
7979	Mejoramiento y equipamiento de las Oficinas Centrales de la Procuraduría General de la República, San Salvador		59,867.40	-	59,867.40	-
MTYPS		5	1,148,225.94	113,185.94	74,625.94	65.93
7576	Mejoramiento en Infraestructura y Equipamiento de los Centros de Recreación del MTPS que funcionaron como Centros de Contención durante la Pandemia por COVID19		500,000.00	-	-	-
7206	Mejoramiento de infraestructura y equipamiento básico en Oficinas Centrales y Regionales del MTYPS, para atención de personas retornadas y grupos vulnerables		300,000.00	-	-	-
8004	Desarrollo de un Sistema Integrado de Servicios de Relaciones Laborales y Organizaciones Sindicales para la Dirección General de Trabajo del MTPS, San Salvador		200,000.00	-	-	-
7802	Desarrollo de Sistema Informático para modernizar el Sistema Nacional de Inspección de Trabajo y Visitas Técnicas del MTPS		103,040.00	68,000.00	29,440.00	43.29
7797	Suministro e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado Central en Edificio 2 de Oficinas Centrales del MTPS, San Salvador		45,185.94	45,185.94	45,185.94	100.00
MITUR		1	935,781.00	729,008.30	554,911.75	76.12
5833	Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero-Marina		935,781.00	729,008.30	554,911.75	76.12
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS						
CEL		4	160,262,845.00	82,041,250.00	36,318,931.25	44.27
3119	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL		157,808,305.00	81,430,150.00	36,303,555.64	44.58
5570	Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana.		1,788,895.00	496,925.00	8,422.95	1.70
5801	Programa de eficiencia energética en instalaciones de CEL		652,665.00	113,475.00	6,952.66	6.13
5821	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre		12,980.00	700.00	-	0.00
ANDA		12	50,449,727.50	34,704,584.45	19,964,236.11	57.53
5817	REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR.		30,844,575.91	30,844,575.91	16,876,711.41	54.72
8021	Programa de mejora de infraestructura y servicios, para optimizar el suministro de agua potable, a nivel nacional		7,361,134.60	548,533.75	2,694,366.39	491.19
7135	Introducción de agua potable y obras de saneamiento en cantón San Sebastián, municipio Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión		2,496,990.23	836,026.81	74,163.60	8.87
7136	Programa de construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del Sub Sector de agua potable y saneamiento. Fase I		2,370,682.67	1,398,290.67	229,298.10	16.40
8065	Programa de mejoramiento de sistemas de agua potable en municipios seleccionados, a nivel nacional - PCT II		2,300,000.00	250,000.00	-	0.00
6933	Programa de perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional. Primera Etapa		1,328,703.09	105,706.31	84,696.61	80.12
6660	Mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad		1,000,000.00	286,000.00	-	0.00
6661	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador		1,000,000.00	143,000.00	-	0.00
7662	Introducción de agua potable en zona Surf City, departamento de La Libertad		1,000,000.00	30,000.00	-	0.00
6651	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador		485,190.00	-	-	-
7859	Construcción de Política Pública que garantice la sostenibilidad del Subsector de Agua Potable y Saneamiento en el área rural - FASE II		144,250.00	144,250.00	-	0.00
5584	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.		118,201.00	118,201.00	5,000.00	4.23

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
CEPA		9	44,629,056.71	12,851,672.71	3,680,061.31	28.63
7177	Ampliación del área de registro de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez		10,000,000.00	3,000,000.00	-	0.00
6592	Rehabilitación de la Bodega No.1 del Puerto de Acajutla		7,200,000.00	2,160,000.00	-	0.00
7176	Construcción de la calle de rodaje Foxtrot en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez		6,300,000.00	-	-	-
7182	Ampliación del Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla, Etapa II		6,006,549.87	3,369,165.87	1,771,527.95	52.58
7476	Mejoramiento de la infraestructura eléctrica del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez		5,000,000.00	-	-	-
8006	Ampliación de estacionamiento del Aeropuerto Internacional de El Salvador		5,000,000.00	-	-	-
6487	Ampliación de Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.		4,322,506.84	4,322,506.84	1,908,533.36	44.15
6622	Perforación y Equipamiento de Pozo No. 3 del Puerto de Acajutla, Sonsonate		450,000.00	-	-	-
6872	Perforación y equipamiento de pozo No 5 en planta de tratamiento de agua potable del Aeropuerto Internacional de El Salvador		350,000.00	-	-	-
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES						
DOM		9	343,250,360.37	23,631,274.81	22,953,485.39	97.13
8151	Programa de Obras Municipales para Infraestructura Vial a nivel nacional, año 2022		201,678,780.00	5,999,500.33	5,999,500.33	100.00
8133	Programa de Obras Municipales a nivel nacional, año 2021		44,800,407.37	16,959,017.54	16,281,228.12	96.00
8153	Programa de Obras Municipales a nivel nacional, año 2022		35,709,868.00	428,677.25	428,677.25	100.00
8152	Programa de Obras Municipales para Infraestructura y Equipamiento de Centros Educativos a nivel nacional, año 2022		25,209,840.00	216,679.69	216,679.69	100.00
7994	Programa de Inversiones en Servicios e Infraestructura Municipal Resiliente para apoyar el Desarrollo Económico Local - Componente 1, BIRF 8948-SV		18,200,000.00	-	-	-
7995	Programa de Inversiones de Alto Impacto en Desarrollo Económico Regional (Fondo Competitivo) - Componente 2, BIRF 8948-SV		8,800,000.00	-	-	-
8155	Programa para la Erradicación de la Pobreza, a nivel nacional: Componente Infraestructura Social Básica		4,219,665.00	-	-	-
7997	Programa de Gestión e Implementación del Proyecto Desarrollo Económico Local Resiliente - Componente 5, BIRF 8948-SV		2,631,800.00	27,400.00	27,400.00	100.00
7996	Programa de Fortalecimiento Institucional y Construcción de Capacidad - Componente 3, BIRF 8948-SV		2,000,000.00	-	-	-
INDES		18	94,168,435.00	22,328,813.81	-	0.00
7316	Mejoramiento del Estadio Nacional Jorge Mágico González, San Salvador		19,470,630.00	8,479,096.47	-	0.00
7318	Mejoramiento del Gimnasio Nacional Jose Adolfo Pineda, departamento de San Salvador		18,800,340.00	7,152,281.65	-	0.00
7326	Mejoramiento de Complejo Deportivo El Polvorín, departamento de San Salvador		13,331,500.00	365,095.38	-	0.00
7331	Mejoramiento del Palacio Nacional de los Deportes Carlos El Famoso Hernández, San Salvador		9,652,965.00	269,494.08	-	0.00
7325	Remodelación y equipamiento de Complejo Deportivo de Ciudad Merliot, departamento de La Libertad		9,272,505.00	230,710.65	-	0.00
8075	Fortalecimiento Institucional para el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023		7,283,305.00	288,000.00	-	0.00
7472	Suministro e instalación de pantallas electrónicas para escenarios deportivos, departamentos de San Salvador y La Libertad		5,847,005.00	-	-	-
7330	Mejoramiento de Estadio Las Delicias, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad		3,481,435.00	1,477,376.26	-	0.00
7324	Mejoramiento de Parque de Pelota Saturnino Bengoa, municipio y departamento de San Salvador		2,337,175.00	1,080,510.46	-	0.00
7317	Mejoramiento de Estadio de Softbol Pablo Arnoldo Guzmán, departamento de San Salvador		2,192,525.00	1,033,710.83	-	0.00
7322	Mejoramiento de Complejo Deportivo Ex finca Modelo, municipio y departamento de Santa Ana		977,000.00	781,600.00	-	0.00
8078	Mejoramiento de Villa Centroamericana, municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador		500,000.00	400,000.00	-	0.00
7313	Mejoramiento de Complejo de Equestre, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad		499,050.00	247,938.03	-	0.00
7976	Construcción de Salón Multisensorial y espacio de oficinas en Ciudad Deportiva Inclusiva INDES, municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador		175,000.00	175,000.00	-	0.00
8079	Construcción de área de Archivo en el Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, San Salvador		87,000.00	87,000.00	-	0.00
8080	Mejoramiento de piscina semi olímpica en Complejo Deportivo INDES, municipio y departamento de San Miguel		87,000.00	87,000.00	-	0.00
8081	Construcción de vestidores y servicios sanitarios en Complejo Deportivo INDES, municipio y departamento de Usulután		87,000.00	87,000.00	-	0.00

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
8082	Mejoramiento de Complejo Deportivo INDES El Campito, municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán		87,000.00	87,000.00	-	0.00
ISSS		6	17,700,000.00	2,200,000.00	29,373.19	1.34
7218	Adecuación de infraestructura y equipamiento para Centro de Cuidados Paliativos y Enfermedades Crónicas Complejas y Avanzadas del ISSS, San Salvador		5,500,000.00	1,500,000.00	-	0.00
7949	Adquisición, Adecuación y Equipamiento de Instalaciones para la Unidad Médica del ISSS, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad		5,000,000.00	-	-	-
8025	Construcción y equipamiento de instalaciones para implementar el Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas, en Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico del ISSS, San Salvador		3,500,000.00	-	-	-
7914	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Emergencia y Máxima Urgencia en el Hospital Médico Quirúrgico, San Salvador		2,300,000.00	600,000.00	29,373.19	4.90
6974	Ampliación y mejoramiento del Almacén del ISSS para la Zona Oriental, departamento de Usulután		900,000.00	100,000.00	-	0.00
5363	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL POLICLINICO PLANES DE RENDEROS, SAN SALVADOR		500,000.00	-	-	-
CNR		1	10,000,000.00	899,569.61	899,569.61	100.00
8064	Desarrollo de Sistema de Información Geográfico para levantamiento y actualización del catastro nacional		10,000,000.00	899,569.61	899,569.61	100.00
ISNA		9	8,455,276.25	1,155,614.49	482,048.69	41.71
8196	Mejoramiento de Centros de Integración Social de El Espino (Ahuachapán), Ilobasco (Cabañas), Tonacatepeque, Ilopango, y de Resguardo, en San Salvador		5,031,500.00	-	-	-
7908	Construcción y Equipamiento de Centro de Acogimiento para adolescentes en municipio y departamento de Usulután		2,246,205.00	-	-	-
7789	Mejoramiento de Centro Infantil de Protección Inmediata, municipio y departamento de San Salvador		703,434.56	703,434.56	343,656.68	48.85
7850	Rehabilitación de Edificio La Estrella 2 en instalaciones de ISNA, Colonia Costa Rica, San Salvador		205,022.65	183,065.89	-	0.00
7776	Mejoramiento de Centro de Inserción Social de Tonacatepeque, departamento de San Salvador		72,162.94	72,162.94	72,162.94	100.00
7784	Mejoramiento de Centro de Acogimiento Hogar Marillac, municipio y departamento de Sonsonate		69,470.00	69,470.00	-	0.00
7778	Mejoramiento de Centro de Inserción Social Senderos de Libertad, municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas		61,252.03	61,252.03	-	0.00
7777	Mejoramiento de Centro de Inserción Social Femenino, municipio de Ilopango, departamento San Salvador		41,332.77	41,332.77	41,332.77	100.00
8118	Mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias del costado nor-oriente del Centro de Acogimiento Hogar del Niño San Vicente de Paul, municipio y departamento de San Salvador		24,896.30	24,896.30	24,896.30	100.00
ENA		2	3,827,334.40	1,255,904.40	122,103.40	9.72
6882	Transformación de la Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñónez (ENA) en Instituto Especializado de Nivel Superior		3,167,334.40	595,904.40	122,103.40	20.49
7923	Rehabilitación de Infraestructura y suministro de mobiliario básico de dormitorios, aulas y laboratorio de la Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñónez (ENA)		660,000.00	660,000.00	-	0.00
INSAFORP		1	3,400,000.00	1,020,000.00	-	0.00
6681	Readecuación de instalaciones del Centro de Formación Profesional del INSAFORP en San Bartolo, Ilopango, S.S., para el establecimiento y equipamiento del Centro de Excelencia en Tecnologías de Autotrónica (CETA)		3,400,000.00	1,020,000.00	-	0.00
ISBM		4	2,897,426.87	619,524.25	-	0.00
7516	Adecuación y equipamiento de Policlínico Magisterial, Unidad de Terapia Dialítica y Clínica de pre-diálisis del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, ante la emergencia por Covid-19, San Salvador		1,285,426.87	619,524.25	-	0.00
6674	Construcción y equipamiento de Policlínico Magisterial de La Unión, municipio y departamento de La Unión		900,000.00	-	-	-
6673	Construcción y equipamiento de Consultorio Magisterial de Santa Elena, departamento de Usulután		500,000.00	-	-	-
7138	Mejoramiento de áreas para servicios médicos y complementarias en Policlínico Magisterial de Santa Tecla, departamento de La Libertad		212,000.00	-	-	-
ISTU		2	2,107,341.11	1,066,545.45	293,339.88	27.50
6280	Mejoramiento y acondicionamiento del Centro Recreativo Puerta del Diablo, Cantón Planes de Renderos, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador		1,607,341.11	591,787.91	293,339.88	49.57
8183	Construcción de Obras Complementarias y suministro de sistema de comercialización para el Parque de Diversiones del Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, municipio y departamento de La Libertad		500,000.00	474,757.54	-	0.00

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
ANSP - MJSP		4	1,891,534.40	358,784.40	358,784.40	100.00
6952	Mejoramiento de la Red de Agua potable y Aguas negras, e Instalación de Paneles Fotovoltaicos en la ANSP Sede Comalapa, San Luis Talpa, Dpto. de La Paz		1,000,000.00	-	-	-
7825	Mejoramiento de infraestructura y equipamiento para la ANSP, sede Santa Tecla, La Libertad		444,090.00	-	-	-
7147	Renovación de flota vehicular de la ANSP, sede San Luis Talpa, departamento de La Paz		358,784.40	358,784.40	358,784.40	100.00
7824	Mejoramiento de infraestructura y equipamiento para la ANSP, sede San Luis Talpa, La Paz		88,660.00	-	-	-
CONNA		6	1,291,200.68	320,716.81	130,741.32	40.77
8093	Fortalecimiento del Sistema Informático del CONNA para interconexión con las entidades del Sistema Nacional de Protección		450,000.00	17,516.13	17,516.13	100.00
8091	Mejoramiento de salón de usos múltiples en Hogar del Niño Adalberto Guirola, sede del CONNA de Santa Tecla, La Libertad		270,000.00	-	-	-
8095	Ampliación y mejoramiento del Centro de Atención Integral (CAI) y de la cafetería institucional del CONNA-ISNA, colonia Costa Rica, San Salvador		253,300.68	253,300.68	63,325.19	25.00
8089	Mejoramiento de estructura y cubierta de techo en edificio de la sede central del CONNA, San Salvador		250,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00
7815	Fortalecimiento de las capacidades operativas territoriales del CONNA, a nivel nacional		37,900.00	37,900.00	37,900.00	100.00
8090	Adecuación de clínica institucional del CONNA, municipio y departamento de San Salvador		30,000.00	-	-	-
ISRI		3	1,250,333.19	516,627.39	76,473.71	14.80
8063	Construcción de infraestructura y equipamiento de la Unidad de Docencia e Investigación del ISRI, San Salvador		699,355.00	-	-	-
4763	Construcción y remodelación de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Occidente, Santa Ana		465,277.26	430,926.46	-	0.00
6695	Mejoramiento de infraestructura en áreas física, técnica y administrativa, del Centro de Rehabilitación de Oriente del ISRI, San Miguel		85,700.93	85,700.93	76,473.71	89.23
UES		1	1,000,000.00	1,000,000.00	-	0.00
7917	Construcción y equipamiento de Edificio para Centro de Desarrollo Infantil, sede central de la Universidad de El Salvador		1,000,000.00	1,000,000.00	-	0.00
ISDEMU		2	603,967.75	58,967.75	58,967.75	100.00
7986	Fortalecimiento y equipamiento de las sedes departamentales del ISDEMU, a nivel nacional		405,000.00	-	-	-
7538	Fortalecimiento de las capacidades productivas, autonomía y derechos económicos de las mujeres, en zonas rurales y urbanas de municipios priorizados, a nivel nacional		198,967.75	58,967.75	58,967.75	100.00
CORSATUR		1	300,000.00	300,000.00	-	0.00
7229	Mejoramiento de la infraestructura física del Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, departamento de La Libertad		300,000.00	300,000.00	-	0.00
INJUVE		1	24,273.00	24,273.00	-	0.00
5770	Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias - FOCAP		24,273.00	24,273.00	-	0.00
OTRAS						
FOVIAL		7	254,438,443.00	16,460,304.71	8,755,427.06	53.19
8061	Programa de Inversiones Adicionales al Mantenimiento		101,139,397.99	206,278.86	84,611.25	41.02
8172	Programa de Inversiones Adicionales al Mantenimiento, Fase II		100,040,834.00	-	-	-
7173	Programa de Mantenimiento Rutinario de Vías Pavimentadas a Nivel Nacional 2022 - Componente de inversión		48,457,817.00	14,861,286.85	8,670,815.81	58.34
7165	Programa de Señalización y Seguridad Vial 2022		2,801,370.00	84,040.00	-	0.00
7169	Programa de Mantenimiento Periódico 2022		992,436.00	992,436.00	-	0.00
7161	Programa de Mantenimiento de Puentes y Obras de Paso 2022		900,430.01	210,105.00	-	0.00
5960	MEJORAMIENTO DE VIAS E INTERSECCIONES A NIVEL NACIONAL		106,158.00	106,158.00	-	0.00
CEFAFA		6	4,026,205.00	2,074,245.00	416,307.85	20.07
7068	Construcción de edificio para estacionamiento, anexo al Hospital Militar Central, San Salvador		1,446,205.00	602,585.00	416,307.85	69.09
7808	Ampliación de la Unidad de Medicina de Rehabilitación Temporal del Hospital Militar Central, San Salvador		1,000,000.00	416,665.00	-	0.00
7897	Adecuación y equipamiento de unidad de Resonancia Magnética del Hospital Militar Central, San Salvador		500,000.00	208,330.00	-	0.00

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
7809	Ampliación de la Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del Hospital Militar Regional, San Miguel		400,000.00	166,665.00	-	0.00
7810	Construcción y equipamiento de un Centro de Rehabilitación Permanente, adjunto al Hospital Militar Central, San Salvador		380,000.00	380,000.00	-	0.00
7898	Equipamiento de la Unidad de Oncología del Hospital Militar Central, San Salvador		300,000.00	300,000.00	-	0.00
FSV		1	2,220,000.00	444,000.00	-	0.00
6027	AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA , SAN SALVADOR		2,220,000.00	444,000.00	-	0.00
FONAES		14	1,794,951.10	594,725.69	361,741.79	60.82
8184	Construcción del Centro de Interpretación Ambiental en mirador de Surf City, municipio y departamento de La Libertad		804,065.63	174,796.88	104,878.13	60.00
8129	Arborización de áreas verdes en avenida Jerusalén, Tramo: Redondel de las Naciones Unidas- calle Las Jacarandas, departamentos de San Salvador y La Libertad		347,803.38	110,705.38	51,430.88	46.46
7534	Fortalecimiento de la gestión integral de los recursos naturales y su sostenibilidad en el departamento de La Libertad		175,904.68	-	-	-
7519	Implementación de Centro Regional de Semillas Forestales para distribución, conservación y restauración ecológica en El Salvador, Fase I		174,269.37	134,565.97	110,797.56	82.34
7845	Implementación de medidas de compensación ambiental en zona del by-pass de San Miguel		157,954.22	79,962.24	-	0.00
7517	Implementación de obras de Compensación Ambiental en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, La Libertad y La Paz		67,739.37	52,340.62	52,340.62	100.00
7912	Conservación de especies de Tortugas Marinas y del Medio Ambiente en playa caserio El Espino, cantón Barra de Santiago, municipio de Jujutla, Ahuachapán		28,750.00	16,250.00	16,250.00	100.00
7930	Restauración de ecosistemas y paisajes en zonas de recuperación del Área Natural Protegida Walter Thilo Deininger, y reforestación de rotondas en Bypass de La Libertad, departamento de La Libertad		21,850.60	21,850.60	21,850.60	100.00
6888	Plan de Restauración Ambiental en la Cuenca del Río Las Cañas, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador		6,749.69	-	-	-
7513	Plan de Restauración de 14.81 manzanas a través de reforestación y hábitat para la vida silvestre en el Área Natural Protegida Zanjón El Chino, municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán		4,233.16	-	-	-
6948	Plan de Restauración Ambiental en la Cuenca del Río Jiboa, departamento de La Paz		4,194.00	4,194.00	4,194.00	100.00
7130	Restauración ambiental en los márgenes del Río Amolunca, municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán		800.00	-	-	-
7128	Restauración ambiental en colonia Casa Blanca, municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana		577.00	-	-	-
7129	Restauración ambiental en la Reserva de la Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, cantón Las Lagunetas, municipio de Citalá, departamento de Chalatenango		60.00	60.00	-	0.00
FONAVIPO		5	111,780.00	52,351.00	29,514.75	56.38
5085	CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		95,970.00	41,583.00	29,276.30	70.40
5371	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de San Vicente		14,000.00	10,000.00	-	0.00
5503	CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		1,000.00	143.00	143.00	100.00
5372	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Villas de San Pedro, Municipio de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz		500.00	500.00	-	0.00
5245	CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		310.00	125.00	95.45	76.36
TOTAL GENERAL		332	2,134,088,308.33	470,720,859.23	168,732,369.67	35.85

a/ Información registrada por las Ejecutoras en los Sistemas SAFI y SIIP, con datos al 09 de junio de 2022.
