



MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General de
Inversión y Crédito Público

PROGRAMA ANUAL DE **INVERSIÓN** **PÚBLICA 2022**

Informe de Ejecución
al mes de noviembre

Diciembre 2022


INTRODUCCIÓN

El Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2022, vigente al mes de noviembre asciende a \$2,399.82 millones y está conformado por 362 proyectos, correspondientes a 46 Entidades Ejecutoras pertenecientes al Gobierno Central, Empresas Públicas No Financieras, Instituciones Descentralizadas No Empresariales, y Otras, según detalle anexo de dicho Programa, las cuales al mes que se reporta, ejecutaron un total de \$717.17 millones, del monto programado de \$1,340.14 millones para el periodo enero – noviembre.

I. Composición del Programa

El PAIP 2022 al mes de noviembre por valor de \$2,399.82 millones, que representa el 7.5% del PIB¹, contempla asignaciones del año 2022 provenientes de diferentes presupuestos, y provisiones financieras 2021, como se detalla en el Gráfico No.1; y en comparación con el mes de octubre, dicho PAIP tiene un incremento de \$36.22 millones, por efecto neto de modificativas presupuestarias aprobadas hasta la fecha de generación de los reportes para este Informe con registros SAFI/SIIP.

Gráfico No.1
Composición del PAIP 2022 al mes de noviembre

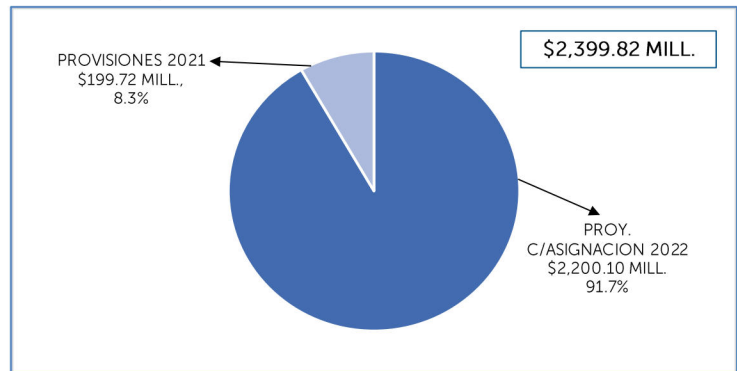

II. Ejecución de los recursos del PAIP 2022 al mes de noviembre

El Cuadro No.1 y Gráfico No.2 muestran los montos del PAIP programados para el año 2022, la inversión programada y ejecutada al mes de noviembre, con aplicación a las asignaciones vigentes provenientes de diferentes presupuestos y de las provisiones financieras 2021; así como los montos comprometidos y no comprometidos al mes que se informa.


Cuadro No.1
PAIP 2022 por Presupuesto al mes de noviembre
(En millones US\$)

PRESUPUESTO	PROGRAMADO VIGENTE ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE	% DE AVANCE	COMPROMETIDO			% DE LO COMPROMETIDO RESPECTO A LO PROGRAMADO	NO COMPROMETIDO		
					TOTAL	EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE	PENDIENTE DE EJECUTAR		TOTAL	EN PROCESOS ADMINIST.	SIN INICIAR PROCESOS ADMINIST.
	1	2	3	4=(3/2)	5	6	7=5-6	8=5/1	9	10	11=9-10
PROYECTOS C/ASIGNACION 2022	2,200.10	1,145.63	572.00	49.9	1,053.28	572.00	481.28	47.9	1,146.82	326.08	820.74
PROVISIONES FINANCIERAS 2021*	199.72	194.51	145.17	74.6	199.72	145.17	54.55	100.0	-	-	-
TOTAL	2,399.82	1,340.14	717.17	53.5	1,253.00	717.17	535.83	52.2	1,146.82	326.08	820.74

* Corresponde a recursos comprometidos en el ejercicio fiscal 2021, que se ejecutarán en el año 2022.

¹PIB: US\$31,816.6 millones.

Gráfico No.2
Situación de los Recursos del PAIP 2022 al mes de noviembre
(En millones de US\$)

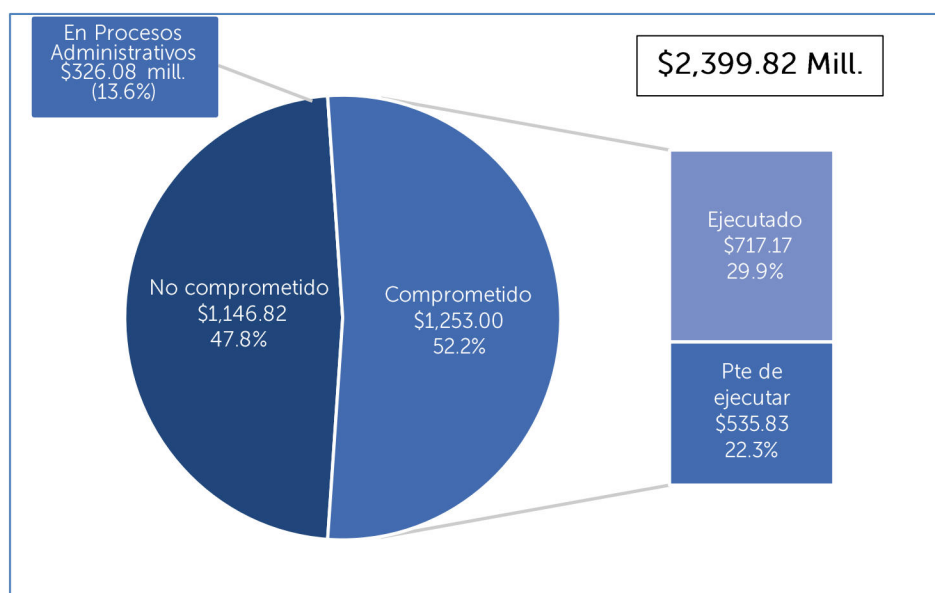

En relación a los recursos no comprometidos, en los Cuadros Nos.2 y 3, se presentan los datos correspondientes de estos asociados a proyectos que al mes de noviembre se encontraban en diferentes fases del proceso administrativo, por valor de \$326.08 millones, y el detalle por Entidad con sus respectivos montos.

Cuadro No.2
Recursos del PAIP 2022 en Procesos Administrativos al
mes de noviembre
(En millones de US\$)

PROCESO ADMINISTRATIVO	MONTO	%
Elaboración de Términos de Referencia	209.46	64.2%
Elaboración Bases de Licitación	19.28	5.9%
Publicación	1.59	0.5%
Elaboración de Ofertas	7.46	2.3%
Apertura de Ofertas	0.50	0.2%
Evaluación de Ofertas	35.79	11.0%
Adjudicación	19.37	5.9%
Declaratoria de Desierto	12.02	3.7%
Proceso de Contratación	20.61	6.3%
TOTAL	326.08	100.0%


Cuadro No.3
Recursos del PAIP 2022 en Procesos Administrativos por
institución al mes de noviembre
(En millones de US\$)

INSTITUCION	PROCESO ADMINISTRATIVO	MONTO	TOTAL	INSTITUCION	PROCESO ADMINISTRATIVO	MONTO	TOTAL
ANDA	Elaboración de Términos de Referencia	0.05	2.86	MINEDUCYT	Elaboración de Términos de Referencia	196.31	206.13
	Evaluación de Ofertas	2.56			Elaboración Bases de Licitación	0.10	
	Adjudicación	0.25			Publicación	0.40	
ANSP-MJSP	Evaluación de Ofertas	0.76	1.00		Evaluación de Ofertas	3.58	
	Adjudicación	0.24			Adjudicación	1.38	
CEPA	Declaratoria de Desierto	7.20	17.20		Declaratoria de Desierto	3.91	
	Elaboración de Términos de Referencia	10.00			Proceso de Contratación	0.45	
DGCP - MJSP	Elaboración de Términos de Referencia	1.25	1.25	MINSAL	Elaboración de Términos de Referencia	1.32	42.53
ISRI	Evaluación de Ofertas	0.70	0.70		Elaboración Bases de Licitación	16.15	
MAG	Elaboración Bases de Licitación	1.05	1.73		Publicación	0.54	
	Publicación	-			Evaluación de Ofertas	7.69	
	Evaluación de Ofertas	0.21			Adjudicación	16.83	
	Adjudicación	0.36		MIVI	Adjudicación	0.01	
	Declaratoria de Desierto	0.11			Declaratoria de Desierto	0.28	
MICULTURA	Elaboración de Términos de Referencia	0.48	0.54	MOPT	Elaboración Bases de Licitación	1.30	47.42
	Proceso de Contratación	0.06			Elaboración de Ofertas	7.46	
MIGOB DT	Evaluación de Ofertas	0.29	0.86		Evaluación de Ofertas	20.00	
	Adjudicación	0.28			Proceso de Contratación	18.66	
	Proceso de Contratación	0.29		PNC - MJSP	Elaboración Bases de Licitación	0.53	2.20
MINDEF	Proceso de Contratación	1.15	1.15		Publicación	0.65	
MINEC	Elaboración de Términos de Referencia	0.05	0.22		Apertura de Ofertas	0.50	
	Elaboración Bases de Licitación	0.15			Declaratoria de Desierto	0.52	
	Adjudicación	0.02		TOTAL			326.08

III. Comparativo Inversión Programada/Ejecutada al mes de noviembre 2017-2022

En el Gráfico No.3 se presenta un comparativo de los montos programados y ejecutados al mes de noviembre de los años 2017 al 2022; así como los montos del PAIP total de cada año y el porcentaje con respecto al PIB.

Gráfico No.3
Inversión Programada/Ejecutada, al mes de noviembre 2017 – 2022

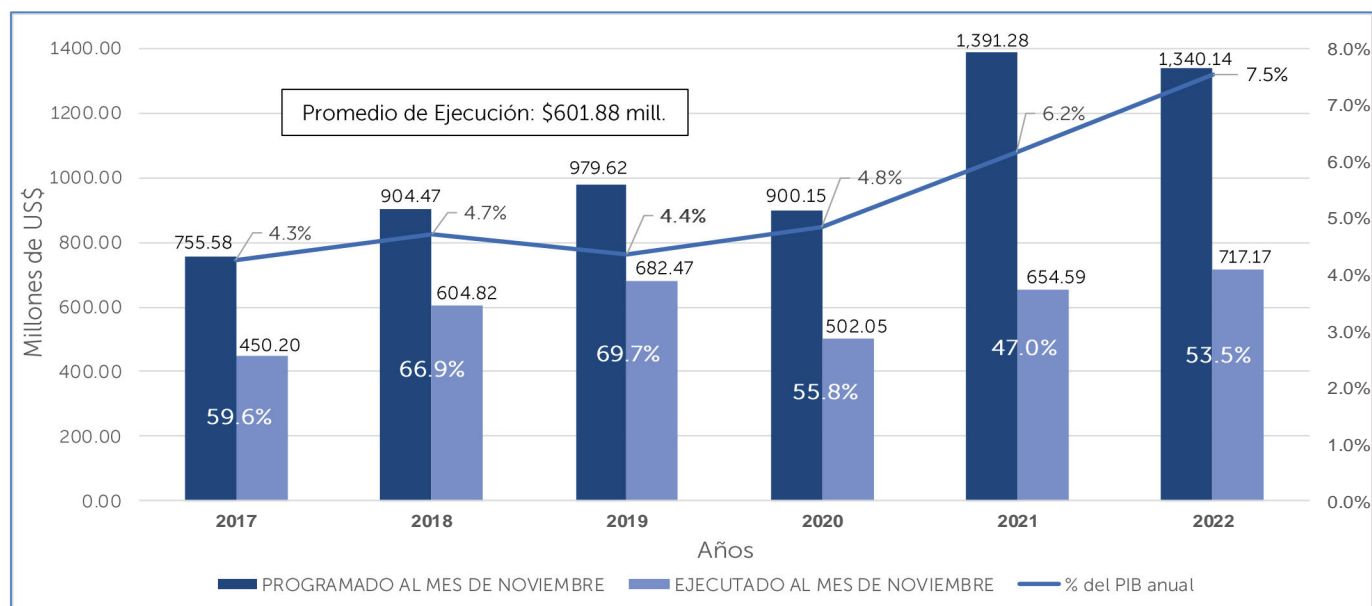


IV. Ejecución del PAIP 2022 al mes de noviembre, por Fuente de Financiamiento

El Gráfico No.4 muestra la conformación del PAIP 2022 por fuente de financiamiento interna y externa, así como su avance al mes de noviembre; y el Cuadro No.4 contiene el detalle de la distribución de dicho Programa por cada una de las fuentes de financiamiento, con su correspondiente programación y ejecución al periodo que se informa.

Gráfico No.4

PAIP 2022 por Fuente de Financiamiento al mes de noviembre
(En millones US\$)

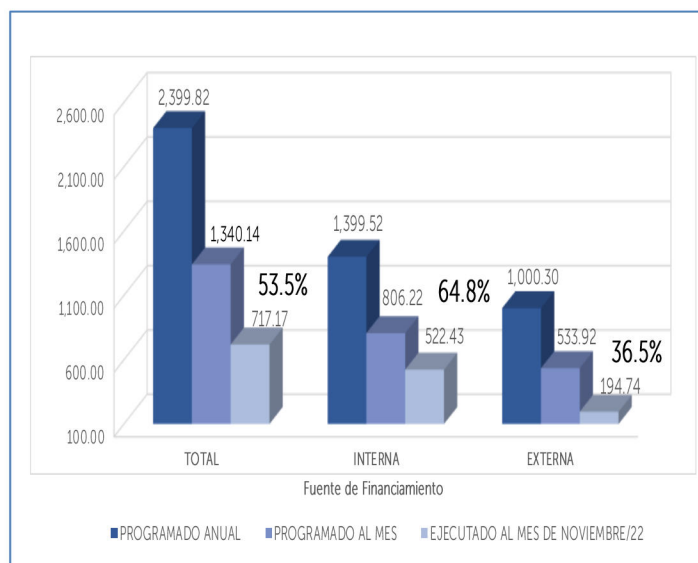

Cuadro No.4

PAIP 2022 por Fuente de Financiamiento al mes de noviembre
(En millones US\$)


FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE	% DE EJECUCION
	1	2	3	4=3/2
FONDO GENERAL	962.28	551.76	393.60	71.3
RECURSOS PROPIOS	209.49	170.84	113.58	66.5
PREST. INTERNOS	217.74	76.99	11.37	14.8
OTROS*	10.01	6.63	3.88	58.5
TOTAL INTERNO	1,399.52	806.22	522.43	64.8
PREST. EXTERNOS	952.27	492.52	180.35	36.6
DONACIONES	48.03	41.40	14.39	34.8
TOTAL EXTERNO	1,000.30	533.92	194.74	36.5
TOTAL GENERAL	2,399.82	1,340.14	717.17	53.5

*Otros: Incluye FANTEL, FINET, Fondos de Compensación (FCA), y Fondos de Sentencia Judicial por daños ambientales (FSJDA)

Avance del PAIP 2022, por Estructura del Sector Público, al mes de noviembre

El Gráfico No.5 muestra el PAIP 2022 por Estructura del Sector Público, detallándose además de lo programado al año, el monto programado y ejecutado al mes de noviembre, para el conjunto de instituciones del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas No Empresariales, Empresas Públicas y Otro grupo de Entidades.


Gráfico No.5
PAIP 2022 por Estructura del Sector Público al mes de noviembre
(En millones US\$)

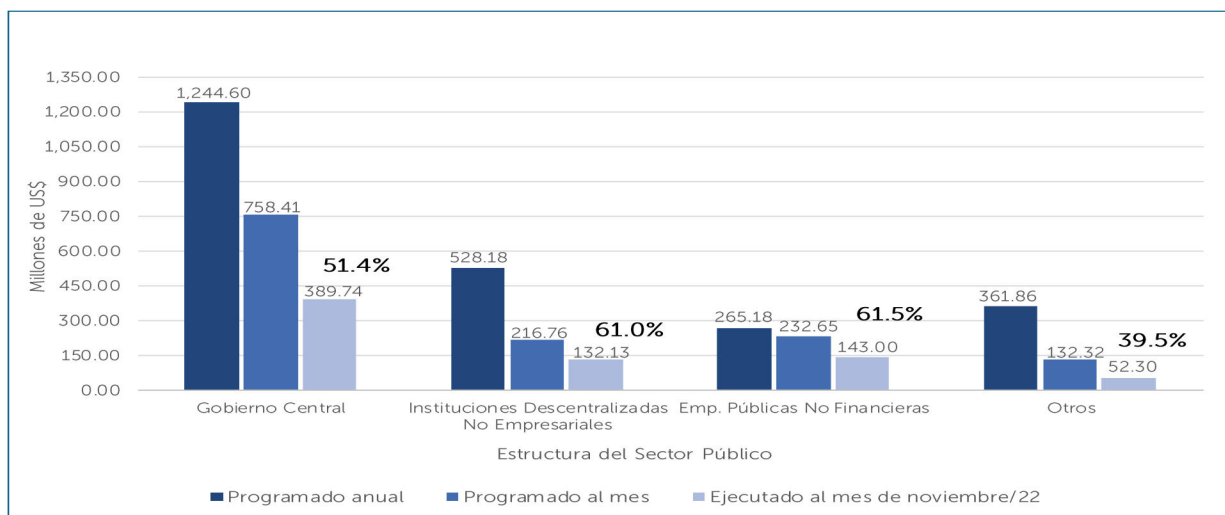

V. PAIP 2022 al mes de noviembre, por Sector de Actividad

El PAIP 2022 contiene proyectos vinculados a los Sectores Social, Económico y de Seguridad y Justicia, mostrándose en el Gráfico No.6, los montos que corresponden a cada uno de ellos; así como lo programado y ejecutado al mes de noviembre; encontrándose en el Sector Social, entre otros, programas de apoyo a la modernización del Sistema Educativo, y de salud, cuyo propósito es garantizar una mejor cobertura de servicios, permitiendo el acceso a la población vulnerable; en el caso del Sector Económico se tienen proyectos relacionados con la infraestructura vial, que permitirán mejorar la interconexión de movilidad del país, de desarrollo portuario, de generación de energía y de fomento a la producción agrícola; y en el Sector Seguridad y Justicia están incluidos proyectos vinculados al Plan Control Territorial, y de construcción y equipamiento de oficinas centrales de la FGR.

Gráfico No.6
PAIP 2022 por Sector de Actividad al mes de noviembre
(En millones US\$)

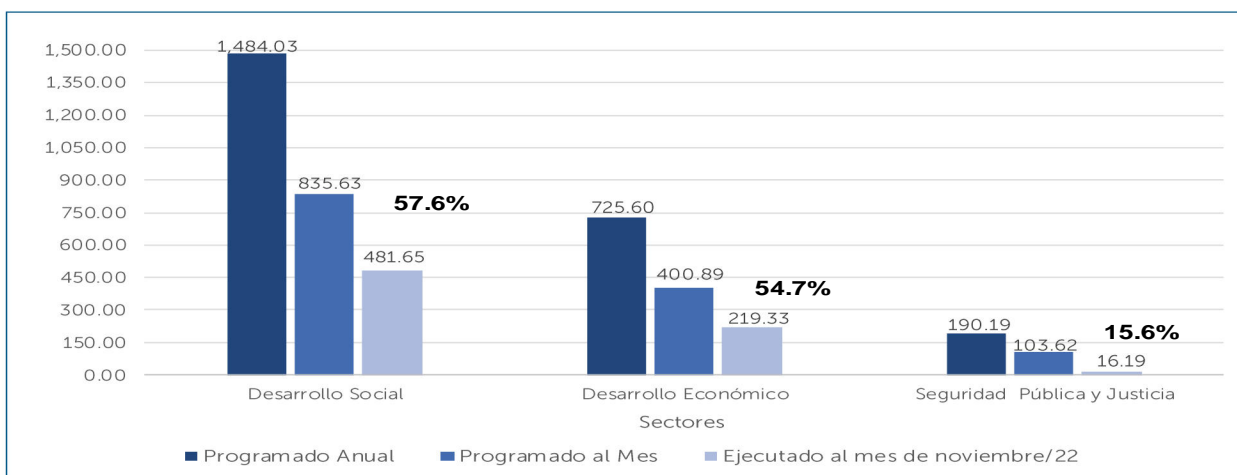

El Cuadro No. 5 contiene el detalle de los Subsectores que conforman cada uno de los Sectores de Actividad antes relacionados, con sus respectivos montos programados al año y al mes de noviembre, así como su ejecución a dicho mes.

Cuadro No.5
Programación/Ejecución Financiera del PAIP 2022 al mes de noviembre
(Millones de US\$)

SECTOR/SUBSECTOR	MONTO ANUAL PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE	%
DESARROLLO SOCIAL	1,484.03	835.63	481.65	57.6
Educación y Cultura	538.08	272.16	164.67	60.5
Desarrollo Urbano y Comunal	372.69	161.49	124.91	77.3
Salud	323.02	234.05	130.57	55.8
Deporte y Recreación	92.81	59.14	2.55	4.3
Agua Potable y Alcantarillado	51.05	46.82	26.03	55.6
Multisectorial	70.07	38.35	18.33	47.8
Asistencia social	14.38	11.71	5.62	48.0
Medio Ambiente	10.92	6.92	5.85	84.5
Vivienda	10.57	4.61	2.86	62.0
Previsión Social	0.44	0.38	0.26	68.4
DESARROLLO ECONOMICO	725.60	400.89	219.33	54.7
Transporte y Almacenaje	541.03	228.11	97.60	42.8
Energía	169.51	161.45	111.36	69.0
Silvoagropecuario	7.69	5.80	5.47	94.3
Industria, Comercio y Turismo	7.37	5.53	4.90	88.6
SEGURIDAD Y JUSTICIA	190.19	103.62	16.19	15.6
Seguridad	105.56	27.10	8.98	33.1
Justicia	84.63	76.52	7.21	9.4
TOTAL	2,399.82	1,340.14	717.17	53.5

VI. Avance de la Inversión Ejecutada por Institución, al mes de noviembre 2022

A continuación, en el Cuadro No.6 se detalla el Avance del PAIP 2022 al mes de noviembre por institución/entidad ejecutora, distribuidas por Estructura del Sector Público.

Cuadro No.6
Programación/Ejecución Financiera del PAIP 2022, al mes de noviembre por Institución Ejecutora
(Millones de dólares)

INSTITUCIONES / ENTIDADES	No. de Programas/ Proyectos	PROGRAMA VIGENTE ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE	COMPROMETIDO			PENDIENTE DE COMPROMETER		
		1	2	3	TOTAL	EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE	PENDIENTE DE EJECUTAR	TOTAL	EN PROCESOS ADMINIST.	SIN INICIAR PROCESOS ADMINIST.
		1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8
GOBIERNO CENTRAL	215	1,244.60	758.41	389.74	601.67	389.74	211.93	642.93	304.32	338.61
MINEDUCYT	17	460.41	238.76	161.14	218.86	161.14	57.72	241.55	206.13	35.42
MINSAL	15	264.08	216.63	125.40	188.33	125.40	62.93	75.75	42.53	33.22
MOPT	52	180.83	107.42	51.10	109.36	51.10	58.26	71.47	47.42	24.05
PNC - MJSP	11	50.18	9.00	4.55	11.22	4.55	6.67	38.96	2.20	36.76
CSJ	20	46.19	43.79	5.03	5.77	5.03	0.74	40.42	-	40.42
SE - MJSP	12	35.95	35.91	10.37	17.26	10.37	6.89	18.69	-	18.69
FGR	2	35.87	30.67	0.49	0.67	0.49	0.18	35.19	-	35.19
DRTS - MJSP	4	27.88	27.88	-	-	-	-	27.88	-	27.88
MINDEF	6	23.89	0.06	0.06	0.14	0.06	0.08	23.75	1.15	22.60
MH	9	22.23	7.10	3.67	7.76	3.67	4.09	14.47	-	14.47
DGCP - MJSP	6	19.91	0.31	0.31	0.31	0.31	-	19.60	1.25	18.35
MAG	10	16.54	10.52	9.88	11.91	9.88	2.03	4.63	1.73	2.90
MIGOBDET	10	16.47	7.18	2.89	9.17	2.89	6.28	7.30	0.87	6.43
MINDEL	5	12.27	4.72	1.10	1.10	1.10	-	11.17	-	11.17
MIVI	5	10.46	4.51	2.79	4.71	2.79	1.92	5.75	0.29	5.46
MINEC	5	9.90	8.36	7.49	8.73	7.49	1.24	1.17	0.21	0.96
MICULTURA	10	6.13	1.28	0.27	1.88	0.27	1.61	4.25	0.54	3.71
PGR	3	2.31	2.04	1.68	2.19	1.68	0.51	0.12	-	0.12
MTYPS	5	1.15	0.45	0.07	0.65	0.07	0.58	0.50	-	0.50
MARN	7	1.01	0.88	0.69	0.89	0.69	0.20	0.13	-	0.13
MITUR	1	0.94	0.94	0.76	0.76	0.76	-	0.18	-	0.18
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	26	265.18	232.65	143.00	160.62	143.00	17.62	104.55	20.06	84.49
CEL	4	169.43	161.38	111.35	111.36	111.35	0.01	58.08	-	58.08
ANDA	13	51.05	46.82	26.03	34.58	26.03	8.55	16.46	2.86	13.60
CEPA	9	44.70	24.45	5.62	14.68	5.62	9.06	30.01	17.20	12.81
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	77	528.18	216.76	132.13	220.27	132.13	88.14	307.91	1.70	306.21
DOM	11	378.14	117.68	111.99	122.11	111.99	10.12	256.03	-	256.03
INDES	19	94.97	60.39	2.17	61.90	2.17	59.73	33.07	-	33.07
ISSS	6	17.70	11.60	3.30	13.46	3.30	10.16	4.24	-	4.24
CNR	1	10.00	9.93	5.44	5.44	5.44	-	4.56	-	4.56
ISNA	11	6.91	5.87	4.18	6.42	4.18	2.24	0.49	-	0.49
ENA	2	5.09	3.19	1.31	3.33	1.31	2.02	1.75	-	1.75
ISBM	4	3.51	1.46	0.24	2.69	0.24	2.45	0.82	-	0.82
INSAFORP	2	3.40	1.32	-	-	-	-	3.40	-	3.40
ISTU	2	2.11	1.52	1.45	2.11	1.45	0.66	0.00	-	0.00
ANSP - MJSP	4	1.89	0.42	0.42	0.42	0.42	-	1.48	1.00	0.48
CONNA	7	1.29	0.93	0.38	0.94	0.38	0.56	0.35	-	0.35
ISRI	3	1.25	0.55	0.49	0.55	0.49	0.06	0.70	0.70	-
UES	1	1.00	1.00	-	-	-	-	1.00	-	1.00
ISDEMU	2	0.60	0.59	0.47	0.59	0.47	0.12	0.01	-	0.01
CORSATUR	1	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	-	0.01	-	0.01
INJUVE	1	0.02	0.02	-	0.02	-	0.02	-	-	-
OTRAS	44	361.86	132.32	52.30	270.44	52.30	218.14	91.43	-	91.43
FOVIAL	9	353.44	126.07	49.88	265.54	49.88	215.66	87.90	-	87.90
CEFAFA	6	4.03	3.75	1.08	1.08	1.08	0.00	2.95	-	2.95
FSV	2	2.22	0.73	0.30	2.05	0.30	1.75	0.17	-	0.17
ASA	12	1.44	1.06	0.36	1.08	0.36	0.72	0.36	-	0.36
FONAES	10	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	-	-	-	-
FONAVIPO	5	0.11	0.09	0.06	0.07	0.06	0.01	0.05	-	0.05
TOTAL	362	2,399.82	1,340.14	717.17	1,253.00	717.17	535.83	1,146.82	326.08	820.74

Del conjunto de entidades e instituciones detalladas en el cuadro anterior, a continuación se presentan en el cuadro No.7, las 10 ejecutoras que concentran los mayores montos programados para el año, cuyo total equivale al 85.4% del PAIP vigente por \$2,399.82 millones, e incluye además, la programación y ejecución al mes que se reporta.

Cuadro No.7
Instituciones con mayor inversión anual programada y su ejecución a noviembre/2022
(En millones US\$)

INSTITUCIONES / ENTIDADES	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE
MINEDUCYT	460.41	238.76	161.14
DOM	378.14	117.68	111.99
FOVIAL	353.44	126.07	49.88
MINSAL	264.08	216.63	125.40
MOPT	180.84	107.42	51.10
CEL	169.43	161.38	111.35
INDES	94.97	60.39	2.17
ANDA	51.05	46.83	26.03
PNC- MJSP	50.18	9.00	4.55
CSJ	46.19	43.79	5.03
TOTAL	2,048.73	1,127.95	648.64

VII. Proyectos con mayores montos programados para el año 2022 y su avance al mes de noviembre

Los 10 proyectos contenidos en el PAIP 2022, que tienen los mayores montos de inversión programada, y cuya suma conjunta conforme al Programa vigente asciende a \$1,238.86 millones (51.6% del total), se presentan en el Cuadro No.8, con su respectiva programación y ejecución financiera al mes de noviembre.

Cuadro No.8
Avance Financiero al mes de noviembre, de los 10 proyectos con mayores montos programados en el PAIP 2022
(En millones US\$)

INSTITUCIONES / ENTIDADES	PROGRAMAS/PROYECTOS	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE	EFICACIA FINANCIERA AL MES
DOM	Programa de Obras Municipales para Infraestructura Vial a Nivel Nacional, año 2022.	201.68	69.29	69.29	100.0%
FOVIAL	Programa de Inversiones Adicionales al Mantenimiento, Fase II	178.29	66.04	5.59	8.5%
MINEDUCYT	Programa de Reducción de Brecha Digital en Centros Escolares de El Salvador	169.69	139.28	133.67	96.0%
CEL	Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	167.52	159.86	111.25	69.6%
MINSAL	Programa de Respuesta de El Salvador ante el COVID-19	149.43	116.86	93.09	79.7%
FOVIAL	Programa de Inversiones Adicionales al Mantenimiento	91.44	11.03	9.56	86.7%
MINEDUCYT	Programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador.	75.00	5.77	0.09	1.6%
MINEDUCYT	Programa de Mejoramiento de ambientes educativos para la formación integral y aprendizajes, a nivel nacional.	72.45	40.85	18.55	45.4%
MINEDUCYT	Programa "Mi Nueva Escuela" de El Salvador.	70.00	35.92	0.02	0.1%
MOPT	Construcción de By Pass en la Ciudad de San Miguel	63.36	37.39	32.10	85.9%
TOTAL		1,238.86	682.29	473.21	69.4%

VIII. Detalle de los proyectos del PAIP 2022

En anexo se presenta el detalle de los proyectos del PAIP vigente al mes de noviembre/2022 y el avance en la ejecución financiera de los mismos a dicho mes, agrupados por institución, según reporte generado del SIIP, con base a lo registrado por las diferentes entidades e instituciones ejecutoras, en las aplicaciones informáticas del SAFI y SIIP, al 12 de diciembre.

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
GOBIERNO CENTRAL						
MINEDUCYT		17	460,408,813.48	238,763,108.72	161,144,232.82	67.49
7731	Programa de Reducción de Brecha Digital en Centros Escolares de El Salvador		169,687,133.00	139,283,499.08	133,674,319.19	95.97
7495	Programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador		75,000,000.00	5,770,175.00	90,374.25	1.57
7240	Programa de mejoramiento de ambientes educativos para la formación integral y aprendizajes, a nivel nacional		72,451,903.42	40,846,986.55	18,546,984.55	45.41
7800	Programa "Mi Nueva Escuela" de El Salvador		70,000,000.00	35,924,584.12	16,585.22	0.05
7521	Programa de Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa: Nacer, Crecer, Aprender		50,950,000.00	3,525,063.00	112,062.00	3.18
6910	Programa de Becas FANTEL a nivel nacional, para realizar estudios de Educación Superior, 2018-2022		8,099,240.00	5,112,212.54	3,129,916.66	61.22
7239	Programa de equipamiento y capacitación docente en tecnología e innovación al servicio de los aprendizajes, a nivel nacional		5,372,102.52	2,800,850.78	2,434,163.95	86.91
7729	Implementación del Plan Multimodal en educación básica, media y media técnica, en el marco de recuperación de la emergencia por Covid 19, a nivel nacional		2,855,875.00	885,988.11	922,038.00	104.07
7723	Implementación de nuevas modalidades de aprendizaje, a través del apoyo de aulas móviles, a nivel nacional		1,632,960.00	1,219,540.00	192,892.33	15.82
7728	Rehabilitación de infraestructura en Centros Educativos que presentan riesgo sísmico y vulnerabilidad ambiental, a nivel nacional		1,390,795.00	1,088,425.00	-	0.00
7238	Programa de formación docente al servicio de los aprendizajes, a nivel nacional		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
6998	Construcción de Centro Escolar en Cantón El Piche, municipio de El Carmen, departamento de La Unión		682,659.89	372,559.89	239,659.89	64.33
6958	Programa de Becas Integrales a Familiares de Víctimas de la Masacre en Caserio El Mozote en Meanguera y zonas aledañas, departamento de Morazán		400,000.00	400,000.00	374,381.72	93.60
7725	Suministro e instalación de sistemas de higienización y bioseguridad en Centros Escolares, a nivel nacional		399,294.65	399,294.65	399,294.65	100.00
7733	Mejoramiento y equipamiento de Centros de Educación Especial, a nivel nacional		250,350.00	124,305.00	9,060.41	7.29
7730	Construcción, equipamiento y mejoramiento de infraestructura en Instituciones de educación media técnica y técnica superior, a nivel nacional		234,000.00	7,125.00	-	0.00
5657	Potenciando la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El Salvador		2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
MINSAL		15	264,076,553.06	216,634,524.19	125,397,771.35	57.88
7500	Programa de Respuesta de El Salvador ante el COVID-19		149,426,780.02	116,862,554.41	93,089,964.66	79.66
6300	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II		31,059,413.00	25,625,881.06	8,529,286.89	33.28
7518	Programa de Respuesta de Salud Pública para contener y controlar el Coronavirus y mitigar su efecto en El Salvador		25,398,190.62	22,034,336.76	6,831,414.47	31.00
7496	Programa Creciendo Saludables Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador		20,639,740.00	19,032,994.38	1,483,027.45	7.79
7836	Mejoramiento de Infraestructura y equipamiento de la Red Nacional de Hospitales		12,405,735.03	12,208,691.55	4,654,368.76	38.12
8126	Reubicación, adecuación, traslado y equipamiento del Laboratorio Nacional de Salud Pública de El Salvador - SLV-C-MOH / SLV-H-MOH		11,491,759.00	7,741,439.12	516,718.87	6.67
7837	Mejoramiento de Infraestructura y equipamiento de Unidades de Salud de Primer Nivel, a nivel nacional		8,200,428.36	8,198,752.88	6,034,359.88	73.60
7833	Equipamiento y dotación de suministros para Establecimientos de Salud a nivel Hospitalario y Comunitario, para atención Materna y de Primera Infancia, a nivel nacional		1,693,518.80	1,693,518.80	1,693,518.80	100.00
7924	Habilitación de Laboratorio de Cateterismo Cardíaco en Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, San Salvador		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
8024	Construcción, mejoramiento y equipamiento para la puesta en marcha de Unidades de Terapia Dialítica en Hospitales priorizados del MINSAL, a nivel nacional		993,093.64	993,093.64	430,374.98	43.34
8179	Construcción y equipamiento de la Unidad de Terapia Dialítica del Hospital Nacional San Rafael, La Libertad		500,000.00	-	-	-
6015	PROGRAMA SALUD Mesoamérica 2015 - EL SALVADOR		349,130.40	324,497.40	215,972.40	66.56
7284	Equipamiento de la Red Hospitalaria nacional y Establecimientos de Salud del Primer Nivel, para la atención preventiva y curativa de Primera Infancia		261,254.49	261,254.49	261,254.49	100.00
6546	Mejoramiento de Infraestructura de Establecimientos de Salud en el Departamento de Morazán		155,009.70	155,009.70	155,009.70	100.00
6107	CONSTRUCCIÓN DEL TAPIAL PERIMETRAL DEL HOSPITAL NACIONAL MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO GALDAMEZ DE CIUDAD BARRIOS, SAN MIGUEL		2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
MOPT		52	180,835,595.04	107,422,118.22	51,095,327.64	47.56
5980	CONSTRUCCIÓN DE BY PASS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL		63,362,478.66	37,392,692.47	32,095,002.27	85.83
7215	Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramo Los Chorrros), entre Autopista Monseñor Romero y CA01W: municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, departamento de La Libertad		21,658,061.00	-	-	-
5964	CONSTRUCCIÓN PUENTE GENERAL MANUEL JOSÉ ARCE, FRONTERA LA HACHADURA-PEDRO DE ALVARADO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN		14,980,206.19	11,068,809.03	1,407,634.03	12.72

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
6062	Programa de Caminos Rurales Progresivos y Mejoramiento de Caminos a Nivel Nacional		11,133,560.00	3,329,494.12	-	0.00
6611	Programa de Corredores Productivos - Componente II: Inversiones productivas y logísticas para la competitividad (BID 3170/OC-ES)		7,722,430.00	7,722,430.00	-	0.00
7904	Modernización integral del Puesto Fronterizo de Angiatú, municipio de Metapán, departamento de Santa Ana. (MOPT-FGEN)		4,485,036.29	4,485,036.29	3,029,347.24	67.54
7844	Reconstrucción de descarga de aguas lluvias del sistema denominado: Valle Nuevo, Comunidad Belén, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador		4,241,291.77	4,223,907.02	3,663,581.91	86.73
8252	Rehabilitación de Sistemas de Drenaje de Aguas Lluvias, Colonia Santa Lucía, Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador		4,000,000.00	1,496,435.00	-	0.00
7952	Construcción de obras de mitigación y colector para descarga de aguas lluvias en colonia El Matazano, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador		3,702,165.99	3,688,691.28	1,191,498.01	32.30
7899	Reconstrucción de tramo de cama hidráulica en bóveda de Calle Principal de la Residencial Brisas de San Francisco, municipio y departamento de San Salvador, Fase II		3,192,378.00	3,171,205.54	156,818.58	4.95
7940	Construcción de Complejo Turístico y miradores en camino a Surf City, municipio y departamento de La Libertad		2,872,822.00	2,416,044.76	369,702.69	15.30
7975	Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático en Centroamérica - Componente El Salvador - MOPT		2,856,630.00	2,856,630.00	-	0.00
7903	Construcción de By Pass entre Carretera a Sonsonate y Carretera a Santa Ana (CA01W - CA08W), municipios de Colón, Ciudad Arce y Sacacoyo, departamento de La Libertad. (MOPT-FGEN)		2,173,747.57	2,173,747.57	2,173,747.55	100.00
8180	Adquisición de equipo para el mejoramiento de calles de acceso a comunidades, centros culturales, deportivos y técnicos, a nivel nacional - PCT II		2,000,000.00	2,000,000.00	-	0.00
7939	Construcción de Unidad Comunitaria de Salud Familiar en Isla Tasajera, municipio de San Luis La Herradura, departamento de La Paz		1,964,699.00	-	-	-
7719	Construcción de obras de mitigación de cárcava en Colonia Brisas de San Bartolo, municipio de Ilopango, San Salvador		1,792,543.00	1,060,485.79	307,142.55	28.96
5460	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAM33, TRAMO: CANTON SAN ANTONIO - CANTON EL CARRIZAL, DEPARTAMENTOS DE SAN MIGUEL Y MORAZAN.		1,775,300.00	28,927.50	59,122.39	204.38
7882	Construcción de sistema de drenaje de aguas lluvias en Avenida Morazán, municipio y departamento de Sonsonate		1,727,264.00	645,540.47	59,186.38	9.17
7734	Reconstrucción de colector de aguas lluvias en Residencial Lomas de Miramonte, San Salvador		1,681,943.00	1,551,382.46	487,717.72	31.44
8007	Construcción de obras para control de erosión en cauce de afluente del Río Chaguíte, colonia Santa Lucía, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador		1,637,258.00	1,637,258.00	-	0.00
7703	Construcción de obras de mitigación y reconstrucción de bóveda hacia Río Acelhuat, contiguo a Condominios El Atonal, municipio de Soyapango, San Salvador		1,577,971.83	1,577,971.83	-	0.00
7001	Mejoramiento y tramo de apertura de Camino Rural SAN16N, tramo: Cantón la Magdalena - El Coco - Frontera con Guatemala, municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, subtramo de estacionamiento 6+750 al 8+550		1,552,603.75	1,552,603.75	-	0.00
8254	Rehabilitación y Protección de tramo en Km. 125 de Carretera Longitudinal del Norte, Sensuntepeque, Cabañas		1,500,000.00	348,566.94	-	0.00
7638	Construcción de Puente Apancoyito, Carretera RN11S, Tramo: Isabel Ishuatán-CA02W, municipio de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate		1,300,000.00	4,611.53	4,150.38	90.00
5462	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MOR13W, TRAMO: MUNICIPIO SAN SIMON - MUNICIPIO SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.		1,282,868.18	1,258,468.18	167,451.77	13.31
7006	Mejoramiento de Camino Terciario MOR25W tramo: Jocoaitique (CA07N) - El Rosario, departamento de Morazán		1,193,543.00	106,638.36	7,519.42	7.05
4067	Mejoramiento Camino Rural CHA08S, Tramo: Entre San Isidro Labrador - San José Cancasque. Chalatenango		1,061,911.50	1,061,911.50	50,202.09	4.73
7714	Construcción de obras de mitigación de cárcava en Colonia Bosques de La Paz, municipio de Ilopango, San Salvador		1,000,000.00	526,844.00	-	0.00
7928	Construcción de Parque de Diversiones en el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, municipio y departamento de La Libertad		938,216.41	899,785.41	529,569.31	58.86
8131	Mejoramiento de interconexión urbana para movilidad ciclista y peatonal, entre av. El Espino y av. Jerusalén en Bulevar Monseñor Romero, municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad		797,900.25	797,900.25	239,370.08	30.00
7758	Construcción de obras de mitigación de cárcava en Colonia Jardines del Boulevard, municipio de Soyapango, San Salvador		790,655.92	790,655.92	237,757.32	30.07
7905	Construcción del Recinto Fronterizo El Amatillo, municipio de Pasaquina, departamento de La Unión. (MOPT-FGEN)		775,504.78	775,504.78	775,504.78	100.00
7003	Mejoramiento de Camino Rural USU14N (Antigua calle a Santa Elena), tramo: By Pass de Usulután - municipio Santa Elena, departamento de Usulután		762,790.51	762,790.51	328,943.81	43.12
8149	Construcción de obras de protección en zona del malecón del Puerto de La Libertad, municipio y departamento de La Libertad		761,014.00	-	-	-
7684	Construcción de Puente sobre Río Ceniza, ruta Pedro Oldor Ramírez de Quiñónez, CA08W, tramo desde By Pass Norte hasta By Pass Sur, Limite Intermunicipal de Sonzacate e Izalco, departamento de Sonsonate		759,278.06	759,278.06	741,650.06	97.68
7902	Construcción de Sistema de Riego en los cantones San Rafael, Potrero Grande, La Cabaña y San Diego, municipio de El Paisnal, departamento de San Salvador. (MOPT-FGEN)		733,815.59	733,815.59	-	0.00
8287	Adquisición de equipo para recuperación de vías afectadas por eventos naturales en el AMSS y otros municipios priorizados		694,930.00	694,930.00	-	0.00

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
5939	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMMS		689,049.97	689,049.97	581,545.67	84.40
7947	Construcción de retorno de ingreso y salida sobre Bulevar Monseñor Romero (RN21W) hacia la calle al Volcán (LIB10N), municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad		643,694.63	643,694.63	643,694.63	100.00
8150	Adecuación de edificio para el funcionamiento del Instituto de Bienestar Animal (IBA) del MAG, municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad		598,171.44	598,171.44	553,292.41	92.50
3918	DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES		489,230.07	296,243.14	220,510.33	74.44
6442	Fortalecimiento Institucional Convenio JICA - By Pass de San Miguel		365,775.64	261,237.10	241,345.64	92.39
6934	Fortalecimiento Institucional - Programa FONPRODE		359,924.69	289,633.04	267,188.28	92.25
6545	Fortalecimiento Institucional Fondos Yucatán		274,023.00	234,022.64	178,822.64	76.41
6756	Fortalecimiento Institucional - Componente II (BID 3170/OC-ES)		227,834.00	174,634.00	173,434.00	99.31
7413	Construcción de Puente de doble carril en entrada principal a la Ciudad de Chilanga, Morazán		207,465.62	207,465.62	-	0.00
7411	Mejoramiento de Cancha España, municipio de San Sebastián, San Vicente		171,884.15	171,884.15	3,308.38	1.92
7756	Construcción de obras de mitigación de cárcava en Colonia La Campanera, municipio de Soyapango, San Salvador		110,635.00	-	-	-
5913	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAZ18W, TRAMO: VERAPAZ - JERUSALÉN - MERCEDES LA CEIBA Y RAMAL SAV21S, TRAMO: SAV18W - JERUSALÉN, DEPARTAMENTOS DE SAN VICENTE Y LA PAZ		105,932.00	105,932.00	92,231.42	87.07
7832	Construcción de ciclovía y obras complementarias en Avenida Jerusalén: Tramo: Redondel de las Naciones Unidas - Et. calle Las Jacarandas, departamentos de San Salvador y La Libertad		76,482.26	76,482.26	-	0.00
7505	Rehabilitación del puente de arcos sobre Río Quezalapa, ruta CUS11N, tramo Tenancingo-Tenango - Et. CUS18N, municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán		68,227.77	68,227.77	52,887.35	77.52
7514	Construcción de Hospital de Especialidades para atención de la emergencia por COVID-19, San Salvador		4,446.55	4,446.55	4,446.55	100.00
PNC - MJSP		11	50,178,718.80	8,998,848.80	4,545,594.40	50.51
8011	Equipamiento táctico, estratégico, tecnológico y de video vigilancia de la Policía Nacional Civil, a nivel nacional - PCT III		30,000,000.00	-	-	-
8173	Suministro e instalación de Sistema de Información de Operadores de Redes Móviles de Telecomunicaciones, para investigación y control de calidad de servicios de la PNC, San Salvador		10,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	50.00
8009	Mejoramiento y equipamiento médico para Clínicas, Policlínico y Laboratorios de la Policía Nacional Civil, a nivel nacional PCT III		5,730,200.00	-	-	-
8128	Suministro e instalación de generadores atmosféricos de agua potable para las dependencias de la PNC, a nivel nacional		998,848.80	998,848.80	545,594.40	54.62
7925	Construcción y equipamiento de puesto policial caserio El Mozote, cantón Guacamaya, municipio de Meanguera, departamento de Morazán		748,015.00	-	-	-
8246	Adecuación y ampliación de hangar del Grupo Aéreo Policial de la PNC, municipio de Ilopango, San Salvador		533,000.00	-	-	-
8290	Mejoramiento de Policlínico Policial, municipio y departamento de San Salvador		520,771.14	-	-	-
8233	Fortalecimiento Institucional de la División de Policía de Turismo (POLITUR), a nivel nacional		500,000.00	-	-	-
5673	Reemplazo de la Flota Vehicular de la Policía Nacional Civil		500,000.00	-	-	-
8289	Mejoramiento de estructura y cubierta de techo de almacén de suministros de la Subdirección de Administración, PNC, municipio y departamento de San Salvador		443,883.86	-	-	-
8247	Mejoramiento del sistema eléctrico en Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas de la PNC, municipio y departamento de San Salvador		204,000.00	-	-	-
CSJ		20	46,194,327.39	43,788,869.99	5,032,597.59	11.49
6631	Construcción del Centro Judicial en Materia Penal, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana		10,429,000.00	10,068,333.36	-	0.00
6630	Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango		7,949,435.00	6,958,392.00	-	0.00
6632	Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Usulután, Departamento de Usulután		6,608,500.00	6,463,020.86	-	0.00
7237	Construcción de Centro de Desarrollo Formativo y Atención Social del personal del Órgano Judicial		3,950,000.00	3,950,000.00	3,198,873.92	80.98
8124	Construcción de edificación para estacionamiento en el Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador		3,825,000.00	3,825,000.00	-	0.00
8188	Construcción y adecuación de espacios en el sexto nivel del Palacio Judicial de la Corte Suprema de Justicia, municipio y departamento de San Salvador		2,100,000.00	2,100,000.00	-	0.00
8003	Remodelaciones, ampliaciones y mejoras de la infraestructura institucional del Órgano Judicial a nivel nacional, año 2022		1,929,215.00	1,619,971.48	35,590.16	2.20
7216	Construcción de Almacén Regional Occidental DACI, Archivo Judicial y de Notariado y otras Dependencias del Órgano Judicial, Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana		1,725,625.00	1,636,250.00	-	0.00
6635	Construcción del Instituto de Medicina Legal, Región Occidental I, Departamento de Santa Ana		1,400,624.60	1,244,374.60	407,994.60	32.79
7533	Remodelaciones, ampliaciones y mejoras de la infraestructura institucional del Órgano Judicial a nivel nacional, año 2021		1,353,846.64	1,226,302.79	1,063,905.05	86.76
6634	Construcción del Instituto de Medicina Legal, Región Oriental III, Departamento de La Unión		1,000,625.00	844,375.00	-	0.00

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
6703	Construcción de Centro Judicial en el Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador		633,750.00	589,143.75	-	0.00
7159	Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán		625,000.00	625,000.00	-	0.00
7064	Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz		600,000.00	600,000.00	-	0.00
6627	Construcción de Bodegas para Archivo Judicial, Regional Paracentral, Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente		595,000.00	595,000.00	271,233.86	45.59
7158	Construcción de Centro Judicial en el Municipio y Departamento de San Vicente		575,000.00	575,000.00	-	0.00
8062	Construcción de Centro Judicial en el municipio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad		372,456.15	347,456.15	-	0.00
6685	Construcción de Centro Judicial en el Municipio y Departamento de San Miguel		316,250.00	316,250.00	-	0.00
4225	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR		150,000.00	150,000.00	-	0.00
7848	Ampliación de estacionamiento a doble nivel en el Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador		55,000.00	55,000.00	55,000.00	100.00
SE - MJSP		12	35,945,838.41	35,912,838.41	10,369,306.60	28.87
6963	Programa de Infraestructura para la recuperación y dinamización de espacios públicos 2019 - LA/2017/40-134		15,527,059.46	15,527,059.46	6,652,470.93	42.84
8205	Ampliación y equipamiento del Centro Penitenciario de Zacatecoluca, departamento de La Paz		6,000,000.00	6,000,000.00	1,341,327.85	22.36
6453	Programa de mejoramiento de espacios seguros de convivencia para jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)		3,667,915.00	3,667,915.00	-	0.00
6961	Fortalecimiento al sistema de Educación Pública para la prevención de la violencia y la Convivencia LA/2017/40-134		2,891,750.00	2,891,750.00	-	0.00
7910	Dotación de Flota Vehicular para apoyar labores de Seguridad Pública, a nivel nacional		2,067,472.60	2,067,472.60	1,350,000.00	65.30
6962	Programa de Fortalecimiento de atención a víctimas - LA/2017/40-134		1,488,481.12	1,488,481.12	114,146.12	7.67
6967	Fortalecimiento de Comités Municipales de Prevención de la Violencia en municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro - LA/2017/40-134		1,377,965.00	1,377,965.00	-	0.00
6968	Fortalecimiento Institucional - LA/2017/40-134		1,198,200.00	1,198,200.00	352,300.00	29.40
8199	Construcción y equipamiento de Sede Policial en cantón San Antonio Los Blancos, municipio de San Luis La Herradura, departamento de La Paz		662,015.00	662,015.00	-	0.00
8111	Construcción y equipamiento de Sede Policial en cantón El Zonte, municipio de Chiltiupán, departamento de La Libertad		559,214.74	559,214.74	559,061.70	99.97
8074	Fortalecimiento Institucional - PCT III		500,000.00	467,000.00	-	0.00
7222	Construcción de Sub Delegación Policial en Calle Principal del municipio de Olocuilta, departamento de La Paz		5,765.49	5,765.49	-	0.00
FGR		2	35,865,976.50	30,669,495.50	487,005.50	1.59
6093	Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República de El Salvador		35,113,045.00	30,191,655.00	-	0.00
6091	Actualización de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General de la República, a Nivel Nacional		752,931.50	477,840.50	487,005.50	101.92
DRTS - MJSP		4	27,880,950.00	27,880,950.00	-	0.00
8066	Construcción y equipamiento de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidad (CUBOS) en municipios priorizados, a nivel nacional - PCT II		15,486,680.00	15,486,680.00	-	0.00
8069	Construcción de infraestructura y equipamiento del Instituto Técnico Digital (ITD) en Sonsonate - PCT II		10,392,795.00	10,392,795.00	-	0.00
8067	Construcción de Skateparks e infraestructura para actividades deportivas en comunidades priorizadas, a nivel nacional - PCT II		1,325,020.00	1,325,020.00	-	0.00
8072	Fortalecimiento Institucional - PCT II		676,455.00	676,455.00	-	0.00
MINDEF		6	23,894,070.00	57,200.90	57,200.90	100.00
8014	Equipamiento de movilidad estratégica, táctico y de vigilancia del Ministerio de Defensa, a nivel nacional, PCT III		17,500,000.00	-	-	-
8015	Mejoramiento y equipamiento médico del Hospital Militar Central, municipio y departamento de San Salvador, PCT III		3,500,000.00	-	-	-
8084	Mejoramiento de Infraestructura de Clínicas de las Unidades Militares, a nivel nacional		1,145,455.40	-	-	-
8017	Equipamiento médico y odontológico para las clínicas de las Unidades Militares, a nivel nacional, PCT III		607,570.00	-	-	-
8085	Equipamiento de Clínicas de las Unidades Militares, a nivel nacional		604,544.60	57,200.90	57,200.90	100.00
8016	Equipamiento médico para el Hospital Militar Regional (HMR), municipio y departamento de San Miguel, PCT III		536,500.00	-	-	-
MH		9	22,228,947.24	7,095,741.31	3,672,712.29	51.76
7116	Programa de Mejora de la Gestión de los Tributos Internos - BID 3852/OC-ES		7,477,737.24	2,337,385.91	1,617,379.10	69.20
8194	Instalación y equipamiento de oficinas prefabricadas, construcción de obras hidráulicas y obras exteriores, en Parque de la Familia, municipio de Panchimalco, San Salvador		5,892,900.29	2,996,010.44	690,168.17	23.04
7118	Programa de Mejora de la Gestión de Información y Fortalecimiento Estratégico del Viceministerio de Ingresos y sus Recursos Humanos - BID 3852/OC-ES		3,773,500.00	892,448.32	782,076.33	87.63

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
7117	Programa de Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros - BID 3852/OC-ES		1,938,310.00	288,105.79	32,380.34	11.24
6916	Rehabilitación y equipamiento de edificio del Ministerio de Hacienda ubicado en intersección de Calle San Antonio Abad y Avenida Santa Mónica, municipio y departamento de San Salvador		1,150,000.00	10,245.14	10,245.14	100.00
7520	Mejoras a la Infraestructura Tecnológica de Recintos Administrados por la Dirección General de Aduanas a Nivel Nacional, para la Plena Incorporación de El Salvador al Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Personas y Mercancías		750,000.00	-	-	-
7119	Fortalecimiento Institucional - BID 3852/OC-ES		639,400.00	464,446.00	433,363.50	93.31
7639	Construcción y Equipamiento del nuevo Centro de Datos de la Dirección General de Aduanas, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador		500,000.00	-	-	-
8051	Rehabilitación, remodelación y equipamiento del edificio Tres Torres del Ministerio de Hacienda, San Salvador		107,099.71	107,099.71	107,099.71	100.00
DGCP - MJSP		6	19,914,635.00	313,044.87	313,044.87	100.00
7555	Construcción y Equipamiento de Cocinas Industriales en Centros Penales priorizados a nivel nacional		9,138,900.00	-	-	-
7556	Ampliación y Equipamiento del Centro Penal de Izcalco, Fase II, departamento de Sonsonate		8,961,635.00	-	-	-
8055	Construcción y equipamiento de taller de servicio automotriz en el Centro de Detención Menor La Esperanza, municipio de Ayutuxtepeque, San Salvador		750,000.00	-	-	-
8056	Ampliación y equipamiento de taller de confección textil en el Centro Preventivo y de cumplimiento de Penas La Esperanza, municipio de Ayutuxtepeque, San Salvador		500,000.00	-	-	-
8057	Fortalecimiento de la estrategia de apoyo interinstitucional y comunitario de la Dirección General de Centros Penales, a nivel nacional		300,000.00	298,944.87	298,944.87	100.00
6162	Fortalecimiento Institucional Préstamo BCIE 2102		264,100.00	14,100.00	14,100.00	100.00
MAG		10	16,540,997.65	10,521,911.44	9,876,655.04	93.87
7200	Programa de Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros en El Salvador		7,850,000.00	4,354,246.22	4,186,918.92	96.16
6400	Programa Nacional de Transformación Económica Rural para el Buen Vivir - Rural Adelante		4,750,000.00	3,846,285.00	3,846,285.00	100.00
8022	Programa de Modernización y Fortalecimiento del MAG, Fase I		1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	100.00
7580	Mejoramiento de la infraestructura informática y sistemas del MAG y de puntos fronterizos, para facilitar el comercio en El Salvador		1,000,000.00	365,881.93	217,564.50	59.46
7297	Rehabilitación de Pozos y Estaciones de Bombeo para el Incremento de la Capacidad Productiva del Distrito de Riego y Avenamiento No.1 Zapotitán.		1,000,000.00	262,226.18	-	0.00
7578	Construcción de Módulos para Cultivo de Tilapia, en fomento al desarrollo de la Acuicultura Familiar, a nivel nacional		246,000.00	240,974.20	176,422.00	73.21
7577	Construcción y Equipamiento de Pozo Industrial en la Estación Acuicola de Santa Cruz Porrillo, municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente		235,000.00	-	-	-
7302	Apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el Proceso de Admisibilidad de Productos Avícolas y de Productos que Contengan más del 2% de Carne de Aves, al Mercado de los Estados Unidos de América, Mediante la Equivalencia de Sistemas		200,197.65	200,197.65	198,864.36	99.33
5562	Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF)		76,800.00	76,800.00	76,800.00	100.00
8169	Reactivación de Vivero Forestal Estatal en el Centro de Desarrollo Forestal (CEDEFOR)		12,000.00	4,300.26	2,800.26	65.12
MIGOBTD		10	16,473,532.37	7,176,307.92	2,885,730.18	40.21
7503	Construcción de infraestructura, suministro e instalación de equipo de producción gráfica en la Imprenta Nacional, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador		3,800,000.00	355,967.80	11,204.80	3.15
7594	Dotación de equipo de protección para personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador		3,274,992.70	2,968,719.15	1,786,519.15	60.18
7948	Equipamiento del Sistema Nacional de Protección Civil para prevención ante emergencias, a nivel nacional		2,669,050.38	2,669,050.38	461,388.00	17.29
7598	Equipamiento y dotación de suministros para nueva Planta de Operaciones de la Imprenta Nacional, municipio y departamento de San Salvador		2,411,780.00	71,700.98	39,187.98	54.65
8195	Mejoramiento y equipamiento de Estaciones del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, a nivel nacional		1,800,000.00	283,659.36	-	0.00
7590	Construcción de sucursales, mejoramiento de edificaciones existentes y renovación de flota vehicular de Correos de El Salvador, a nivel nacional		750,000.00	-	-	-
7591	Mejoramiento de la Infraestructura Informática de Correos de El Salvador, a nivel nacional		619,695.00	599,037.96	359,257.96	59.97
7596	Suministro e instalación de sistema de video vigilancia de quebradas y afluentes de mayor riesgo del AMSS		500,000.00	-	-	-
7553	Mejoramiento de cubierta de techo con sus accesorios, instalación de ventanas e iluminación del Área Operativa de la Imprenta Nacional, San Salvador		419,842.00	-	-	-
8002	Adquisición de Impresora Rotativa para la modernización de la Imprenta Nacional, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador - Fase II		228,172.29	228,172.29	228,172.29	100.00
MINDEL		5	12,266,830.00	4,724,077.00	1,100,000.00	23.28
8163	Programa para la Erradicación de la Pobreza, a nivel nacional: Componente Desarrollo y Protección Social		5,780,335.00	4,645,372.00	1,100,000.00	23.68

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
7612	Construcción y Equipamiento de edificaciones para la Facultad Multidisciplinaria de la Universidad de El Salvador, municipio y departamento de Chalatenango		2,500,000.00	-	-	-
7613	Construcción y Equipamiento de edificaciones para la Facultad Multidisciplinaria de la Universidad de El Salvador, municipio de San Francisco Gotera, departamento de Morazán		2,500,000.00	-	-	-
6454	Programa de inclusión productiva en el marco de programas sociales en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador		1,407,790.00	-	-	-
4472	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV		78,705.00	78,705.00	-	0.00
MIVI		5	10,461,416.67	4,514,004.70	2,795,097.74	61.92
5397	RESCATE DE LA FUNCION HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE SAN SALVADOR MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA.		5,691,050.00	171,694.27	124,781.58	72.68
7841	Programa de construcción y dotación de vivienda social para familias en condiciones de vulnerabilidad, a nivel nacional		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
8147	Construcción de Complejo Habitacional La Breaña, municipio de San Martín, departamento de San Salvador		2,000,000.00	1,579,137.94	180,001.93	11.40
6903	Programa de Mejoramiento de Viviendas para familias de escasos recursos, a nivel nacional		767,700.00	760,505.82	487,647.56	64.12
6612	Programa de Desarrollo Habitacional en el Caserio El Mozote y lugares aledaños, Departamento de Morazán		2,666.67	2,666.67	2,666.67	100.00
MINEC		5	9,900,492.74	8,358,008.66	7,491,180.28	89.63
8148	Fortalecimiento para implementar el proceso de simplificación de trámites y servicios asociados al comercio e inversiones en El Salvador		5,608,293.01	5,608,293.01	5,239,935.06	93.43
6613	Programa de Corredores Productivos - Componentes I, III y IV (BID 3170/OC-ES)		3,092,199.73	2,465,072.07	2,159,637.24	87.61
8020	Capacitación y certificación en habilidades digitales e idioma inglés para promover la competitividad, a nivel nacional		500,000.00	194,738.28	80,183.68	41.18
8077	Fortalecimiento de capacidades técnicas para el fomento de la competitividad empresarial en sectores industriales priorizados, a nivel nacional		500,000.00	15,187.20	10,441.20	68.75
8076	Fortalecimiento de capacidades técnicas para la gestión sistémica de la innovación al interior de las PYMES, a nivel nacional		200,000.00	74,718.10	983.10	1.32
MICULTURA		10	6,128,547.42	1,274,750.45	270,964.83	21.26
8050	Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la Escuela Nacional de Danza Morena Celarí y del Centro Nacional de Artes, municipio y departamento de San Salvador - PCT II		1,200,000.00	-	-	-
8094	Programa de conservación, restauración, mejoramiento, construcción y equipamiento de espacios patrimoniales, culturales y sitios arqueológicos, a nivel nacional		1,000,000.00	466,342.34	-	0.00
7984	Mejoramiento y equipamiento de Casas de la Cultura, a nivel nacional - PCT II		891,645.00	-	-	-
7269	Programa de Mejoramiento y Equipamiento de Infraestructura Cultural y Arqueológica a Nivel Nacional		650,175.00	201,561.36	12,382.68	6.14
7644	Ampliación, mejoramiento y equipamiento de la red de museos y salas de exposición a nivel nacional, y adecuación de instalaciones para la puesta en funcionamiento del Museo Nacional de Artes Visuales de El Salvador		500,000.00	30,000.00	-	0.00
7654	Actualización de inventario de Bienes Culturales Inmuebles para contribuir en los procesos de revitalización de Centros Históricos, a nivel nacional		500,000.00	345,119.60	29,655.00	8.59
7796	Mejoramiento, rehabilitación y restauración del Palacio Nacional de El Salvador y sus bienes culturales muebles - PCT II		500,000.00	-	-	-
8049	Mejoramiento y equipamiento de los Teatros Nacionales de los departamentos de San Salvador, Santa Ana y San Miguel - PCT II		445,000.00	-	-	-
7648	Programa de mejoramiento de infraestructura y equipamiento de Casas de la Cultura y Cubos, a nivel nacional, enmarcado en el Plan Control Territorial fase 2		231,727.42	231,727.15	228,927.15	98.79
7985	Adecuación y equipamiento de Bibliotecas Móviles, a nivel nacional - PCT II		210,000.00	-	-	-
PGR		3	2,308,492.17	2,042,644.17	1,679,833.37	82.24
6698	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL		2,089,544.77	1,823,696.77	1,619,965.97	88.83
7870	Mejoramiento y equipamiento de la PGR, para brindar servicios virtuales por la pandemia Covid-19, a nivel nacional		159,080.00	159,080.00	-	0.00
7979	Mejoramiento y equipamiento de las Oficinas Centrales de la Procuraduría General de la República, San Salvador		59,867.40	59,867.40	59,867.40	100.00
MTYPS		5	1,148,225.94	448,225.94	74,625.94	16.65
7576	Mejoramiento en Infraestructura y Equipamiento de los Centros de Recreación del MTPS que funcionaron como Centros de Contención durante la Pandemia por COVID19		500,000.00	-	-	-
7206	Mejoramiento de infraestructura y equipamiento básico en Oficinas Centrales y Regionales del MTYPS, para atención de personas retornadas y grupos vulnerables		300,000.00	120,000.00	-	0.00
8004	Desarrollo de un Sistema Integrado de Servicios de Relaciones Laborales y Organizaciones Sindicales para la Dirección General de Trabajo del MTPS, San Salvador		200,000.00	180,000.00	-	0.00

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
7802	Desarrollo de Sistema Informático para modernizar el Sistema Nacional de Inspección de Trabajo y Visitas Técnicas del MTPS		103,040.00	103,040.00	29,440.00	28.57
7797	Suministro e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado Central en Edificio 2 de Oficinas Centrales del MTPS, San Salvador		45,185.94	45,185.94	45,185.94	100.00
MARN		7	1,012,588.69	880,803.44	687,246.18	78.02
7243	Fortalecimiento de las Capacidades del MARN para la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y Vida Silvestre		340,338.85	334,458.68	304,226.68	90.96
7611	Renovación de redes de monitoreo del Observatorio Nacional de Amenazas y de los Recursos Naturales, a nivel nacional		189,630.00	72,042.80	61,536.05	85.42
7560	Construcción de obras de mitigación y reparación de bodegas de almacenamiento de elementos contaminados por plomo en ex fábrica Baterías de El Salvador, municipio de San Juan Opico, La Libertad		143,119.44	143,119.44	-	0.00
7242	Fortalecimiento de la Dirección General del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, para la Prevención y Reducción de Riegos a nivel nacional		142,494.99	138,105.33	135,705.33	98.26
7346	Implementación de acciones para la reducción y/o eliminación de fuentes de contaminación que afectan la calidad del agua del Río Santa Rosa, en la Cuenca del Río Goascorán		91,772.19	89,272.19	89,272.19	100.00
7566	Construcción y equipamiento de cabañas y casetas, y adquisición de equipo de vigilancia para Áreas Naturales Protegidas, a nivel nacional		66,250.00	66,172.71	66,172.71	100.00
7561	Construcción de obras para tratamiento de drenaje ácido en ex mina San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión		38,983.22	37,632.29	30,333.22	80.60
MITUR		1	935,781.00	935,781.00	759,980.00	81.21
5833	Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero-Marina		935,781.00	935,781.00	759,980.00	81.21
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS						
CEL		4	169,433,622.25	161,375,167.25	111,353,437.48	69.00
3119	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL		167,520,572.25	159,858,492.25	111,252,202.47	69.59
5570	Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana.		1,247,405.00	1,190,265.00	50,311.62	4.23
5801	Programa de eficiencia energética en instalaciones de CEL		652,665.00	313,570.00	50,923.39	16.24
5821	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre		12,980.00	12,840.00	-	0.00
ANDA		13	51,049,727.50	46,825,023.86	26,032,556.18	55.60
5817	REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR.		30,844,575.91	30,016,249.94	17,671,107.21	58.87
8021	Programa de mejora de infraestructura y servicios, para optimizar el suministro de agua potable, a nivel nacional		7,361,134.60	5,922,162.01	7,169,150.39	121.06
7135	Introducción de agua potable y obras de saneamiento en cantón San Sebastián, municipio Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión		2,496,990.23	2,396,990.23	201,063.16	8.39
7136	Programa de construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del Sub Sector de agua potable y saneamiento. Fase I		2,370,682.67	2,138,329.67	449,667.12	21.03
8065	Programa de mejoramiento de sistemas de agua potable en municipios seleccionados, a nivel nacional - PCT II		2,300,000.00	2,050,000.00	-	0.00
6933	Programa de perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional. Primera Etapa		1,328,703.09	1,208,723.09	229,028.69	18.95
6660	Mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad		1,000,000.00	412,704.43	-	0.00
6661	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador		1,000,000.00	995,663.49	4,400.22	0.44
7662	Introducción de agua potable en zona Surf City, departamento de La Libertad		1,000,000.00	600,000.00	-	0.00
8171	Suministro e instalación de dos sistemas móviles de plantas desalinizadoras y purificadoras de agua, cantones El Majahual y San Diego, municipio y departamento de La Libertad		600,000.00	600,000.00	-	0.00
6651	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador		485,190.00	366,000.00	206,139.39	56.32
7859	Construcción de Política Pública que garantice la sostenibilidad del Subsector de Agua Potable y Saneamiento en el área rural - FASE II		144,250.00	-	-	-
5584	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.		118,201.00	118,201.00	102,000.00	86.29
CEPA		9	44,695,802.71	24,449,552.71	5,613,853.36	22.96
7177	Ampliación del área de registro de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez		10,000,000.00	9,000,000.00	-	0.00
8362	Construcción y equipamiento de nueva bodega en el Puerto de Acajutla		7,200,000.00	-	-	-
7176	Construcción de la calle de rodaje Foxtrot en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez		6,300,000.00	-	-	-
7182	Ampliación del Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla, Etapa II		6,006,549.87	5,972,799.87	2,390,784.11	40.03
7476	Mejoramiento de la infraestructura eléctrica del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez		5,000,000.00	1,750,000.00	-	0.00
8006	Ampliación de estacionamiento del Aeropuerto Internacional de El Salvador		5,000,000.00	2,625,000.00	-	0.00
6487	Ampliación de Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.		4,389,252.84	4,389,252.84	3,223,069.25	73.43

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
6622	Perforación y Equipamiento de Pozo No. 3 del Puerto de Acajutla, Sonsonate		450,000.00	397,500.00	-	0.00
6872	Perforación y equipamiento de pozo No 5 en planta de tratamiento de agua potable del Aeropuerto Internacional de El Salvador		350,000.00	315,000.00	-	0.00
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES						
DOM		11	378,138,335.37	117,678,957.83	111,994,317.68	95.17
8151	Programa de Obras Municipales para Infraestructura Vial a nivel nacional, año 2022		201,678,780.00	69,293,665.68	69,292,699.92	100.00
8133	Programa de Obras Municipales a nivel nacional, año 2021		44,800,407.37	42,258,789.96	36,575,206.12	86.55
8153	Programa de Obras Municipales a nivel nacional, año 2022		35,709,868.00	3,914,127.95	3,914,037.40	100.00
8206	Construcción y equipamiento del Edificio de Consulta Externa Especializada y Hospital de Día, anexo al Hospital Nacional Rosales, municipio y departamento de San Salvador		26,061,765.00	-	-	-
8152	Programa de Obras Municipales para Infraestructura y Equipamiento de Centros Educativos a nivel nacional, año 2022		25,209,840.00	1,819,639.10	1,819,639.10	100.00
7994	Programa de Inversiones en Servicios e Infraestructura Municipal Resiliente para apoyar el Desarrollo Económico Local - Componente 1, BIRF 8948-SV		18,200,000.00	-	-	-
8358	Programa de mejora de la calidad y expansión de la oferta de Educación Parvularia (Subc. 1.2) y Centros de Desarrollo Infantil (Subc. 1.3): Infraestructura. BID 5080/OC-ES		8,826,210.00	-	-	-
7995	Programa de Inversiones de Alto Impacto en Desarrollo Económico Regional (Fondo Competitivo) - Componente 2, BIRF 8948-SV		8,800,000.00	-	-	-
8155	Programa para la Erradicación de la Pobreza, a nivel nacional: Componente Infraestructura Social Básica		4,219,665.00	255,054.31	255,054.31	100.00
7997	Programa de Gestión e Implementación del Proyecto Desarrollo Económico Local Resiliente - Componente 5, BIRF 8948-SV		2,631,800.00	137,680.83	137,680.83	100.00
7996	Programa de Fortalecimiento Institucional y Construcción de Capacidad - Componente 3, BIRF 8948-SV		2,000,000.00	-	-	-
INDES		19	94,968,435.00	60,388,817.82	2,165,481.30	3.59
7316	Mejoramiento del Estadio Nacional Jorge Mágico González, San Salvador		19,470,630.00	13,851,841.51	278,671.02	2.01
7318	Mejoramiento del Gimnasio Nacional Jose Adolfo Pineda, departamento de San Salvador		18,800,340.00	12,506,989.34	708,513.69	5.66
7326	Mejoramiento de Complejo Deportivo El Polvorín, departamento de San Salvador		13,331,500.00	9,627,668.12	356,101.20	3.70
7331	Mejoramiento del Palacio Nacional de los Deportes Carlos El Famoso Hernández, San Salvador		9,652,965.00	-	-	-
7325	Remodelación y equipamiento de Complejo Deportivo de Ciudad Merliot, departamento de La Libertad		9,272,505.00	6,083,894.81	129,066.38	2.12
8075	Fortalecimiento Institucional para el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023		7,283,305.00	5,875,657.10	477,332.10	8.12
7472	Suministro e instalación de pantallas electrónicas para escenarios deportivos, departamentos de San Salvador y La Libertad		5,847,005.00	4,872,504.15	-	0.00
7330	Mejoramiento de Estadio Las Delicias, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad		3,481,435.00	2,458,396.60	-	0.00
7324	Mejoramiento de Parque de Pelota Saturnino Bengoa, municipio y departamento de San Salvador		2,337,175.00	1,951,889.83	78,747.74	4.03
7317	Mejoramiento de Estadio de Softbol Pablo Arnoldo Guzmán, departamento de San Salvador		2,192,525.00	1,786,252.29	48,464.82	2.71
7322	Mejoramiento de Complejo Deportivo Ex finca Modelo, municipio y departamento de Santa Ana		977,000.00	-	-	-
8354	Mejoramiento del Complejo Deportivo Universitario de la UES para los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023		800,000.00	-	-	-
8078	Mejoramiento de Villa Centroamericana, municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador		500,000.00	500,000.00	-	0.00
7313	Mejoramiento de Complejo de Ecuestre, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad		499,050.00	415,742.83	-	0.00
7976	Construcción de Salón Multisensorial y espacio de oficinas en Ciudad Deportiva Inclusiva INDES, municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador		175,000.00	144,423.88	-	0.00
8079	Construcción de área de Archivo en el Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, San Salvador		87,000.00	87,000.00	41,381.09	47.56
8080	Mejoramiento de piscina semi olimpica en Complejo Deportivo INDES, municipio y departamento de San Miguel		87,000.00	87,000.00	29,502.23	33.91
8081	Construcción de vestidores y servicios sanitarios en Complejo Deportivo INDES, municipio y departamento de Usulután		87,000.00	52,557.36	-	0.00
8082	Mejoramiento de Complejo Deportivo INDES El Campito, municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán		87,000.00	87,000.00	17,701.03	20.35
ISSS		6	17,700,000.00	11,600,000.00	3,303,431.82	28.48
7218	Adecuación de infraestructura y equipamiento para Centro de Cuidados Paliativos y Enfermedades Crónicas Complejas y Avanzadas del ISSS, San Salvador		5,500,000.00	3,000,000.00	2,630,743.25	87.69
7949	Adquisición, Adecuación y Equipamiento de Instalaciones para la Unidad Médica del ISSS, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad		5,000,000.00	4,000,000.00	178,797.50	4.47
8025	Construcción y equipamiento de instalaciones para implementar el Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas, en Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico del ISSS, San Salvador		3,500,000.00	2,000,000.00	930.00	0.05

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
7914	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Emergencia y Máxima Urgencia en el Hospital Médico Quirúrgico, San Salvador		2,300,000.00	1,800,000.00	399,669.04	22.20
6974	Ampliación y mejoramiento del Almacén del ISSS para la Zona Oriental, departamento de Usulután		900,000.00	550,000.00	93,292.03	16.96
5363	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL POLICLINICO PLANES DE RENDERO, SAN SALVADOR		500,000.00	250,000.00	-	0.00
CNR		1	10,000,000.00	9,927,493.82	5,440,049.55	54.80
8064	Desarrollo de Sistema de Información Geográfico para levantamiento y actualización del catastro nacional		10,000,000.00	9,927,493.82	5,440,049.55	54.80
ISNA		11	6,912,331.25	5,872,592.39	4,175,354.60	71.10
8196	Mejoramiento de Centros de Integración Social de El Espino (Ahuachapán), Ilobasco (Cabañas), Tonacatepeque, Ilopango, y de Resguardo, en San Salvador		5,154,760.00	4,498,397.76	2,946,474.62	65.50
7789	Mejoramiento de Centro Infantil de Protección Inmediata, municipio y departamento de San Salvador		703,434.56	703,434.56	703,434.56	100.00
8319	Construcción y mejoramiento de calles internas del ISNA Central, municipio y departamento de San Salvador		380,000.00	114,000.00	-	0.00
7850	Rehabilitación de Edificio La Estrella 2 en instalaciones de ISNA, Colonia Costa Rica, San Salvador		205,022.65	205,022.65	202,490.41	98.76
8210	Mejoramiento de edificio Estrella 2 en instalaciones del ISNA, Colonia Costa Rica, San Salvador		100,000.00	82,623.38	61,724.20	74.71
8213	Mejoramiento de Área de Atención Psicosocial del ISNA, colonia Costa Rica, municipio y departamento de San Salvador		100,000.00	-	-	-
7776	Mejoramiento de Centro de Inserción Social de Tonacatepeque, departamento de San Salvador		72,162.94	72,162.94	72,162.94	100.00
7784	Mejoramiento de Centro de Acogimiento Hogar Marillac, municipio y departamento de Sonsonate		69,470.00	69,470.00	62,647.08	90.18
7778	Mejoramiento de Centro de Inserción Social Senderos de Libertad, municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas		61,252.03	61,252.03	60,191.72	98.27
7777	Mejoramiento de Centro de Inserción Social Femenino, municipio de Ilopango, departamento San Salvador		41,332.77	41,332.77	41,332.77	100.00
8118	Mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias del costado nor-oriental del Centro de Acogimiento Hogar del Niño San Vicente de Paul, municipio y departamento de San Salvador		24,896.30	24,896.30	24,896.30	100.00
ENA		2	5,087,511.31	3,190,645.40	1,314,171.43	41.19
7923	Rehabilitación de Infraestructura y suministro de mobiliario básico de dormitorios, aulas y laboratorio de la Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñónez (ENA)		2,556,865.91	660,000.00	907,586.78	137.51
6882	Transformación de la Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñónez (ENA) en Instituto Especializado de Nivel Superior		2,530,645.40	2,530,645.40	406,584.65	16.07
ISBM		4	3,509,646.87	1,457,426.87	243,220.08	16.69
7516	Adecuación y equipamiento de Policlínico Magisterial, Unidad de Terapia Dialítica y Clínica de pre-dialisis del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, ante la emergencia por Covid-19, San Salvador		1,285,426.87	1,285,426.87	243,220.08	18.92
6674	Construcción y equipamiento de Policlínico Magisterial de La Unión, municipio y departamento de La Unión		1,039,315.00	60,000.00	-	0.00
7138	Mejoramiento de áreas para servicios médicos y complementarias en Policlínico Magisterial de Santa Tecla, departamento de La Libertad		712,000.00	112,000.00	-	0.00
8230	Adquisición de ambulancias para Policlínicos Magisteriales del ISBM, en municipios y departamentos de San Salvador, Santa Ana y San Miguel		472,905.00	-	-	-
INSAFORP		2	3,400,000.00	1,315,760.00	-	0.00
8355	Mejoramiento de infraestructura del Centro de Formación Profesional del INSAFORP en San Bartolo, municipio de Ilopango, San Salvador		2,084,240.00	-	-	-
6681	Readecuación de instalaciones del Centro de Formación Profesional del INSAFORP en San Bartolo, Ilopango, S.S., para el establecimiento y equipamiento del Centro de Excelencia en Tecnologías de Autotónica (CETA)		1,315,760.00	1,315,760.00	-	0.00
ISTU		2	2,107,341.11	1,516,820.08	1,449,607.38	95.57
6280	Mejoramiento y acondicionamiento del Centro Recreativo Puerta del Diablo, Cantón Planes de Renderos, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador		1,507,341.11	916,820.08	869,001.03	94.78
8183	Construcción de Obras Complementarias y suministro de sistema de comercialización para el Parque de Diversiones del Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, municipio y departamento de La Libertad		600,000.00	600,000.00	580,606.35	96.77
ANSP - MJSP		4	1,891,534.40	415,127.77	415,127.77	100.00
6952	Mejoramiento de la Red de Agua potable y Aguas negras, e Instalación de Paneles Fotovoltaicos en la ANSP Sede Comalapa, San Luis Talpa, Dpto. de La Paz		1,000,000.00	-	-	-
7825	Mejoramiento de infraestructura y equipamiento para la ANSP, sede Santa Tecla, La Libertad		444,090.00	53,556.81	53,556.81	100.00
7147	Renovación de flota vehicular de la ANSP, sede San Luis Talpa, departamento de La Paz		358,784.40	358,784.40	358,784.40	100.00
7824	Mejoramiento de infraestructura y equipamiento para la ANSP, sede San Luis Talpa, La Paz		88,660.00	2,786.56	2,786.56	100.00

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2022, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
CONNA		7	1,291,200.68	933,727.47	384,588.54	41.19
8093	Fortalecimiento del Sistema Informático del CONNA para interconexión con las entidades del Sistema Nacional de Protección		450,000.00	446,000.00	41,516.13	9.31
8095	Ampliación y mejoramiento del Centro de Atención Integral (CAI) y de la cafetería institucional del CONNA-ISNA, colonia Costa Rica, San Salvador		423,900.68	400,319.27	258,835.39	64.66
8091	Mejoramiento de salón de usos múltiples en Hogar del Niño Adalberto Guirola, sede del CONNA de Santa Tecla, La Libertad		270,000.00	-	-	-
8190	Equipamiento de clínica y cafetería institucionales del CONNA - ISNA, Colonia Costa Rica, San Salvador		65,000.00	5,527.80	2,356.62	42.63
7815	Fortalecimiento de las capacidades operativas territoriales del CONNA, a nivel nacional		37,900.00	37,900.00	37,900.00	100.00
8090	Adecuación de clínica institucional del CONNA, municipio y departamento de San Salvador		30,000.00	29,580.40	29,580.40	100.00
8089	Mejoramiento de estructura y cubierta de techo en edificio de la sede central del CONNA, San Salvador		14,400.00	14,400.00	14,400.00	100.00
ISRI		3	1,250,333.19	550,978.19	491,057.66	89.12
8063	Construcción de infraestructura y equipamiento de la Unidad de Docencia e Investigación del ISRI, San Salvador		699,355.00	-	-	-
4763	Construcción y remodelación de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Occidente, Santa Ana		465,277.26	465,277.26	406,483.95	87.36
6695	Mejoramiento de infraestructura en áreas física, técnica y administrativa, del Centro de Rehabilitación de Oriente del ISRI, San Miguel		85,700.93	85,700.93	84,573.71	98.68
UES		1	1,000,000.00	1,000,000.00	-	0.00
7917	Construcción y equipamiento de Edificio para Centro de Desarrollo Infantil, sede central de la Universidad de El Salvador		1,000,000.00	1,000,000.00	-	0.00
ISDEMU		2	603,967.75	593,128.02	465,130.11	78.42
7986	Fortalecimiento y equipamiento de las sedes departamentales del ISDEMU, a nivel nacional		405,000.00	394,179.89	283,281.98	71.87
7538	Fortalecimiento de las capacidades productivas, autonomía y derechos económicos de las mujeres, en zonas rurales y urbanas de municipios priorizados, a nivel nacional		198,967.75	198,948.13	181,848.13	91.40
CORSATUR		1	300,000.00	294,709.27	294,709.27	100.00
7229	Mejoramiento de la infraestructura física del Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, departamento de La Libertad		300,000.00	294,709.27	294,709.27	100.00
INJUVE		1	24,273.00	24,273.00	-	0.00
5770	Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias - FOCAF		24,273.00	24,273.00	-	0.00
OTRAS						
FOVIAL		9	353,438,443.00	126,065,527.29	49,875,080.16	39.56
8172	Programa de Inversiones Adicionales al Mantenimiento, Fase II		178,290,834.00	66,035,881.01	5,593,120.36	8.47
8061	Programa de Inversiones Adicionales al Mantenimiento		91,435,562.15	11,033,393.92	9,562,977.98	86.67
7173	Programa de Mantenimiento Rutinario de Vías Pavimentadas a Nivel Nacional 2022 - Componente de inversión		48,931,652.84	44,010,549.07	33,815,122.73	76.83
7169	Programa de Mantenimiento Periódico 2022		29,342,436.00	992,436.00	334,254.67	33.68
7165	Programa de Señalización y Seguridad Vial 2022		2,701,370.00	1,860,960.00	300,821.44	16.16
7161	Programa de Mantenimiento de Puentes y Obras de Paso 2022		2,230,430.01	1,701,812.96	57,317.55	3.37
7160	Programa de Mantenimiento de Puentes y Obras de Paso 2021		200,000.00	200,000.00	107,462.21	53.73
7168	Programa de Mantenimiento Periódico 2021		200,000.00	200,000.00	104,003.22	52.00
5960	MEJORAMIENTO DE VIAS E INTERSECCIONES A NIVEL NACIONAL		106,158.00	30,494.33	-	0.00
CEFAFA		6	4,026,205.00	3,747,343.00	1,077,079.80	28.74
7068	Construcción de edificio para estacionamiento, anexo al Hospital Militar Central, San Salvador		1,446,205.00	1,325,687.00	771,159.90	58.17
7808	Ampliación de la Unidad de Medicina de Rehabilitación Temporal del Hospital Militar Central, San Salvador		1,000,000.00	916,663.00	-	0.00
7897	Adecuación y equipamiento de unidad de Resonancia Magnética del Hospital Militar Central, San Salvador		500,000.00	458,330.00	16,385.90	3.58
7809	Ampliación de la Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del Hospital Militar Regional, San Miguel		400,000.00	366,663.00	-	0.00
7810	Construcción y equipamiento de un Centro de Rehabilitación Permanente, adjunto al Hospital Militar Central, San Salvador		380,000.00	380,000.00	-	0.00
7898	Equipamiento de la Unidad de Oncología del Hospital Militar Central, San Salvador		300,000.00	300,000.00	289,534.00	96.51
FSV		2	2,220,000.00	732,880.00	302,382.97	41.26
8185	Mejoramiento de las Oficinas Centrales del FSV, municipio y departamento de San Salvador		2,054,074.50	732,880.00	302,382.97	41.26
6027	AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA , SAN SALVADOR		165,925.50	-	-	-

CODIGO	INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
ASA		12	1,441,399.32	1,061,206.20	361,635.47	34.08
8184	Construcción del Centro de Interpretación Ambiental en mirador de Surf City, municipio y departamento de La Libertad		475,449.62	181,957.56	-	0.00
8182	Implementación de soluciones tecnológicas para aprovechamiento de recursos naturales, a nivel nacional		276,000.00	264,547.00	264,547.00	100.00
8129	Arborización de áreas verdes en avenida Jerusalén, Tramo: Redondel de las Naciones Unidas-calle Las Jacarandas, departamentos de San Salvador y La Libertad		243,852.85	177,015.89	17,379.97	9.82
7534	Fortalecimiento de la gestión integral de los recursos naturales y su sostenibilidad en el departamento de La Libertad		175,904.68	175,904.68	-	0.00
7845	Implementación de medidas de compensación ambiental en zona del by-pass de San Miguel		124,810.54	116,399.44	-	0.00
7519	Implementación de Centro Regional de Semillas Forestales para distribución, conservación y restauración ecológica en El Salvador, Fase I		95,182.94	95,182.94	76,403.25	80.27
8202	Adquisición de equipo para estudios de batimetría del Recurso Hídrico en los cuerpos de agua de El Salvador		25,340.25	25,340.25	3,305.25	13.04
7912	Conservación de especies de Tortugas Marinas y del Medio Ambiente en playa caserio El Espino, cantón Barra de Santiago, municipio de Jujutla, Ahuachapán		12,500.00	12,500.00	-	0.00
7517	Implementación de obras de Compensación Ambiental en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, La Libertad y La Paz		6,248.75	6,248.75	-	0.00
6888	Plan de Restauración Ambiental en la Cuenca del Río Las Cañas, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador		5,249.69	5,249.69	-	0.00
7130	Restauración ambiental en los márgenes del Río Amolunca, municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán		800.00	800.00	-	0.00
7129	Restauración ambiental en la Reserva de la Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, cantón Las Lagunetas, municipio de Citalá, departamento de Chalatenango		60.00	60.00	-	0.00
FONAES		10	618,878.55	618,878.55	618,878.55	100.00
8184	Construcción del Centro de Interpretación Ambiental en mirador de Surf City, municipio y departamento de La Libertad		276,628.13	276,628.13	276,628.13	100.00
7519	Implementación de Centro Regional de Semillas Forestales para distribución, conservación y restauración ecológica en El Salvador, Fase I		155,493.22	155,493.22	155,493.22	100.00
7517	Implementación de obras de Compensación Ambiental en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, La Libertad y La Paz		61,482.25	61,482.25	61,482.25	100.00
8129	Arborización de áreas verdes en avenida Jerusalén, Tramo: Redondel de las Naciones Unidas-calle Las Jacarandas, departamentos de San Salvador y La Libertad		51,430.88	51,430.88	51,430.88	100.00
7845	Implementación de medidas de compensación ambiental en zona del by-pass de San Miguel		26,739.31	26,739.31	26,739.31	100.00
7930	Restauración de ecosistemas y paisajes en zonas de recuperación del Área Natural Protegida Walter Thilo Deininger, y reforestación de rotondas en Bypass de La Libertad, departamento de La Libertad		21,850.60	21,850.60	21,850.60	100.00
7912	Conservación de especies de Tortugas Marinas y del Medio Ambiente en playa caserio El Espino, cantón Barra de Santiago, municipio de Jujutla, Ahuachapán		16,250.00	16,250.00	16,250.00	100.00
7513	Plan de Restauración de 14.81 manzanas a través de reforestación y hábitat para la vida silvestre en el Área Natural Protegida Zanjón El Chino, municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán		4,233.16	4,233.16	4,233.16	100.00
6948	Plan de Restauración Ambiental en la Cuenca del Río Jiboa, departamento de La Paz		4,194.00	4,194.00	4,194.00	100.00
7128	Restauración ambiental en colonia Casa Blanca, municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana		577.00	577.00	577.00	100.00
FONAVIPO		5	111,780.00	94,019.73	61,096.19	64.98
5085	CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		95,970.00	78,289.73	60,499.28	77.28
5371	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de San Vicente		14,000.00	14,000.00	-	0.00
5503	CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		1,000.00	950.00	386.92	40.73
5372	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Villas de San Pedro, Municipio de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz		500.00	500.00	-	0.00
5245	CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.		310.00	280.00	209.99	75.00
TOTAL GENERAL		362	2,399,822,097.83	1,340,143,312.15	717,168,354.87	53.51

a/ Información registrada por las Ejecutoras en los Sistemas SAFI y SIIP, con datos al 12 de diciembre de 2022.
