

MINISTERIO DE HACIENDA

# DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN Y CRÉDITO PÚBLICO



## INFORME DE AVANCE DEL PAIP 2012 AL MES DE NOVIEMBRE

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA  
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012**

**I. GENERALIDADES DEL PAIP TOTAL**

Para el presente ejercicio fiscal, el PAIP vigente al mes de noviembre asciende a \$1,230.8 millones, que equivale al 5.2% del PIB<sup>1</sup>; reportando una disminución de \$16.2 millones, con respecto al PAIP vigente al mes de octubre; debido a la modificación de los programas institucionales de MINSAL, ISSS y DGCP-MJSP que incrementaron y FOMILENIO, MOP, ANDA, FONAVIPO, FOVIAL, MIGOB y FOPROLYD que disminuyeron. Dicho programa financia total o parcialmente la ejecución de 548 programas y/o proyectos.

Los \$1,230.8 millones programados incorporan \$711.9 millones para proyectos regulares, \$114.9 millones de recursos del Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS), \$4.0 millones de recursos post Tormenta IDA, \$5.6 millones de recursos por Depresión Tropical 12E, \$170.0 millones de provisiones 2011 y \$224.4 millones del FODES, como se indica en el siguiente cuadro, que además presenta el avance del PAIP al mes de noviembre:

**CUADRO No.1  
PAIP 2012: CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA**  
(En millones de dólares y porcentajes)

| PROGRAMA /<br>PRESUPUESTO | Programado<br>vigente anual | Programado<br>a noviembre | Ejecutado a<br>noviembre | % de<br>Avance | COMPROMETIDO  |                                     |                             | % DE LO<br>COMPROMETIDO<br>RESPECTO A LO<br>PROGRAMADO | NO COMPROMETIDO |                             |                                      |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                           |                             |                           |                          |                | TOTAL         | EJECUTADO<br>AL MES DE<br>NOVIEMBRE | PENDIENTE<br>DE<br>EJECUTAR |                                                        | TOTAL           | EN<br>PROCESOS<br>ADMINIST. | SIN INICIAR<br>PROCESOS<br>ADMINIST. |
|                           | 1                           | 2                         | 3                        | 4=(3/2)        | 5             | 6                                   | 7=5-6                       | 8=5/1                                                  | 9               | 10                          | 11=9-10                              |
| PROYECTOS REGULARES       | 711.93                      | 555.33                    | 300.72                   | 54.2           | 442.86        | 300.72                              | 142.14                      | 62.2                                                   | 269.07          | 111.90                      | 157.17                               |
| IDA                       | 3.98                        | 2.89                      | 0.16                     | 5.5            | 1.67          | 0.16                                | 1.51                        | 42.0                                                   | 2.30            | -                           | 2.30                                 |
| Depresión Tropical 12E    | 5.60                        | 5.60                      | 4.12                     | 73.6           | 5.54          | 4.12                                | 1.42                        | 98.9                                                   | 0.06            | -                           | 0.06                                 |
| PROVISIONES 2011          | 169.97                      | 163.14                    | 132.96                   | 81.5           | 169.97        | 132.96                              | 37.01                       | 100.0                                                  | -               | -                           | -                                    |
| PEIS                      | 114.96                      | 86.82                     | 39.01                    | 44.9           | 62.15         | 39.01                               | 23.14                       | 54.1                                                   | 52.81           | 43.08                       | 9.72                                 |
| <b>Subtotal</b>           | <b>1,006.44</b>             | <b>813.78</b>             | <b>476.97</b>            | <b>58.6</b>    | <b>682.19</b> | <b>476.97</b>                       | <b>205.22</b>               | <b>67.8</b>                                            | <b>324.25</b>   | <b>154.98</b>               | <b>169.27</b>                        |
| FODES                     | 224.37                      | 205.67                    | 205.67                   | 100.0          | 224.37        | 205.67                              | 18.70                       | 100.0                                                  | -               | -                           | -                                    |
| <b>TOTAL</b>              | <b>1,230.81</b>             | <b>1,019.45</b>           | <b>682.64</b>            | <b>✓ 67.0</b>  | <b>906.56</b> | <b>682.64</b>                       | <b>223.92</b>               | <b>73.7</b>                                            | <b>324.25</b>   | <b>154.98</b>               | <b>169.27</b>                        |


| PROVISIONES 2011       | Programado<br>vigente anual | Programado<br>a noviembre | Ejecutado a<br>noviembre | % de<br>Avance |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
|                        | 1                           | 2                         | 3                        | 4=(3/2)        |
| PROYECTOS REGULARES    | 117.92                      | 114.86                    | 91.56                    | 79.7           |
| IDA                    | 8.22                        | 8.09                      | 7.23                     | 89.4           |
| PEIS                   | 39.64                       | 36.01                     | 29.99                    | 83.3           |
| Depresión Tropical 12E | 4.19                        | 4.18                      | 4.18                     | 100.0          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>169.97</b>               | <b>163.14</b>             | <b>132.96</b>            | <b>81.5</b>    |

<sup>1</sup> PIB: US\$23,844.2 millones.

Del monto total del PAIP, al mes de noviembre se programó ejecutar \$1,019.5 millones, de los cuales se ejecutaron \$682.6 millones, que representan el 67.0% de lo programado al mes y el 55.5% del programado anual.

En el siguiente gráfico se presenta un comparativo de la inversión programada/ejecutada durante enero - noviembre de 2007 - 2012, período en el cual el mayor monto de inversión ejecutada es de \$682.6 millones, que corresponde al ejercicio 2012, siendo superior en \$180.8 millones al promedio (\$501.8 millones) de los 6 años.


**Grafico No.1**  
**INVERSION PROGRAMADA/EJECUTADA, ENERO – NOVIEMBRE 2007 – 2012**  
(En millones de \$)

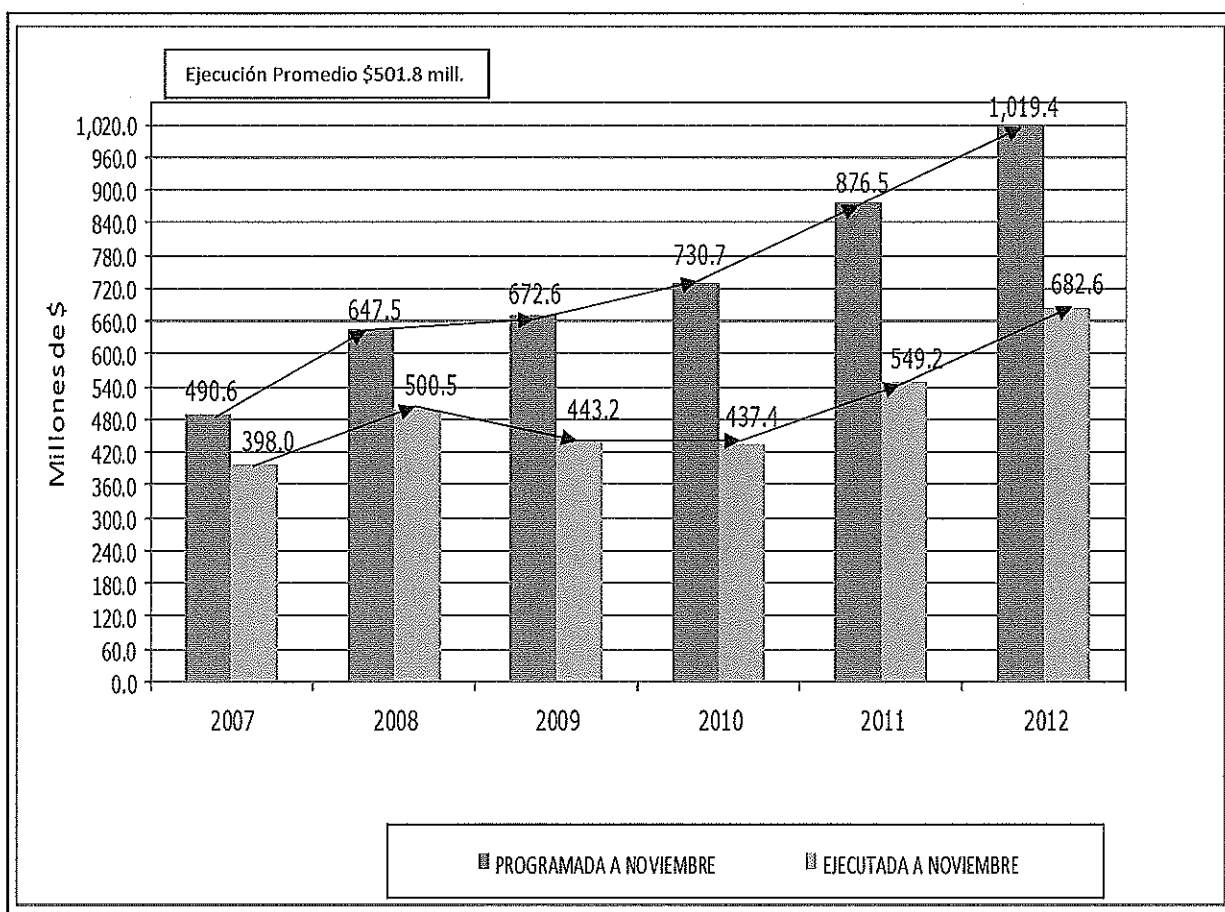

De los \$1,230.8 millones del PAIP vigente, al mes de noviembre se ha comprometido el 73.7%, es decir \$906.6 millones, quedando pendientes de comprometer \$324.2 millones, (26.3%), de los cuales de acuerdo a lo registrado por las diferentes instituciones, \$155.0 millones están en procesos administrativos, y los restantes \$169.3 millones no han iniciado dichos procesos.



**Grafico No.2**  
**AVANCE EN EL USO DE LOS RECURSOS DEL PAIP A NOVIEMBRE 2012**  
**(En millones de \$ y %)**

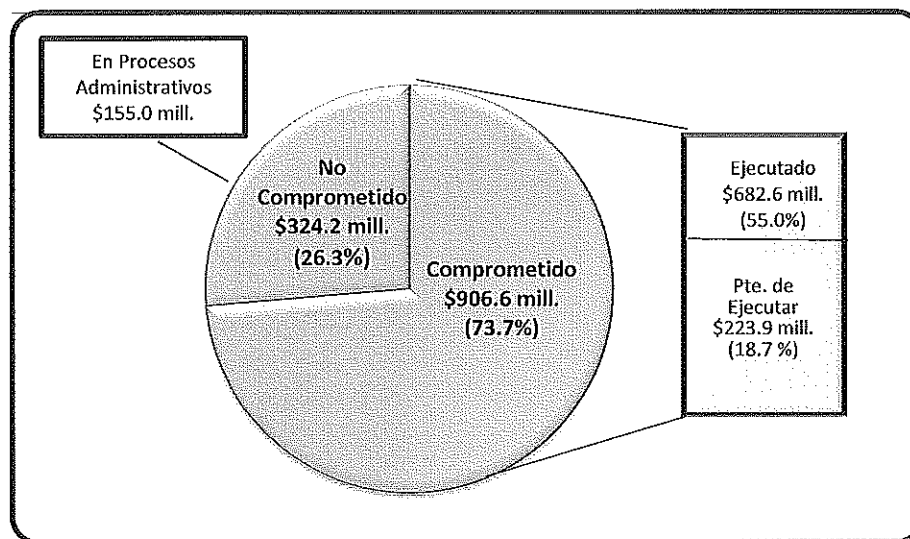

En los siguientes apartados del informe, se presenta la inversión programada/ejecutada, sin incluir la transferencia del FODES a las municipalidades, que al mes de noviembre fue de \$205.7 millones.

## **II. COMPORTAMIENTO DEL PAIP 2012 SIN FODES AL MES DE NOVIEMBRE:**

Sin FODES, el PAIP vigente al mes de noviembre es de **\$1,006.4 millones**, que representa el 4.2% del PIB, de los cuales están comprometidos \$682.2 millones (67.8%), y ejecutados **\$477.0 millones**, que equivalen al 58.6% de lo programado al mes (\$813.8 millones). El monto programado al mes y no ejecutado es de **\$336.8 millones**, que corresponden a asignaciones del Presupuesto/2012, Tormenta IDA, PEIS, Depresión Tropical 12E y a Provisiones 2011.


Del total de recursos comprometidos (\$682.2 millones), las instituciones con los mayores montos y que representan el 84.2% de los mismos son: FOMILENIO \$128.8 millones (18.9%), MOP \$101.5 millones (14.9%), FISDL \$90.5 millones (13.3%), MINSAL \$87.0 millones (12.8%), FOVIAL \$47.0 millones (6.9%), ANDA \$41.9 millones (6.1%), MINED \$40.3 millones (5.9%), y CEL \$37.3 millones (5.5%),.

Del monto ejecutado al mes de noviembre que totaliza **\$477.0 millones**, \$300.7 millones (63.0%) corresponden a proyectos de la Ley de Presupuesto 2012, \$133.0 millones (27.9%) a provisiones 2011 (\$91.6 millones de proyectos regulares, \$7.2 millones de recursos IDA, \$30.0 millones del PEIS y \$4.2 millones de la Depresión Tropical 12E), \$39.0 millones (8.2%) al PEIS, \$4.1 millones (0.9%) a la Depresión Tropical 12E y \$0.2 millones a Tormenta IDA.

De los recursos pendientes de comprometer al mes de noviembre por valor de **\$324.3 millones**, de acuerdo a lo manifestado por las diferentes instituciones **\$155.0 millones** se encuentran en procesos administrativos y **\$169.3 millones** sin iniciar procesos.



**Gráfico No.3**  
**AVANCE DEL USO DE LOS RECURSOS DEL PAIP, SIN FODES, A NOVIEMBRE 2012**  
**(En millones de \$ y %)**

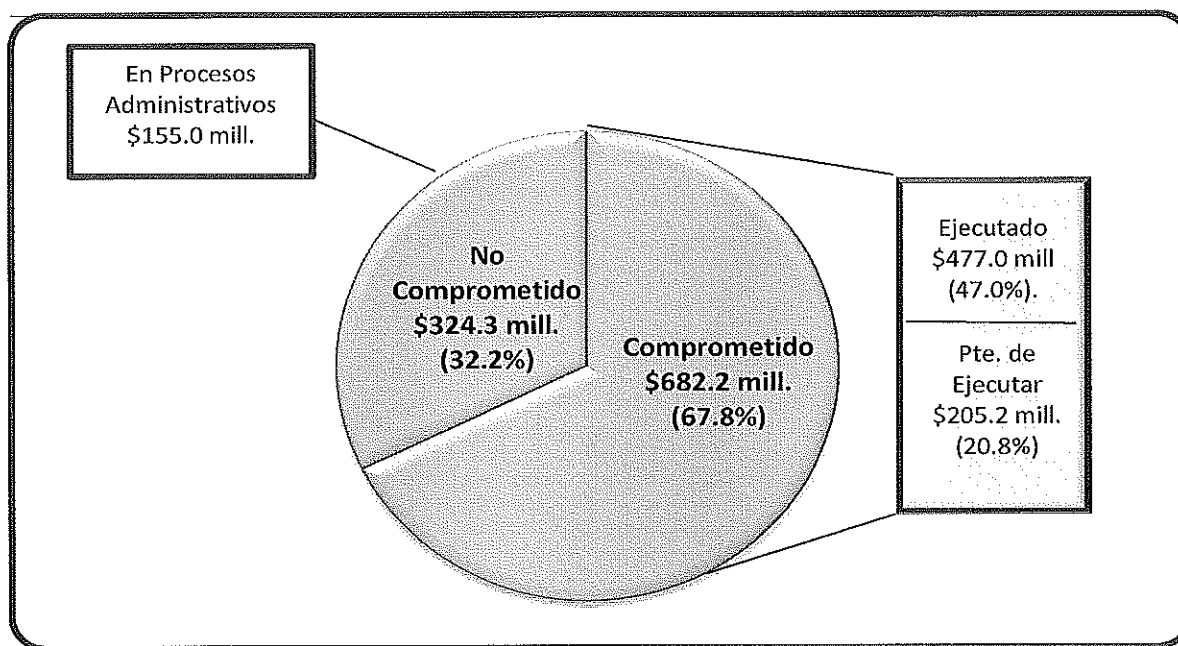

De los \$155.0 millones que se encuentran en procesos administrativos, \$45.0 millones son de MINSAL, \$25.0 millones de MOP, \$18.1 millones del MINED, \$13.1 millones de ANDA, \$12.2 millones del VMT, \$8.3 millones de la UES, \$8.3 millones de CNR, y \$8.2 millones de la CSJ, que en conjunto representan el 89.2% del total; y del monto de \$155.0 millones, de acuerdo a lo registrado por las instituciones ejecutoras, se tiene que: \$6.1 millones (3.9%) están en Elaboración de Términos de Referencia o de Bases de Licitación, \$10.9 millones (7.0%) en Publicaciones, \$2.6 millones (1.7%) en Elaboración de Ofertas, \$1.7 millones (1.1%) en Apertura de Ofertas, \$63.2 millones (40.8%) en Evaluación de Ofertas, \$16.0 millones (10.3%) en Adjudicación, \$45.2 millones (29.2%) en Procesos de Contratación y \$9.3 millones (6.0%) Declarados Desiertos, conforme al siguiente detalle:


**CUADRO No.2**  
**PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR INSTITUCION**  
**(En millones \$)**

| INSTITUCION                                      | PROCESO ADMINISTRATIVO                | MONTO        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>AL</b><br><b>(\$0.41 MILL.)</b>               | Elaboración de Términos de Referencia | 0.19         |
|                                                  | Elaboración de Ofertas                | 0.21         |
|                                                  | Adjudicación                          | 0.01         |
| <b>ANDA</b><br><b>(\$13.1 MILL.)</b>             | Elaboración de Términos de Referencia | 0.22         |
|                                                  | Elaboración Bases de Licitación       | 1.74         |
|                                                  | Publicación                           | 0.37         |
|                                                  | Evaluación de Ofertas                 | 8.78         |
|                                                  | Adjudicación                          | 1.99         |
| <b>ANSP - MJSP</b><br><b>(\$0.48 MILL.)</b>      | Evaluación de Ofertas                 | 0.48         |
| <b>CEPA</b><br><b>(\$1.99 MILL.)</b>             | Adjudicación                          | 1.99         |
| <b>CI - MJSP</b><br><b>(\$0.05 MILL.)</b>        | Adjudicación                          | 0.05         |
| <b>CNR</b><br><b>(\$8.29 MILL.)</b>              | Elaboración Bases de Licitación       | 0.18         |
|                                                  | Evaluación de Ofertas                 | 6.71         |
|                                                  | Proceso de Contratación               | 1.40         |
| <b>CSJ</b><br><b>(\$8.15 MILL.)</b>              | Evaluación de Ofertas                 | 8.15         |
| <b>FISDL</b><br><b>(\$2.22 MILL.)</b>            | Elaboración Bases de Licitación       | 1.64         |
|                                                  | Evaluación de Ofertas                 | 0.57         |
|                                                  | Proceso de Contratación               | 0.01         |
| <b>FONAVIPO</b><br><b>(\$0.26 MILL.)</b>         | Proceso de Contratación               | 0.26         |
| <b>FOVIAL</b><br><b>(\$0.31 MILL.)</b>           | Apertura de Ofertas                   | 0.12         |
|                                                  | Evaluación de Ofertas                 | 0.19         |
| <b>FSV</b><br><b>(\$1.25 MILL.)</b>              | Proceso de Contratación               | 1.25         |
| <b>MAG</b><br><b>(\$1.58 MILL.)</b>              | Elaboración Bases de Licitación       | 0.16         |
|                                                  | Elaboración de Ofertas                | 0.10         |
|                                                  | Evaluación de Ofertas                 | 0.24         |
|                                                  | Adjudicación                          | 0.91         |
|                                                  | Declaratoria de Desierto              | 0.17         |
| <b>MARN</b><br><b>(\$3.26 MILL.)</b>             | Elaboración de Términos de Referencia | 0.04         |
|                                                  | Elaboración Bases de Licitación       | 0.08         |
|                                                  | Elaboración de Ofertas                | 0.13         |
|                                                  | Evaluación de Ofertas                 | 0.87         |
|                                                  | Adjudicación                          | 2.11         |
| <b>MINED</b><br><b>(\$18.11 MILL.)</b>           | Proceso de Contratación               | 0.03         |
|                                                  | Evaluación de Ofertas                 | 1.33         |
|                                                  | Adjudicación                          | 5.88         |
|                                                  | Declaratoria de Desierto              | 0.01         |
| <b>MINSAL</b><br><b>(\$44.98 MILL.)</b>          | Proceso de Contratación               | 10.89        |
|                                                  | Elaboración Bases de Licitación       | 1.06         |
|                                                  | Apertura de Ofertas                   | 1.53         |
|                                                  | Evaluación de Ofertas                 | 23.65        |
|                                                  | Adjudicación                          | 2.46         |
| <b>MOP</b><br><b>(\$24.98 MILL.)</b>             | Proceso de Contratación               | 16.28        |
|                                                  | Evaluación de Ofertas                 | 11.31        |
|                                                  | Declaratoria de Desierto              | 1.46         |
|                                                  | Proceso de Contratación               | 12.21        |
| <b>PNC - MJSP</b><br><b>(\$0.33 MILL.)</b>       | Elaboración de Ofertas                | 0.33         |
| <b>Secr. de Cultura</b><br><b>(\$0.52 MILL.)</b> | Declaratoria de Desierto              | 0.52         |
| <b>UES</b><br><b>(\$8.27 MILL.)</b>              | Elaboración de Términos de Referencia | 0.47         |
|                                                  | Adjudicación                          | 0.65         |
|                                                  | Declaratoria de Desierto              | 7.15         |
| <b>VMT</b><br><b>(\$12.21 MILL.)</b>             | Publicación                           | 10.5         |
|                                                  | Apertura de Ofertas                   | 0.05         |
|                                                  | Proceso de Contratación               | 1.67         |
| <b>VMVDU</b><br><b>(\$4.25 MILL.)</b>            | Elaboración de Términos de Referencia | 0.35         |
|                                                  | Elaboración de Ofertas                | 1.80         |
|                                                  | Evaluación de Ofertas                 | 0.89         |
|                                                  | Proceso de Contratación               | 1.21         |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                       | <b>155.0</b> |

### III. AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION PUBLICA POR INSTITUCION, EXCLUYENDO FODES A NOVIEMBRE 2012.

De las 42 instituciones que tienen proyectos incluidos en el PAIP 2012, la ejecución financiera al mes de noviembre es la siguiente: FOMILENIO \$124.0 millones, FISDL \$83.8 millones, MOP \$54.0 millones, CEL \$36.1 millones, MINSAL \$34.4 millones, MINED \$32.7 millones, ANDA \$25.8 millones, FOVIAL \$21.7 millones, FONAVIPO \$14.5 millones, PNC-MJSP \$12.4 millones, MAG \$10.7 millones, CNR \$3.8 millones, VMVDU \$3.3 millones, MARN \$3.2 millones, CI-MJSP \$2.9 millones, UES \$2.6 millones, ISSS \$1.9 millones, CEPA \$1.5 millones, FONAES \$0.9 millones, MH \$0.9 millones, IMTYP \$0.8 millones, AL \$0.8 millones, SE-MJSP \$0.7 millones, MIREX \$0.5 millones, DGCP-MSPJ \$0.5 millones, MIGOB \$0.5 millones, ILEA \$0.5 millones, SIS \$0.4 millones, CSJ \$0.3 millones, ISNA \$0.3 millones, BOMBEROS - MIGOB \$0.2 millones, DC \$0.2 millones, SEC. DE LA CULTURA \$0.1 millones, CENTA \$0.07 millones, ISDEMU \$0.07 millones, CORSATUR \$0.02 y ANSP-MJSP \$0.02 millones; totalizando en su conjunto \$477.0 millones.

**Gráfico No.4**  
**INSTITUCIONES CON MAYOR INVERSION EJECUTADA A NOVIEMBRE**  
**(En millones de \$)**

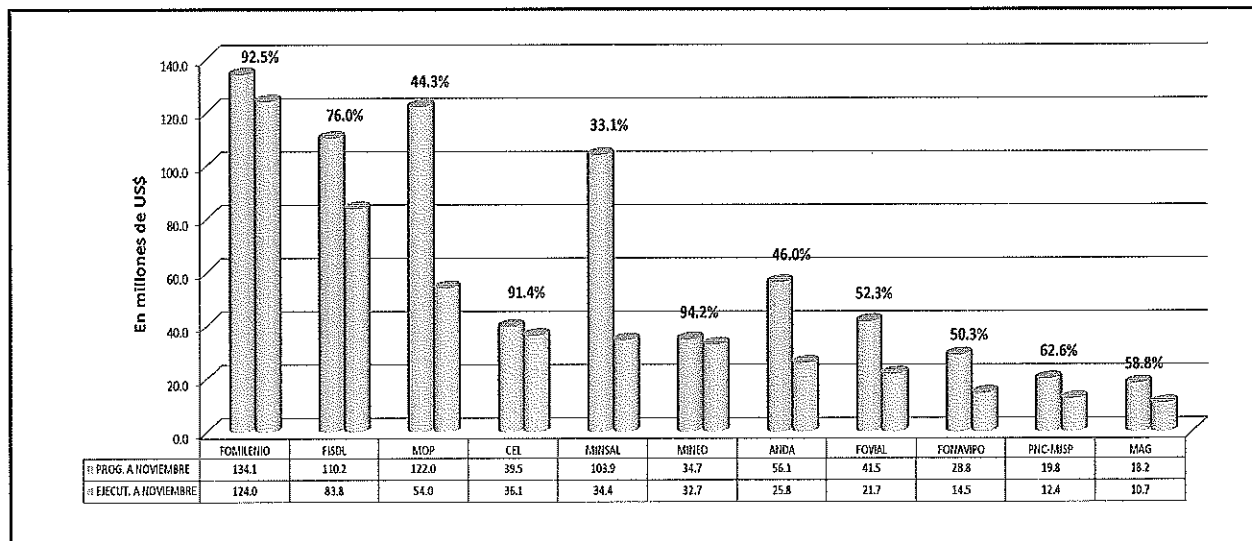

En el presente gráfico se reportan las principales ejecutoras del período y además se puede visualizar algunas de las instituciones con mayor inversión programada al mes de noviembre y no ejecutada en su totalidad, cuyo monto asciende a \$336.8 millones, siendo las de mayor incidencia en el desfase: MINSAL (\$69.5 millones), MOP (\$68.0 millones), ANDA (\$30.3 millones), FISDL (\$26.4 millones), FOVIAL (\$19.8 millones), CSJ (\$15.9 millones), FONAVIPO (\$14.3 millones), CNR (\$11.3 millones), UES (\$10.6 millones), FOMILENIO (\$10.1 millones), VMVDU (\$9.9 millones), MH (\$9.7 millones), MAG (\$7.5 millones), PNC-MJSP (\$7.4 millones) y CI-MJSP (\$5.5 millones), que en conjunto totalizan \$316.2 millones y representan el 93.9% de la inversión programada y no ejecutada.

En el cuadro que a continuación se presenta, se detalla por cada una de las instituciones ejecutoras, el número de proyectos, el monto de inversión programado y el avance financiero, montos de recursos comprometidos y los recursos asociados a proyectos en procesos administrativos registrados en el SAFI y SIIP por las ejecutoras, al mes de noviembre.



**Cuadro No.3**  
**EJECUCION FINANCIERA DEL PAIP 2012 AL MES DE NOVIEMBRE, SIN FODES, POR INSTITUCION\***  
(En millones de dólares y porcentajes)

| INSTITUCIONES                                          | No. de Programas /Proyectos | PROGRAMA VIGENTE ANUAL | PROGRAMADO AL MES DE NOVIEMBRE | EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE | % DE AVANCE | COMPROMETIDO  |                               |                       | % DE LO COMPROMETIDO RESPECTO A LO PROGRAMADO | PENDIENTE DE COMPROMETER |                       |                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                        |                             | 1                      | 2                              | 3                             | 4=3/2       | TOTAL         | EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE | PENDIENTE DE EJECUTAR | 8=5/1                                         | TOTAL                    | EN PROCESOS ADMINIST. | SIN INICIAR PROCESOS ADMINIST. |
|                                                        |                             |                        |                                |                               |             | 5             | 6                             | 7=5-6                 |                                               | 9                        | 10                    | 11=9-10                        |
| <b>GOBIERNO CENTRAL</b>                                | <b>362</b>                  | <b>485.76</b>          | <b>364.77</b>                  | <b>159.69</b>                 | <b>43.8</b> | <b>299.55</b> | <b>159.69</b>                 | <b>139.85</b>         | <b>61.7</b>                                   | <b>186.22</b>            | <b>118.81</b>         | <b>67.40</b>                   |
| MOP                                                    | 75                          | 153.13                 | 122.04                         | 54.01                         | 44.3        | 101.47        | 54.01                         | 47.46                 | 66.3                                          | 51.66                    | 24.98                 | 26.67                          |
| MINSAL                                                 | 131                         | 128.10                 | 103.86                         | 34.41                         | 33.1        | 86.96         | 34.41                         | 52.56                 | 67.9                                          | 41.13                    | 44.99                 | 3.85                           |
| MINED                                                  | 77                          | 65.76                  | 34.71                          | 32.71                         | 94.2        | 40.26         | 32.71                         | 7.56                  | 61.2                                          | 25.49                    | 18.12                 | 7.38                           |
| PNC - MJSP                                             | 4                           | 19.76                  | 19.76                          | 12.36                         | 62.6        | 19.29         | 12.36                         | 6.93                  | 97.6                                          | 0.46                     | 0.33                  | 0.13                           |
| CSJ                                                    | 10                          | 18.72                  | 16.21                          | 0.28                          | 1.7         | 1.81          | 0.28                          | 1.52                  | 9.7                                           | 16.92                    | 8.15                  | 8.76                           |
| VMVDU                                                  | 4                           | 20.83                  | 13.19                          | 3.25                          | 24.7        | 9.93          | 3.25                          | 6.68                  | 47.7                                          | 10.89                    | 4.25                  | 6.64                           |
| MAG                                                    | 21                          | 19.52                  | 18.23                          | 10.66                         | 58.5        | 11.17         | 10.66                         | 0.50                  | 57.2                                          | 8.35                     | 1.55                  | 6.81                           |
| MH                                                     | 9                           | 12.32                  | 10.63                          | 0.93                          | 8.8         | 3.29          | 0.93                          | 2.36                  | 26.7                                          | 9.03                     | -                     | 9.03                           |
| CI - MJSP                                              | 1                           | 9.04                   | 8.40                           | 2.88                          | 34.3        | 8.47          | 2.88                          | 5.58                  | 93.7                                          | 0.57                     | 0.05                  | 0.52                           |
| MARN                                                   | 5                           | 7.75                   | 4.20                           | 3.16                          | 75.3        | 4.85          | 3.16                          | 1.69                  | 62.6                                          | 2.89                     | 3.25                  | 0.36                           |
| ILEA                                                   | 1                           | 5.66                   | 3.86                           | 0.47                          | 12.0        | 5.54          | 0.47                          | 5.07                  | 97.9                                          | 0.13                     | -                     | 0.13                           |
| SEC. INCLUSION S.                                      | 3                           | 3.11                   | 1.76                           | 0.45                          | 25.7        | 0.49          | 0.45                          | 0.04                  | 15.8                                          | 2.62                     | -                     | 2.62                           |
| AL                                                     | 1                           | 1.38                   | 1.37                           | 0.83                          | 60.6        | 0.98          | 0.83                          | 0.15                  | 71.0                                          | 0.40                     | 0.40                  | -                              |
| MIGOB                                                  | 4                           | 1.24                   | 0.87                           | 0.53                          | 60.7        | 1.06          | 0.53                          | 0.54                  | 85.5                                          | 0.18                     | -                     | 0.18                           |
| SE - MJSP                                              | 1                           | 1.13                   | 1.13                           | 0.71                          | 63.0        | 1.02          | 0.71                          | 0.31                  | 90.3                                          | 0.11                     | -                     | 0.11                           |
| MTYPS                                                  | 3                           | 0.77                   | 0.77                           | 0.76                          | 98.7        | 0.77          | 0.76                          | 0.01                  | 100.0                                         | -                        | -                     | -                              |
| MIREX                                                  | 1                           | 0.47                   | 0.47                           | 0.47                          | 100.0       | 0.47          | 0.47                          | -                     | 100.0                                         | -                        | -                     | -                              |
| DGCP - MJSP                                            | 5                           | 2.46                   | 2.14                           | 0.46                          | 21.6        | 0.46          | 0.46                          | 0.00                  | 100.0                                         | 2.00                     | -                     | 2.00                           |
| BOMBER - MIGOB                                         | 2                           | 0.20                   | 0.20                           | 0.20                          | 100.0       | 0.20          | 0.20                          | 0.00                  | 100.0                                         | 0.00                     | -                     | 0.00                           |
| VMT                                                    | 1                           | 12.73                  | -                              | 0.01                          | 0.0         | 0.81          | 0.01                          | 0.80                  | 6.4                                           | 11.92                    | 12.21                 | 0.29                           |
| CONJUVE                                                | 1                           | 0.90                   | 0.78                           | -                             | 0.0         | -             | -                             | -                     | 0.0                                           | 0.90                     | -                     | 0.90                           |
| SEC. DE CULTURA                                        | 2                           | 0.79                   | 0.19                           | 0.14                          | 77.2        | 0.25          | 0.14                          | 0.11                  | 31.6                                          | 0.54                     | 0.52                  | 0.02                           |
| <b>INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> | <b>79</b>                   | <b>224.63</b>          | <b>185.11</b>                  | <b>114.46</b>                 | <b>61.8</b> | <b>152.99</b> | <b>114.46</b>                 | <b>38.53</b>          | <b>51.0</b>                                   | <b>71.64</b>             | <b>19.57</b>          | <b>52.07</b>                   |
| FISDL                                                  | 13                          | 137.50                 | 110.21                         | 83.76                         | 76.0        | 90.46         | 83.76                         | 6.70                  | 65.8                                          | 47.04                    | 2.22                  | 44.82                          |
| FOVIAL                                                 | 26                          | 49.82                  | 41.48                          | 21.71                         | 52.3        | 46.97         | 21.71                         | 25.26                 | 94.3                                          | 2.86                     | 0.31                  | 2.54                           |
| CNR                                                    | 1                           | 16.45                  | 15.11                          | 3.82                          | 25.3        | 4.19          | 3.82                          | 0.37                  | 25.5                                          | 12.26                    | 8.29                  | 3.97                           |
| UES                                                    | 20                          | 14.58                  | 13.22                          | 2.59                          | 19.6        | 6.10          | 2.59                          | 3.52                  | 41.8                                          | 8.48                     | 8.28                  | 0.20                           |
| ISSS                                                   | 8                           | 3.88                   | 2.69                           | 1.90                          | 70.6        | 3.01          | 1.90                          | 1.11                  | 77.6                                          | 0.87                     | -                     | 0.87                           |
| ISTU                                                   | 1                           | 0.80                   | 0.80                           | -                             | 0.0         | 0.77          | -                             | 0.77                  | 96.3                                          | 0.03                     | -                     | 0.03                           |
| DC                                                     | 1                           | 0.49                   | 0.49                           | 0.23                          | 47.6        | 0.46          | 0.23                          | 0.22                  | 93.9                                          | 0.04                     | -                     | 0.04                           |
| ANSP-MJSP                                              | 2                           | 0.51                   | 0.51                           | 0.02                          | 4.2         | 0.47          | 0.02                          | 0.45                  | 92.2                                          | 0.03                     | 0.48                  | 0.44                           |
| ISNA                                                   | 2                           | 0.31                   | 0.31                           | 0.27                          | 86.7        | 0.29          | 0.27                          | 0.02                  | 93.5                                          | 0.02                     | -                     | 0.02                           |
| CORSATUR                                               | 1                           | 0.10                   | 0.10                           | 0.03                          | 28.5        | 0.08          | 0.03                          | 0.05                  | 80.0                                          | 0.02                     | -                     | 0.02                           |
| CENTA                                                  | 1                           | 0.07                   | 0.07                           | 0.07                          | 100.0       | 0.07          | 0.07                          | -                     | 100.0                                         | -                        | -                     | -                              |
| ISDEMU                                                 | 3                           | 0.13                   | 0.12                           | 0.07                          | 59.7        | 0.13          | 0.07                          | 0.06                  | 100.0                                         | -                        | -                     | -                              |
| <b>EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</b>                | <b>78</b>                   | <b>120.89</b>          | <b>98.67</b>                   | <b>63.39</b>                  | <b>65.3</b> | <b>81.07</b>  | <b>63.39</b>                  | <b>17.68</b>          | <b>67.1</b>                                   | <b>39.82</b>             | <b>15.09</b>          | <b>38.39</b>                   |
| ANDA                                                   | 65                          | 73.08                  | 56.12                          | 25.80                         | 46.0        | 41.94         | 25.80                         | 16.14                 | 57.4                                          | 31.14                    | 13.10                 | 18.04                          |
| CEL                                                    | 7                           | 41.54                  | 39.51                          | 36.08                         | 91.3        | 37.30         | 36.08                         | 1.22                  | 89.8                                          | 4.24                     | -                     | 4.24                           |
| CEPA                                                   | 6                           | 6.27                   | 3.03                           | 1.50                          | 49.5        | 1.83          | 1.50                          | 0.33                  | 29.2                                          | 4.44                     | 1.99                  | 2.45                           |
| <b>OTRAS</b>                                           | <b>28</b>                   | <b>175.15</b>          | <b>165.23</b>                  | <b>139.43</b>                 | <b>84.4</b> | <b>148.58</b> | <b>139.43</b>                 | <b>7.55</b>           | <b>84.8</b>                                   | <b>26.58</b>             | <b>1.51</b>           | <b>25.07</b>                   |
| FOMILENIO                                              | 13                          | 142.95                 | 134.13                         | 124.02                        | 92.5        | 128.84        | 124.02                        | 4.82                  | 90.1                                          | 14.12                    | -                     | 14.12                          |
| FONAVIPO                                               | 11                          | 29.59                  | 28.81                          | 14.47                         | 50.2        | 17.06         | 14.47                         | 2.60                  | 57.7                                          | 12.53                    | 0.26                  | 12.27                          |
| FSV                                                    | 1                           | 1.51                   | 1.31                           | -                             | -           | 1.51          | -                             | 1.51                  | 100.0                                         | -                        | 1.25                  | 1.25                           |
| FONAES                                                 | 2                           | 1.07                   | 0.95                           | 0.95                          | 100.0       | 1.16          | 0.95                          | 0.22                  | 108.4                                         | -                        | -                     | 0.10                           |
| FOPROLYD                                               | 1                           | 0.03                   | 0.03                           | 0.00                          | 6.3         | 0.00          | 0.00                          | 0.00                  | 0.0                                           | 0.03                     | -                     | 0.03                           |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>547</b>                  | <b>1,006.44</b>        | <b>813.77</b>                  | <b>476.97</b>                 | <b>58.7</b> | <b>682.19</b> | <b>476.97</b>                 | <b>203.62</b>         | <b>67.8</b>                                   | <b>324.25</b>            | <b>154.98</b>         | <b>169.27</b>                  |

\* Esta clasificación Institucional, obedece a la aplicación informática del cubo SAFI.


#### IV. AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION PUBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SIN FODES.

Clasificada por **Fuentes de Financiamiento**, la inversión ejecutada al mes de noviembre se ha financiado en un 31.9% con recursos de donaciones, que fundamentalmente son fondos del FOMILENIO, 25.1% de desembolsos de préstamos externos, 33.9% con recursos de fondo general y el 9.2% restante con recursos propios, como se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

**Cuadro No.4**  
**SITUACION FINANCIERA DEL PAIP, SIN FODES, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
(En millones de dólares y porcentajes)

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMA VIGENTE A NOVIEMBRE/12 | PROGRAMADO A NOVIEMBRE/12 | EJECUTADO A NOVIEMBRE/12 | % EJECUCION A NOVIEMBRE/12 | % RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO | NO EJECUTADO DE LO PROGRAMADO A NOVIEMBRE/12 |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Fondo General             | 333.9                           | 278.7                     | 161.6                    | 58.0                       | 33.9                          | 117.1                                        |
| Recursos Propios          | 72.7                            | 63.9                      | 43.7                     | 68.4                       | 9.2                           | 20.2                                         |
| <b>TOTAL INTERNO</b>      | <b>406.6</b>                    | <b>342.6</b>              | <b>205.3</b>             | <b>59.9</b>                | <b>43.0</b>                   | <b>137.3</b>                                 |
| Préstamos Externos        | 365.3                           | 275.5                     | 119.6                    | 43.4                       | 25.1                          | 155.9                                        |
| Donaciones                | 234.5                           | 195.7                     | 152.1                    | 77.7                       | 31.9                          | 43.6                                         |
| <b>TOTAL EXTERNO</b>      | <b>599.8</b>                    | <b>471.2</b>              | <b>271.7</b>             | <b>57.7</b>                | <b>57.0</b>                   | <b>199.5</b>                                 |
| <b>TOTAL</b>              | <b>1,006.4</b>                  | <b>813.8</b>              | <b>477.0</b>             | <b>58.6</b>                | <b>100.0</b>                  | <b>336.8</b>                                 |

**Gráfico No.5**  
**AVANCE DEL PAIP, SIN FODES, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, A NOVIEMBRE 2012**  
(En millones de dólares)

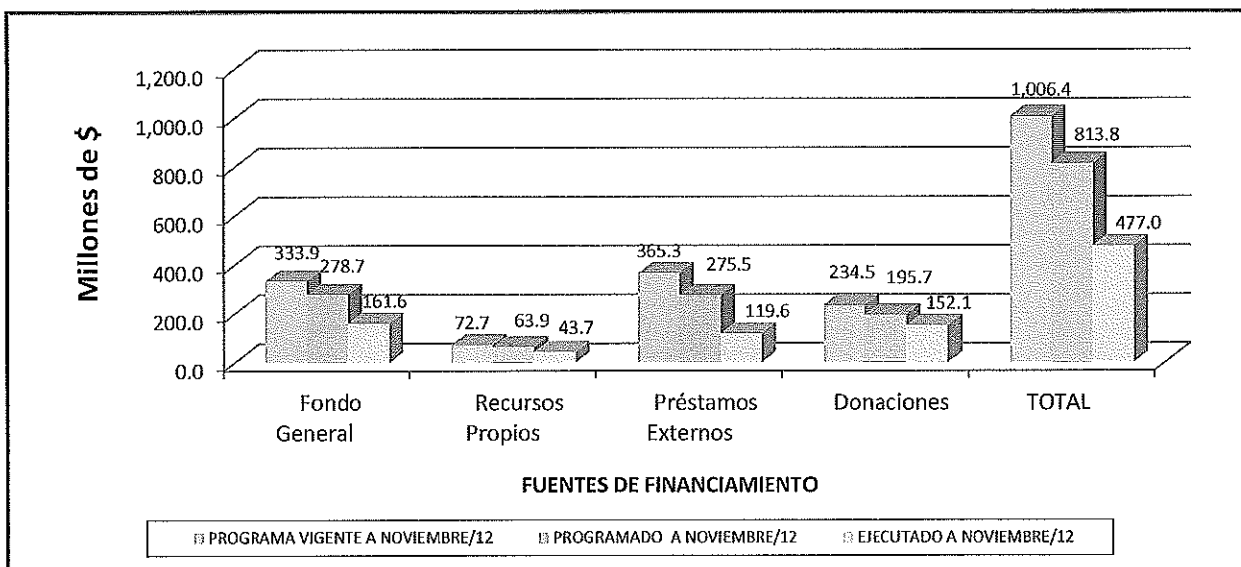


## V. AVANCE DE LA INVERSION PUBLICA POR ESTRUCTURA DEL SPNF, SIN FODES.

De la inversión registrada al mes de noviembre, el 33.5% es inversión en proyectos ejecutados por las instituciones del Gobierno Central, 24.0% de proyectos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales, entre las cuales destaca FISDL y FOVIAL; 13.3% de inversión de las Empresas Públicas no Financieras, principalmente ANDA, y 29.2% de otras entidades, que básicamente corresponde a proyectos de FOMILENIO; siendo importante que las diversas instituciones públicas realicen un mayor esfuerzo para elevar el nivel de la inversión y contribuir a dinamizar la economía; dado que en conjunto, el porcentaje de ejecución financiera de lo programado al mes de noviembre equivale al 58.6%.

**Cuadro No.5**  
**SITUACION FINANCIERA DEL PAIP, SIN FODES, POR ESTRUCTURA DEL SPNF**  
(En Millones de dólares y porcentajes)

| ESTRUCTURA                                      | PROGRAMA VIGENTE A NOVIEMBRE/12 | PROGRAMADO A NOVIEMBRE/12 | EJECUTADO A NOVIEMBRE/12 | % EJECUCION A NOVIEMBRE/12 | % RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO | NO EJECUTADO DE LO PROGRAMADO A NOVIEMBRE/12 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| GOBIERNO CENTRAL                                | 485.8                           | 364.8                     | 159.7                    | 43.8                       | 33.5                          | 205.1                                        |
| INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 224.6                           | 185.1                     | 114.5                    | 61.9                       | 24.0                          | 70.6                                         |
| EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS                | 120.9                           | 98.7                      | 63.4                     | 64.2                       | 13.3                          | 35.3                                         |
| OTROS                                           | 175.1                           | 165.2                     | 139.4                    | 84.4                       | 29.2                          | 25.8                                         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1006.4</b>                   | <b>813.8</b>              | <b>477.0</b>             | <b>58.6</b>                | <b>100.0</b>                  | <b>336.8</b>                                 |

**Gráfico No.6**  
**AVANCE DEL PAIP, SIN FODES, POR ESTRUCTURA DEL SPNF, A NOVIEMBRE 2012**  
(En Millones de dólares)

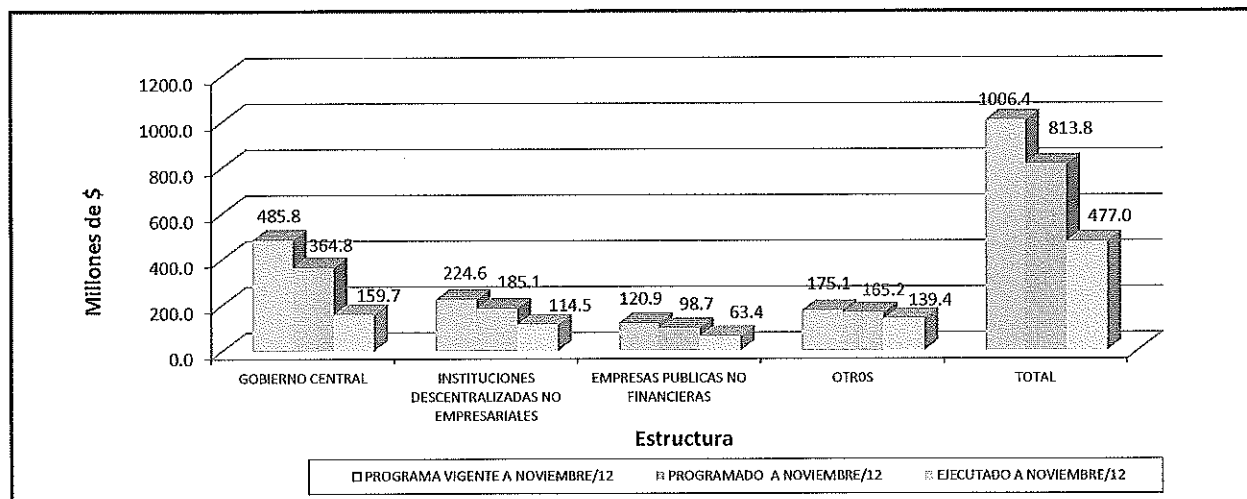


## VI. AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION PUBLICA POR SECTOR DE ACTIVIDAD, SIN FODES.

A continuación se presenta el comportamiento de la inversión ejecutada a noviembre 2012 por sector de actividad, de la cual al sector social corresponden \$284.4 millones, al sector económico \$174.7 millones, y el sector seguridad y justicia presenta una ejecución de \$17.9 millones.

**Cuadro No.6**  
**SITUACION FINANCIERA DE LA INVERSION DEL SPNF, SIN FODES, POR SECTOR DE ACTIVIDAD**  
(En millones de dólares y porcentajes)

| SECTORES             | PROGRAMA VIGENTE A NOVIEMBRE/12 | PROGRAMADO A NOVIEMBRE/12 | EJECUTADO A NOVIEMBRE/12 | % EJECUCION A NOVIEMBRE/12 | % RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO | NO EJECUTADO DE LO PROGRAMADO A NOVIEMBRE/12 |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| SOCIAL               | 657.4                           | 525.8                     | 284.4                    | 54.1                       | 59.6                          | 241.4                                        |
| ECONOMICO            | 290.3                           | 234.9                     | 174.7                    | 74.4                       | 36.6                          | 60.2                                         |
| SEGURIDAD Y JUSTICIA | 58.7                            | 53.1                      | 17.9                     | 33.7                       | 3.8                           | 35.2                                         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>1006.4</b>                   | <b>813.8</b>              | <b>477.0</b>             | <b>58.6</b>                | <b>100.0</b>                  | <b>336.8</b>                                 |


**Gráfico No.7**  
**AVANCE DEL PAIP, SIN FODES, POR SECTOR DE ACTIVIDAD A NOVIEMBRE 2012**  
(En millones de dólares)

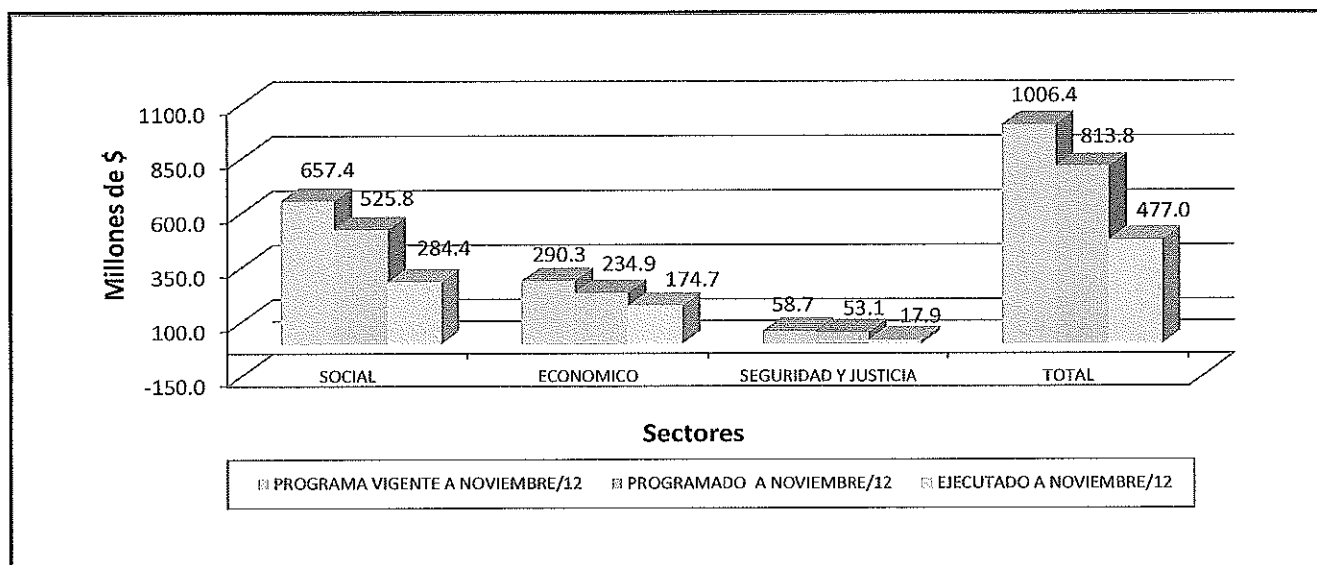




La inversión ejecutada a noviembre 2012 en proyectos del **sector social** por valor de \$284.4 millones, se distribuyó en los siguientes subsectores: (i) Desarrollo Urbano y Comunal \$107.1 millones, (37.7%), (ii) Salud \$36.3 millones, (12.8%), (iii) Educación y Cultura \$35.2 millones, (12.4%), (iv) Agua Potable y Alcantarillado \$29.6 millones, (10.4%), (v) Asistencia y Previsión Social \$26.3 millones, (9.2%), (vi) Vivienda \$16.9 millones, (5.9%), (vii) Medio Ambiente \$4.1 millones (1.4%) y (viii) Multisectorial \$28.9 millones, (10.2%).

**Gráfico No.8**  
**COMPOSICION DE LA INVERSION DEL SECTOR SOCIAL, SIN FODES, POR SUBSECTOR**  
**A NOVIEMBRE 2012**

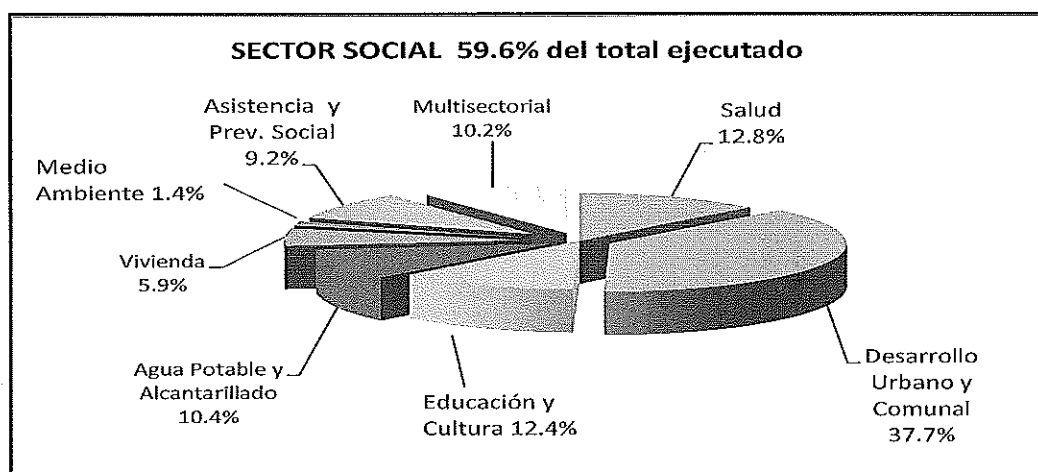


La inversión ejecutada al mes de noviembre en proyectos del **Sector Económico** por valor de \$174.7 millones se distribuyó en los siguientes subsectores: (i) Transporte y Almacenaje \$126.8 millones (72.6%), (ii) Energía \$36.7 millones (21.0%), (iii) Silvoagropecuario \$10.9 millones (6.2%) y (iv) Industria, Comercio y Turismo \$0.3 millones (0.2%).

**Gráfico No.9**  
**COMPOSICION DE LA INVERSION DEL SECTOR ECONOMICO, SIN FODES, POR SUBSECTOR**  
**A NOVIEMBRE 2012**

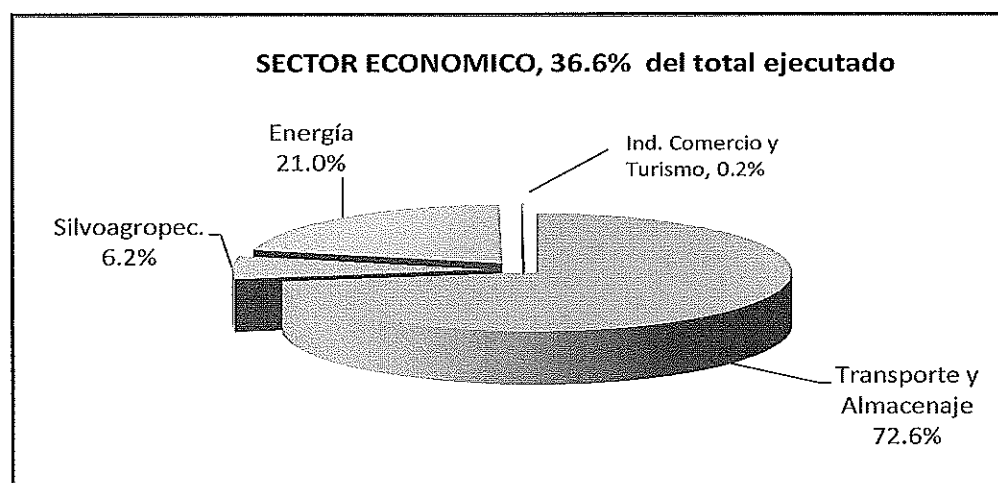

Para el **Sector Seguridad Pública y Justicia** la ejecución al mes de noviembre fue de \$17.9 millones, de los cuales \$13.5 millones (75.4%) corresponden a proyectos del área de seguridad y \$4.4 millones (24.6%) al área de justicia.

**Gráfico No.10**  
**COMPOSICION DEL SECTOR SEGURIDAD Y JUSTICIA, SIN FODES A NOVIEMBRE 2012**

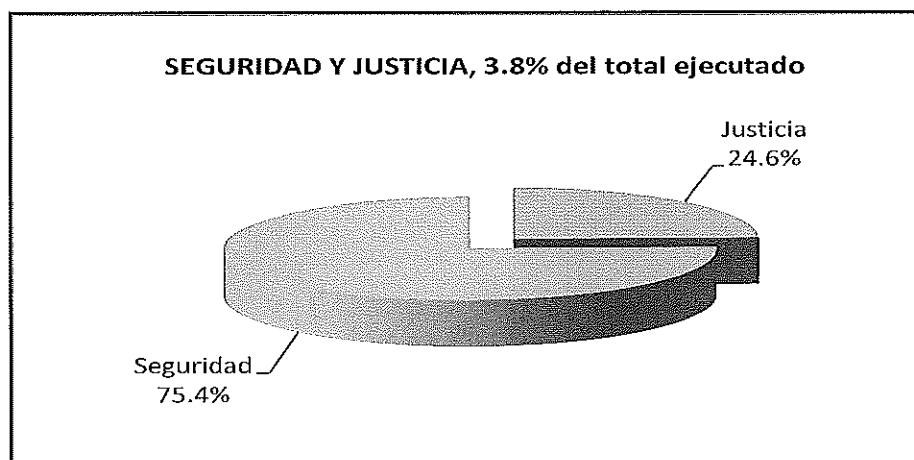

#### **VII. AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION EJECUTADA CON RECURSOS PEIS**

El PAIP 2012 vigente al mes de noviembre contiene proyectos del MINSAL, MOP, ANDA, MAG, MINED y UES, que se financian con recursos del Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS), por un monto de \$154.6 millones, (incluyen \$39.6 millones de provisiones 2011), de los cuales se programaron a noviembre \$122.8 millones y se ejecutaron \$69.0 millones, representando el 56.2% de lo programado al mes.

**Cuadro No.7**  
**INVERSION FINANCIERA DE RECURSOS PEIS POR INSTITUCION**  
(En millones de dólares y porcentajes)

| Instituciones | Programa vigente a noviembre/12 | Programado a noviembre/12 | Ejecutado a noviembre/12 | % de Ejecución a noviembre/12 | No ejecutado del programado a noviembre/12 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|               | 1                               | 2                         | 3                        | 4= (3/2)                      | 5=(2-3)                                    |
| MINSAL        | 69.4                            | 50.5                      | 21.3                     | 42.2                          | 29.2                                       |
| MOP           | 33.2                            | 27.4                      | 13.7                     | 50.0                          | 13.7                                       |
| ANDA          | 18.9                            | 18.8                      | 16.3                     | 86.7                          | 2.5                                        |
| MAG           | 2.7                             | 2.6                       | 1.9                      | 73.1                          | 0.7                                        |
| MINED         | 15.8                            | 10.3                      | 13.2                     | 128.2                         | -2.9                                       |
| UES           | 14.6                            | 13.2                      | 2.6                      | 19.7                          | 10.6                                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>154.6</b>                    | <b>122.8</b>              | <b>69.0</b>              | <b>56.2</b>                   | <b>53.8</b>                                |

# **VIII. AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION EJECUTADA CON RECURSOS POST TORMENTA IDA**

El PAIP 2012 vigente a noviembre incorpora \$12.2 millones de recursos destinados a financiar proyectos por daños de la Tormenta IDA, (incluye \$8.2 millones de provisiones 2011), de los cuales se han ejecutado \$7.4 millones, equivalente al 67.3% del monto de \$11.0 millones programado al mes, como se muestra a continuación:

**Cuadro No.8**  
**INVERSION FINANCIERA DE RECURSOS POST TORMENTA IDA POR INSTITUCION**  
 (En millones de dólares y porcentajes)

| Instituciones  | Programa vigente a noviembre/12 | Programado a noviembre/12 | Ejecutado a noviembre/12 | % de Ejecución a noviembre/12 | No ejecutado del programado a noviembre/12 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                | 1                               | 2                         | 3                        | 4= (3/2)                      | 5=(2-3)                                    |
| MOP            | 2.0                             | 2.0                       | 2.0                      | 100.0                         | 0.0                                        |
| FOVIAL         | 3.3                             | 2.2                       | 1.7                      | 77.3                          | 0.5                                        |
| MINSAL         | 1.3                             | 1.3                       | 0.6                      | 46.2                          | 0.7                                        |
| MARN           | 0.7                             | 0.7                       | 0.7                      | 100.0                         | 0.0                                        |
| FONAVIPO       | 2.4                             | 2.3                       | 0.1                      | 4.3                           | 2.2                                        |
| MIGOB          | 0.4                             | 0.4                       | 0.4                      | 100.0                         | 0.0                                        |
| MAG            | 0.2                             | 0.2                       | 0.2                      | 100.0                         | 0.0                                        |
| CENTA          | 0.06                            | 0.06                      | 0.06                     | 100.0                         | 0.0                                        |
| CEPA           | 1.4                             | 1.4                       | 1.2                      | 85.7                          | 0.2                                        |
| MINED          | 0.2                             | 0.2                       | 0.2                      | 100.0                         | 0.0                                        |
| BOMBER - MIGOB | 0.2                             | 0.2                       | 0.2                      | 100.0                         | 0.0                                        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>12.2</b>                     | <b>11.0</b>               | <b>7.4</b>               | <b>67.3</b>                   | <b>3.6</b>                                 |

A continuación se presenta el detalle de los proyectos que conforman el PAIP 2012, agrupados por Institución Ejecutora.



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE  
(MONTOS EN DOLARES)**

| CODIGO                  | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO                                                                                                                                                                                                       | No. Prog. y Proyec. | PROGRAMADO TOTAL      | PROGRAMADO AL MES     | EJECUTADO AL MES     | % EJE. FINAN. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>GOBIERNO CENTRAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                       |                       |                      |               |
|                         | <b>MOP</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>75</b>           | <b>153,127,339.63</b> | <b>122,044,667.67</b> | <b>54,009,364.99</b> | <b>44.25</b>  |
| 3737                    | APERTURA BOULEVARD DIEGO DE HOLGUIN-SANTA TECLA TRAMO II                                                                                                                                                                            |                     | 45,202,992.56         | 44,994,713.07         | 21,212,854.61        | 47.15         |
| 5567                    | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NTE DE EL SALVADOR. MANTTO DE LA CARRETERA CA03 TRAMO 2A: NVA CONCEPCION CHALATENANGO, RUTA CA03E TRAMO: CA04N (DV AMAYO) - CHALATENANGO, DEPTO DE CHALATENANGO                              |                     | 13,403,686.00         | 8,974,467.00          | 80,052.46            | 0.89          |
| 4529                    | Mejoramiento de Camino Rural LIB16S Tramo LIB22S - Tamanique. La Libertad                                                                                                                                                           |                     | 8,178,351.56          | 8,178,351.56          | 2,313,342.24         | 28.29         |
| 4532                    | Mejoramiento de Camino Rural LIB18N: Tramo LIB22S - Chilitupan. La Libertad                                                                                                                                                         |                     | 6,262,138.81          | 6,262,138.81          | 1,878,641.64         | 30.00         |
| 5566                    | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NTE DE EL SALVADOR. MANTTO DE LA CARRETERA CA03 TRAMO 2A: NVA CONCEPCION, CHALATENANGO, RUTA CA03W TRAMO: CA04N (DV AMAYO)- NVA CONCEPCION, DEPTO DE CHALATENANGO                            |                     | 6,096,920.00          | 3,266,540.00          | 227,019.66           | 6.95          |
| 5457                    | MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO CHA25N, TRAMO: NUEVA CONCEPCION - LD. LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO                                                                                                                        |                     | 5,715,795.00          | 1,295,755.00          | -                    | 0.00          |
| 5741                    | PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD EN LA CUENCA BAJA DEL RIO LEMPA, MUNICIPIOS DE TECOLUCA, BERLIN Y JIQUILISCO, DEPARTAMENTOS DE SAN VICENTE Y USULUTAN                   |                     | 5,467,586.00          | 5,467,586.00          | 4,115,867.15         | 75.28         |
| 5458                    | MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO LIB22S: ET. LIB05W (DV. COMASAGUA) - DV. LIB18S (CHILITUPAN), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                                                                                                              |                     | 5,290,957.00          | 5,191,317.91          | 110,043.48           | 2.12          |
| 3091                    | CONSTRUCCION BY PASS EN LA CIUDAD DE USULUTAN                                                                                                                                                                                       |                     | 4,482,492.73          | 4,482,492.73          | 4,012,204.80         | 89.51         |
| 4638                    | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AHU16S TRAMO: APANECA - QUEZALAPA - HACIA SAN PEDRO PUXTLA, APANECA, AHUACHAPAN                                                                                                                           |                     | 4,144,929.03          | -                     | 1,243,478.71         | -             |
| 4530                    | Mejoramiento de Camino Rural LIB19N Tramo LIB22S - Jayaque. La Libertad                                                                                                                                                             |                     | 3,874,886.67          | 3,874,886.67          | 3,542,191.96         | 91.41         |
| 5463                    | MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO LIB31N, TRAMO: SAN PABLO TACACHICO - CANTON SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.                                                                                 |                     | 3,597,758.46          | 3,156,713.46          | 181,701.92           | 5.76          |
| 5006                    | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION DEL PUENTE DE LA AVENIDA CHAPARRASTIQUE SOBRE ARENAL SECO, MUNICIPIO DE ILOPANGO                                                                                                                |                     | 3,446,981.00          | -                     | -                    | -             |
| 5098                    | PROGRAMA OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS                                                                                                                                                                                             |                     | 3,141,420.00          | 1,696,010.00          | -                    | -             |
| 5652                    | RECONSTRUCCION DE PUENTE ATEOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN CAUCE DEL RIO TALNIQUE, RUTA CA08W MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                                                                       |                     | 2,949,273.66          | 2,949,273.66          | 2,949,273.65         | 100.00        |
| 4531                    | Ampliación de un Tramo del Camino Terciario LIB05W: Tramo CA04S-LIB15S. (Desvio a Comasagua). La Libertad                                                                                                                           |                     | 2,403,282.55          | 2,403,282.55          | 639,806.44           | 26.62         |
| 5737                    | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO COPAPAYO 1, RUTA CA: 08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD ? DVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE                                                                                  |                     | 2,325,526.00          | -                     | -                    | -             |
| 5002                    | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN ZONA DE CARCAVA DEL REPARTO LA CAMPANERA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, SAN SALVADOR                                                                                                               |                     | 2,304,330.00          | -                     | -                    | -             |
| 3603                    | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAM28N, TRAMO:CHAPELTIQUE - SESORI, SAN MIGUEL                                                                                                                                                         |                     | 1,957,368.69          | 1,957,368.69          | 1,100,811.90         | 56.24         |
| 5008                    | REPARACION Y REFORZAMIENTO DE PUENTES TULE (KM 45.48) Y COLIMA (KM 47.45), CARRETERA TRONCAL DEL NORTE (CA:4N), MUNICIPIO DE EL PAISNAL. DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR                                                               |                     | 1,837,979.84          | 1,837,979.84          | 1,397,695.66         | 76.05         |
| 5465                    | CONSTRUCCION E INSTALACION DE OBRAS PARA PUENTE PERMANENTE SOBRE RIO QUEZALAPA, CAMINO CUS18E MUNICIPIO DE SUCHITOTO; DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN                                                                                     |                     | 1,770,456.96          | 845,492.96            | -                    | -             |
| 4640                    | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO: COMASAGUA HACIA BELLO HORIZONTE, LA LIBERTAD                                                                                                                                                       |                     | 1,519,393.08          | -                     | 455,817.92           | -             |
| 5633                    | RECONSTRUCCION DE PUENTES CUINIKUIL, AZAMBIO Y BOVEDA ENTRADA A CHALATENANGO, RUTA CA03 TRAMO: DVIO AMAYO - CHALATENANGO, MUNICIPIOS DE SANTA RITA Y CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO                                     |                     | 1,362,786.00          | 1,248,196.00          | 23,244.51            | 1.86          |
| 5654                    | CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION SOBRE EL RIO COLON Y REHABILITACION DE CALLE QUE CONDUCE DESDE LA INTERSEC. DE LA CARRETERA CA08W (KM. 29½) HACIA HDA. LAS SEISCIENTAS, CTÓN ENTRE RÍOS, MUNICIPIO DE COLON, DEPTO. DE LA LIBERTAD |                     | 1,235,037.51          | 1,235,037.51          | 1,235,037.51         | 100.00        |
| 4563                    | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MITIGACION CÁRCAVAS DE JARDINES DE SAN BARTOLO (1 PRINCIPAL Y 2 SECUNDARIAS) ILOPANGO, SAN SALVADOR.                                                                                                       |                     | 963,543.47            | 978,726.82            | 874,540.90           | 89.35         |
| 5511                    | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369                                                                                                                                                                                              |                     | 925,835.00            | 925,835.00            | 236,557.20           | 25.55         |
| 5459                    | MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO SAV29S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE.                                                                                                                         |                     | 861,821.00            | -                     | -                    | -             |
| 5838                    | CONSTRUCCION DE CARRIL AUXILIAR PARA LA SEGURIDAD VIAL DE CICLISTAS Y PEATONES, COMPLEMENTARIO AL BOULEVARD DIEGO DE HOLGUIN, ANTIGUO CUSCATLAN, TRAMO II-A, ETAPA II.                                                              |                     | 836,068.00            | -                     | -                    | -             |
| 4624                    | CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN COLONIA LAS MARGARITAS, BARRIO SAN JACINTO. SAN SALVADOR                                                                                                                                       |                     | 775,000.00            | 678,125.00            | -                    | -             |
| 5351                    | Reconstrucción de Obras de Protección y de Mitigación en Quebrada Chilismuyo, Av. Washington, Colonia Ciudad Satélite, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador                                                      |                     | 739,016.00            | 739,016.00            | 481,344.48           | 62.43         |
| 4557                    | OBRAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE TALUD EN COMUNIDAD EL TRIUNFO CONCEPCION DE ATACO, AHUACHAPAN                                                                                                                                   |                     | 720,672.70            | 720,672.70            | 720,672.70           | 100.00        |
| 4535                    | Rehabilitación de la Carretera CHA07E-CHA09S, Tramo del Et. CHA08E-Arcatao, Chalatenango                                                                                                                                            |                     | 654,887.52            | 654,887.52            | 654,887.52           | 100.00        |
| 4562                    | OBRAS DE MITIGACION EN ZONA DE CÁRCAVA COLONIA LLANO VERDE, (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO, SAN SALVADOR                                                                                                                   |                     | 644,707.72            | 634,707.74            | 150,508.48           | 23.71         |
| 5411                    | Mejoramiento Camino Vecinal, Tramo: La Laguna-Canton Cuevitas ET- CHA13N (Dutce Nombre de María-San Fernando) Departamento de Chalatenango.                                                                                         |                     | 589,156.29            | 589,156.29            | 412,408.50           | 70.00         |



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE  
(MONTOS EN DOLARES)

| CODIGO | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                      | No. Prog. y<br>Proyec. | PROGRAMADO<br>TOTAL | PROGRAMADO<br>AL MES | EJECUTADO AL MES | % EJEC.<br>FINANC. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 4558   | MUROS DE CONTENCIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD EL TRIUNFO SAN JULIAN, SONSONATE                                                                                                                                                          |                        | 580,000.00          | 580,000.00           | 580,000.00       | 100.00             |
| 5378   | Construcción de Bóveda y Muro de Contención del Parque Central de Soyapango, San Salvador.                                                                                                                                                         |                        | 545,572.29          | 545,572.29           | 541,458.43       | 99.25              |
| 5655   | CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE QUEBRADA LA LECHUZA, ALEDAÑO AL PARQUEO DE LA UIDV (VMOP), MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR                                                                                                    |                        | 491,854.00          | 491,854.00           | 262,459.59       | 53.36              |
| 5400   | OBRAS DE MITIGACION EN ZONA DE CARCAVA DE URBANIZACION LAS VICTORIAS, SOYAPANGO, SAN SALVADOR                                                                                                                                                      |                        | 483,065.32          | 483,065.32           | 483,064.96       | 100.00             |
| 5404   | Mejoramiento de Caminos Rurales en los Municipios de Santa Elena, Jucuaran, Concepción Batres y San Buenaventura, Departamento de Usulután.                                                                                                        |                        | 457,249.90          | 457,249.90           | 457,249.90       | 100.00             |
| 5681   | Rehabilitación de calle entre el desvío de Cantón Guarjila hacia Municipio Las Vueltas, Departamento de Chalatenango                                                                                                                               |                        | 400,000.00          | 400,000.00           | 22,944.48        | 5.74               |
| 5682   | Rehabilitación de calle entre Caserío El Mozote, Cantón La Guacamaya, Colonia Altomiro y Comunidad El Barrial del Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán                                                                                  |                        | 400,000.00          | 295,980.00           | 4,642.92         | 1.57               |
| 4559   | PROYECTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A FAMILIAS EN ZONAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD NUEVO ISRAEL, SAN SALVADOR                                                                                                                                       |                        | 305,839.09          | 305,839.09           | -                | -                  |
| 5684   | Pavimentación de Calle entre Cantón Los Lagartos, Municipio de San Julián hacia el Cantón El Sunza, Municipio de Izalco, en el Departamento de Sonsonate.                                                                                          |                        | 303,570.00          | 288,280.98           | 11,826.95        | 4.10               |
| 4641   | OBRAS DE MITIGACION EN ZONA DE QUEBRADA LA LECHUZA, ALEDAÑO AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SAN SALVADOR                                                                                                                                          |                        | 285,936.10          | 285,936.10           | 66,107.32        | 23.12              |
| 5623   | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2067                                                                                                                                                                                                            |                        | 257,415.00          | 205,305.00           | 20,370.00        | 9.92               |
| 4585   | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN 8a - 10a. Y CALLE PARAGUAY, SAN SALVADOR                                                                                                                                                                      |                        | 243,055.31          | 243,055.31           | -                | -                  |
| 5410   | Mejoramiento de Calles entre la 11 Calle Oriente y Calle a San Jorge, Municipio de San Rafael, Departamento de San Miguel                                                                                                                          |                        | 242,329.15          | 242,329.15           | 242,329.15       | 100.00             |
| 5793   | CONSTRUCCIÓN DE CARRIL AUXILIAR PARA LA SEGURIDAD VIAL DE CICLISTAS Y PEATONES, COMPLEMENTARIO AL BOULEVARD DIEGO DE HOLGUÍN, ANTIGUO CUSCATLÁN, TRAMO II-A - ETAPA I                                                                              |                        | 230,873.00          | -                    | -                | -                  |
| 5409   | Pavimentación de Calles en el Municipio y Departamento de Santa Ana.                                                                                                                                                                               |                        | 230,505.83          | 230,505.83           | 218,200.59       | 94.66              |
| 5688   | Mejoramiento de calle entre el desvío Caserío Camalote, Municipio El Carrizal hacia carretera CHA06N ( La Montañona ); Municipio de La Laguna, en el Departamento de Chalatenango.                                                                 |                        | 200,000.00          | 93,000.01            | 21,249.49        | 22.85              |
| 5690   | Mejoramiento de calle entre los Municipios de San Rafael Oriente y San Jorge, Departamento de San Miguel .                                                                                                                                         |                        | 200,000.00          | 200,000.00           | -                | -                  |
| 5743   | Construcción de Obras de Protección del Puente La Chaplina en el Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate.                                                                                                                                   |                        | 160,615.00          | 160,615.00           | -                | -                  |
| 5412   | Mejoramiento del camino que conduce al Caserío Los Pérez del Ctn. Texipulco, Camino Vecinal Caserío Los Martínez del mismo Ctn. y al Camino Vecinal La Joya del Ctn. La Concepción, todos Jurisdicción de San Pedro Puxtla del Dpto. de Ahuachapán |                        | 150,000.00          | 150,000.00           | 149,999.98       | 100.00             |
| 5337   | Construcción de Obras para Mitigación en Quebrada Arenal Tutunichapa, Colonia Santa Eugenia, Barrio La Esperanza, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador                                                                          |                        | 140,000.00          | 140,000.00           | 140,000.00       | 100.00             |
| 5653   | RECONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES S/ RIO COPAPAYO, RUTA CA-08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD - DIVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.                                                                                 |                        | 132,577.00          | 132,577.00           | -                | -                  |
| 5330   | Construcción de Obras de Mitigación en Urbanización La Campiña 2000, Municipio de Cuscatancingo, San Salvador                                                                                                                                      |                        | 131,164.60          | 131,164.60           | 131,164.60       | 100.00             |
| 5320   | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN AGUAS ABAJO DEL PUENTE No. 2, ARENAL SECO, NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR                                                                                              |                        | 96,540.50           | 96,540.50            | 96,540.50        | 100.00             |
| 5685   | Construcción de Empedrado y Fraguado de calle San Martín, Municipio Guaymango, Ahuachapán                                                                                                                                                          |                        | 80,000.00           | 67,816.18            | 16,316.22        | 24.06              |
| 5687   | Construcción de Empedrado y Fraguado de calle en el Municipio de San Lorenzo, Ahuachapán                                                                                                                                                           |                        | 80,000.00           | 68,814.97            | 9,780.14         | 14.21              |
| 5321   | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CON SU DESCARGA, OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES EN CALLE ROMÁN PEÑA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR                                                                  |                        | 71,487.00           | 71,487.00            | 71,486.82        | 100.00             |
| 5413   | Mejoramiento Calles en la Colonia San Joaquín, Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador.                                                                                                                                              |                        | 69,650.45           | 69,650.45            | 69,650.45        | 100.00             |
| 5345   | Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Reparto El Carmen, Soyapango, San Salvador                                                                                                                                                          |                        | 59,357.76           | 59,357.76            | 58,046.43        | 97.79              |
| 4630   | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MURO DE RETENCIÓN EN URBANIZACIÓN ALTOS DEL BOULEVARD, SAN SALVADOR                                                                                                                                                       |                        | 57,518.70           | 57,518.70            | 24,186.63        | 42.05              |
| 5686   | Rehabilitación de calles en los Cantones Caizotes Arriba y Potrero Grande, Municipio de Santa Ana, Santa Ana.                                                                                                                                      |                        | 52,000.00           | 51,636.40            | 8,275.50         | 16.03              |
| 4566   | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DEL CENTRO DE CONFERENCIAS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES ( EX FERIA INTERNACIONAL)                                                                                               |                        | 48,843.02           | 14,087.79            | -                | -                  |
| 4564   | CONSTRUCCIÓN DE MUROS GUARDANIVELES Y REPARACIÓN DE MURO GUARDANIVEL EN RÍO LAS CAÑAS ILOPANGO, SAN SALVADOR                                                                                                                                       |                        | 48,390.02           | 48,390.02            | -                | -                  |
| 4626   | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DE CASA PRESIDENCIAL                                                                                                                                                           |                        | 46,983.14           | 18,704.19            | -                | -                  |
| 3918   | DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                    |                        | 42,627.00           | 20,420.00            | -                | -                  |
| 5407   | Reparación de Calles en el Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador                                                                                                                                                                    |                        | 27,201.65           | 27,201.65            | 27,201.65        | 100.00             |
| 5004   | CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RÍO LEMPA (KM. 75.5 LIB31N), LA LIBERTAD - CHALATENANGO                                                                                                                                                       |                        | 27,085.59           | 27,085.59            | -                | -                  |
| 1506   | AMPLIACION DE ALAMEDA JUAN PABLO II E/ 75 AV. NORTE Y AV. MASFERRER. SAN SALVADOR.                                                                                                                                                                 |                        | 23,917.00           | 23,917.00            | 23,916.89        | 100.00             |
| 5406   | Mejoramiento de calles en Colonia Concepción, en el Municipio y Departamento de San Vicente.                                                                                                                                                       |                        | 19,999.40           | 19,999.40            | 19,999.40        | 100.00             |
| 3180   | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 1556                                                                                                                                                                                                            |                        | 880.00              | 880.00               | 880.00           | 100.00             |





**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE  
(MONTOS EN DOLARES)**

| CODIGO        | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO                                                                                                                                      | No. Prog. y<br>Proyec. | PROGRAMADO<br>TOTAL   | PROGRAMADO<br>AL MES  | EJECUTADO AL MES     | % EJEC.<br>FINANC. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 4642          | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CON SU DESCARGA EN COLONIA EL MATAZANO, ILOPANGO, SAN SALVADOR                                                           |                        | 100.00                | -                     | -                    | -                  |
| 4639          | MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO SAV29S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE                                                        |                        | 100.00                | 100.00                | -                    | -                  |
| <b>MINSAL</b> |                                                                                                                                                                    | <b>131</b>             | <b>128,098,881.67</b> | <b>103,860,981.84</b> | <b>34,407,056.26</b> | <b>33.13</b>       |
| 5131          | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR                                                                                      |                        | 30,643,387.09         | 29,410,310.09         | 4,469,269.95         | 15.20              |
| 5128          | Programa Integrado de Salud                                                                                                                                        |                        | 26,644,827.29         | 22,717,289.62         | 7,465,637.48         | 32.86              |
| 401           | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION                                                                                                      |                        | 13,691,149.77         | 4,580,228.56          | 234,269.79           | 5.11               |
| 4657          | Programa de Extensión de Cobertura en la Zona Rural (período 2009-2011)                                                                                            |                        | 8,786,918.56          | 8,025,776.55          | 8,309,297.61         | 103.53             |
| 4654          | Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"                                                                 |                        | 7,871,430.23          | 6,541,259.58          | 447,581.08           | 6.84               |
| 4656          | Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña" |                        | 5,847,945.74          | 5,577,681.00          | 1,680,155.53         | 30.12              |
| 4653          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"                                         |                        | 4,505,476.67          | 3,184,600.30          | 1,502,025.95         | 47.17              |
| 4661          | Apoyo al Primer Nivel de Atención y Hospitales del MSPAS.                                                                                                          |                        | 2,959,641.60          | 2,468,837.37          | 1,488,131.84         | 60.28              |
| 4655          | Remodelación y Equipamiento de la Tercera Planta del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales                                                      |                        | 2,891,955.00          | 2,271,081.00          | 79,891.00            | 3.52               |
| 4890          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La Libertad, La Libertad                                                                                      |                        | 1,105,409.83          | 1,102,919.17          | 430,867.25           | 39.07              |
| 4908          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás Pineda Martínez, Santa Ana                                                                                 |                        | 964,895.25            | 949,301.25            | 6,820.89             | 0.72               |
| 4853          | Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martín, San Salvador                                                                                      |                        | 886,825.38            | 659,222.15            | 37,767.90            | 5.73               |
| 4836          | Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de Ayutuxtepeque, San Salvador                                                                                   |                        | 660,504.25            | 554,060.85            | -                    | 0.00               |
| 4918          | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Candelaria, Cuscatlán                                                     |                        | 505,522.25            | 486,138.95            | 48,920.84            | 10.06              |
| 4658          | Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Red de Establecimientos de Salud.                                                                             |                        | 502,807.01            | 496,234.32            | 496,234.32           | 100.00             |
| 4887          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Ciudad Arce, La Libertad                                                                                         |                        | 497,980.25            | 497,980.25            | 15,594.00            | 3.13               |
| 4938          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guadalupe, San Vicente                                                                                           |                        | 462,313.70            | 369,966.28            | 279,788.11           | 75.63              |
| 4907          | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Bárbara, Santa Ana                                                                  |                        | 445,000.00            | 374,123.42            | 19,266.50            | 5.15               |
| 4924          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán                                                                                 |                        | 436,384.50            | 392,980.75            | 310.75               | 0.06               |
| 4911          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Nahulzalco, Sonsonate                                                                                         |                        | 435,000.50            | 422,409.30            | 11,509.27            | 2.72               |
| 4913          | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Ahuachapán, Ahuachapán                                                                 |                        | 435,000.25            | 345,741.13            | 141,220.05           | 40.85              |
| 4910          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio, San Antonio del Monte, Sonsonate                                                                    |                        | 435,000.25            | 395,522.62            | -                    | -                  |
| 4927          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guacotelecti, Cabañas                                                                                            |                        | 435,000.25            | 248,687.20            | 15,594.00            | 6.27               |
| 4862          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Carlos, La Unión                                                                                          |                        | 435,000.25            | 433,414.60            | -                    | -                  |
| 4866          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las Marías, Chinameca, San Miguel                                                                                |                        | 435,000.25            | 362,483.35            | 15,594.00            | 4.30               |
| 4859          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Bobadilla, San Alejo, La Unión                                                                                |                        | 435,000.25            | 393,937.11            | 322,258.07           | 81.80              |
| 4876          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Usulután, Usulután                                                                                            |                        | 435,000.00            | 15,584.00             | 15,594.00            | 100.00             |
| 3345          | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CHALATENANGO                                                                                                  |                        | 435,000.00            | 343,875.16            | 244,292.45           | 71.04              |
| 3346          | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA                                                                                              |                        | 434,726.25            | 415,884.41            | 15,594.00            | 3.75               |
| 4867          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Uluazapa, San Miguel                                                                                             |                        | 431,095.38            | 344,400.40            | 327,458.26           | 95.08              |
| 4894          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana                                                                                         |                        | 420,500.25            | 420,500.25            | 17,469.80            | 4.15               |
| 4861          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Faro, Conchagua, La Unión                                                                                  |                        | 405,494.42            | 317,746.46            | 290,391.40           | 91.39              |
| 4874          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Rafael, San Miguel                                                                                           |                        | 403,382.93            | 401,687.93            | 63,364.15            | 15.77              |
| 4884          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango                                                                                   |                        | 400,000.25            | 348,915.80            | -                    | -                  |
| 4891          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Matías, La Libertad                                                                                          |                        | 353,957.70            | 263,612.62            | 263,612.62           | 100.00             |
| 4893          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Tamanique, La Libertad                                                                                        |                        | 350,000.25            | 245,661.95            | 244,900.76           | 99.69              |
| 4850          | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador                                                                |                        | 334,154.40            | 241,426.50            | 92,128.07            | 38.16              |
| 4880          | Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud El Espino, Jucuarán, Usulután                                                                                   |                        | 309,193.25            | 202,789.79            | 1,695.00             | 0.84               |
| 4897          | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana                                                                     |                        | 309,183.70            | 260,725.45            | 260,723.03           | 100.00             |
| 4912          | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Salcoatitán, Sonsonate                                                                 |                        | 302,938.01            | 221,526.50            | 19,831.50            | 8.95               |
| 4878          | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután                                                                                              |                        | 300,593.19            | 286,196.57            | 285,236.39           | 99.66              |
| 4858          | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilopango, San Salvador                                                    |                        | 285,685.50            | 175,789.50            | 22,872.72            | 13.01              |
| 4660          | Remodelación y equipamiento del Hospital Nacional de Chachuapa                                                                                                     |                        | 280,356.88            | 280,356.88            | 803,987.60           | 286.77             |
| 4885          | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Arracaos, Nueva Concepción, Chalatenango                                               |                        | 265,500.25            | 223,474.99            | 3,729.00             | 1.67               |
| 4906          | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Lucía, Santa Ana                                                                    |                        | 250,500.25            | 205,960.91            | 205,889.26           | 99.97              |



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE  
(MONTOS EN DOLARES)**

| CODIGO | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO                                                                                              | No. Prog. y<br>Proyec. | PROGRAMADO<br>TOTAL | PROGRAMADO<br>AL MES | EJECUTADO AL MES | % EJE.<br>FINANC. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 4917   | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán |                        | 250,500.25          | 210,820.46           | 210,324.23       | 99.76             |
| 4889   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad        |                        | 250,500.00          | 195,389.79           | 190,785.26       | 97.64             |
| 4852   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador      |                        | 241,026.15          | 238,457.63           | 4,167.25         | 1.75              |
| 4863   | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Playa, La Unión                               |                        | 238,700.00          | 190,714.51           | 128,248.77       | 67.25             |
| 4864   | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Llano los Patos, Conchagua, La Unión             |                        | 222,000.50          | 222,000.50           | 17,406.98        | 7.84              |
| 4879   | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud California, Usulután                             |                        | 222,000.25          | 199,210.16           | 3,032.86         | 1.52              |
| 4888   | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel              |                        | 220,906.70          | 164,969.65           | 163,274.65       | 98.97             |
| 4839   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes, San Salvador                             |                        | 218,612.96          | 157,035.42           | 5,510.81         | 3.51              |
| 4926   | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Sensuntepeque, Cabañas            |                        | 217,376.00          | 153,663.38           | 152,729.00       | 99.39             |
| 4898   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa Ana   |                        | 197,986.72          | 165,684.50           | 164,496.63       | 99.26             |
| 4931   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyulitán, La Paz                               |                        | 197,335.29          | 161,297.36           | 151,828.88       | 94.13             |
| 4920   | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de Concepcion, Cuscatlán |                        | 196,489.45          | 136,788.17           | 136,788.17       | 100.00            |
| 4904   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Sebastian Saltillo, Santa Ana                 |                        | 181,331.11          | 149,414.30           | 143,550.97       | 96.08             |
| 4903   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Juan las Minas, Metapán, Santa Ana            |                        | 176,609.61          | 139,765.60           | 139,765.60       | 100.00            |
| 4905   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana                          |                        | 173,679.89          | 116,430.36           | 116,430.36       | 100.00            |
| 4929   | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucia, Ilobasco, Cabañas    |                        | 167,906.45          | 117,395.41           | 91,534.69        | 77.87             |
| 4932   | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Mercedes La Ceiba, La Paz         |                        | 167,000.75          | 121,719.36           | 1,695.00         | 1.39              |
| 4919   | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de El Carmen, Cuscatlán              |                        | 167,000.25          | 121,099.50           | 0                | 0.00              |
| 4892   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad                  |                        | 166,230.61          | 116,072.83           | 116,072.83       | 100.00            |
| 4936   | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Rafael Obrajuelo, La Paz      |                        | 164,457.50          | 120,421.53           | 120,421.53       | 100.00            |
| 5773   | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CASERIO LA PIRRAYA, ISLA SAN SEBASTIAN, USULUTAN    |                        | 156,798.00          | -                    | -                | -                 |
| 4935   | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Juan Talpa, La Paz            |                        | 145,065.93          | 103,051.50           | 14,373.02        | 13.95             |
| 4900   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Congo, Santa Ana                               |                        | 142,684.96          | 123,134.01           | 115,431.35       | 93.74             |
| 4928   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco del Monte, Ilobasco, Cabañas      |                        | 141,406.25          | 133,778.83           | 4,576.50         | 3.42              |
| 4937   | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitán, San Vicente            |                        | 138,478.21          | 87,633.07            | 58,347.88        | 66.58             |
| 4881   | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Cruz, Usulután                                |                        | 135,169.75          | 169.50               | -                | -                 |
| 4865   | Ampliación ,Equipamiento Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Piche, El Carmen, La Unión                      |                        | 134,726.25          | 95,275.20            | 95,251.82        | 99.98             |
| 4873   | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Silva, San Miguel                    |                        | 128,624.25          | 95,859.71            | 208.71           | 0.22              |
| 4930   | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Jutiapa, Cabañas        |                        | 125,606.50          | 53,773.38            | 51,654.63        | 96.06             |
| 4872   | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Milagro de la Paz, San Miguel                    |                        | 125,234.25          | 93,545.03            | -                | -                 |
| 4909   | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio Pajonal, Santa Ana                                           |                        | 113,530.02          | 98,625.36            | 84,461.58        | 87.41             |
| 4916   | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Chinamas, Ahuachapán                         |                        | 112,632.80          | 89,902.24            | 87,736.59        | 97.59             |
| 4882   | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Dorado, Chalatenango                          |                        | 105,395.00          | -                    | -                | -                 |
| 4923   | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Ramon, Cuscatlán              |                        | 103,127.88          | 60,489.34            | 59,108.88        | 97.72             |
| 4860   | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Carmen, La Unión                                                   |                        | 100,000.00          | 20,000.00            | -                | -                 |
| 4914   | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Lorenzo, Ahuachapán                                                  |                        | 89,199.93           | 70,844.93            | 61,314.60        | 86.55             |
| 4901   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Belen Guijat, Metapán, Santa Ana                  |                        | 89,056.33           | 70,468.91            | 65,847.15        | 93.44             |
| 4915   | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Jose Naranjo, Jutiapa, Ahuachapán                                 |                        | 87,656.10           | 69,700.18            | 60,149.37        | 86.30             |
| 4843   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilares, San Salvador                           |                        | 85,692.17           | 74,313.17            | 74,313.17        | 100.00            |
| 4922   | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Jose Guayabal, Cuscatlán      |                        | 83,636.80           | 17,894.20            | 17,894.20        | 100.00            |
| 4837   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador                    |                        | 80,775.04           | 80,775.04            | 59,871.43        | 74.12             |
| 4902   | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Jose Ingenio, Metapán, Santa Ana                                     |                        | 75,000.25           | 0.05                 | -                | -                 |
| 4844   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador                      |                        | 72,302.94           | 60,956.62            | 60,956.62        | 100.00            |
| 4934   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz                 |                        | 71,399.82           | 61,359.31            | 61,117.34        | 99.61             |



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE  
(MONTOS EN DOLARES)**

| CODIGO | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO                                                                                                            | No. Prog. y<br>Proyec. | PROGRAMADO<br>TOTAL | PROGRAMADO<br>AL MES | EJECUTADO AL MES | % EJE.<br>FINANC. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 4659   | Remodelación y equipamiento del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales                                                 |                        | 62,761.54           | -                    | -                | -                 |
| 4855   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Paisnal, San Salvador                                        |                        | 60,500.25           | -                    | -                | -                 |
| 4869   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Comacaran, San Miguel                                           |                        | 55,840.28           | 40,010.18            | 40,010.18        | 100.00            |
| 4851   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Tonacatepeque, San Salvador                                  |                        | 55,758.68           | 18,608.69            | 18,608.69        | 100.00            |
| 4870   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lolotique, San Miguel                                           |                        | 53,137.02           | 50,197.44            | 48,041.44        | 95.70             |
| 4838   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Monserrat, San Salvador                                      |                        | 51,826.19           | 47,716.89            | 42,712.65        | 89.51             |
| 4877   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Triunfo, Usulután                                            |                        | 50,601.99           | 40,147.19            | 40,147.19        | 100.00            |
| 4840   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador                                     |                        | 50,074.96           | 29,639.95            | 31,379.90        | 105.87            |
| 4933   | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucia Orcoyo, Olocuitla, La Paz           |                        | 50,000.50           | -                    | -                | -                 |
| 4875   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Primavera, El Tránsito, San Miguel                              |                        | 49,135.47           | 34,507.02            | 34,507.02        | 100.00            |
| 4921   | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Pedro Penulapán, Cuscatlán                                                      |                        | 49,040.00           | -                    | -                | -                 |
| 4841   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador                                   |                        | 48,691.31           | 33,833.00            | 37,203.73        | 109.98            |
| 4925   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Perulapia, Cuscatlán                                         |                        | 48,380.75           | -                    | -                | -                 |
| 4866   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Azacualpa, Chalatenango                                      |                        | 48,320.15           | 38,553.17            | 37,053.17        | 96.11             |
| 4858   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador                         |                        | 47,687.60           | 2,961.35             | 2,961.35         | 100.00            |
| 4846   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Villa Mariona, Cuscatancingo, San Salvador                      |                        | 47,369.56           | 19,599.29            | 19,599.29        | 100.00            |
| 4845   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Popotlán, Apopa, San Salvador                                   |                        | 46,770.50           | 29,430.75            | 27,889.23        | 94.76             |
| 4842   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Barrios, San Salvador                                           |                        | 45,486.89           | 37,451.05            | 37,430.31        | 99.94             |
| 4883   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Palma, Chalatenango                                          |                        | 42,679.34           | 26,643.39            | 26,643.39        | 100.00            |
| 4854   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Guazapa, San Salvador                                        |                        | 38,170.64           | 19,012.15            | 19,012.15        | 100.00            |
| 4849   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Marcos, San Salvador                                        |                        | 38,084.63           | 13,760.07            | 13,760.07        | 100.00            |
| 4857   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador                            |                        | 37,201.46           | 20,808.58            | 20,722.17        | 99.58             |
| 5124   | REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD SAN LUIS TALPA, LA PAZ         |                        | 36,514.39           | 36,514.39            | 36,514.39        | 100.00            |
| 4871   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Cuco, Chinlagua, San Miguel                                  |                        | 35,508.00           | -                    | -                | -                 |
| 4847   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Ciudad Delgado, San Salvador                                    |                        | 35,234.25           | -                    | -                | -                 |
| 4888   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Manuel Gallardo, Colón, La Libertad                             |                        | 35,000.25           | -                    | -                | -                 |
| 4895   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Palmar, Santa Ana                                            |                        | 28,879.11           | 28,879.11            | 28,879.11        | 100.00            |
| 4899   | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Sabanetas, Chalchuapa, Santa Ana                                                       |                        | 25,000.25           | -                    | -                | -                 |
| 4896   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Planes de la Laguna, Santa Ana                                  |                        | 15,500.00           | -                    | -                | -                 |
| 4848   | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador                                         |                        | 13,103.68           | 3,382.39             | 3,382.39         | 100.00            |
| 5129   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD VERAPAZ, SAN VICENTE         |                        | 11,562.35           | 11,562.35            | 11,562.35        | 100.00            |
| 5334   | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA CANOA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN                                                    |                        | 9,256.25            | 9,256.25             | 9,256.25         | 100.00            |
| 5333   | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SISIGUAYO POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN                                                   |                        | 6,802.10            | 6,802.10             | 6,802.10         | 100.00            |
| 5335   | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NUEVO AMANECE POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN                                               |                        | 6,588.25            | 6,588.25             | 6,588.25         | 100.00            |
| 5332   | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NUEVA GRANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN                                               |                        | 5,650.75            | 5,650.75             | 5,650.75         | 100.00            |
| 5112   | REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD APOPA, SAN SALVADOR            |                        | 5,352.20            | 5,352.20             | 5,352.20         | 100.00            |
| 5119   | REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD SANTO TOMÁS, SAN SALVADOR      |                        | 2,419.95            | 2,419.95             | 2,419.95         | 100.00            |
| 5103   | REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA CASA DE SALUD BARRANCONES, PASAQUINA, LA UNIÓN |                        | 2,415.64            | 2,415.64             | 2,415.64         | 100.00            |
| 5331   | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CORRAL DE MULAS POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN                                             |                        | 2,088.85            | 2,088.85             | 2,088.85         | 100.00            |
| 5106   | REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD CONCEPCIÓN, SAN SALVADOR       |                        | 539.10              | 539.10               | 539.10           | 100.00            |



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE  
(MONTOS EN DOLARES)**

| CODIGO       | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO                                                                                                                              | No. Prog. y<br>Proyec. | PROGRAMADO<br>TOTAL  | PROGRAMADO<br>AL MES | EJECUTADO AL MES     | % EJC.<br>FINANC. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 5109         | REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD PANCHIMALCO, SAN SALVADOR                        |                        | 305.00               | 305.00               | 305.00               | 100.00            |
| 5135         | REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA CASA DE SALUD DE JOYA GRANDE, SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR |                        | 162.50               | 162.50               | 162.50               | 100.00            |
| <b>MINED</b> |                                                                                                                                                            | <b>77</b>              | <b>65,758,237.37</b> | <b>34,714,285.34</b> | <b>32,706,140.70</b> | <b>94.22</b>      |
| 5066         | Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador                                                      |                        | 26,663,767.47        | 3,609,681.25         | 4,415,733.22         | 122.33            |
| 5268         | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO-EDUCA)                                                        |                        | 19,120,005.57        | 18,181,728.16        | 14,681,119.53        | 80.75             |
| 5768         | Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACES) - Componente Educación.                                                                  |                        | 2,217,310.00         | 2,179,297.45         | 250,627.88           | 11.50             |
| 5813         | Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.                                                                                                    |                        | 1,171,508.00         | -                    | -                    | -                 |
| 4635         | PROGRAMA DE REPARACIONES MENORES EN CENTROS ESCOLARES A NIVEL NACIONAL                                                                                     |                        | 1,131,631.28         | 841,917.69           | 851,917.69           | 101.19            |
| 4690         | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR                                                                   |                        | 790,519.06           | 375,098.56           | 54,702.15            | 14.58             |
| 5755         | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 16 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE                                                                |                        | 780,663.00           | -                    | 780,663.00           | -                 |
| 4708         | REHABILITACION INSTITUTO NACIONAL CATOLICO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SENSUNTEPEQUE                                                                      |                        | 658,176.44           | 658,176.44           | 658,176.44           | 100.00            |
| 4688         | MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE SAN MARCOS , SAN SALVADOR                                                                                               |                        | 589,280.66           | 589,280.66           | 589,280.66           | 100.00            |
| 5759         | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 10 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE USulután                                                                 |                        | 527,500.00           | -                    | 527,500.00           | -                 |
| 5620         | Programa de Infraestructura Educativa 2012                                                                                                                 |                        | 500,000.00           | 165,104.29           | -                    | -                 |
| 4692         | MEJORAMIENTO DE INSTITUTO NACIONAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS , SAN SALVADOR                                                                                  |                        | 467,792.45           | 467,792.45           | 467,792.45           | 100.00            |
| 4706         | MEJORAMIENTO ESCUELA PARVULARIA MISAE RAMOS, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS                                                                                        |                        | 415,975.85           | 415,975.85           | 415,975.85           | 100.00            |
| 4712         | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR AGUSTIN SANCHEZ, APASTEPEQUE, SAN VICENTE                                                                     |                        | 404,232.95           | 404,232.95           | 404,232.95           | 100.00            |
| 4703         | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR "CANTON SAN JOSE LOMAS DE PEÑA", ILOBASCO, CABAÑAS                                                            |                        | 390,239.08           | 390,239.08           | 390,239.08           | 100.00            |
| 4694         | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANDELARIO CUELLAR, M/COJUTEPEQUE, D/CUSCATLAN.                                                               |                        | 366,278.42           | 366,278.42           | 366,278.42           | 100.00            |
| 5756         | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 8 CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHALATENANGO, LA LIBERTAD Y SAN SALVADOR                                |                        | 344,261.00           | -                    | 344,261.00           | -                 |
| 4664         | REPARACION Y MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCATIVO COL. NUEVA, CANTON GUYAPA ABAJO, JUJUTLA, AHUACHAPAN                                                          |                        | 341,394.00           | 256,045.50           | 341,394.00           | 133.33            |
| 4695         | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR COLONIA FÁTIMA, M/COJUTEPEQUE, D/CUSCATLAN.                                                                   |                        | 313,808.97           | 313,808.97           | 294,980.42           | 94.00             |
| 4705         | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO HUISCOYOL , CANTON TRINIDAD, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS                                                   |                        | 312,854.16           | 312,854.16           | 291,042.91           | 93.03             |
| 4721         | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR EL MARQUEZADO, SANTIAGO DE MARIA, USULUTAN                                                                    |                        | 310,729.00           | 83,898.77            | 254,279.25           | 303.08            |
| 4715         | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE                                                                                                   |                        | 307,020.26           | 288,599.05           | 223,352.43           | 77.39             |
| 4677         | REHABILITACION Y MEJORAS CENTRO ESCOLAR HEROES DEL 11 DE ENERO, CHALATENANGO                                                                               |                        | 282,850.97           | 282,850.97           | 282,025.67           | 99.71             |
| 5758         | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 6 CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y SAN VICENTE                                                    |                        | 266,200.00           | -                    | 266,200.00           | -                 |
| 4943         | CENTRO ESCOLAR BARRIO LA FATIMA, LA UNION                                                                                                                  |                        | 245,028.11           | 61,257.03            | 157,739.46           | 257.50            |
| 4710         | MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE SAN JUAN TEPEZONTES, LA PAZ                                                                                             |                        | 244,034.92           | 122,017.46           | -                    | -                 |
| 4718         | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL TABURETE, JIQUILISCO, USULUTAN                                                                      |                        | 240,843.53           | 60,210.88            | 155,023.00           | 257.47            |
| 4711         | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR ANASTASIO AQUINO, SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ                                                                   |                        | 232,382.79           | 232,382.79           | 116,191.40           | 50.00             |
| 4941         | CENTRO ESCOLAR HACIENDA LA CAÑADA, CONCHAGUA, LA UNION                                                                                                     |                        | 232,292.43           | 232,292.43           | 232,292.43           | 100.00            |
| 4675         | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR JORGE LARDE, JUAYUA, SONSONATE                                                                                |                        | 226,001.14           | 219,107.22           | 106,006.64           | 48.38             |
| 4667         | REPARACION Y MEJORAMIENTO ESC. EDUCACION ESPECIAL DE CHALCHUAPA, SANTA ANA                                                                                 |                        | 221,925.75           | 221,925.75           | 221,925.75           | 100.00            |
| 5761         | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 5 CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE MORAZÁN Y LA UNIÓN                                                      |                        | 217,586.00           | -                    | 217,586.00           | -                 |
| 4942         | CENTRO ESCOLAR CANTON LOS CONEJOS, EL CARMEN, LA UNION                                                                                                     |                        | 216,744.57           | 54,186.14            | 108,372.28           | 200.00            |
| 4636         | PROGRAMA DE DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE CENTROS ESCOLARES A NIVEL NACIONAL                                                                           |                        | 212,740.61           | 67,740.61            | 138,720.61           | 204.78            |
| 4944         | CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CUEVONA, LISIQUE, LA UNION                                                                                                       |                        | 212,485.33           | 212,485.33           | 212,485.33           | 100.00            |
| 4716         | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR BRISAS DEL SOL, BERLIN, USULUTAN                                                                                               |                        | 205,722.83           | 57,494.62            | 102,861.42           | 178.91            |
| 4679         | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA EDUCACION PARVULARIA LUCILA TRUJILLO, CHALATENANGO                                                                   |                        | 203,724.26           | 203,724.26           | 203,724.26           | 100.00            |
| 4701         | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN CARLOS , J/ DOLORES, D/ CABAÑAS                                                                    |                        | 201,024.52           | 69,008.24            | 52,154.27            | 75.58             |
| 5271         | Reconstrucción y Rehabilitación de Centros Escolares Afectados por la Tormenta IDA                                                                         |                        | 200,841.07           | 200,841.07           | 200,841.07           | 100.00            |
| 4685         | REHABILITACION CENTRO ESCOLAR WALTER SOUNDY, SANTA TECLA, LA LIBERTAD                                                                                      |                        | 199,040.00           | 199,040.00           | 199,040.00           | 100.00            |
| 5754         | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA                                                                 |                        | 193,200.00           | -                    | 193,200.00           | -                 |



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE  
(MONTOS EN DOLARES)**

| CODIGO            | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO                                                                                                                        | No. Prog. y<br>Proyec. | PROGRAMADO<br>TOTAL  | PROGRAMADO<br>AL MES | EJECUTADO AL MES     | % EJEC.<br>FINANC. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 4723              | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CHAPELTIQUE, SAN MIGUEL                                                                          |                        | 184,181.36           | 52,568.78            | 143,469.15           | 272.92             |
| 5757              | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCATLÁN Y CABAÑAS                                               |                        | 179,000.00           | -                    | 179,000.00           | -                  |
| 5760              | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL                                                          |                        | 173,900.00           | -                    | 173,900.00           | -                  |
| 4704              | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR ISABEL LA CATÓLICA, CANTON LOS LLANITOS, ILOBASCO, CABAÑAS                                              |                        | 168,799.02           | 168,799.02           | 168,799.02           | 100.00             |
| 5753              | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN                                                          |                        | 167,800.00           | -                    | 167,800.00           | -                  |
| 4726              | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR PARAISO REAL, SAN MIGUEL                                                                                |                        | 162,162.74           | 152,432.99           | 162,162.74           | 106.38             |
| 4727              | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL "DE ULUAZAPA", SAN MIGUEL                                                                           |                        | 153,144.09           | 153,144.09           | 153,144.09           | 100.00             |
| 4939              | INSTITUTO NACIONAL DE OSICALA, MORAZAN                                                                                                               |                        | 152,655.43           | 152,655.43           | 152,655.43           | 100.00             |
| 4665              | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO, JUJUTLA, AHUACHAPAN                                                                                  |                        | 142,340.87           | 142,340.87           | 142,340.87           | 100.00             |
| 4728              | CENTRO ESCOLAR COLONIA CARRILLO, CANTON EL PAPALÓN, SAN MIGUEL                                                                                       |                        | 141,923.60           | 39,716.81            | 89,708.80            | 225.87             |
| 4700              | MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CINQUERA, CABAÑAS                                                                                                 |                        | 140,125.99           | 140,125.99           | 140,125.99           | 100.00             |
| 4662              | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO NUEVO NANCE AMARILLO, CANTON RIO FRIO, AHUACHAPAN                                                                |                        | 133,645.70           | 133,645.70           | 133,645.70           | 100.00             |
| 4725              | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR LA CARMENZA, SAN MIGUEL                                                                                                  |                        | 121,862.99           | 58,056.61            | 59,214.58            | 101.99             |
| 4702              | CENTRO ESCOLAR CASERIO CONCEPCION, CANTON LA QUESERA, ILOBASCO, CABAÑAS                                                                              |                        | 119,691.71           | 29,922.93            | 58,129.54            | 194.26             |
| 4676              | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SISIMITEPEC, NAHUIZALCO, SONSONATE                                                                      |                        | 117,534.81           | 117,534.81           | 117,534.81           | 100.00             |
| 4666              | REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON GUASCOTA, SAN LORENZO AHUACHAPAN                                                                                |                        | 112,317.99           | 64,426.90            | 71,986.70            | 111.73             |
| 4671              | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCATIVO HACIENDA SAN CAYETANO, SANTA ANA                                                                    |                        | 106,866.86           | 106,866.86           | 106,866.86           | 100.00             |
| 4663              | REPARACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL SALITRERO, ATQUIZAYA, AHUACHAPAN                                                                  |                        | 105,867.25           | 105,867.25           | 105,867.25           | 100.00             |
| 4709              | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR FABIO IGNACIO MAGAÑA, EL ROSARIO, LA PAZ                                                                |                        | 99,975.00            | 93,976.50            | 99,975.00            | 106.38             |
| 4683              | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR DE QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD                                                                           |                        | 99,698.35            | 99,698.35            | 99,698.35            | 100.00             |
| 4673              | REPARACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON CERRO ALTO, CALUCO, SONSONATE                                                                        |                        | 86,511.83            | 86,511.83            | 81,321.13            | 94.00              |
| 4682              | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR JICALAPA, LA LIBERTAD                                                                                   |                        | 78,718.08            | 78,718.08            | 78,718.08            | 100.00             |
| 4940              | INSTITUTO NACIONAL DE SAN SIMON, MORAZAN                                                                                                             |                        | 78,505.00            | 19,626.25            | 20,701.50            | 105.48             |
| 4678              | REPARACION ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "DE CHALATENANGO" , CHALATENANGO                                                                            |                        | 73,897.96            | 73,897.96            | 73,897.96            | 100.00             |
| 4714              | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN VICENTE                                                                           |                        | 64,948.86            | 64,948.86            | 64,948.86            | 100.00             |
| 4707              | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO CERRO EL TORO, C/ LA TRINIDAD, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS                                           |                        | 51,367.14            | 23,049.84            | 11,342.28            | 49.21              |
| 4722              | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE USULUTAN                                                                              |                        | 46,192.73            | 46,192.73            | -                    | -                  |
| 4186              | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS ESCOLARES EN DPTOS. DE AHUACHAPAN, CHALATENANGO, SAN MIGUEL, Y MORAZAN                                        |                        | 37,821.00            | 37,821.00            | 5,200.00             | 13.75              |
| 4669              | REHABILITACION ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE METAPAN, SANTA ANA                                                                                   |                        | 20,244.62            | 20,244.62            | 20,244.62            | 100.00             |
| 4687              | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL BARILLO, ZARAGOZA, LA LIBERTAD                                                                                 |                        | 18,622.00            | 18,621.84            | 17,504.53            | 94.00              |
| 4699              | REHABILITACION COMPLEJO EDUCATIVO RAFAEL CABRERA , M/SAN RAMON, D/CUSCATLAN.                                                                         |                        | 18,574.97            | 18,574.97            | 18,574.97            | 100.00             |
| 4686              | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON SAN SEBASTIAN, ZARAGOZA, LA LIBERTAD                                                             |                        | 14,608.84            | 14,608.84            | 14,608.84            | 100.00             |
| 4698              | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN CERRO COLORADO, M/SAN RAFAEL CEDROS, D/CUSCATLAN.                                                |                        | 954.7                | 954.7                | 954.7                | 100.00             |
| 4684              | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ZAPOTE, CANTON CASTILLO, SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD                                                          |                        | 749.87               | 749.87               | 749.87               | 100.00             |
| 4693              | MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL GENERAL ADOLFO BLANDÓN, M/COJUTEPEQUE, D/CUSCATLAN.                                                       |                        | 712.91               | 712.91               | 712.91               | 100.00             |
| 4672              | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO VALLE NUEVO, CANTON METALIO, ACAJUTLA, SONSONATE                                                |                        | 696.65               | 696.65               | 696.65               | 100.00             |
| <b>PNC - MJSP</b> |                                                                                                                                                      | <b>4</b>               | <b>19,755,325.33</b> | <b>19,755,325.33</b> | <b>12,364,522.29</b> | <b>62.59</b>       |
| 5099              | Suministro e Instalación del Sistema Integral para los Centros de Atención de Emergencias 911 y AVL/GPS de la Policía Nacional Civil de El Salvador. |                        | 16,788,583.33        | 16,788,583.33        | 10,743,095.85        | 63.99              |
| 4766              | Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil                                                                             |                        | 1,700,000.00         | 1,700,000.00         | 1,234,815.50         | 72.64              |
| 5436              | Equipamiento e instalación de un sistema para el registro del Expediente Único Digital de la Policía Nacional Civil.                                 |                        | 1,100,000.00         | 1,100,000.00         | 386,610.94           | 35.15              |
| 5778              | Construcción de Estacionamiento en Instalaciones de la Subdirección de Tránsito Terrestre de la PNC.                                                 |                        | 166,742.00           | 166,742.00           | -                    | -                  |
| <b>CSJ</b>        |                                                                                                                                                      | <b>10</b>              | <b>18,723,845.00</b> | <b>16,208,821.41</b> | <b>283,591.38</b>    | <b>1.75</b>        |
| 4344              | Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador                                                                         |                        | 9,149,333.00         | 7,640,759.41         | -                    | -                  |
| 3831              | Construcción Centro Judicial Integrado de La Unión                                                                                                   |                        | 2,570,120.00         | 2,570,120.00         | 8,518.00             | 0.33               |
| 4225              | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR                                           |                        | 2,168,000.00         | 2,168,000.00         | 11,372.00            | 0.52               |



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE  
(MONTOS EN DOLARES)**

| CODIGO       | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO                                                                                                                                                                                               | No. Prog. y<br>Proyec. | PROGRAMADO<br>TOTAL  | PROGRAMADO<br>AL MES | EJECUTADO AL MES     | % EJEC.<br>FINANC. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 5637         | Construcción y Equipamiento de Salas de Audiencia en Tribunales a Nivel Nacional                                                                                                                                            |                        | 1,500,000.00         | 510,050.00           | 8,635.13             | 1.69               |
| 5638         | Remodelaciones, Ampliaciones, Readequaciones y Mejoras Institucionales a Nivel Nacional.                                                                                                                                    |                        | 1,500,000.00         | 1,483,500.00         | 255,066.25           | 17.19              |
| 3385         | Construcción Centro Judicial Integrado de Apopa, San Salvador                                                                                                                                                               |                        | 1,004,392.00         | 1,004,392.00         | -                    | -                  |
| 3388         | "Construcción Centro Judicial Integrado de San Marcos, San Salvador".                                                                                                                                                       |                        | 350,000.00           | 350,000.00           | -                    | -                  |
| 3465         | Remodelación y Ampliación Centro Judicial Integrado de Sonsonate                                                                                                                                                            |                        | 350,000.00           | 350,000.00           | -                    | -                  |
| 5444         | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE LA CIRCUNSCRIPCION DE SAN RAFAEL, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO                                                                                                 |                        | 66,000.00            | 66,000.00            | -                    | -                  |
| 5445         | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE LA CIRCUNSCRIPCION DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.                                                                                   |                        | 66,000.00            | 66,000.00            | -                    | -                  |
| <b>VMVDU</b> |                                                                                                                                                                                                                             | <b>4</b>               | <b>20,828,088.00</b> | <b>13,185,659.29</b> | <b>3,264,616.67</b>  | <b>24.69</b>       |
| 5132         | PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS                                                                                                                                             |                        | 10,500,000.00        | 5,299,996.29         | 2,399,892.67         | 45.28              |
| 5100         | DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA                                                                                                                                 |                        | 7,445,585.00         | 6,281,300.00         | -                    | -                  |
| 5769         | Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios- PACSES, a nivel Nacional.                                                                                                                             |                        | 2,086,880.00         | 809,740.00           | 59,100.00            | 7.30               |
| 5781         | Programa de fortalecimiento de las capacidades asociativas para la generación de empleo intensivo en Comunidades Solidarias Urbanas, a nivel Nacional.                                                                      |                        | 795,623.00           | 795,623.00           | 795,623.00           | 100.00             |
| <b>MAG</b>   |                                                                                                                                                                                                                             | <b>21</b>              | <b>19,620,223.57</b> | <b>16,231,186.08</b> | <b>10,664,791.47</b> | <b>68.50</b>       |
| 3752         | Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO)                                                                                                                                              |                        | 4,936,628.03         | 4,876,265.40         | 3,692,198.70         | 75.72              |
| 4377         | PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LA REGION CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR-Central)                                                                                                                        |                        | 4,903,835.00         | 4,796,764.22         | 3,265,586.81         | 68.08              |
| 5725         | CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA REGIÓN ORIENTAL CEDAF MORAZAN                                                                                                    |                        | 2,050,000.00         | 1,933,099.00         | 84,699.60            | 4.38               |
| 5730         | Fortalecimiento de las Capacidades Productivas de Productores y Productoras de Hortalizas y Frutas, en 46 Municipios de 10 Departamentos Atendidos por el Programa PAF Cadenas Productivas del Plan de Agricultura Familiar |                        | 1,466,130.30         | 1,028,420.20         | -                    | -                  |
| 5731         | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS FAMILIAS RURALES PARA MEJORAR SUS INGRESOS, EN MUNICIPIOS DE LAS REGIONES CENTRAL Y OCCIDENTAL DE EL SALVADOR                                                         |                        | 1,400,000.00         | 1,400,000.00         | 1,400,000.00         | 100.00             |
| 5783         | Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de Riego del Bajo Lempa, en los Departamentos de San Vicente, La Paz y Usulután                                                                                                      |                        | 1,223,123.17         | 813,673.17           | -                    | -                  |
| 4643         | Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador                                                                                                            |                        | 1,075,979.57         | 1,002,438.59         | 632,109.67           | 63.06              |
| 4648         | Construcción de Obras de Mitigación en Cordillera El Bálsamo, al Sur de Santa Tecla, 2da. Etapa                                                                                                                             |                        | 804,112.48           | 804,112.48           | 635,033.09           | 78.97              |
| 4646         | Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de Control de Inundaciones                                                                                           |                        | 343,613.53           | 343,613.53           | 191,208.64           | 55.65              |
| 4650         | Construcción de Obras de Control de Inundaciones Rios Tihuapa - Huiza, Depto. de La Libertad                                                                                                                                |                        | 218,078.73           | 218,078.73           | 218,078.73           | 100.00             |
| 4651         | Construcción de Muro de Retención en Quebrada La Oscurana, Municipio de Berlín                                                                                                                                              |                        | 204,997.87           | 167,587.87           | 131,975.32           | 78.75              |
| 5729         | Construcción y Equipamiento de Infraestructura para la Producción de Camarón Marino y Cultivo de Tilapia, como Apoyo a Organizaciones Acuicolas en el Departamento de Usulután.                                             |                        | 200,000.00           | 154,408.00           | 33,912.99            | 21.96              |
| 2963         | PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION RURAL (PREMODER)                                                                                                                                                                 |                        | 155,000.00           | 155,000.00           | 149,938.07           | 96.73              |
| 5300         | REACTIVACION DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION ACUICOLA Y ENTREGA DE POST-LARVAS DE CAMARON MARINO, A COOPERATIVAS CAMARONERAS DEL BAJO LEMPA AFECTADAS POR LA DEPRESION TROPICAL IDA                                        |                        | 147,965.95           | 147,965.95           | 145,715.95           | 98.48              |
| 5764         | Fortalecimiento Institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológicas en Sanidad Animal, Análisis de Riesgo de Plagas y Sistema de Inteligencia de Mercados Agropecuarios en El Salvador               |                        | 143,700.00           | 143,700.00           | -                    | -                  |
| 5763         | Remodelación y Equipamiento del Laboratorio de Microbiología de Alimentos sede El Matzapán para la Inspección Sanitaria de la Carne                                                                                         |                        | 130,000.00           | 129,000.00           | 1,000.00             | 0.78               |
| 4647         | Obras de Control de Inundaciones en los Rios Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Goascorán (II Fase)                                                                                                                  |                        | 77,717.06            | 77,717.06            | 44,406.70            | 57.14              |
| 5297         | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN COOPERATIVAS DE LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE                                                                                                                      |                        | 34,256.52            | 34,256.52            | 34,126.52            | 99.62              |
| 4649         | Reparación de Cárcava en Asentamiento Bello Horizonte, Comasagua, La Libertad                                                                                                                                               |                        | 4,681.61             | 4,681.61             | 4,681.61             | 100.00             |
| 5284         | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS RIOS LEMPA, GRANDE DE SAN MIGUEL, PAZ Y JIBOA                                                                                           |                        | 282.68               | 282.68               | -                    | -                  |
| 4644         | Fortalecimiento del Sector Pecuário y Avícola en El Salvador                                                                                                                                                                |                        | 121.07               | 121.07               | 121.07               | 100.00             |
| <b>MH</b>    |                                                                                                                                                                                                                             | <b>9</b>               | <b>12,322,517.40</b> | <b>10,634,351.40</b> | <b>933,940.99</b>    | <b>8.78</b>        |
| 4958         | Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV.                                                                                                                     |                        | 11,300,000.00        | 10,384,000.00        | 670,741.73           | 6.46               |
| 5749         | Remodelación de las instalaciones físicas de la Dirección General de Aduanas y Aduana San Bartolo                                                                                                                           |                        | 563,426.36           | -                    | -                    | -                  |
| 5776         | REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                            |                        | 163,538.93           | -                    | -                    | -                  |
| 5522         | REPARACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓN EN EL CENTRO RECREATIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, SAN BARTOLO, ILOPANGO.                                                                            |                        | 87,284.77            | 87,284.77            | 87,284.77            | 100.00             |
| 5631         | EQUIPAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS SEIS ADUANAS DE FRONTERA DE EL SALVADOR.                                                                                                                           |                        | 80,574.65            | 80,574.65            | 80,574.65            | 100.00             |





**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE  
(MONTOS EN DOLARES)**

| CODIGO                                                    | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO                                                                                                                                                        | No. Prog. y<br>Proyec. | PROGRAMADO<br>TOTAL | PROGRAMADO<br>AL MES | EJECUTADO AL MES    | % EJE.<br>FINANC. |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 5747                                                      | REPARACIÓN DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                              |                        | 49,710.00           | 49,710.00            | 49,199.10           | 98.97             |
| 5736                                                      | PROTECCIÓN PERIMETRAL DE DOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                          |                        | 45,200.00           | -                    | 13,358.76           | -                 |
| 5513                                                      | Reparaciones en infraestructura de la Aduana en Frontera Las Chinamas, Departamento de Ahuachapán.                                                                                   |                        | 32,781.98           | 32,781.98            | 32,781.98           | 100.00            |
| 4204                                                      | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TRIBUTARIA                                                                                                                                               |                        | 0.71                | -                    | -                   | -                 |
| <b>Centros Intermedios (CI - MJSP)</b>                    |                                                                                                                                                                                      | <b>1</b>               | <b>9,040,000.00</b> | <b>8,403,009.97</b>  | <b>2,884,254.62</b> | <b>34.32</b>      |
| 5137                                                      | Granja de Rehabilitación para Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil de Ilobasco, Departamento de Cabañas                                                                     |                        | 9,040,000.00        | 8,403,009.97         | 2,884,254.62        | 34.32             |
| <b>MARN</b>                                               |                                                                                                                                                                                      | <b>5</b>               | <b>7,746,361.92</b> | <b>4,196,785.61</b>  | <b>3,161,416.41</b> | <b>75.33</b>      |
| 5102                                                      | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL                                                                                             |                        | 5,429,646.12        | 1,966,601.91         | 1,784,878.29        | 90.76             |
| 5563                                                      | Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias - Programa de Agua y Saneamiento Rural                                                                 |                        | 850,000.00          | 777,661.40           | 57,047.63           | 7.34              |
| 5229                                                      | PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE RIESGO                                                                                                                                             |                        | 710,880.37          | 710,880.37           | 710,880.37          | 100.00            |
| 5742                                                      | PROGRAMA DE MANEJO DE ECOSISTEMAS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD                                                                                                                      |                        | 500,000.00          | 485,806.50           | 352,773.69          | 72.62             |
| 2881                                                      | PROGRAMA DE DESCONTAMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS                                                                                                                                       |                        | 255,835.43          | 255,835.43           | 255,835.43          | 100.00            |
| <b>ILEA</b>                                               |                                                                                                                                                                                      | <b>1</b>               | <b>5,663,685.00</b> | <b>3,864,548.32</b>  | <b>466,647.26</b>   | <b>12.05</b>      |
| 4493                                                      | "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, ILEA SAN SALVADOR"                                                                            |                        | 5,663,685.00        | 3,864,548.32         | 466,647.26          | 12.05             |
| <b>Secretaría de Inclusión Social (SIS)</b>               |                                                                                                                                                                                      | <b>3</b>               | <b>3,111,560.00</b> | <b>1,759,129.85</b>  | <b>452,348.98</b>   | <b>25.71</b>      |
| 5644                                                      | PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROMOCION COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CIUDAD MUJER                                                                                 |                        | 1,756,085.00        | 447,126.75           | 452,348.98          | 101.17            |
| 5785                                                      | Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer Usulután, Santa Ana y San Martín                                                                                                           |                        | 1,304,300.00        | 1,260,828.10         | -                   | -                 |
| 5740                                                      | CONSTRUCCION DE KIOSCO DE MADERA PARA OFICINA DE SOLVENCIAS DE LA PNC EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO DE CIUDAD MUJER, COLON                                                          |                        | 51,175.00           | 51,175.00            | -                   | -                 |
| <b>AL</b>                                                 |                                                                                                                                                                                      | <b>1</b>               | <b>1,383,091.29</b> | <b>1,368,591.29</b>  | <b>829,697.14</b>   | <b>60.62</b>      |
| 5222                                                      | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO II                                                                                                                                  |                        | 1,383,091.29        | 1,368,591.29         | 829,697.14          | 60.62             |
| <b>MIGOB</b>                                              |                                                                                                                                                                                      | <b>4</b>               | <b>1,243,353.91</b> | <b>869,013.25</b>    | <b>527,105.44</b>   | <b>60.66</b>      |
| 5277                                                      | Mejoramiento de Infraestructura de 9 Gobernaciones Departamentales a nivel nacional                                                                                                  |                        | 830,923.20          | 537,188.77           | 391,873.61          | 72.95             |
| 5775                                                      | Construcción de la Infraestructura para albergar la Gobernación Política Departamental de San Vicente.                                                                               |                        | 164,597.00          | 83,990.77            | 49,445.44           | 58.87             |
| 5572                                                      | Suministro e Instalación de Sub-Estación Eléctrica de 1000kva para Imprenta Nacional.                                                                                                |                        | 162,047.32          | 162,047.32           | -                   | -                 |
| 5275                                                      | Adquisición de equipo par las Gobernaciones Departamentales, Dirección de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y Cuerpo de Bomberos del Ministerio de Gobernación  |                        | 85,786.39           | 85,786.39            | 85,786.39           | 100.00            |
| <b>Secretaría de Estado (SE - MJSP)</b>                   |                                                                                                                                                                                      | <b>1</b>               | <b>1,130,000.96</b> | <b>1,130,000.96</b>  | <b>711,767.38</b>   | <b>62.99</b>      |
| 5136                                                      | Programa de Prevención de la Violencia y la Delincuencia                                                                                                                             |                        | 1,130,000.96        | 1,130,000.96         | 711,767.38          | 62.99             |
| <b>MTYPS</b>                                              |                                                                                                                                                                                      | <b>3</b>               | <b>769,619.96</b>   | <b>769,619.96</b>    | <b>759,259.43</b>   | <b>98.65</b>      |
| 5625                                                      | REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA CENTRO DE RECREACION OBRERA DR. MARIO ZAMORA RIVAS LA PALMA-CHALATENANGO, MTYS                                                                       |                        | 500,000.00          | 500,000.00           | 492,681.07          | 98.54             |
| 5626                                                      | REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA CENTRO DE RECREACION OBRERA CONSTITUCION 1950, COATEPEQUE-SANTA ANA II ETAPA, MTYS                                                                   |                        | 200,000.00          | 200,000.00           | 200,000.00          | 100.00            |
| 5191                                                      | Construcción, Reconstrucción, Modernización y Equipamiento en Centro de Recreación Obrera, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Constitución 1950, Lago de Coatepeque Santa Ana |                        | 69,619.96           | 69,619.96            | 66,578.36           | 95.63             |
| <b>MIREX</b>                                              |                                                                                                                                                                                      | <b>1</b>               | <b>467,000.00</b>   | <b>467,000.00</b>    | <b>467,000.00</b>   | <b>100.00</b>     |
| 5557                                                      | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ESPAÑA EL SALVADOR (FFI) - APOORTE EL SALVADOR                                                                          |                        | 467,000.00          | 467,000.00           | 467,000.00          | 100.00            |
| <b>Dirección General de Centros Penales (DGCP - MJSP)</b> |                                                                                                                                                                                      | <b>5</b>               | <b>2,458,436.48</b> | <b>2,142,660.48</b>  | <b>463,357.36</b>   | <b>21.63</b>      |
| 5791                                                      | Readecuación y Equipamiento de Granjas Penitenciarias en Izalco y Santa Ana                                                                                                          |                        | 1,998,700.00        | 1,682,914.00         | 3,620.88            | 0.22              |
| 5520                                                      | Obras de Reforzamiento de Seguridad Pasiva y Control del Centro Penal de Zacatecoluca                                                                                                |                        | 187,782.01          | 187,782.01           | 187,782.01          | 100.00            |
| 5582                                                      | Construcción y readecuación de instalaciones del Centro de Formación de la Escuela Penitenciaria en la Penitenciaría Central La Esperanza, Dpto. San Salvador                        |                        | 113,552.81          | 113,552.81           | 113,552.81          | 100.00            |
| 5518                                                      | Readecuación del Área de Visitas de los Centros Penitenciarios de Quezaltepeque y Ciudad Barrios                                                                                     |                        | 84,530.26           | 84,530.26            | 84,530.26           | 100.00            |
| 5519                                                      | Reparación e impermeabilización de techos en el Centro Penitenciario de Zacatecoluca                                                                                                 |                        | 73,871.40           | 73,871.40            | 73,871.40           | 100.00            |



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE  
(MONTOS EN DOLARES)**

| CODIGO                                                 | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO                                                                                                                                                        | No. Prog. y<br>Proyec. | PROGRAMADO<br>TOTAL   | PROGRAMADO<br>AL MES  | EJECUTADO AL MES     | % EJE.<br>FINANC. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>BOMBER - MIGOB</b>                                  |                                                                                                                                                                                      | <b>2</b>               | <b>198,046.01</b>     | <b>198,046.01</b>     | <b>198,036.89</b>    | <b>99.99</b>      |
| 5270                                                   | Adquisición de equipo para el Cuerpo de Bomberos de El Salvador a nivel nacional                                                                                                     |                        | 157,228.95            | 157,228.95            | 157,228.95           | 100.00            |
| 4999                                                   | Construcción y Equipamiento de dormitorios para el personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Estación Central.                                                                 |                        | 40,817.06             | 40,817.06             | 40,808.74            | 99.97             |
| <b>VMT</b>                                             |                                                                                                                                                                                      | <b>1</b>               | <b>12,725,525.00</b>  | <b>-</b>              | <b>5,000.00</b>      | <b>-</b>          |
| 5478                                                   | Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador                                                                                                                        |                        | 12,725,525.00         | -                     | 5,000.00             | -                 |
| <b>CONJUVE</b>                                         |                                                                                                                                                                                      | <b>1</b>               | <b>900,531.00</b>     | <b>775,398.25</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
| 5770                                                   | Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias - FOCAP |                        | 900,531.00            | 775,398.25            | -                    | -                 |
| <b>Secr. de Cultura</b>                                |                                                                                                                                                                                      | <b>2</b>               | <b>792,060.00</b>     | <b>186,862.21</b>     | <b>144,338.96</b>    | <b>77.24</b>      |
| 5798                                                   | MEJORAMIENTO, ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE LA CULTURA A NIVEL NACIONAL, PARA LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR                                                |                        | 605,630.00            | 37,608.18             | 19,940.80            | 53.02             |
| 5647                                                   | RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL SANTA LUCÍA DE SUCHITOTO, SEGUNDA FASE                                                                                                         |                        | 186,430.00            | 149,254.03            | 124,398.16           | 83.35             |
| <b>INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                                                                                                                                                                                      |                        |                       |                       |                      |                   |
| <b>FISDL</b>                                           |                                                                                                                                                                                      | <b>13</b>              | <b>137,499,559.95</b> | <b>110,211,304.83</b> | <b>83,757,779.46</b> | <b>76.00</b>      |
| 4997                                                   | PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL                                                                                                                                      |                        | 54,844,951.18         | 45,940,717.08         | 42,805,503.24        | 93.18             |
| 5629                                                   | PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y EMPLEABILIDAD                                                                                                                                |                        | 27,260,092.00         | 21,773,550.05         | 16,954,863.41        | 77.87             |
| 5384                                                   | PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS                                                                                                                     |                        | 13,500,000.00         | 11,231,181.00         | 5,488,483.38         | 48.87             |
| 5628                                                   | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER                                                                                                                             |                        | 11,085,875.00         | 10,028,093.71         | 7,904,578.16         | 78.82             |
| 5630                                                   | COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN EDUCACIÓN                                                                                                                                   |                        | 7,797,254.00          | 2,802,545.00          | 394,087.73           | 14.08             |
| 4996                                                   | PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FISDL V)                                                                                                              |                        | 6,658,772.96          | 5,784,279.18          | 4,387,406.52         | 75.85             |
| 4460                                                   | FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNANZA (FISDL / KFW IV)                                                                                                                           |                        | 4,581,920.00          | 4,409,245.00          | 2,495,458.53         | 56.60             |
| 2660                                                   | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL                                                                                                                                                       |                        | 3,900,000.00          | 2,850,069.00          | 812,774.76           | 28.52             |
| 4184                                                   | PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA DE EL SALVADOR (PAPE)                                                                                                                                |                        | 3,094,739.86          | 2,169,552.86          | 1,725,879.19         | 79.55             |
| 5627                                                   | PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR, COMPONENTE I                                                                                                                    |                        | 3,000,000.00          | 1,891,365.00          | 61,597.09            | 3.27              |
| 4472                                                   | PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV                                                                                                                   |                        | 1,600,000.00          | 1,164,752.00          | 587,417.71           | 48.72             |
| 5648                                                   | Rehabilitación de Infraestructura Básica en Municipios Afectados por la Depresión Tropical 12 E                                                                                      |                        | 114,585.00            | 114,585.00            | 98,359.79            | 85.84             |
| 5045                                                   | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES DE SALUD EN COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES                                                                                      |                        | 61,369.95             | 61,369.95             | 61,369.95            | 100.00            |
| <b>FOVIAL</b>                                          |                                                                                                                                                                                      | <b>26</b>              | <b>49,823,821.28</b>  | <b>41,479,084.88</b>  | <b>21,705,177.45</b> | <b>52.33</b>      |
| 4784                                                   | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2012                                                                                                                                         |                        | 16,465,700.00         | 13,465,700.00         | 3,028,587.92         | 22.49             |
| 4783                                                   | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2011                                                                                                                                         |                        | 12,933,982.28         | 12,933,982.28         | 11,344,096.77        | 87.71             |
| 4795                                                   | Mejoramiento Camino Rural UNIO2S, Tramo: El Jagüey - El Tamarindo, Departamento de La Unión                                                                                          |                        | 4,387,437.65          | 2,249,661.30          | 76,022.76            | 3.38              |
| 4774                                                   | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2012                                                                                                                        |                        | 2,090,000.00          | 1,313,230.37          | 95,661.98            | 7.28              |
| 4778                                                   | PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2011                                                                                                                                   |                        | 1,938,393.57          | 1,938,393.57          | 1,928,660.17         | 99.39             |
| 4771                                                   | Mejoramiento Camino Rural AHU24S/AHU25S, Entre: Km. 151 Carretera El Litoral (CA02W) - Garita Palmera. Ahuachapán.                                                                   |                        | 1,793,170.39          | 1,793,170.39          | 1,152,125.98         | 64.25             |
| 5509                                                   | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN KM 124+000 DE LA CARRETERA CA08W, FRONTERA LAS CHINAMAS                                                                                       |                        | 1,547,805.83          | 547,805.83            | 19,015.36            | 3.47              |
| 5541                                                   | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL UNI39S: CA02E - EMBARCADERO LOS CORRALES, DEPARTAMENTO DE LA UNION                                                                                         |                        | 1,471,497.77          | 1,215,172.40          | 68,059.40            | 7.25              |
| 4773                                                   | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2011                                                                                                                        |                        | 1,303,858.58          | 1,303,858.58          | 1,159,982.05         | 88.97             |
| 5405                                                   | Reparación de Calle entre Urbanización Plan del Pino Municipio de Soyapango y Municipio de Ciudad Delgado, Depto de San Salvador.                                                    |                        | 1,139,782.24          | 1,139,782.24          | 524,879.29           | 46.05             |
| 4779                                                   | PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2012                                                                                                                                   |                        | 900,000.00            | -                     | -                    | -                 |
| 4794                                                   | Mejoramiento Camino Rural UNI22N, Tramo Nueva Esparta - Polorós, La Unión                                                                                                            |                        | 822,771.12            | 822,771.12            | -                    | -                 |
| 5621                                                   | CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION EN EST. 0+500 DE LA RUTA SAN19W:SAN21E-MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA                                                                        |                        | 455,216.00            | 380,245.34            | 364,132.59           | 95.76             |
| 5521                                                   | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN LA ZONA DEL PUENTE SOBRE EL RIO EL DESAGUE, EST. 31+720 DE LA CARRETERA RN03E, CANDELARIA, CUSCATLAN                                          |                        | 447,660.75            | 447,660.75            | 447,378.79           | 99.94             |
| 4488                                                   | Administración del Programa (Unidad Ejecutora)                                                                                                                                       |                        | 447,382.00            | 307,163.32            | 149,694.02           | 48.73             |
| 5403                                                   | Reparación de calle SAL22S,Tramo Puerta del Diablo(SAL07W)- Mil Cumbres, Municipio de Panchimalco,Departamento de San Salvador                                                       |                        | 388,419.36            | 388,419.36            | 290,060.58           | 74.68             |
| 5408                                                   | Mejoramiento Camino Rural PAZ37E/PAZ10S, Tramo: Cantón el Nilo -Cantón El Garrapatero-Cantón San Francisco Los Reyes(PAZ10S)-CA:02E, Departamento de la Paz                          |                        | 380,449.59            | 380,449.59            | 158,305.85           | 41.61             |
| 5622                                                   | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION EN EJE 73-B (BOULEVARD VENEZUELA), EST. 1+400, SAN SALVADOR                                                                                  |                        | 375,591.36            | 316,915.65            | 370,961.94           | 117.05            |



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE  
(MONTOS EN DOLARES)**

| CODIGO                  | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO                                                                                                                                                         | No. Prog. y<br>Proyec. | PROGRAMADO<br>TOTAL  | PROGRAMADO<br>AL MES | EJECUTADO AL MES    | % EJEC.<br>FINANC. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 5515                    | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS PAVIMENTADAS DEL DEPARTAMENTO DE USulután                                                              |                        | 191,486.56           | 191,486.56           | 191,486.56          | 100.00             |
| 5280                    | REPARACION DE OBRA DE PASO EN EST. 1+060 DE RUTA RN02E, SOYAPANGO, SAN SALVADOR                                                                                                       |                        | 116,621.47           | 116,621.47           | 102,385.70          | 87.79              |
| 5379                    | REPARACIÓN DE CÁRCAVAS EN KM 17+400 Y KM 18+400 DE LA RUTA RN05S, SANTO TOMAS, SAN SALVADOR                                                                                           |                        | 109,653.69           | 109,653.69           | 109,653.67          | 100.00             |
| 5516                    | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS NO PAVIMENTADAS DEL DEPARTAMENTO DE USulután                                                           |                        | 52,269.40            | 52,269.40            | 45,989.56           | 87.99              |
| 5508                    | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN LA RUTA CA02E, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y LA PAZ                                                        |                        | 45,260.48            | 45,260.48            | 45,260.48           | 100.00             |
| 5282                    | REPARACION DE CARCAVA EN KM. 37+450 DE RUTA RN05S, SAN LUIS TALPA, LA PAZ                                                                                                             |                        | 8,283.79             | 8,283.79             | 5,739.89            | 69.29              |
| 4786                    | Mejoramiento del Camino Rural USU27E, entre Cantón La Canoa (Et. USU08S) - Corral de Mulas, Usulután                                                                                  |                        | 7,138.03             | 7,138.03             | 7,138.03            | 100.00             |
| 5281                    | REPARACION DE OBRA DE PASO EN EJE 81 (ZOOLOGICO NACIONAL), SAN SALVADOR                                                                                                               |                        | 3,989.37             | 3,989.37             | 1,998.11            | 50.09              |
| <b>CNR</b>              |                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>               | <b>16,449,466.08</b> | <b>15,110,987.77</b> | <b>3,819,625.84</b> | <b>25.28</b>       |
| 3541                    | PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II                                                                                                       |                        | 16,449,466.08        | 15,110,987.77        | 3,819,625.84        | 25.28              |
| <b>UES</b>              |                                                                                                                                                                                       | <b>20</b>              | <b>14,679,238.66</b> | <b>13,217,350.02</b> | <b>2,687,097.04</b> | <b>19.67</b>       |
| 3762                    | CONSTRUCCION DE BOVEDA                                                                                                                                                                |                        | 6,500,000.00         | 5,687,500.00         | -                   | -                  |
| 5025                    | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA JÓVENES TALENTO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR                                                                                                         |                        | 2,000,000.00         | 1,775,000.00         | -                   | -                  |
| 5024                    | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES GENERANDO OPORTUNIDADES DE ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CON PERSPECTIVAS HACIA EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL |                        | 1,643,792.03         | 1,479,403.50         | 1,437,982.45        | 97.20              |
| 5013                    | Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias Economicas                                                                                                             |                        | 755,571.47           | 755,571.47           | -                   | -                  |
| 5015                    | Construcción de Edificio para instituto de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas                                                                    |                        | 653,846.00           | 573,846.00           | -                   | -                  |
| 5016                    | Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias y Humanidades.                                                                                                       |                        | 653,846.00           | 573,846.00           | -                   | -                  |
| 5012                    | Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente                                                                                                      |                        | 457,702.67           | 457,702.67           | 22,947.10           | 5.01               |
| 5014                    | Construcción de Edificio de Usos Múltiples para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.                                                                                    |                        | 457,697.38           | 457,697.38           | -                   | -                  |
| 5023                    | Modernizacion de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.                                                                                                        |                        | 269,042.23           | 269,042.23           | 268,993.32          | 99.98              |
| 5011                    | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL                                                                                        |                        | 251,433.78           | 251,433.78           | 251,433.78          | 100.00             |
| 5018                    | Construcción de Edificio de Posgrados en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.                                                                                                 |                        | 236,416.01           | 236,416.01           | -                   | -                  |
| 5009                    | Fortalecimiento de los Laboratorios del area Básica de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas                                                                                |                        | 181,792.93           | 181,792.93           | 179,106.11          | 98.52              |
| 5026                    | Fortalecimiento de la Radio Universitaria                                                                                                                                             |                        | 175,000.00           | 175,000.00           | 174,966.00          | 99.98              |
| 5017                    | Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la Facultad de Medicina.                                                                                                          |                        | 117,894.22           | 117,894.22           | 76,863.42           | 65.20              |
| 5019                    | Construcción de Muro Perimetral en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente                                                                                                        |                        | 92,232.69            | 92,232.69            | 48,048.59           | 52.09              |
| 5027                    | Modernizacion de la Administración Académica                                                                                                                                          |                        | 66,737.04            | 66,737.04            | 61,471.10           | 92.11              |
| 5020                    | Modernización de el Sistema de Energía Eléctrica en el Campus Central                                                                                                                 |                        | 44,409.40            | 44,409.40            | 44,409.40           | 100.00             |
| 5022                    | Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia.                                                                                                             |                        | 20,062.62            | 20,062.62            | 19,442.17           | 96.91              |
| 5021                    | Modernización de los Laboratorios del Departamento de Química de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.                                                                         |                        | 1,724.35             | 1,724.35             | 1,433.60            | 83.14              |
| 5010                    | Fortalecimiento de Infraestructura en la Facultad de Odontología.                                                                                                                     |                        | 37.73                | 37.73                | -                   | -                  |
| <b>ISSS</b>             |                                                                                                                                                                                       | <b>8</b>               | <b>3,877,611.00</b>  | <b>2,690,106.00</b>  | <b>1,898,079.71</b> | <b>70.66</b>       |
| 862                     | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ZACAMIL                                                                                                                                      |                        | 1,074,405.00         | -                    | 1,074,403.96        | -                  |
| 5386                    | READECUACION DE LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL AMATEPEC, SAN SALVADOR.                                                                                                                   |                        | 647,875.00           | 647,875.00           | 432,850.53          | 51.05              |
| 5326                    | MEJORAMIENTO DE FARMACIAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL.                                                                                                                    |                        | 462,615.00           | 462,615.00           | 29,155.38           | 6.30               |
| 4398                    | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA                                                                            |                        | 452,400.00           | 339,300.00           | -                   | -                  |
| 5323                    | REMODELACIÓN DEL ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS GENERALES EN CIUDADELA MONSERRAT, SAN SALVADOR.                                                                                  |                        | 400,000.00           | 400,000.00           | -                   | -                  |
| 5325                    | REMODELACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA ATLACATL, SAN SALVADOR.                                                                                                                              |                        | 370,000.00           | 370,000.00           | 95,228.71           | 25.74              |
| 5183                    | REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DE SANTA ANA.                                                                                                                           |                        | 180,000.00           | 180,000.00           | 176,158.81          | 97.87              |
| 5308                    | SUSTITUCION DE LA CUBIERTA DE TECHO DE LA TORRE ONCOLOGICA DEL ISSS                                                                                                                   |                        | 90,316.00            | 90,316.00            | 90,282.32           | 99.96              |
| <b>ISTU</b>             |                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>               | <b>800,000.00</b>    | <b>800,000.00</b>    | -                   | -                  |
| 5624                    | MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS RECREATIVOS DEL ISTU A NIVEL NACIONAL                                                                                                                     |                        | 800,000.00           | 800,000.00           | -                   | -                  |
| <b>Def. del Consum.</b> |                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>               | <b>490,272.00</b>    | <b>490,272.00</b>    | <b>233,340.60</b>   | <b>47.59</b>       |
| 5133                    | FORTALECIENDO LA ATENCION A CONSUMIDORES: DESCENTRALIZANDO SERVICIOS Y MEJORANDO LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA                                                         |                        | 490,272.00           | 490,272.00           | 233,340.60          | 47.59              |



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE  
(MONTOS EN DOLARES)**

| CODIGO                                  | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO                                                                                                                                                                         | No. Prog. y Proyec. | PROGRAMADO TOTAL     | PROGRAMADO AL MES    | EJECUTADO AL MES     | % EJE. FINANC. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>ANSP - MJSP</b>                      |                                                                                                                                                                                                       | <b>2</b>            | <b>607,300.00</b>    | <b>607,300.00</b>    | <b>21,174.88</b>     | <b>4.17</b>    |
| 5827                                    | REFORZAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SUR DE LA ANSP, SEDE SANTA TECLA.                                                                                                            |                     | 495,200.00           | 495,200.00           | 19,997.00            | 4.04           |
| 5430                                    | REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA PROVISIONAL Y REMODELACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ANSP, SEDE SANTA TECLA                                                                                    |                     | 12,100.00            | 12,100.00            | 1,177.88             | 9.73           |
| <b>ISNA</b>                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>2</b>            | <b>312,084.12</b>    | <b>312,084.12</b>    | <b>270,474.25</b>    | <b>86.67</b>   |
| 4830                                    | REPARACION EDIFICIO LA ESTRELLA, DELEGACION CENTRAL ISNA (FASE II)                                                                                                                                    |                     | 214,800.26           | 214,800.26           | 179,864.26           | 83.74          |
| 4511                                    | REPARACIONES Y MEJORAS EN CENTRO DE REINSENCION EL ESPINO, AHUACHAPAN (Primera Fase)                                                                                                                  |                     | 97,283.86            | 97,283.86            | 90,609.99            | 93.14          |
| <b>CORSATUR</b>                         |                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>            | <b>100,000.00</b>    | <b>100,000.00</b>    | <b>20,845.66</b>     | <b>20.85</b>   |
| 5689                                    | Mejoramiento del muelle artesanal del Puerto de La Libertad, en el departamento de La Libertad                                                                                                        |                     | 100,000.00           | 100,000.00           | 20,845.66            | 20.85          |
| <b>CENTA</b>                            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>            | <b>65,991.00</b>     | <b>65,991.00</b>     | <b>65,991.00</b>     | <b>100.00</b>  |
| 5298                                    | Rehabilitación de la Producción y Comercialización de Hortalizas en Zonas Afectadas por el Huracán Ida                                                                                                |                     | 65,991.00            | 65,991.00            | 65,991.00            | 100.00         |
| <b>ISDEMU</b>                           |                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b>            | <b>129,649.06</b>    | <b>123,031.06</b>    | <b>73,412.68</b>     | <b>69.67</b>   |
| 5765                                    | Adecuación de Centros de Atención para la Gestión Territorial para la Igualdad y la Prevención social de la violencia de Genero en 11 Municipios de Comunidades Solidarias Urbanas                    |                     | 91,301.00            | 84,683.00            | 35,064.62            | 41.41          |
| 5555                                    | Readecuación de Espacio y Acabados de Cocina y Oficinas de ISDEMU San Salvador                                                                                                                        |                     | 29,992.81            | 29,992.81            | 29,992.81            | 100.00         |
| 5556                                    | MEJORA DE LA OFICINA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR                                                                                        |                     | 8,355.25             | 8,355.25             | 8,355.25             | 100.00         |
| <b>EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</b> |                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |                      |                      |                |
| <b>ANDA</b>                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>65</b>           | <b>73,076,734.57</b> | <b>56,122,867.63</b> | <b>25,801,314.17</b> | <b>45.97</b>   |
| 5584                                    | Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.                                                                                                                                             |                     | 21,401,958.75        | 11,251,055.00        | -                    | 0.00           |
| 5034                                    | PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR.                                                                                                                                                  |                     | 15,759,868.00        | 10,810,028.00        | 895,054.37           | 8.28           |
| 5134                                    | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.                                                                                       |                     | 14,673,696.36        | 14,047,245.43        | 7,406,649.22         | 52.73          |
| 4567                                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN.                                                                                                    |                     | 5,052,292.83         | 5,052,292.83         | 4,733,679.83         | 93.69          |
| 4620                                    | MEJORAS EN LA LINEA DE IMPELENCIA Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LA UNION.                                                    |                     | 1,899,242.35         | 1,899,242.35         | 1,856,529.68         | 97.75          |
| 4586                                    | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA                                                                                |                     | 1,263,815.01         | 1,263,815.01         | 764,221.95           | 60.47          |
| 5499                                    | INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A CANTÓN LOS MORANES, NEJAPA, SAN SALVADOR.                                                                                                                  |                     | 807,024.08           | 807,024.08           | 807,024.08           | 100.00         |
| 4573                                    | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES EL PORVENIR, EL MILAGRO, VILANOVA, LAS TORRES Y LOMAS DE CANDELARIA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN. |                     | 787,524.04           | 787,524.04           | 787,459.97           | 99.99          |
| 4588                                    | CAMBIO DE LINEA DE IMPELENCIA DE ø6" PVC A ø8" HoFo L=3,000 METROS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PAJONAL.                                                                                                 |                     | 748,769.10           | 748,769.10           | 742,776.85           | 99.20          |
| 4588                                    | PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO A SISTEMA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS, CUSCATLÁN.                                                                                              |                     | 636,975.68           | 636,975.68           | 445,875.25           | 70.00          |
| 4597                                    | PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN LOS AMATES DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, CHALATENANGO.                                                  |                     | 613,589.46           | 613,589.46           | 613,589.46           | 100.00         |
| 4594                                    | PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTON TUTULTEPEQUE EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA, SAN SALVADOR.                                                                                                   |                     | 554,785.78           | 554,785.78           | 554,785.78           | 100.00         |
| 4595                                    | PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTON JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR.                                                                                        |                     | 521,359.71           | 521,359.71           | 515,845.65           | 98.94          |
| 5750                                    | PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO A SISTEMA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.                                                                            |                     | 473,909.00           | -                    | -                    | -              |
| 4621                                    | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután.                                                                                          |                     | 469,218.14           | 469,218.14           | 458,471.20           | 97.71          |
| 4611                                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.                                                                                            |                     | 434,056.75           | 434,056.75           | 366,338.90           | 84.40          |
| 4592                                    | PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUILARES.                                                                                                                        |                     | 398,720.63           | 398,720.63           | 235,220.29           | 58.99          |
| 5497                                    | INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL CANTÓN LA LAGUNETA, SANTIAGO DE CHILE, SAN JUAN NONUALCO, LA PAZ.                                                                                        |                     | 361,386.17           | 361,386.17           | 361,212.09           | 99.95          |
| 4619                                    | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.                                                                                 |                     | 357,026.38           | 357,026.38           | 313,147.20           | 87.71          |
| 4631                                    | INTRODUCCIÓN Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES EL SINGUIL, SANTA RITA Y EL CERRON, EL PORVENIR, SANTA ANA                                                                                   |                     | 350,000.00           | 350,000.00           | 263,197.67           | 75.20          |
| 4603                                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN PABLO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL.                                                                                 |                     | 348,592.11           | 348,592.11           | 332,085.65           | 95.26          |
| 4602                                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, LA UNION.                                                                                              |                     | 341,846.08           | 341,846.08           | 341,846.08           | 100.00         |
| 4608                                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, USULUTÁN.                                                                                                    |                     | 314,280.27           | 314,280.27           | 313,968.38           | 99.90          |



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE  
(MONTOS EN DOLARES)**

| CODIGO | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO                                                                                                                                                                        | No. Prog. y<br>Proyec. | PROGRAMADO<br>TOTAL | PROGRAMADO<br>AL MES | EJECUTADO AL MES | % EJEC.<br>FINANC. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 4574   | PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO GEMELO EN ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA-LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE.                                                                         |                        | 300,000.00          | 277,000.00           | -                | -                  |
| 4614   | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE EL TRANSITO, SAN MIGUEL.                                                                                                                     |                        | 296,925.69          | 296,925.69           | 275,511.42       | 92.79              |
| 4601   | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD HERMOSA PROVINCIA DEL MUNICIPIO DE JICALAPA, LA LIBERTAD.                                                                                                  |                        | 292,343.59          | 292,343.59           | 269,477.08       | 92.18              |
| 4583   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M3 Y LA INSTALACION DE UN ANILLO DE DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE           |                        | 286,827.56          | 286,827.56           | 136,688.30       | 47.66              |
| 4591   | REHABILITACION DEL POZO NO.2 EN PLANTA DE BOMBEO EL TINTERAL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.                                                                                     |                        | 263,376.49          | 263,376.49           | 263,207.27       | 99.94              |
| 4612   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARAN, MUNICIPIO DE JUCUARAN DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.                                                                              |                        | 240,165.12          | 240,165.12           | 70,479.03        | 29.35              |
| 4578   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE DE SANTA ANA.                                                                                                            |                        | 240,027.88          | 240,027.88           | 178,804.30       | 74.49              |
| 5392   | RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN REPRESA CHILAMA DEL PUERTO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.                                                                                                   |                        | 174,114.00          | -                    | -                | -                  |
| 4618   | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAROLINA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.                                                                                      |                        | 163,929.64          | 163,929.64           | 107,827.64       | 65.78              |
| 4585   | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS BRISAS DE CANTARRANA Y BARCELONA, UBICADAS EN CANTÓN CANTARRANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.           |                        | 161,749.91          | 161,749.91           | 161,320.61       | 99.73              |
| 4600   | PERFORACION E INCORPORACION DE POZO EN LA ANTENA II DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS.                                                                                                         |                        | 155,577.05          | 155,577.05           | 155,259.13       | 99.80              |
| 5249   | RECONSTRUCCION Y HABILITACION DE PLANTA DE BOMBEO CACAHUATAL, SAN RAMON, CUSCATLAN.                                                                                                                  |                        | 155,536.00          | -                    | -                | -                  |
| 4615   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NOR- ORIENTE DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL.                                                                                        |                        | 153,777.31          | 153,777.31           | 67,757.29        | 44.06              |
| 4576   | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA ø 10 HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCION DE SANTA ANA.                                                    |                        | 149,276.53          | 149,276.53           | -                | -                  |
| 4587   | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE METAPAN.                                                                                                                       |                        | 148,076.50          | 148,076.50           | 147,697.00       | 99.74              |
| 4596   | PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO EN PLANTA LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, LA PAZ.                                                                                                     |                        | 141,883.12          | 141,883.12           | 138,826.64       | 97.85              |
| 4590   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN CRISTOBAL DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA. DEPARTAMENTO DE SANTA ANA                                                          |                        | 138,643.75          | 138,643.75           | 137,705.49       | 99.32              |
| 4616   | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, ASI COMO CAMBIO DE LA LINEA DE IMPELENCIA EN EL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE, LA UNIÓN.                                                                               |                        | 135,443.88          | 135,443.88           | 94,877.19        | 70.05              |
| 4580   | PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO JARDINES DE SONSONATE.                                                                                                         |                        | 133,403.58          | 133,403.58           | 133,403.58       | 100.00             |
| 4575   | REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIREADORES DE LA CAMARA HUMEDA DE LA ESTACION DE BOMBEO LA TOMA DE QUEZALTEPEQUE, DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE                                                  |                        | 78,518.95           | 78,518.95            | 78,518.95        | 100.00             |
| 5248   | RECONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN POZO DE RESIDENCIAL LIBERTAD, TONACATEPEQUE, SAN SALVADOR.                                                                                                  |                        | 75,620.00           | -                    | -                | -                  |
| 5259   | RECONSTRUCCION DE PUENTES PARA TUBERIA DE HFD DE ø16", 14" Y 10" QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE A URBANIZACION POPOTLAN, NUEVO APOPA Y VALLE DEL SOL, APOPA, SAN SALVADOR.                            |                        | 75,117.00           | -                    | -                | -                  |
| 5253   | RECONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUA POTABLE CHALAPAN, SAN PEDRO PERULAPAN, CUSCATLAN.                                                                                                                   |                        | 74,201.00           | -                    | -                | -                  |
| 4593   | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE.                                                                                                             |                        | 62,456.50           | 62,456.50            | 55,778.32        | 89.31              |
| 5266   | RECONSTRUCCION DE VIGA CANAL PARA TUBERIA DE 60" DE AGUAS NEGRAS, BARRIO LA VEGA, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.                                                                                        |                        | 46,830.00           | -                    | -                | -                  |
| 4584   | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M³ Y CERCADO PERIMETRAL EN PLANTA DE BOMBEO COLONIAS UNIDAS, MUNICIPIO DE SANTA ANA                                                                 |                        | 42,366.21           | 42,366.21            | 41,999.23        | 99.13              |
| 4604   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PASAQUINA Y FRONTERA EL AMATILLO, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.                                                                                              |                        | 41,489.07           | 41,489.07            | 41,489.07        | 100.00             |
| 4581   | PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO BARRIO EL PILAR DE SONSONATE.                                                                                                  |                        | 38,824.74           | 38,824.74            | 38,824.74        | 100.00             |
| 5514   | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PASO PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN LOS RIOS PASAQUINA, SANTA ROSA, SIRAMA Y AGUA SALADA, MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE LIMA Y PASAQUINA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.         |                        | 34,014.00           | -                    | -                | -                  |
| 4609   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA LLANO LOS PATOS, CAMBIO LINEA DE IMPELENCIA DE Ø 8" A Ø 10", MUNICIPIO DE CONCHAGUA, LA UNIÓN.                                                                              |                        | 30,920.34           | 30,920.34            | 30,920.34        | 100.00             |
| 5252   | RECONSTRUCCION DE LINEA DE IMPELENCIA DE AGUA POTABLE, SAN SEBASTIAN, SAN VICENTE.                                                                                                                   |                        | 28,414.00           | -                    | -                | -                  |
| 5251   | RECONSTRUCCION DE LINEA DE IMPELENCIA Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PLANTA CHILAMA, LA LIBERTAD, LA LIBERTAD.                                                                                    |                        | 26,522.00           | -                    | -                | -                  |
| 5254   | RECONSTRUCCION DE LINEA DE IMPELENCIA Y PLANTA DE AGUA POTABLE, EL POTRERITO, TEPETITAN, SAN VICENTE.                                                                                                |                        | 25,606.00           | -                    | -                | -                  |
| 4577   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE DIFERENTES DIAMETROS PARA AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCION EN EL CANTON PRIMAVERA E INCORPORACION DE FUENTE CON EL FIN DE AUMENTAR LA COBERTURA EN LA ZONA. |                        | 22,732.85           | 22,732.85            | 22,732.33        | 100.00             |
| 4633   | CAMBIO Y RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAÑERIAS DE AGUA POTABLE (700 MTS.) CANTON LAS MARIAS, CHINAMECA, SAN MIGUEL                                                                                   |                        | 18,677.01           | 18,677.00            | 18,677.00        | 100.00             |
| 4605   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE USULUTÁN, MEDIANTE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN TANQUES EL NANZAL, MUNICIPIO DE USULUTAN.                                       |                        | 18,514.70           | 18,514.70            | 18,514.70        | 100.00             |
| 4607   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE OZATLÁN, USULUTÁN.                                                                                                                     |                        | 14,775.54           | 14,775.54            | -                | -                  |



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE  
(MONTOS EN DOLARES)**

| CODIGO           | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO                                                                                                                                                                          | No. Prog. y<br>Proyec. | PROGRAMADO<br>TOTAL   | PROGRAMADO<br>AL MES  | EJECUTADO AL MES      | % EJE.<br>FINANC. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 5260             | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN ACCESO A ESTACION DE BOMBEO R-1, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.                                                                                                    |                        | 12,472.00             | -                     | -                     | -                 |
| 4579             | CAMBIO Y PROFUNDIZACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CANTON EL TINTERAL, MUNICIPIO DE COATEPEQUE.                                                                                                     |                        | 6,331.13              | 6,331.13              | 6,037.97              | 95.37             |
| 4606             | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER, USulután.                                                                                          |                        | 305.37                | -                     | -                     | -                 |
| 4570             | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 DE CAPACIDAD, EN PLANTA EL MIRADOR, PLANES DE RENDEROS, SAN SALVADOR.                                                                               |                        | 11.87                 | -                     | -                     | -                 |
| 4572             | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE REBOMBEO, MUNICIPIO DE APOPA.                                                                                                                                            |                        | 0.01                  | -                     | -                     | -                 |
| <b>CEL</b>       |                                                                                                                                                                                                        | <b>7</b>               | <b>41,636,346.17</b>  | <b>39,512,530.17</b>  | <b>36,081,481.79</b>  | <b>91.32</b>      |
| 3119             | PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL                                                                                                                                                                   |                        | 34,854,755.00         | 33,376,580.00         | 34,854,755.00         | 104.43            |
| 4400             | Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.                                                                                                                                                 |                        | 2,511,755.00          | 2,259,225.00          | 1,187,572.62          | 52.57             |
| 5504             | Suministro e instalación de tres generadores fotovoltaicos con una capacidad total de aproximadamente 540 kw, con conexión a la red en las Centrales Hidroeléctricas Cerrón Grande y 15 de Septiembre. |                        | 2,195,985.00          | 2,195,985.00          | -                     | -                 |
| 622              | PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON                                                                                                                                                                    |                        | 1,239,565.00          | 1,136,295.00          | 37,289.67             | 3.28              |
| 5570             | Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana.                                                                                                                                     |                        | 436,140.00            | 246,300.00            | 1,864.50              | 0.76              |
| 373              | 3A. UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CERRON GRANDE (MUNICIPIO DE JUTIAPA)                                                                                                                                 |                        | 253,130.00            | 253,130.00            | -                     | -                 |
| 3684             | Suministro e instalación de una micro unidad generadora en la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.                                                                                                   |                        | 45,015.17             | 45,015.17             | -                     | -                 |
| <b>CEPA</b>      |                                                                                                                                                                                                        | <b>6</b>               | <b>6,271,043.23</b>   | <b>3,034,043.23</b>   | <b>1,502,435.42</b>   | <b>49.52</b>      |
| 5728             | Adquisición de Puentes de Abordaje para el Aeropuerto Internacional El Salvador                                                                                                                        |                        | 2,100,000.00          | 420,000.00            | -                     | -                 |
| 3951             | REHABILITACION DE LAS TABLESTACAS Y PILOTES METALICOS DE LOS MUELLES "A" Y "B" DEL PUERTO DE ACAJUTLA                                                                                                  |                        | 1,830,000.00          | 326,000.00            | -                     | -                 |
| 4803             | Obras de Mitigación en el Aeropuerto Internacional Ilopango, FASE I.                                                                                                                                   |                        | 1,414,039.16          | 1,414,039.16          | 1,226,835.71          | 86.76             |
| 5583             | Rehabilitación del pavimento asfáltico de calle perimetral entre SEI y acceso 6 del Aeropuerto Internacional El Salvador, Fase I                                                                       |                        | 450,000.00            | 397,000.00            | -                     | -                 |
| 5632             | Remodelación y Equipamiento de Servicios Sanitarios del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional El Salvador                                                                        |                        | 300,000.00            | 300,000.00            | 149,390.99            | 49.80             |
| 5610             | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR                                                                         |                        | 177,004.07            | 177,004.07            | 126,208.72            | 71.30             |
| <b>OTRAS</b>     |                                                                                                                                                                                                        |                        |                       |                       |                       |                   |
| <b>FOMILENIO</b> |                                                                                                                                                                                                        | <b>13</b>              | <b>142,853,915.78</b> | <b>134,132,882.34</b> | <b>124,016,053.64</b> | <b>92.48</b>      |
| 40388            | Proyecto de Conectividad - Carretera Longitudinal del Norte - Sub-actividad de Construcción                                                                                                            |                        | 86,683,478.98         | 76,518,124.11         | 76,518,124.11         | 100.00            |
| 40394            | Proyecto de Conectividad - Caminos Rurales - Sub-actividad de Contrapartida Conectividad                                                                                                               |                        | 11,598,137.03         | 10,864,296.11         | 10,864,296.11         | 100.00            |
| 40637            | Subactividad Contingencias - Conectividad                                                                                                                                                              |                        | 9,719,680.00          | 13,000,000.00         | 2,886,667.96          | 22.21             |
| 40386            | Proyecto de Conectividad - Carretera Longitudinal del Norte - Sub-actividad de Adquisición de Derechos de Vía                                                                                          |                        | 9,289,458.52          | 8,846,490.89          | 8,841,994.13          | 99.95             |
| 40371            | Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Electrificación                                                                                                                                       |                        | 9,265,410.68          | 9,035,616.14          | 9,035,616.14          | 100.00            |
| 40389            | Proyecto de Conectividad - Carretera Longitudinal del Norte - Sub-actividad de Supervisión de Construcción                                                                                             |                        | 4,921,600.79          | 4,404,733.34          | 4,404,733.34          | 100.00            |
| 40372            | Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Agua y Saneamiento                                                                                                                                    |                        | 3,722,106.96          | 3,722,106.96          | 3,722,106.96          | 100.00            |
| 40373            | Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Infraestructura Comunitaria                                                                                                                           |                        | 1,921,674.14          | 1,921,674.14          | 1,921,674.14          | 100.00            |
| 40374            | Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Contrapartida Desarrollo Comunitario                                                                                                                  |                        | 1,861,839.56          | 1,861,839.56          | 1,861,839.56          | 100.00            |
| 40367            | Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Educación Formal                                                                                                                                      |                        | 1,542,131.60          | 1,537,486.10          | 1,537,486.10          | 100.00            |
| 40368            | Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Educación Informal                                                                                                                                    |                        | 1,216,079.03          | 1,211,050.42          | 1,211,050.42          | 100.00            |
| 40369            | Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Asistencia Técnica                                                                                                                                    |                        | 949,837.31            | 949,837.31            | 949,837.31            | 100.00            |
| 40370            | Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Contrapartida Educación y Capacitación                                                                                                                |                        | 262,481.18            | 259,627.26            | 259,627.26            | 100.00            |
| <b>FONAVIPO</b>  |                                                                                                                                                                                                        | <b>11</b>              | <b>29,594,503.43</b>  | <b>28,811,968.63</b>  | <b>14,466,413.22</b>  | <b>50.21</b>      |
| 5503             | CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR                                                                  |                        | 10,404,708.14         | 10,120,350.13         | 2,684,886.63          | 26.53             |
| 5085             | CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA                                                                            |                        | 10,131,291.12         | 9,905,590.83          | 7,436,371.83          | 75.07             |
| 5396             | CONSTRUCCIÓN DE 308 VIVIENDAS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LOS MANANTIALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE                                                     |                        | 3,651,607.56          | 3,565,516.82          | 2,750,410.96          | 77.14             |
| 5192             | CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION PROCAVIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA                                                                                 |                        | 2,773,213.53          | 2,690,590.89          | 1,130,919.46          | 42.03             |
| 5738             | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PERMANENTES EN EL MUNICIPIO DE VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE                                                                                                          |                        | 944,250.00            | 904,675.79            | 193,183.63            | 21.35             |
| 5371             | Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de San Vicente                                                                                  |                        | 434,470.53            | 434,470.53            | 64,374.48             | 14.82             |
| 5735             | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN EL PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LA TOMA, MUNICIPIO DE AGUILARES, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR                                                                        |                        | 354,600.00            | 354,600.00            | -                     | -                 |





**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE  
(MONTOS EN DOLARES)**

| CODIGO               | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO                                                                                                                                                                         | No. Prog. y<br>Proyec. | PROGRAMADO<br>TOTAL     | PROGRAMADO<br>AL MES    | EJECUTADO AL MES      | % EJEC.<br>FINANC. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 5744                 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PROYECTO HABITACIONAL DOS QUEBRADAS, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE                                                                                   |                        | 350,000.00              | 350,000.00              | -                     | -                  |
| 5370                 | Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Nuevo Verapaz, Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente                                                                       |                        | 218,500.37              | 164,500.37              | 85,260.13             | 51.83              |
| 5028                 | CONSTRUCCIÓN DE 501 VIVIENDAS EN URBANIZACIÓN NUEVO BELEN, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL                                                                                                     |                        | 197,115.70              | 186,926.79              | 107,627.31            | 57.58              |
| 5245                 | CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.                                                                 |                        | 134,746.48              | 134,746.48              | 13,378.79             | 9.93               |
| <b>FSV</b>           |                                                                                                                                                                                                       |                        | <b>1,610,000.00</b>     | <b>1,310,000.00</b>     | -                     | -                  |
| 4513                 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RECURSOS LOGISTICOS, COMEDOR DEL PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV, SAN SALVADOR.                                                                                      |                        | 1,510,000.00            | 1,310,000.00            | -                     | -                  |
| <b>FONAES</b>        |                                                                                                                                                                                                       | <b>2</b>               | <b>1,066,973.72</b>     | <b>947,701.10</b>       | <b>947,698.84</b>     | <b>100.00</b>      |
| 5777                 | Programa Techo y Agua 2012-2013                                                                                                                                                                       |                        | 850,000.00              | 730,727.38              | 730,725.12            | 100.00             |
| 5047                 | TECHO Y AGUA FASE 2011                                                                                                                                                                                |                        | 216,973.72              | 216,973.72              | 216,973.72            | 100.00             |
| <b>FOPROLYD</b>      |                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>               | <b>26,800.00</b>        | <b>26,800.00</b>        | <b>1,683.72</b>       | <b>6.28</b>        |
| 5641                 | ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLE EN DONDE FUNCIONARÁ EL TALLER DE PRÓTESIS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO (FOPROLYD) Y SU EQUIPAMIENTO. |                        | 26,800.00               | 26,800.00               | 1,683.72              | 6.28               |
| <b>SUBTOTAL</b>      |                                                                                                                                                                                                       |                        | <b>1,006,434,038.44</b> | <b>813,773,209.30</b>   | <b>476,962,320.69</b> | <b>58.61</b>       |
| <b>FODES</b>         |                                                                                                                                                                                                       |                        | <b>224,370,540.00</b>   | <b>205,672,995.00</b>   | <b>205,672,995.00</b> | <b>100.00</b>      |
| 5088                 | Inversión Municipal a través del FODES 2012                                                                                                                                                           |                        | 224,370,540.00          | 205,672,995.00          | 205,672,995.00        | 100.00             |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                                                                                                                                                       |                        | <b>1,230,804,578.44</b> | <b>1,019,446,204.30</b> | <b>682,635,315.69</b> | <b>66.96</b>       |



Cifras preliminares conforme registro de las instituciones en  
SAFI y SIIP

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012  
(Montos en Dólares)

| INSTITUCION | CODIGO | NOMBRE PROYECTO                                                                                                           | MONTO<br>PROG. ANUAL | FUENTES INTERNAS |                   |       |               | FUENTES EXTERNAS |                |                |                | TOTAL |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|             |        |                                                                                                                           |                      | FONDO<br>GENERAL | RECUR.<br>PROPIOS | OTROS | TOTAL         | PRESTAMOS        | DONACIONES     | TOTAL          |                |       |
| FOMILENIO   |        |                                                                                                                           |                      | 25,985,762.93    | 0.00              | 0.00  | 25,985,762.93 | 0.00             | 108,147,119.41 | 108,147,119.41 | 134,132,882.34 |       |
|             |        |                                                                                                                           | 142,953,915.78       | 15,872,430.89    | 0.00              | 0.00  | 15,872,430.89 | 0.00             | 108,142,622.65 | 108,142,622.65 | 124,015,053.54 |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 10,113,332.04    | 0.00              | 0.00  | 10,113,332.04 | 0.00             | 4,496.76       | 4,496.76       | 10,117,828.80  |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 61.1 %           | 0.0 %             | 0.0 % | 61.1 %        | 0.0 %            | 100.0 %        | 100.0 %        | 92.5 %         |       |
|             | 40388  | Proyecto de Conectividad -<br>Carretera Longitudinal del<br>Norte - Sub-actividad de<br>Construcción                      | 86,683,478.98        | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 76,518,124.11  | 76,518,124.11  | 76,518,124.11  |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 76,518,124.11  | 76,518,124.11  | 76,518,124.11  |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.0 %            | 0.0 %             | 0.0 % | 0.0 %         | 0.0 %            | 100.0 %        | 100.0 %        | 100.0 %        |       |
|             | 40394  | Proyecto de Conectividad -<br>Camino Rurales - Sub-<br>actividad de Contrapartida<br>Conectividad                         | 11,598,137.03        | 10,864,296.11    | 0.00              | 0.00  | 10,864,296.11 | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 10,864,296.11  |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 10,864,296.11    | 0.00              | 0.00  | 10,864,296.11 | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 10,864,296.11  |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 100.0 %          | 0.0 %             | 0.0 % | 100.0 %       | 0.0 %            | 0.0 %          | 0.0 %          | 100.0 %        |       |
|             | 40637  | Subactividad Contingencias -<br>Conectividad                                                                              | 9,719,680.00         | 13,000,000.00    | 0.00              | 0.00  | 13,000,000.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 13,000,000.00  |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 2,886,667.96     | 0.00              | 0.00  | 2,886,667.96  | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 2,886,667.96   |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 10,113,332.04    | 0.00              | 0.00  | 10,113,332.04 | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 10,113,332.04  |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 22.2 %           | 0.0 %             | 0.0 % | 22.2 %        | 0.0 %            | 0.0 %          | 0.0 %          | 22.2 %         |       |
|             | 40386  | Proyecto de Conectividad -<br>Carretera Longitudinal del<br>Norte - Sub-actividad de<br>Adquisición de Derechos de<br>Vía | 9,289,458.52         | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 8,846,490.89   | 8,846,490.89   | 8,846,490.89   |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 8,841,994.13   | 8,841,994.13   | 8,841,994.13   |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 4,496.76       | 4,496.76       | 4,496.76       |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.0 %            | 0.0 %             | 0.0 % | 0.0 %         | 0.0 %            | 99.9 %         | 99.9 %         | 99.9 %         |       |
|             | 40371  | Proyecto de Desarrollo<br>Humano - Sub-actividad de<br>Electrificación                                                    | 9,265,410.68         | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 9,035,616.14   | 9,035,616.14   | 9,035,616.14   |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 9,035,616.14   | 9,035,616.14   | 9,035,616.14   |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.0 %            | 0.0 %             | 0.0 % | 0.0 %         | 0.0 %            | 100.0 %        | 100.0 %        | 100.0 %        |       |
|             | 40389  | Proyecto de Conectividad -<br>Carretera Longitudinal del<br>Norte - Sub-actividad de<br>Supervisión de Construcción       | 4,921,600.79         | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 4,404,733.34   | 4,404,733.34   | 4,404,733.34   |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 4,404,733.34   | 4,404,733.34   | 4,404,733.34   |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.0 %            | 0.0 %             | 0.0 % | 0.0 %         | 0.0 %            | 100.0 %        | 100.0 %        | 100.0 %        |       |
|             | 40372  | Proyecto de Desarrollo<br>Humano - Sub-actividad de<br>Agua y Saneamiento                                                 | 3,722,106.96         | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 3,722,106.96   | 3,722,106.96   | 3,722,106.96   |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 3,722,106.96   | 3,722,106.96   | 3,722,106.96   |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.0 %            | 0.0 %             | 0.0 % | 0.0 %         | 0.0 %            | 100.0 %        | 100.0 %        | 100.0 %        |       |
|             | 40373  | Proyecto de Desarrollo<br>Humano - Sub-actividad de<br>Infraestructura Comunitaria                                        | 1,921,674.14         | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 1,921,674.14   | 1,921,674.14   | 1,921,674.14   |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 1,921,674.14   | 1,921,674.14   | 1,921,674.14   |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.0 %            | 0.0 %             | 0.0 % | 0.0 %         | 0.0 %            | 100.0 %        | 100.0 %        | 100.0 %        |       |
|             | 40374  | Proyecto de Desarrollo<br>Humano - Sub-actividad de<br>Contrapartida Desarrollo<br>Comunitario                            | 1,861,839.56         | 1,861,839.56     | 0.00              | 0.00  | 1,861,839.56  | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 1,861,839.56   |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 1,861,839.56     | 0.00              | 0.00  | 1,861,839.56  | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 1,861,839.56   |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 0.00             | 0.00              | 0.00  | 0.00          | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |       |
|             |        |                                                                                                                           |                      | 100.0 %          | 0.0 %             | 0.0 % | 100.0 %       | 0.0 %            | 0.0 %          | 0.0 %          | 100.0 %        |       |

|       |                                                                                         |   |               |      |              |      |               |               |               |               |               |                |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 40367 | Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Educación Formal                       | P | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1,537,486.10  | 1,537,486.10  | 1,537,486.10   | 1,537,486.10   |
|       |                                                                                         | E | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1,537,486.10  | 1,537,486.10  | 1,537,486.10   | 1,537,486.10   |
|       |                                                                                         | D | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
|       |                                                                                         | % | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100.00        | 100.00        | 100.00         | 100.00         |
| 40368 | Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Educación Informal                     | P | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1,211,050.42  | 1,211,050.42  | 1,211,050.42   | 1,211,050.42   |
|       |                                                                                         | E | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1,211,050.42  | 1,211,050.42  | 1,211,050.42   | 1,211,050.42   |
|       |                                                                                         | D | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
|       |                                                                                         | % | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100.00        | 100.00        | 100.00         | 100.00         |
| 40369 | Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Asistencia Técnica                     | P | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 949,837.31    | 949,837.31    | 949,837.31     | 949,837.31     |
|       |                                                                                         | E | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 949,837.31    | 949,837.31    | 949,837.31     | 949,837.31     |
|       |                                                                                         | D | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
|       |                                                                                         | % | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100.00        | 100.00        | 100.00         | 100.00         |
| 40370 | Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Contrapartida Educación y Capacitación | P | 259,627.26    | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 259,627.26    | 259,627.26    | 259,627.26     | 259,627.26     |
|       |                                                                                         | E | 259,627.26    | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 259,627.26    | 259,627.26    | 259,627.26     | 259,627.26     |
|       |                                                                                         | D | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
|       |                                                                                         | % | 100.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100.00        | 100.00        | 100.00         | 100.00         |
| FISDL |                                                                                         | P | 36,333,768.42 | 0.00 | 2,850,069.00 | 0.00 | 36,333,768.42 | 36,333,768.42 | 41,602,752.48 | 19,312,156.00 | 60,914,908.46 | 100,038,745.88 | 100,038,745.88 |
|       |                                                                                         | E | 34,951,496.44 | 0.00 | 812,774.76   | 0.00 | 34,951,496.44 | 34,951,496.44 | 27,296,825.27 | 12,201,188.24 | 39,486,013.51 | 75,262,284.71  | 75,262,284.71  |
|       |                                                                                         | D | 1,382,271.98  | 0.00 | 2,037,294.24 | 0.00 | 1,382,271.98  | 1,382,271.98  | 14,305,927.19 | 7,110,967.76  | 21,416,894.95 | 24,836,461.17  | 24,836,461.17  |
|       |                                                                                         | % | 96.2          | 0.00 | 28.5         | 0.00 | 96.2          | 96.2          | 65.6          | 63.2          | 64.8          | 75.2           | 75.2           |
| 4997  | PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERSAL                                         | P | 36,333,768.42 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 36,333,768.42 | 36,333,768.42 | 0.00          | 3,500,265.48  | 3,500,265.48  | 39,834,033.90  | 39,834,033.90  |
|       |                                                                                         | E | 34,951,496.44 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 34,951,496.44 | 34,951,496.44 | 0.00          | 2,863,752.54  | 2,863,752.54  | 37,815,248.98  | 37,815,248.98  |
|       |                                                                                         | D | 1,382,271.98  | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 1,382,271.98  | 1,382,271.98  | 0.00          | 636,512.94    | 636,512.94    | 2,018,784.92   | 2,018,784.92   |
|       |                                                                                         | % | 96.2          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 96.2          | 96.2          | 0.00          | 81.8          | 81.8          | 94.9           | 94.9           |
| 5629  | PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y EMPLEABILIDAD                                   | P | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 15,425,787.75 | 6,347,762.30  | 21,773,550.05 | 21,773,550.05  | 21,773,550.05  |
|       |                                                                                         | E | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 11,346,708.11 | 5,608,155.30  | 16,954,863.41 | 16,954,863.41  | 16,954,863.41  |
|       |                                                                                         | D | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 4,079,079.64  | 739,607.00    | 4,818,686.64  | 4,818,686.64   | 4,818,686.64   |
|       |                                                                                         | % | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 73.6          | 88.3          | 77.9          | 77.9           | 77.9           |
| 5384  | PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS                        | P | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 11,231,181.00 | 0.00          | 11,231,181.00 | 11,231,181.00  | 11,231,181.00  |
|       |                                                                                         | E | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 5,488,483.38  | 0.00          | 5,488,483.38  | 5,488,483.38   | 5,488,483.38   |
|       |                                                                                         | D | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 5,742,697.62  | 0.00          | 5,742,697.62  | 5,742,697.62   | 5,742,697.62   |
|       |                                                                                         | % | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 48.9          | 0.00          | 48.9          | 48.9           | 48.9           |
| 5628  | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER                                | P | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 10,028,093.71 | 0.00          | 10,028,093.71 | 10,028,093.71  | 10,028,093.71  |
|       |                                                                                         | E | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 7,904,578.16  | 0.00          | 7,904,578.16  | 7,904,578.16   | 7,904,578.16   |
|       |                                                                                         | D | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 2,123,515.55  | 0.00          | 2,123,515.55  | 2,123,515.55   | 2,123,515.55   |
|       |                                                                                         | % | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 78.8          | 0.00          | 78.8          | 78.8           | 78.8           |
| 5630  | COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN EDUCACIÓN                                      | P | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 2,802,545.00  | 2,802,545.00  | 2,802,545.00  | 2,802,545.00   | 2,802,545.00   |
|       |                                                                                         | E | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 394,087.73    | 394,087.73    | 394,087.73    | 394,087.73     | 394,087.73     |
|       |                                                                                         | D | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 2,408,457.27  | 2,408,457.27  | 2,408,457.27  | 2,408,457.27   | 2,408,457.27   |
|       |                                                                                         | % | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 14.1          | 14.1          | 14.1          | 14.1           | 14.1           |
| 4460  | FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNANZA (FISDL / KFW IV)                              | P | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 4,409,245.00  | 0.00          | 4,409,245.00  | 4,409,245.00   | 4,409,245.00   |
|       |                                                                                         | E | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 2,495,458.53  | 0.00          | 2,495,458.53  | 2,495,458.53   | 2,495,458.53   |
|       |                                                                                         | D | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 1,913,786.47  | 0.00          | 1,913,786.47  | 1,913,786.47   | 1,913,786.47   |
|       |                                                                                         | % | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 56.6          | 0.00          | 56.6          | 56.6           | 56.6           |
| 4996  | PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FISDL V)                 | P | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 3,660,771.22  | 3,660,771.22  | 3,660,771.22  | 3,660,771.22   | 3,660,771.22   |
|       |                                                                                         | E | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 2,624,294.88  | 2,624,294.88  | 2,624,294.88  | 2,624,294.88   | 2,624,294.88   |
|       |                                                                                         | D | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 1,036,476.34  | 1,036,476.34  | 1,036,476.34  | 1,036,476.34   | 1,036,476.34   |
|       |                                                                                         | % | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 71.7          | 71.7          | 71.7          | 71.7           | 71.7           |
| 2660  | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL                                                          | P | 0.00          | 0.00 | 2,850,069.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 2,850,069.00   | 2,850,069.00   |
|       |                                                                                         | E | 0.00          | 0.00 | 812,774.76   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 812,774.76     | 812,774.76     |
|       |                                                                                         | D | 0.00          | 0.00 | 2,037,294.24 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 2,037,294.24   | 2,037,294.24   |
|       |                                                                                         | % | 0.00          | 0.00 | 28.5         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 28.5           | 28.5           |
| 5627  | PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR, COMPONENTE I                       | P | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 508,445.00    | 1,372,920.00  | 1,881,365.00  | 1,881,365.00   | 1,881,365.00   |
|       |                                                                                         | E | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 61,597.09     | 0.00          | 61,597.09     | 61,597.09      | 61,597.09      |
|       |                                                                                         | D | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 446,847.91    | 1,372,920.00  | 1,819,767.91  | 1,819,767.91   | 1,819,767.91   |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                   | %                | 0,0 %         | 0,0 %                                                   | 0,0 %                            | 0,0 %                            | 0,0 %                            | 12,1 %                                                  | 0,0 %                                              | 3,3 %                                                   | 3,3 %                                                    |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     | 4472 | PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV                                                                                                                                                | P<br>E<br>D<br>% | 1,600,000.00  | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %                        | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %                        | 1,184,752.00<br>587,417.71<br>597,334.29<br>48.7 % | 1,184,752.00<br>587,417.71<br>597,334.29<br>48.7 %      | 1,184,752.00<br>587,417.71<br>597,334.29<br>48.7 %       |
| MOP | 4184 | POBREZA DE ALIVIO A LA POBREZA DE EL SALVADOR (PAPE\$)                                                                                                                                                            | P<br>E<br>D<br>% | 1,388,327.00  | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %                        | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %                        | 463,140.00<br>143,480.08<br>319,659.92<br>31.0 %   | 463,140.00<br>143,480.08<br>319,659.92<br>31.0 %        | 463,140.00<br>143,480.08<br>319,659.92<br>31.0 %         |
|     |      |                                                                                                                                                                                                                   | P<br>E<br>D<br>% | 83,412,971.96 | 11,198,362.30<br>5,327,665.20<br>5,870,697.10<br>47.6 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 48,240,337.91<br>2,987,046.09<br>43,253,291.82<br>6.5 % | 845,492.96<br>0.00<br>845,492.96<br>0.0 %          | 47,085,830.87<br>2,987,046.09<br>44,068,784.78<br>6.3 % | 58,284,193.17<br>8,314,711.29<br>49,969,481.88<br>14.3 % |
|     | 3737 | APERTURA BOULEVARD DIEGO DE HOLGUIN-SANTA TECLA TRAMO II                                                                                                                                                          | P<br>E<br>D<br>% | 22,932,839.00 | 1,913,807.76<br>899,453.91<br>1,024,353.85<br>46.5 %    | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 20,925,507.00<br>1,495,919.90<br>19,429,587.10<br>7.1 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                      | 20,925,507.00<br>1,495,919.90<br>19,429,587.10<br>7.1 % | 22,839,314.76<br>2,385,373.81<br>20,453,940.95<br>10.4 % |
|     | 5567 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NTE DE EL SALVADOR. MANITTO DE LA CARRETERA CA03 TRAMO 2A: NVA CONCEPCION CHALATENANGO, RUTA CA03E TRAMO: CA04N (DV AMAYO) - CHALATENANGO, DEPTO DE CHALATENANGO           | P<br>E<br>D<br>% | 13,403,686.00 | 1,032,557.00<br>9,209.58<br>1,023,347.42<br>0.9 %       | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 7,941,900.00<br>70,842.88<br>7,871,057.12<br>0.9 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                      | 7,941,900.00<br>70,842.88<br>7,871,057.12<br>0.9 %      | 8,974,457.00<br>80,052.46<br>8,894,404.54<br>0.9 %       |
|     | 5566 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NTE DE EL SALVADOR. MANITTO DE LA CARRETERA CA03 TRAMO 2A: NVA CONCEPCION CHALATENANGO, RUTA CA03W TRAMO: CA04N (DV AMAYO)- NVA CONCEPCION, DEPTO DE CHALATENANGO          | P<br>E<br>D<br>% | 6,096,920.00  | 375,800.00<br>26,117.31<br>349,682.69<br>6.9 %          | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 2,890,740.00<br>200,902.35<br>2,689,837.65<br>6.9 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                      | 2,890,740.00<br>200,902.35<br>2,689,837.65<br>6.9 %     | 3,266,540.00<br>227,019.66<br>3,039,520.34<br>6.9 %      |
|     | 5457 | MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO CHA25N, TRAMO: NUEVA CONCEPCION - LD. LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO                                                                                                      | P<br>E<br>D<br>% | 5,715,795.00  | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %                        | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 1,295,755.00<br>0.00<br>1,295,755.00<br>0.0 %           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                      | 1,295,755.00<br>0.00<br>1,295,755.00<br>0.0 %           | 1,295,755.00<br>0.00<br>1,295,755.00<br>0.0 %            |
|     | 5741 | PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCION PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD EN LA CUENCA BAJA DEL RIO LEMPA, MUNICIPIOS DE TECOLUCA, BERLIN Y JIQUILISCO, DEPARTAMENTOS DE SAN VICENTE Y USulután | P<br>E<br>D<br>% | 5,467,586.00  | 5,467,586.00<br>4,115,867.15<br>1,351,718.85<br>75.3 %  | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                           | 5,467,586.00<br>4,115,867.15<br>1,351,718.85<br>75.3 %   |
|     | 5458 | MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO LIB22S; ET. LIB05W (DV. COMASAGUA) - DV. LIB19S (CHILTUPAN), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                                                                                             | P<br>E<br>D<br>% | 5,290,957.00  | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %                        | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 %<br>0,0 % | 5,191,317.91<br>110,043.48<br>5,081,274.43<br>2.1 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                      | 5,191,317.91<br>110,043.48<br>5,081,274.43<br>2.1 %     | 5,191,317.91<br>110,043.48<br>5,081,274.43<br>2.1 %      |

|      |                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |                                               |                               |                               |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 5463 | MEJORAMIENTO CAMINO<br>TERCIARIO LIB31N, TRAMO:<br>SAN PABLO TACACHICO -<br>CANTON SAN ISIDRO,<br>MUNICIPIO DE SAN PABLO<br>TACACHICO,<br>DEPARTAMENTO DE LA<br>LIBERTAD.                                                     | P<br>E<br>D<br>% | 3,587,315.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 3,146,270.00<br>181,701.92<br>2,964,568.08<br>5.8 % | 3,146,270.00<br>181,701.92<br>2,964,568.08<br>5.8 % | 3,146,270.00<br>181,701.92<br>2,964,568.08<br>5.8 % |
| 5006 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS<br>DE PROTECCIÓN DEL<br>PUENTE DE LA AVENIDA<br>CHAPARRASTIQUE SOBRE<br>ARENAL SECO, MUNICIPIO<br>DE ILOPANGO                                                                                           | P<br>E<br>D<br>% | 3,446,981.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                       |
| 5098 | PROGRAMA OBRAS DE<br>MITIGACION DE RIESGOS                                                                                                                                                                                    | P<br>E<br>D<br>% | 3,141,420.00 | 195,602.00<br>0.00<br>195,602.00<br>0.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 195,602.00<br>0.00<br>195,602.00<br>0.0 %     | 1,500,408.00<br>0.00<br>1,500,408.00<br>0.0 %       | 1,500,408.00<br>0.00<br>1,500,408.00<br>0.0 %       | 1,696,010.00<br>0.00<br>1,696,010.00<br>0.0 %       |
| 5737 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE<br>SOBRE RIO COPAPAYO 1,<br>RUTA CA: 08W, TRAMO L.D.<br>LA LIBERTAD ? DVIO.<br>ARMENIA, MUNICIPIO DE<br>ARMENIA, DEPARTAMENTO<br>DE SONSONATE                                                          | P<br>E<br>D<br>% | 2,325,526.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                       |
| 5002 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS<br>DE MITIGACIÓN EN ZONA DE<br>CARCAVA DEL REPARTO LA<br>CAMPAÑERA, MUNICIPIO DE<br>SOYAPANGO, SAN<br>SALVADOR                                                                                          | P<br>E<br>D<br>% | 2,304,330.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                       |
| 5465 | CONSTRUCCIÓN E<br>INSTALACION DE OBRAS<br>PARA PUENTE<br>PERMANENTE SOBRE RIO<br>QUEZALAPA, CAMINO<br>CUS18E MUNICIPIO DE<br>SUCHITOTO,<br>DEPARTAMENTO DE<br>CUSCATLAN                                                       | P<br>E<br>D<br>% | 1,770,456.96 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 845,492.96<br>0.00<br>845,492.96<br>0.0 %           | 845,492.96<br>0.00<br>845,492.96<br>0.0 %           | 845,492.96<br>0.00<br>845,492.96<br>0.0 %           |
| 5633 | RECONSTRUCCION DE<br>PUENTES CUINIKUIL,<br>AZAMBIO Y BOVEDA<br>ENTRADA A<br>CHALATENANGO, RUTA<br>CA03 TRAMO: DVIO AMAYO -<br>CHALATENANGO,<br>MUNICIPIOS DE SANTA RITA<br>Y CHALATENANGO,<br>DEPARTAMENTO DE<br>CHALATENANGO | P<br>E<br>D<br>% | 1,362,786.00 | 157,865.00<br>2,674.15<br>155,190.85<br>1.7 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 157,865.00<br>2,674.15<br>155,190.85<br>1.7 % | 1,090,331.00<br>20,570.36<br>1,069,760.64<br>1.9 %  | 1,090,331.00<br>20,570.36<br>1,069,760.64<br>1.9 %  | 1,248,196.00<br>23,244.51<br>1,224,951.49<br>1.9 %  |
| 5511 | FORTALECIMIENTO<br>INSTITUCIONAL BID 2369                                                                                                                                                                                     | P<br>E<br>D<br>% | 925,835.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 925,835.00<br>236,557.20<br>689,277.80<br>25.6 %    | 925,835.00<br>236,557.20<br>689,277.80<br>25.6 %    | 925,835.00<br>236,557.20<br>689,277.80<br>25.6 %    |
| 5459 | MEJORAMIENTO CAMINO<br>TERCIARIO SAV29S, TRAMO:<br>SAN CARLOS LEMPA<br>(SAV09S) HACIA LA PITA,                                                                                                                                | P<br>E<br>D<br>% | 881,821.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                       |

|  |      | TECOLUCA, SAN VICENTE.                                                                                                                                                         | %          | 0.0 %            | 0.0 %                                          | 0.0 %                         | 0.0 %                         | 0.0 %                                            | 0.0 %                         | 0.0 %                                            | 0.0 %                                            |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | 5838 | CONSTRUCCIÓN DE CARRIL AUXILIAR PARA LA SEGURIDAD VIAL DE CICLISTAS Y PEATONES, COMPLEMENTARIO AL BOULEVARD DIEGO DE HOLGUÍN, ANTIGUO CUSCATLÁN, TRAMO II-A, ETAPA II.         | 836,068.00 | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                    |
|  | 5351 | Reconstrucción de Obras de Protección y de Mitigación en Quebrada Chilismuyo, Av. Washington, Colonia Ciudad Satélite, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador | 739,016.00 | P<br>E<br>D<br>% | 85,020.00<br>53,075.03<br>31,944.97<br>62.4 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 653,996.00<br>408,269.45<br>245,726.55<br>62.4 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 653,996.00<br>408,269.45<br>245,726.55<br>62.4 % | 739,016.00<br>461,344.48<br>277,671.52<br>62.4 % |
|  | 5655 | CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION EN ZONA DE QUEBRADA LA LECHUZA, ALEDAÑO AL PARQUEO DE LA UDV (VMOP), MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR                                 | 491,854.00 | P<br>E<br>D<br>% | 56,585.00<br>30,194.46<br>26,390.54<br>53.4 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 435,269.00<br>232,265.13<br>203,003.87<br>53.4 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 435,269.00<br>232,265.13<br>203,003.87<br>53.4 % | 491,854.00<br>262,459.59<br>228,394.41<br>53.4 % |
|  | 5681 | Rehabilitación de calle entre el desvío de Cantón Guarjila hacia Municipio Las Vueltas, Departamento de Chalatenango                                                           | 400,000.00 | P<br>E<br>D<br>% | 400,000.00<br>22,944.48<br>377,056.52<br>5.7 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                    | 400,000.00<br>22,944.48<br>377,056.52<br>5.7 %   |
|  | 5682 | Rehabilitación de calle entre Caserio El Mozote, Cantón La Guacamaya, Colonia Altomiro y Comunidad El Barrial del Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán,             | 400,000.00 | P<br>E<br>D<br>% | 295,980.00<br>4,642.92<br>291,337.08<br>1.6 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                    | 295,980.00<br>4,642.92<br>291,337.08<br>1.6 %    |
|  | 5684 | Pavimentación de Calle entre Cantón Los Lagartos, Municipio de San Julián hacia el Cantón El Sunza, Municipio de Izaico, en el Departamento de Sonsonate.                      | 303,570.00 | P<br>E<br>D<br>% | 288,280.98<br>11,826.95<br>276,454.03<br>4.1 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                    | 288,280.98<br>11,826.95<br>276,454.03<br>4.1 %   |
|  | 5623 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2067                                                                                                                                        | 257,415.00 | P<br>E<br>D<br>% | 23,625.00<br>2,343.46<br>21,281.54<br>9.9 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 181,680.00<br>18,026.54<br>163,653.46<br>9.9 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 181,680.00<br>18,026.54<br>163,653.46<br>9.9 %   | 205,305.00<br>20,370.00<br>184,935.00<br>9.9 %   |
|  | 5793 | CONSTRUCCIÓN DE CARRIL AUXILIAR PARA LA SEGURIDAD VIAL DE CICLISTAS Y PEATONES, COMPLEMENTARIO AL BOULEVARD DIEGO DE HOLGUÍN, ANTIGUO CUSCATLÁN, TRAMO II-A – ETAPA I          | 230,873.00 | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                    |
|  | 5688 | Mejoramiento de calle entre el desvío Caserio Camalote, Municipio El Carrizal hacia carretera CHAO6N ( La                                                                      | 200,000.00 | P<br>E           | 93,000.01<br>21,249.49                         | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                                     | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                                     | 93,000.01<br>21,249.49                           |



|  |      | Montañaña ); Municipio de La Laguna, en el Departamento de Chalatenango.                                                                                                          | D<br>%           | 71,750.52<br>22.8 %                           | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 71,750.52<br>22.8 %                           | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                                 | 71,750.52<br>22.8 %                           |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | 5690 | Mejoramiento de calle entre los Municipios de San Rafael Oriente y San Jorge, Departamento de San Miguel.                                                                         | P<br>E<br>D<br>% | 200,000.00<br>0.00<br>200,000.00<br>0.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 200,000.00<br>0.00<br>200,000.00<br>0.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 200,000.00<br>0.00<br>200,000.00<br>0.0 %     |
|  | 5743 | Construcción de Obras de Protección del Puente La Chapina en el Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate.                                                                   | P<br>E<br>D<br>% | 160,615.00<br>0.00<br>160,615.00<br>0.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 160,615.00<br>0.00<br>160,615.00<br>0.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 160,615.00<br>0.00<br>160,615.00<br>0.0 %     |
|  | 5653 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES SI/ RIO COPAPAYO, RUTA CA'08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD - DAVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.               | P<br>E<br>D<br>% | 132,577.00<br>0.00<br>132,577.00<br>0.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 132,577.00<br>0.00<br>132,577.00<br>0.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 132,577.00<br>0.00<br>132,577.00<br>0.0 %     |
|  | 5685 | Construcción de Empedrado y Fregado de calle San Martín, Municipio Guaymango, Ahuachapán                                                                                          | P<br>E<br>D<br>% | 67,816.18<br>16,316.22<br>51,499.96<br>24.1 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 67,816.18<br>16,316.22<br>51,499.96<br>24.1 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 67,816.18<br>16,316.22<br>51,499.96<br>24.1 % |
|  | 5687 | Construcción de Empedrado y Fregado de calle en el Municipio de San Lorenzo, Ahuachapán                                                                                           | P<br>E<br>D<br>% | 68,814.97<br>9,760.14<br>59,034.83<br>14.2 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 68,814.97<br>9,760.14<br>59,034.83<br>14.2 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 68,814.97<br>9,760.14<br>59,034.83<br>14.2 %  |
|  | 5321 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CON SU DESCARGA, OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES EN CALLE ROMAN PEÑA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | P<br>E<br>D<br>% | 71,487.00<br>71,486.82<br>0.18<br>100.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 71,487.00<br>71,486.82<br>0.18<br>100.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 71,487.00<br>71,486.82<br>0.18<br>100.0 %     |
|  | 5008 | REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PUENTES TULE (KM 45.48) Y COLIMA (KM 47.45), CARRETERA TRONCAL DEL NORTE (CA-4N), MUNICIPIO DE EL PAISNAL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR             | P<br>E<br>D<br>% | 7,974.00<br>1,553.10<br>6,420.90<br>19.5 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 7,974.00<br>1,553.10<br>6,420.90<br>19.5 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 61,329.00<br>11,946.88<br>49,382.12<br>19.5 % | 69,303.00<br>13,499.98<br>55,803.02<br>19.5 % |
|  | 5686 | Rehabilitación de calles en los Cantones Calzontes Arriba y Potrero Grande, Municipio de Santa Ana, Santa Ana.                                                                    | P<br>E<br>D<br>% | 51,636.40<br>8,275.50<br>43,360.90<br>16.0 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 51,636.40<br>8,275.50<br>43,360.90<br>16.0 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 51,636.40<br>8,275.50<br>43,360.90<br>16.0 %  |
|  | 3918 | DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                   | P<br>E<br>D<br>% | 20,420.00<br>0.00<br>20,420.00<br>0.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 20,420.00<br>0.00<br>20,420.00<br>0.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 20,420.00<br>0.00<br>20,420.00<br>0.0 %       |
|  | 1506 | AMPLIACION DE ALAMEDA JUAN PABLO II E/ 75 AV.                                                                                                                                     | P<br>E           | 23,917.00<br>23,916.89                        | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 23,917.00<br>23,916.89                        | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                                  | 23,917.00<br>23,916.89                        |

|        |      |                                                                                                                            |         |                                             |                      |                      |                                             |                      |                      |                                                 |                                                 |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        |      | NORTE Y AV. MASFERRER, SAN SALVADOR.                                                                                       | D %     | 0.11 100.0 %                                | 0.00 0.0 %           | 0.00 0.0 %           | 0.11 100.0 %                                | 0.00 0.0 %           | 0.00 0.0 %           | 0.00 0.0 %                                      | 0.11 100.0 %                                    |
|        | 5400 | OBRAS DE MITIGACION EN ZONA DE CARCAVA DE URBANIZACION LAS VICTORIAS, SOYAPANGO, SAN SALVADOR                              | P E D % | 6,738.00 6,737.64 0.36 100.0 %              | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 6,738.00 6,737.64 0.36 100.0 %              | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 %                            | 6,738.00 6,737.64 0.36 100.0 %                  |
|        | 5004 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RIO LEMPA (KM. 75.5 LIB31N), LA LIBERTAD - CHALATENANGO                               | P E D % | 658.00 0.00 0.00 658.00 0.0 %               | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 658.00 0.00 0.00 658.00 0.0 %               | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 %                            | 658.00 0.00 0.00 658.00 0.0 %                   |
| MINSAL |      |                                                                                                                            | P E D % | 2,534,050.00 473,986.31 2,060,063.69 18.7 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 2,534,050.00 473,986.31 2,060,063.69 18.7 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 36,506,960.33 5,339,652.45 31,167,307.88 14.6 % | 39,041,010.33 5,813,638.76 33,227,371.57 14.9 % |
|        | 5128 | Programa Integrado de Salud                                                                                                | P E D % | 23,145,410.00                               | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 23,145,410.00                               | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 19,217,872.33 3,966,220.19 15,251,652.14 20.6 % | 19,217,872.33 3,966,220.19 15,251,652.14 20.6 % |
|        | 5131 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR                                              | P E D % | 21,056,215.00                               | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 21,056,215.00                               | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 17,289,088.00 848,798.67 16,439,289.33 4.9 %    | 19,823,138.00 1,323,784.98 18,499,353.02 6.7 %  |
|        | 5773 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CASERIO LA PIRRAYA, ISLA SAN SEBASTIAN, USULUTAN    | P E D % | 156,798.00                                  | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 156,798.00                                  | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 %                            | 0.00 0.00 0.00 0.0 %                            |
| ANDA   |      |                                                                                                                            | P E D % | 42,938,166.75                               | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 42,938,166.75                               | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 16,146,482.07 531,279.89 15,615,202.18 3.3 %    | 26,008,617.07 1,426,334.26 24,582,282.81 5.5 %  |
|        | 5584 | Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.                                                                  | P E D % | 21,401,958.75                               | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 21,401,958.75                               | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 11,251,055.00 11,251,055.00 0.00 0.0 %          | 11,251,055.00 11,251,055.00 0.00 0.0 %          |
|        | 5034 | PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR.                                                                       | P E D % | 15,759,868.00                               | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 15,759,868.00                               | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 9,947,893.00 947,893.00 9,000,000.00 0.0 %      | 10,810,028.00 895,054.37 9,914,973.63 8.3 %     |
|        | 5134 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.            | P E D % | 4,573,985.00                                | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 4,573,985.00                                | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 3,947,534.07 531,279.89 3,416,254.18 13.5 %     | 3,947,534.07 531,279.89 3,416,254.18 13.5 %     |
|        | 5750 | PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO A SISTEMA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | P E D % | 473,909.00                                  | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 473,909.00                                  | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 % | 0.00 0.00 0.00 0.0 %                            | 0.00 0.00 0.00 0.0 %                            |
|        |      | RECONSTRUCCIÓN DE                                                                                                          |         |                                             |                      |                      |                                             |                      |                      |                                                 |                                                 |

[illegible]

[illegible]

|          | 5813 | Calidad de la Educación.                                                                                                                           | 1,171,508.00  | D | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          | 5620 | Programa de Infraestructura Educativa 2012                                                                                                         | 500,000.00    | P | 165,104.29    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          | 4186 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS ESCOLARES EN DPTOS. DE AHUACHAPAN, CHALATENANGO, SAN MIGUEL Y MORAZAN                                       | 32,621.00     | E | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | D | 165,104.29    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | % | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONAVIPO |      |                                                                                                                                                    |               | P | 3,753.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | E | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | D | 3,753.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | % | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | P | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | E | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | D | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | % | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          | 5503 | CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR              | 27,157,936.05 | P | 26,468,975.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | E | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | D | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | % | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | P | 10,120,350.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | E | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | D | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | % | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          | 5085 | CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA                        | 10,131,291.12 | P | 9,905,590.83  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | E | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | D | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | % | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          | 5396 | CONSTRUCCIÓN DE 308 VIVIENDAS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LOS MANANTIALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 3,651,607.56  | P | 3,565,516.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | E | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | D | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | % | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          | 5192 | CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION PROCAVIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA                             | 2,773,213.53  | P | 2,690,590.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | E | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | D | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | % | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          | 5028 | CONSTRUCCIÓN DE 501 VIVIENDAS EN URBANIZACION NUEVO BELEN, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL                                                  | 197,115.70    | P | 186,926.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | E | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | D | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | % | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FOVIAL   |      |                                                                                                                                                    |               | P | 15,516,466.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | E | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | D | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | % | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          | 4784 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO                                                                                                                          | 16,485,700.00 | P | 13,465,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | E | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | D | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |                                                                                                                                                    |               | % | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|       |      | PERIODO AÑO 2012                                                                                                                                       | D | 10,437,112.08 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 10,437,112.08 | 22.5 % |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------|
|       | 4795 | Mejoramiento Camino Rural UNIO2S, Tramo: El Jagüey - El Tamarindo, Departamento de La Unión                                                            | P | 249,595.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 249,595.00    | 2.4 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | E | 5,988.22      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 5,988.22      | 0.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | D | 243,606.78    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 243,606.78    | 2.3 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | % | 2.4 %         | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.3 %         | 2.3 %  |
|       | 4774 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2012                                                                                          | P | 1,313,230.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,313,230.37  | 12.5 % |
|       |      |                                                                                                                                                        | E | 95,661.98     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 95,661.98     | 7.3 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | D | 1,217,568.39  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,217,568.39  | 11.7 % |
|       |      |                                                                                                                                                        | % | 7.3 %         | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 7.3 %         | 7.3 %  |
|       | 5541 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL UNIO3S: CA02E - EMBARCADERO LOS CORRALES, DEPARTAMENTO DE LA UNION                                                           | P | 140,175.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 140,175.00    | 1.3 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | E | 7,935.88      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 7,935.88      | 0.7 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | D | 132,239.12    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 132,239.12    | 1.2 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | % | 5.7 %         | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 5.7 %         | 5.7 %  |
|       | 4771 | Mejoramiento Camino Rural AHU24S/AHU25S, Entre: Km. 151 Carretera El Litoral (CA02W) - Garita Palmera. Ahuechapán.                                     | P | 114,739.74    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 114,739.74    | 1.1 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | E | 54,011.57     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 54,011.57     | 0.5 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | D | 60,728.17     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 60,728.17     | 0.6 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | % | 47.1 %        | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 47.1 %        | 47.1 % |
|       | 4779 | PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2012                                                                                                     | P | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | E | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | D | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | % | 0.0 %         | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 %         | 0.0 %  |
|       | 4488 | Administración del Programa (Unidad Ejecutora)                                                                                                         | P | 233,026.30    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 233,026.30    | 2.2 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | E | 75,034.03     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 75,034.03     | 0.7 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | D | 157,992.27    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 157,992.27    | 1.5 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | % | 32.2 %        | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 32.2 %        | 32.2 % |
| VMVDU |      |                                                                                                                                                        | P | 724,130.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 724,130.00    | 7.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | E | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | D | 724,130.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 724,130.00    | 7.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | % | 0.0 %         | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 %         | 0.0 %  |
|       | 5132 | PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS                                                                        | P | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | E | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | D | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | % | 0.0 %         | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 %         | 0.0 %  |
|       | 5100 | DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA                                                            | P | 724,130.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 724,130.00    | 7.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | E | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | D | 724,130.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 724,130.00    | 7.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | % | 0.0 %         | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 %         | 0.0 %  |
|       | 5769 | Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios- PACSES, a nivel Nacional.                                                        | P | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | E | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | D | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | % | 0.0 %         | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 %         | 0.0 %  |
|       | 5781 | Programa de fortalecimiento de las capacidades asociativas para la generación de empleo intensivo en Comunidades Solidarias Urbanas, a nivel Nacional. | P | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | E | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | D | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.0 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | % | 0.0 %         | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 %         | 0.0 %  |
| CSJ   |      |                                                                                                                                                        | P | 16,208,821.41 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 16,208,821.41 | 15.6 % |
|       |      |                                                                                                                                                        | E | 283,591.38    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 283,591.38    | 0.3 %  |
|       |      |                                                                                                                                                        | D | 15,925,230.03 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 15,925,230.03 | 15.1 % |
|       |      |                                                                                                                                                        | % | 1.7 %         | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.7 %         | 1.7 %  |

|      |                                                                                                                                           |             |               |                                                      |                              |                              |                              |                              |                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4344 | Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador                                                              | P<br>E<br>D | 9,149,333.00  | 7,640,759.41<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7,640,759.41<br>0.00<br>0.00<br>0.00                    |
| 3831 | Construcción Centro Judicial Integrado de La Unión                                                                                        | P<br>E<br>D | 2,570,120.00  | 2,570,120.00<br>8,518.00<br>2,561,602.00<br>0.3 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 2,570,120.00<br>8,518.00<br>2,561,602.00<br>0.3 %       |
| 4225 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR                                | P<br>E<br>D | 2,168,000.00  | 2,168,000.00<br>11,372.00<br>2,156,628.00<br>0.5 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 2,168,000.00<br>11,372.00<br>2,156,628.00<br>0.5 %      |
| 5637 | Construcción y Equipamiento de Salas de Audiencia en Tribunales a Nivel Nacional                                                          | P<br>E<br>D | 1,500,000.00  | 510,050.00<br>8,635.13<br>501,414.87<br>1.7 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 510,050.00<br>8,635.13<br>501,414.87<br>1.7 %           |
| 5638 | Remodelaciones, Ampliaciones, Readecuaciones y Mejoras Institucionales a Nivel Nacional.                                                  | P<br>E<br>D | 1,500,000.00  | 1,483,500.00<br>255,066.25<br>1,228,433.75<br>17.2 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 1,483,500.00<br>255,066.25<br>1,228,433.75<br>17.2 %    |
| 3385 | Construcción Centro Judicial Integrado de Apopa, San Salvador                                                                             | P<br>E<br>D | 1,004,392.00  | 1,004,392.00<br>0.00<br>1,004,392.00<br>0.0 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 1,004,392.00<br>0.00<br>1,004,392.00<br>0.0 %           |
| 3386 | "Construcción Centro Judicial Integrado de San Marcos, San Salvador".                                                                     | P<br>E<br>D | 350,000.00    | 350,000.00<br>0.00<br>350,000.00<br>0.0 %            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 350,000.00<br>0.00<br>350,000.00<br>0.0 %               |
| 3465 | Remodelación y Ampliación Centro Judicial Integrado de Sonsonate                                                                          | P<br>E<br>D | 350,000.00    | 350,000.00<br>0.00<br>350,000.00<br>0.0 %            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 350,000.00<br>0.00<br>350,000.00<br>0.0 %               |
| 5444 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE LA CIRCUNSCRIPCION DE SAN RAFAEL, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO               | P<br>E<br>D | 66,000.00     | 66,000.00<br>0.00<br>66,000.00<br>0.0 %              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 66,000.00<br>0.00<br>66,000.00<br>0.0 %                 |
| 5445 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE LA CIRCUNSCRIPCION DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO. | P<br>E<br>D | 66,000.00     | 66,000.00<br>0.00<br>66,000.00<br>0.0 %              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 66,000.00<br>0.00<br>66,000.00<br>0.0 %                 |
| MAG  |                                                                                                                                           | P<br>E<br>D | 16,299,493.47 | 1,118,793.00<br>392,624.61<br>726,168.39<br>35.1 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 15,121,406.96<br>8,318,411.14<br>6,802,995.82<br>55.0 % |
| 4377 | PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LA REGION CENTRAL                                                                       | P<br>E<br>D | 4,903,835.00  | 564,160.00<br>99,375.94<br>464,784.06                | 0.00<br>0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00<br>0.00         | 4,796,764.22<br>3,265,586.81<br>1,531,177.41            |



|      | Y PARACENTRAL<br>(PRODEMOR-Central)                                                                                                                                                                                         | %                | 17.6 %       | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 17.6 %                                           | 0.0 % | 74.8 %                                               | 0.0 %                                              | 74.8 %                                               | 68.1 %                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3752 | Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMOR)                                                                                                                                               | P<br>E<br>D<br>% | 4,627,705.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 504,633.00<br>248,198.67<br>256,434.33<br>49.2 % | 0.00  | 3,688,724.37<br>2,933,737.17<br>754,987.20<br>79.5 % | 373,985.00<br>201,339.83<br>172,645.17<br>53.8 %   | 4,062,709.37<br>3,135,077.00<br>927,632.37<br>77.2 % | 4,567,342.37<br>3,383,275.67<br>1,184,066.70<br>74.1 % |
| 5725 | CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA REGIÓN ORIENTAL CEDAF MORAZAN                                                                                                    | P<br>E<br>D<br>% | 2,050,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 50,000.00<br>45,050.00<br>4,950.00<br>90.1 %     | 0.00  | 0.00                                                 | 1,883,099.00<br>39,649.60<br>1,843,449.40<br>2.1 % | 1,883,099.00<br>39,649.60<br>1,843,449.40<br>2.1 %   | 1,933,099.00<br>84,699.60<br>1,848,399.40<br>4.4 %     |
| 5730 | Fortalecimiento de las Capacidades Productivas de Productores y Productoras de Hortalizas y Frutas, en 46 Municipios de 10 Departamentos Atendidos por el Programa PAF Cadenas Productivas del Plan de Agricultura Familiar | P<br>E<br>D<br>% | 1,466,130.30 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                                             | 0.00  | 0.00                                                 | 1,028,420.20<br>0.00<br>1,028,420.20<br>0.0 %      | 1,028,420.20<br>0.00<br>1,028,420.20<br>0.0 %        | 1,028,420.20<br>0.00<br>1,028,420.20<br>0.0 %          |
| 5731 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS FAMILIAS RURALES PARA MEJORAR SUS INGRESOS, EN MUNICIPIOS DE LAS REGIONES CENTRAL Y OCCIDENTAL DE EL SALVADOR                                                         | P<br>E<br>D<br>% | 1,400,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                                             | 0.00  | 0.00                                                 | 1,400,000.00<br>0.00<br>1,400,000.00<br>100.0 %    | 1,400,000.00<br>0.00<br>1,400,000.00<br>100.0 %      | 1,400,000.00<br>0.00<br>1,400,000.00<br>100.0 %        |
| 5783 | Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de Riego del Bajo Lempa, en los Departamentos de San Vicente, La Paz y Usulután                                                                                                      | P<br>E<br>D<br>% | 1,223,123.17 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                                             | 0.00  | 0.00                                                 | 813,673.17<br>0.00<br>813,673.17<br>0.0 %          | 813,673.17<br>0.00<br>813,673.17<br>0.0 %            | 813,673.17<br>0.00<br>813,673.17<br>0.0 %              |
| 5729 | Construcción y Equipamiento de Infraestructura para la Producción de Camarón Marino y Cultivo de Tilapia, como Apoyo a Organizaciones Acuícolas en el Departamento de Usulután.                                             | P<br>E<br>D<br>% | 200,000.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                                             | 0.00  | 0.00                                                 | 154,408.00<br>33,912.99<br>120,495.01<br>22.0 %    | 154,408.00<br>33,912.99<br>120,495.01<br>22.0 %      | 154,408.00<br>33,912.99<br>120,495.01<br>22.0 %        |
| 2963 | PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION RURAL (PREMODER)                                                                                                                                                                 | P<br>E<br>D<br>% | 155,000.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                                             | 0.00  | 0.00                                                 | 0.00                                               | 155,000.00<br>149,936.07<br>5,063.93<br>96.7 %       | 155,000.00<br>149,936.07<br>5,063.93<br>96.7 %         |
| 5764 | Fortalecimiento Institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológicas en Sanidad Animal, Análisis de Riesgo de Plagas y Sistema de Inteligencia de Mercados Agropecuarios en El Salvador               | P<br>E<br>D<br>% | 143,700.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                                             | 0.00  | 0.00                                                 | 143,700.00<br>0.00<br>143,700.00<br>0.0 %          | 143,700.00<br>0.00<br>143,700.00<br>0.0 %            | 143,700.00<br>0.00<br>143,700.00<br>0.0 %              |
| 5763 | Remodelación y Equipamiento del Laboratorio de Microbiología de Alimentos sede El Matizano para la Inspección Sanitaria de la                                                                                               | P<br>E<br>D<br>% | 130,000.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                                             | 0.00  | 0.00                                                 | 129,000.00<br>1,000.00<br>128,000.00<br>0.8 %      | 129,000.00<br>1,000.00<br>128,000.00<br>0.8 %        | 129,000.00<br>1,000.00<br>128,000.00<br>0.8 %          |

[illegible]

[illegible]

|                      |      |                                                                                                                                 |         |              |                                        |                                                         |                              |                              |                                                     |                              |                              |                                                   |                                                     |
|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                      | 5583 | asfáltico de calle perimetral entre SEI y acceso 6 del Aeropuerto Internacional El Salvador, Fase I                             | E D %   | 450,000.00   | 0.00<br>0.00<br>0.0%                   | 0.00<br>0.00<br>0.0%                                    | 397,000.00<br>0.00<br>0.0%   | 0.00<br>0.00<br>0.0%         | 397,000.00<br>0.00<br>0.0%                          | 0.00<br>0.00<br>0.0%         | 0.00<br>0.00<br>0.0%         | 0.00<br>0.00<br>0.0%                              | 397,000.00<br>0.00<br>0.0%                          |
|                      | 5632 | Remodelación y Equipamiento de Servicios Sanitarios del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional El Salvador | P E D % | 300,000.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%           | 300,000.00<br>149,390.99<br>150,609.01<br>49.8%         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 300,000.00<br>149,390.99<br>150,609.01<br>49.8%     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                      | 300,000.00<br>149,390.99<br>150,609.01<br>49.8%     |
| ISSS                 |      |                                                                                                                                 | P E D % | 3,877,611.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%           | 2,690,106.00<br>1,898,079.71<br>792,026.29<br>70.6%     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 2,690,106.00<br>1,898,079.71<br>792,026.29<br>70.6% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                      | 2,690,106.00<br>1,898,079.71<br>792,026.29<br>70.6% |
|                      | 862  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ZACAMIL                                                                                | P E D % | 1,074,405.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%           | 0.00<br>1,074,403.96<br>-1,074,403.96<br>0.0%           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>1,074,403.96<br>-1,074,403.96<br>0.0%       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                      | 0.00<br>1,074,403.96<br>-1,074,403.96<br>0.0%       |
|                      | 5386 | READECUACION DE LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL AMATEPEC, SAN SALVADOR.                                                             | P E D % | 847,875.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%           | 0.00<br>847,875.00<br>432,850.53<br>415,024.47<br>51.1% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 847,875.00<br>432,850.53<br>415,024.47<br>51.1%     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                      | 847,875.00<br>432,850.53<br>415,024.47<br>51.1%     |
|                      | 5326 | MEJORAMIENTO DE FARMACIAS EN CENTROS DE ATENCION A NIVEL NACIONAL                                                               | P E D % | 462,615.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%           | 0.00<br>462,615.00<br>29,155.38<br>433,459.62<br>6.3%   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 462,615.00<br>29,155.38<br>433,459.62<br>6.3%       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                      | 462,615.00<br>29,155.38<br>433,459.62<br>6.3%       |
|                      | 4398 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETAS EN LA REGION METROPOLITANA                      | P E D % | 452,400.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%           | 339,300.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 339,300.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                      | 339,300.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                  |
|                      | 5323 | REMODELACIÓN DEL ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS GENERALES EN CIUDAD EL MONSERRAT, SAN SALVADOR.                            | P E D % | 400,000.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%           | 400,000.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 400,000.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                      | 400,000.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                  |
|                      | 5325 | REMODELACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA ATLACATL, SAN SALVADOR.                                                                        | P E D % | 370,000.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%           | 370,000.00<br>95,228.71<br>274,771.29<br>25.7%          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 370,000.00<br>95,228.71<br>274,771.29<br>25.7%      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                      | 370,000.00<br>95,228.71<br>274,771.29<br>25.7%      |
|                      | 5183 | REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA DE SANTA ANA.                                                                     | P E D % | 180,000.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%           | 180,000.00<br>176,158.81<br>3,841.19<br>97.9%           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 180,000.00<br>176,158.81<br>3,841.19<br>97.9%       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                      | 180,000.00<br>176,158.81<br>3,841.19<br>97.9%       |
|                      | 5308 | SUSTITUCION DE LA CUBIERTA DE TECHO DE LA TORRE ONCOLOGICA DEL ISSS                                                             | P E D % | 90,316.00    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%           | 90,316.00<br>90,282.32<br>33.68<br>100.0%               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 90,316.00<br>90,282.32<br>33.68<br>100.0%           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                      | 90,316.00<br>90,282.32<br>33.68<br>100.0%           |
| Secr. de Inclu. Soc. |      |                                                                                                                                 | P E D % | 3,111,560.00 | 51,175.00<br>0.00<br>51,175.00<br>0.0% | 51,175.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 51,175.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0%                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0% | 1,260,828.10<br>447,126.75<br>-5,222.23<br>101.2% | 1,759,129.85<br>452,348.98<br>                      |

|             |      |                                                                                                                             |              |         |            |      |      |      |      |              |         |              |              |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|------|------|------|------|--------------|---------|--------------|--------------|
|             | 5644 | FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CIUDAD MUJER                                                                              | 1,756,065.00 | D %     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,222.23    | 0.00    | -5,222.23    | -5,222.23    |
|             | 5785 | Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer Usulután, Santa Ana y San Martín                                                  | 1,304,300.00 | P E D % | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260,828.10 | 0.00    | 1,260,828.10 | 1,260,828.10 |
|             | 5740 | CONSTRUCCION DE KIOSCO DE MADERA PARA OFICINA DE SOLVENCIAS DE LA PNC EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO DE CIUDAD MUJER, COLON | 51,175.00    | P E D % | 51,175.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,175.00    | 0.00    | 51,175.00    | 51,175.00    |
| DGCP - MJSP |      |                                                                                                                             | 1,998,700.00 | P E D % | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,914.00 | 0.00    | 1,682,914.00 | 1,682,914.00 |
|             | 5791 | Readecuación y Equipamiento de Granjas Penitenciarias en Izalco y Santa Ana                                                 | 1,998,700.00 | P E D % | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,679,293.12 | 0.00    | 1,679,293.12 | 1,679,293.12 |
| FSV         |      |                                                                                                                             | 1,510,000.00 | P E D % | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310,000.00 | 0.00    | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 |
|             | 4513 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RECURSOS LOGISTICOS, COMEDOR DEL PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV, SAN SALVADOR.            | 1,510,000.00 | P E D % | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310,000.00 | 0.00    | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 |
| CI - MJSP   |      |                                                                                                                             | 1,293,850.00 | P E D % | 120,125.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924,042.11   | 0.00    | 924,042.11   | 1,044,167.47 |
|             | 5137 | Granja de Rehabilitación para Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil de Ilobasco, Departamento de Cabañas            | 1,293,850.00 | P E D % | 23,428.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,219.90   | 0.00    | 180,219.90   | 203,648.50   |
| AL          |      |                                                                                                                             | 1,150,000.00 | P E D % | 66,553.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,052.01   | 0.00    | 530,052.01   | 596,605.91   |
|             | 5222 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO II                                                                         | 1,150,000.00 | P E D % | 83,446.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455,447.99   | 0.00    | 455,447.99   | 538,894.09   |
| FONAES      |      |                                                                                                                             | 1,066,973.72 | P E D % | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947,701.10   | 0.00    | 947,701.10   | 947,701.10   |
|             | 5777 | Programa Techo y Agua 2012-2013                                                                                             | 850,000.00   | P E D % | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,727.38   | 0.00    | 730,727.38   | 730,727.38   |
|             |      |                                                                                                                             |              |         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 %      | 100.0 % | 100.0 %      | 100.0 %      |

|                  |      |                                                                                                                                                                                      |                  |            |                                                  |                              |                              |                              |                                                  |                                                 |                                                  |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                  | 5047 | TECHO Y AGUA FASE 2011                                                                                                                                                               | P<br>E<br>D<br>% | 216,973.72 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 216,973.72<br>216,973.72<br>100.0 %              | 216,973.72<br>216,973.72<br>100.0 %             | 216,973.72<br>216,973.72<br>100.0 %              |
| CONJUVE          |      |                                                                                                                                                                                      | P<br>E<br>D<br>% | 900,631.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 775,398.25<br>775,398.25<br>0.0 %                | 775,398.25<br>775,398.25<br>0.0 %               | 775,398.25<br>775,398.25<br>0.0 %                |
|                  | 5770 | Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias - FOCAP | P<br>E<br>D<br>% | 900,631.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 775,398.25<br>775,398.25<br>0.0 %                | 775,398.25<br>775,398.25<br>0.0 %               | 775,398.25<br>775,398.25<br>0.0 %                |
| MIGOB            |      |                                                                                                                                                                                      | P<br>E<br>D<br>% | 830,047.32 | 455,706.66<br>113,798.85<br>341,907.81<br>25.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 455,706.66<br>113,798.85<br>341,907.81<br>25.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                    | 455,706.66<br>113,798.85<br>341,907.81<br>25.0 % |
|                  | 5277 | Mejoramiento de Infraestructura de 9 Gobernaciones Departamentales a nivel nacional                                                                                                  | P<br>E<br>D<br>% | 503,403.00 | 209,668.57<br>64,353.41<br>145,315.16<br>30.7 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 209,668.57<br>64,353.41<br>145,315.16<br>30.7 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                    | 209,668.57<br>64,353.41<br>145,315.16<br>30.7 %  |
|                  | 5775 | Construcción de la Infraestructura para albergar la Gobernación Política Departamental de San Vicente.                                                                               | P<br>E<br>D<br>% | 164,597.00 | 83,990.77<br>49,445.44<br>34,545.33<br>58.9 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 83,990.77<br>49,445.44<br>34,545.33<br>58.9 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                    | 83,990.77<br>49,445.44<br>34,545.33<br>58.9 %    |
|                  | 5572 | Suministro e Instalación de Sub-Estación Eléctrica de 100kva para Imprenta Nacional.                                                                                                 | P<br>E<br>D<br>% | 162,047.32 | 162,047.32<br>0.00<br>0.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 162,047.32<br>0.00<br>0.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                    | 162,047.32<br>0.00<br>0.00<br>0.00               |
| ISTU             |      |                                                                                                                                                                                      | P<br>E<br>D<br>% | 800,000.00 | 800,000.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 800,000.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                    | 800,000.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00               |
|                  | 5624 | MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS RECREATIVOS DEL ISTU A NIVEL NACIONAL                                                                                                                    | P<br>E<br>D<br>% | 800,000.00 | 800,000.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 800,000.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                    | 800,000.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00               |
| Secr. de Cultura |      |                                                                                                                                                                                      | P<br>E<br>D<br>% | 792,060.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 186,862.21<br>144,338.96<br>42,523.25<br>77.2 %  | 186,862.21<br>144,338.96<br>42,523.25<br>77.2 % | 186,862.21<br>144,338.96<br>42,523.25<br>77.2 %  |
|                  | 5796 | MEJORAMIENTO, ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE LA CULTURA A NIVEL NACIONAL, PARA LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR                                                | P<br>E<br>D<br>% | 605,630.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 37,608.18<br>19,940.80<br>17,667.38<br>53.0 %    | 37,608.18<br>19,940.80<br>17,667.38<br>53.0 %   | 37,608.18<br>19,940.80<br>17,667.38<br>53.0 %    |
|                  | 5647 | RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL SANTA LUCIA DE SUCHITOTO, SEGUNDA FASE                                                                                                         | P<br>E<br>D<br>% | 186,430.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 149,254.03<br>124,398.16<br>24,855.87<br>83.3 %  | 149,254.03<br>124,398.16<br>24,855.87<br>83.3 % | 149,254.03<br>124,398.16<br>24,855.87<br>83.3 %  |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SE - MJSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                |  | 5557 | INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ESPAÑA EL SALVADOR (FFI) - APOORTE EL SALVADOR                                                                                                                       | E D %   | 467,000.00<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 467,000.00<br>0.00<br>100.0 %                  | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 467,000.00<br>0.00<br>100.0 %                  |
|----------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| CORSATUR       |  |      |                                                                                                                                                                                                       | P E D % | 100,000.00                    | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 100,000.00<br>20,845.66<br>79,154.34<br>20.8 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 100,000.00<br>20,845.66<br>79,154.34<br>20.8 % |
|                |  | 5689 | Mejoramiento del muelle<br>arsenal del Puerto de La Libertad, en el departamento de La Libertad                                                                                                       | P E D % | 100,000.00                    | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 100,000.00<br>20,845.66<br>79,154.34<br>20.8 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 100,000.00<br>20,845.66<br>79,154.34<br>20.8 % |
| ISDEMU         |  |      |                                                                                                                                                                                                       | P E D % | 91,301.00                     | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 %                          | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 84,683.00<br>35,064.62<br>49,618.38<br>41.4 %  |
|                |  | 5765 | Adecuación de Centros de Atención para la Gestión Territorial para la Igualdad y la Prevención social de la violencia de Género en 11 Municipios de Comunidades Solidarias Urbanas                    | P E D % | 91,301.00                     | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 %                          | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 84,683.00<br>35,064.62<br>49,618.38<br>41.4 %  |
| ISNA           |  |      |                                                                                                                                                                                                       | P E D % | 47,605.00                     | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 47,605.00<br>6,000.25<br>41,604.75<br>12.6 %   | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 47,605.00<br>6,000.25<br>41,604.75<br>12.6 %   |
|                |  | 4830 | REPARACION EDIFICIO LA ESTRELLA, DELEGACION CENTRAL ISNA (FASE II)                                                                                                                                    | P E D % | 34,936.00                     | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 34,936.00<br>0.00<br>0.0 %                     | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 34,936.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %             |
|                |  | 4511 | REPARACIONES Y MEJORAS EN CENTRO DE REINSERCIÓN EL ESPINO, AHUACHAPAN (Primera Fase)                                                                                                                  | P E D % | 12,669.00                     | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 12,669.00<br>6,000.25<br>6,668.75<br>47.4 %    | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 12,669.00<br>6,000.25<br>6,668.75<br>47.4 %    |
| FOPROLYD       |  |      |                                                                                                                                                                                                       | P E D % | 26,800.00                     | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 26,800.00<br>1,683.72<br>25,116.28<br>6.3 %    | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 26,800.00<br>1,683.72<br>25,116.28<br>6.3 %    |
|                |  | 5641 | ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLE EN DONDE FUNCIONARA EL TALLER DE PRÓTESIS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO (FOPROLYD) Y SU EQUIPAMIENTO. | P E D % | 26,800.00                     | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 26,800.00<br>1,683.72<br>25,116.28<br>6.3 %    | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 26,800.00<br>1,683.72<br>25,116.28<br>6.3 %    |
| BOMBER - MIGOB |  |      |                                                                                                                                                                                                       | P E D % | 3,520.05                      | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 3,520.05<br>3,520.04<br>0.01<br>100.0 %        | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 3,520.05<br>3,520.04<br>0.01<br>100.0 %        |
|                |  | 4999 | Construcción y Equipamiento de dormitorios para el personal del Cuerpo de Bomberos de El                                                                                                              | P E D % | 3,520.05                      | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 3,520.05<br>3,520.04<br>0.01                   | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 3,520.05<br>3,520.04<br>0.01                   |

|                     |      | Salvador, Estación Central. | % | 0.0 %          | 100.0 %       | 0.0 %        | 100.0 %        | 0.0 %          | 0.0 %          | 0.0 %          | 100.0 %        |
|---------------------|------|-----------------------------|---|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PROYECTOS REGulares |      |                             | P | 117,885,860.39 | 62,353,488.61 | 4,532,983.00 | 181,922,263.00 | 202,938,423.42 | 173,206,375.94 | 376,144,799.36 | 580,917,131.36 |
|                     |      | 717,527,269.98              | E | 64,328,771.67  | 42,208,845.49 | 816,395.64   | 106,541,338.04 | 63,607,570.36  | 133,873,713.07 | 197,481,263.43 | 304,836,996.23 |
|                     |      |                             | D | 53,557,088.72  | 20,144,543.12 | 3,716,587.36 | 75,380,924.96  | 139,330,853.06 | 39,332,662.87  | 178,663,515.93 | 266,081,735.13 |
|                     |      |                             | % | 54.6 %         | 87.7 %        | 18.0 %       | 58.6 %         | 31.3 %         | 77.3 %         | 52.5 %         | 54.3 %         |
| FONAVIPO            |      |                             | P | 0.00           | 0.00          | 1,609,275.79 | 1,609,275.79   | 733,717.38     | 0.00           | 733,717.38     | 2,342,993.17   |
|                     |      | 2,436,567.38                | E | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 163,013.40     | 0.00           | 163,013.40     | 163,013.40     |
|                     |      |                             | D | 0.00           | 0.00          | 1,609,275.79 | 1,609,275.79   | 570,703.98     | 0.00           | 570,703.98     | 2,179,979.77   |
|                     |      |                             | % | 0.0 %          | 0.0 %         | 0.0 %        | 0.0 %          | 22.2 %         | 0.0 %          | 22.2 %         | 7.0 %          |
|                     | 5738 |                             | P | 0.00           | 0.00          | 904,675.79   | 904,675.79     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 904,675.79     |
|                     |      | 944,250.00                  | E | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|                     |      |                             | D | 0.00           | 0.00          | 904,675.79   | 904,675.79     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 904,675.79     |
|                     |      |                             | % | 0.0 %          | 0.0 %         | 0.0 %        | 0.0 %          | 0.0 %          | 0.0 %          | 0.0 %          | 0.0 %          |
|                     | 5371 |                             | P | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 434,470.53     | 0.00           | 434,470.53     | 434,470.53     |
|                     |      | 434,470.53                  | E | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 64,374.48      | 0.00           | 64,374.48      | 64,374.48      |
|                     |      |                             | D | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 370,096.05     | 0.00           | 370,096.05     | 370,096.05     |
|                     |      |                             | % | 0.0 %          | 0.0 %         | 0.0 %        | 0.0 %          | 14.8 %         | 0.0 %          | 14.8 %         | 14.8 %         |
|                     | 5735 |                             | P | 0.00           | 0.00          | 354,600.00   | 354,600.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 354,600.00     |
|                     |      | 354,600.00                  | E | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|                     |      |                             | D | 0.00           | 0.00          | 354,600.00   | 354,600.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 354,600.00     |
|                     |      |                             | % | 0.0 %          | 0.0 %         | 0.0 %        | 0.0 %          | 0.0 %          | 0.0 %          | 0.0 %          | 0.0 %          |
|                     | 5744 |                             | P | 0.00           | 0.00          | 350,000.00   | 350,000.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 350,000.00     |
|                     |      | 350,000.00                  | E | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|                     |      |                             | D | 0.00           | 0.00          | 350,000.00   | 350,000.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 350,000.00     |
|                     |      |                             | % | 0.0 %          | 0.0 %         | 0.0 %        | 0.0 %          | 0.0 %          | 0.0 %          | 0.0 %          | 0.0 %          |
|                     | 5370 |                             | P | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 164,500.37     | 0.00           | 164,500.37     | 164,500.37     |
|                     |      | 218,500.37                  | E | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 85,260.13      | 0.00           | 85,260.13      | 85,260.13      |
|                     |      |                             | D | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 79,240.24      | 0.00           | 79,240.24      | 79,240.24      |
|                     |      |                             | % | 0.0 %          | 0.0 %         | 0.0 %        | 0.0 %          | 51.8 %         | 0.0 %          | 51.8 %         | 51.8 %         |
|                     | 5245 |                             | P | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 134,746.48     | 0.00           | 134,746.48     | 134,746.48     |
|                     |      | 134,746.48                  | E | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 13,378.79      | 0.00           | 13,378.79      | 13,378.79      |
|                     |      |                             | D | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 121,367.69     | 0.00           | 121,367.69     | 121,367.69     |
|                     |      |                             | % | 0.0 %          | 0.0 %         | 0.0 %        | 0.0 %          | 9.9 %          | 0.0 %          | 9.9 %          | 9.9 %          |
| FOVIAL              |      |                             | P | 0.00           | 0.00          | 541,049.31   | 541,049.31     | 0.00           | 0.00           | 541,049.31     | 541,049.31     |
|                     |      | 1,541,049.31                | E | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|                     |      |                             | D | 0.00           | 0.00          | 541,049.31   | 541,049.31     | 0.00           | 0.00           | 541,049.31     | 541,049.31     |
|                     |      |                             | % | 0.0 %          | 0.0 %         | 0.0 %        | 0.0 %          | 0.0 %          | 0.0 %          | 0.0 %          | 0.0 %          |
|                     | 5509 |                             | P | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 528,790.47     | 0.00           | 528,790.47     | 528,790.47     |
|                     |      | 1,528,790.47                | E | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|                     |      |                             | D | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 528,790.47     | 0.00           | 528,790.47     | 528,790.47     |
|                     |      |                             | % | 0.0 %          | 0.0 %         | 0.0 %        | 0.0 %          | 0.0 %          | 0.0 %          | 0.0 %          | 0.0 %          |
|                     |      |                             | P | 0.00           | 0.00          | 7,629.44     | 7,629.44       | 0.00           | 0.00           | 7,629.44       | 7,629.44       |

[illegible]

|      |                                                                                                                           |              |             |   |                                                   |                               |                               |                               |                               |                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4661 | Atención y Hospitales del MSPAS.                                                                                          | 1,350,767.34 | D           | % | -198,467.34<br>117.2 %                            | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | -198,467.34<br>117.2 %                                                       |
| 4890 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La Libertad, La Libertad                                             | 1,060,786.27 | P<br>E<br>D | % | 37,075.00<br>29,981.64<br>7,113.36<br>80.8 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 1,023,711.27<br>1,060,786.27<br>390,034.35<br>670,751.92<br>35.2 %<br>36.8 % |
| 4658 | Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Red de Establecimientos de Salud.                                    | 490,667.43   | P<br>E<br>D | % | 490,667.43<br>490,667.43<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 490,667.43<br>490,667.43<br>0.00<br>100.0 %                                  |
| 4938 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Guadalupe, San Vicente                                               | 349,102.08   | P<br>E<br>D | % | 349,102.08<br>267,923.11<br>81,178.97<br>76.7 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 349,102.08<br>267,923.11<br>81,178.97<br>76.7 %                              |
| 4859 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Bobadilla, San Alejo, La Unión                                       | 328,481.14   | P<br>E<br>D | % | 287,418.00<br>312,962.91<br>-25,544.91<br>108.9 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 287,418.00<br>312,962.91<br>-25,544.91<br>108.9 %                            |
| 4867 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Uluazapa, San Miguel                                                 | 320,678.26   | P<br>E<br>D | % | 320,678.26<br>320,678.26<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 320,678.26<br>320,678.26<br>0.00<br>100.0 %                                  |
| 4861 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Faro, Conchagua, La Unión                                         | 308,263.30   | P<br>E<br>D | % | 308,263.30<br>280,908.24<br>27,355.06<br>91.1 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 308,263.30<br>280,908.24<br>27,355.06<br>91.1 %                              |
| 3345 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CHALATENANGO                                                         | 301,000.00   | P<br>E<br>D | % | 301,000.00<br>228,251.92<br>72,748.08<br>75.8 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 301,000.00<br>228,251.92<br>72,748.08<br>75.8 %                              |
| 4878 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután                                                     | 273,728.94   | P<br>E<br>D | % | 132,265.64<br>132,265.64<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 273,728.94<br>273,728.94<br>960.18<br>99.6 %                                 |
| 4660 | Remodelación y equipamiento del Hospital Nacional de Chalchuapa                                                           | 273,624.18   | P<br>E<br>D | % | 273,624.18<br>273,624.18<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 273,624.18<br>273,624.18<br>0.00<br>100.0 %                                  |
| 4891 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Matías, La Libertad                                                 | 253,589.56   | P<br>E<br>D | % | 253,589.56<br>253,589.56<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 253,589.56<br>253,589.56<br>0.00<br>100.0 %                                  |
| 4897 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana                            | 252,250.45   | P<br>E<br>D | % | 252,250.45<br>252,248.03<br>2.42<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 252,250.45<br>252,248.03<br>2.42<br>100.0 %                                  |
| 4893 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Tamanique, La Libertad                                               | 236,169.95   | P<br>E<br>D | % | 236,169.95<br>235,458.03<br>711.92<br>99.7 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 236,169.95<br>235,458.03<br>711.92<br>99.7 %                                 |
| 4917 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán | 195,565.46   | P<br>E<br>D | % | 195,565.46<br>195,125.79<br>439.67<br>99.8 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 195,565.46<br>195,125.79<br>439.67<br>99.8 %                                 |

|      |                                                                                                                            |                  |                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                             |                                               |                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4906 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Lucía, Santa Ana                            | P<br>E<br>D<br>% | 194,095.91<br>194,095.91<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 194,095.91<br>194,095.91<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 194,095.91<br>194,095.91<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>100.0 % |
| 4899 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad        | P<br>E<br>D<br>% | 188,609.79<br>184,046.17<br>4,563.62<br>97.6 %              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 188,609.79<br>184,046.17<br>4,563.62<br>97.6 %              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 188,609.79<br>184,046.17<br>4,563.62<br>97.6 %              |
| 4893 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Playa, La Unión                                | P<br>E<br>D<br>% | 178,623.51<br>116,233.19<br>62,390.32<br>65.1 %             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 178,623.51<br>116,233.19<br>62,390.32<br>65.1 %             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 178,623.51<br>116,233.19<br>62,390.32<br>65.1 %             |
| 4898 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa Ana   | P<br>E<br>D<br>% | 160,260.50<br>159,411.63<br>848.87<br>99.5 %                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 160,260.50<br>159,411.63<br>848.87<br>99.5 %                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 160,260.50<br>159,411.63<br>848.87<br>99.5 %                |
| 4886 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel               | P<br>E<br>D<br>% | 154,799.65<br>154,799.65<br>0.00<br>100.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 154,799.65<br>154,799.65<br>0.00<br>100.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 154,799.65<br>154,799.65<br>0.00<br>100.0 %                 |
| 4931 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyultitán, La Paz                              | P<br>E<br>D<br>% | 152,287.88<br>151,828.88<br>459.00<br>99.7 %                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 152,287.88<br>151,828.88<br>459.00<br>99.7 %                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 152,287.88<br>151,828.88<br>459.00<br>99.7 %                |
| 4926 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Sensuntepeque, Cabañas            | P<br>E<br>D<br>% | 146,883.38<br>145,949.00<br>934.38<br>99.4 %                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 146,883.38<br>145,949.00<br>934.38<br>99.4 %                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 146,883.38<br>145,949.00<br>934.38<br>99.4 %                |
| 4904 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Sebastián Salitrillo, Santa Ana               | P<br>E<br>D<br>% | 140,939.30<br>135,075.97<br>5,863.33<br>95.8 %              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 140,939.30<br>135,075.97<br>5,863.33<br>95.8 %              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 140,939.30<br>135,075.97<br>5,863.33<br>95.8 %              |
| 4903 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Juan las Minas, Metapán, Santa Ana            | P<br>E<br>D<br>% | 129,149.66<br>129,149.66<br>0.00<br>100.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 129,149.66<br>129,149.66<br>0.00<br>100.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 129,149.66<br>129,149.66<br>0.00<br>100.0 %                 |
| 4920 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de Concepción, Cuscatlán | P<br>E<br>D<br>% | 128,313.17<br>128,313.17<br>0.00<br>100.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 128,313.17<br>128,313.17<br>0.00<br>100.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 128,313.17<br>128,313.17<br>0.00<br>100.0 %                 |
| 4900 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Congo, Santa Ana                               | P<br>E<br>D<br>% | 123,134.01<br>115,431.35<br>7,702.66<br>93.7 %              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 123,134.01<br>115,431.35<br>7,702.66<br>93.7 %              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 123,134.01<br>115,431.35<br>7,702.66<br>93.7 %              |
| 4905 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana                          | P<br>E<br>D<br>% | 116,430.36<br>116,430.36<br>0.00<br>100.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 116,430.36<br>116,430.36<br>0.00<br>100.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                 | 116,430.36<br>116,430.36<br>0.00<br>100.0 %                 |
| 4936 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de                                            | P<br>E           | 112,985.40<br>112,985.40                                    | 0.00<br>0.00                                  | 0.00<br>0.00                                  | 0.00<br>0.00                                  | 0.00<br>0.00                                  | 112,985.40<br>112,985.40                                    | 0.00<br>0.00                                  | 112,985.40<br>112,985.40                                    |

|      | Salud de San Rafael Obrajuelo, La Paz                                                                                      | D          | % | 0.00       | 100.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4929 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilobasco, Caballeros | 108,920.41 | P | 108,920.41 | 100.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % |
|      |                                                                                                                            | 83,059.69  | E | 83,059.69  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 25,860.72  | D | 25,860.72  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 76.3 %     | % | 76.3 %     | 0.0 %   | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 4892 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad                  | 108,527.35 | P | 108,527.35 | 100.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % |
|      |                                                                                                                            | 84,012.39  | E | 84,012.39  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 9,550.81   | D | 9,550.81   | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 89.8 %     | % | 89.8 %     | 0.0 %   | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 4909 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio Pajonal, Santa Ana                                           | 94,012.39  | P | 94,012.39  | 100.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % |
|      |                                                                                                                            | 84,461.58  | E | 84,461.58  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 9,550.81   | D | 9,550.81   | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 89.8 %     | % | 89.8 %     | 0.0 %   | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 4916 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Chinanas, Ahuachapán                          | 89,902.24  | P | 89,902.24  | 100.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % |
|      |                                                                                                                            | 87,736.59  | E | 87,736.59  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 2,165.65   | D | 2,165.65   | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 97.6 %     | % | 97.6 %     | 0.0 %   | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 4865 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Piche, El Carmen, La Unión                     | 88,495.20  | P | 88,495.20  | 100.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % |
|      |                                                                                                                            | 88,495.20  | E | 88,495.20  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 0.00       | D | 0.00       | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 100.0 %    | % | 100.0 %    | 0.0 %   | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 4937 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitán, San Vicente            | 87,633.07  | P | 87,633.07  | 100.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % |
|      |                                                                                                                            | 58,347.88  | E | 58,347.88  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 29,285.19  | D | 29,285.19  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 66.6 %     | % | 66.6 %     | 0.0 %   | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 4843 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilares, San Salvador                           | 74,313.17  | P | 74,313.17  | 100.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % |
|      |                                                                                                                            | 74,313.17  | E | 74,313.17  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 0.00       | D | 0.00       | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 100.0 %    | % | 100.0 %    | 0.0 %   | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 4914 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Lorenzo, Ahuachapán                                                  | 70,844.93  | P | 70,844.93  | 100.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % |
|      |                                                                                                                            | 61,314.60  | E | 61,314.60  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 9,530.33   | D | 9,530.33   | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 86.5 %     | % | 86.5 %     | 0.0 %   | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 4901 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Belén, Gujiat, Metapán, Santa Ana                 | 70,468.91  | P | 70,468.91  | 100.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % |
|      |                                                                                                                            | 65,847.15  | E | 65,847.15  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 4,621.76   | D | 4,621.76   | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 93.4 %     | % | 93.4 %     | 0.0 %   | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 4915 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Jose Naranjo, Jujutla, Ahuachapán                                 | 69,700.18  | P | 69,700.18  | 100.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % |
|      |                                                                                                                            | 60,149.37  | E | 60,149.37  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 9,550.81   | D | 9,550.81   | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 86.3 %     | % | 86.3 %     | 0.0 %   | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 4837 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador                    | 61,189.25  | P | 61,189.25  | 100.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % |
|      |                                                                                                                            | 59,279.43  | E | 59,279.43  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 1,318.82   | D | 1,318.82   | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 97.8 %     | % | 97.8 %     | 0.0 %   | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 4934 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz                 | 61,117.37  | P | 61,117.37  | 100.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % |
|      |                                                                                                                            | 61,117.34  | E | 61,117.34  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 0.03       | D | 0.03       | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |                                                                                                                            | 100.0 %    | % | 100.0 %    | 0.0 %   | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 4844 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de                                                                      | 60,956.62  | P | 60,956.62  | 100.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % | 0.00  | 0.0 % |
|      |                                                                                                                            | 60,956.62  | E | 60,956.62  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |      |                                                                                                                                  |                  |                                                |                               |                               |                                                |                               |                                           |                                                |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  |      | la Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador                                                                                  | D<br>%           | 0.00<br>100.0 %                                | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>100.0 %                                | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                             | 0.00<br>100.0 %                                |
|  | 4923 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Ramon, Cuscatlán                    | P<br>E<br>D<br>% | 60,489.34<br>59,108.88<br>1,380.46<br>97.7 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 60,489.34<br>59,108.88<br>1,380.46<br>97.7 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %             | 60,489.34<br>59,108.88<br>1,380.46<br>97.7 %   |
|  | 4870 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lolotique, San Miguel                                   | P<br>E<br>D<br>% | 50,197.44<br>48,041.44<br>2,156.00<br>95.7 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 50,197.44<br>48,041.44<br>2,156.00<br>95.7 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %             | 50,197.44<br>48,041.44<br>2,156.00<br>95.7 %   |
|  | 4930 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Jutiapa, Cabañas              | P<br>E<br>D<br>% | 44,874.63<br>44,874.63<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 44,874.63<br>44,874.63<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %             | 44,874.63<br>44,874.63<br>0.00<br>100.0 %      |
|  | 4838 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Monserrat, San Salvador                              | P<br>E<br>D<br>% | 36,900.00<br>41,009.30<br>-4,109.30<br>111.1 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 36,900.00<br>41,009.30<br>-4,109.30<br>111.1 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 1,703.35<br>1,703.35<br>0.00<br>100.0 %   | 38,603.35<br>42,712.65<br>-4,109.30<br>110.6 % |
|  | 4877 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Triunfo, Usulután                                    | P<br>E<br>D<br>% | 40,147.19<br>40,147.19<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 40,147.19<br>40,147.19<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %             | 40,147.19<br>40,147.19<br>0.00<br>100.0 %      |
|  | 4869 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Comacaran, San Miguel                                   | P<br>E<br>D<br>% | 40,010.18<br>40,010.18<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 40,010.18<br>40,010.18<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %             | 40,010.18<br>40,010.18<br>0.00<br>100.0 %      |
|  | 4842 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Barrios, San Salvador                                   | P<br>E<br>D<br>% | 36,671.71<br>36,671.71<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 36,671.71<br>36,671.71<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 758.60<br>758.60<br>0.00<br>100.0 %       | 37,430.31<br>37,430.31<br>0.00<br>100.0 %      |
|  | 4841 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador                           | P<br>E<br>D<br>% | 33,700.00<br>37,070.73<br>-3,370.73<br>110.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 33,700.00<br>37,070.73<br>-3,370.73<br>110.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 133.00<br>133.00<br>0.00<br>100.0 %       | 33,833.00<br>37,203.73<br>-3,370.73<br>110.0 % |
|  | 4886 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Azacualpa, Chalatenango                              | P<br>E<br>D<br>% | 37,053.17<br>37,053.17<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 37,053.17<br>37,053.17<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %             | 37,053.17<br>37,053.17<br>0.00<br>100.0 %      |
|  | 5124 | REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD SAN LUIS TALPA, LA PAZ | P<br>E<br>D<br>% | 36,514.39<br>36,514.39<br>0.00<br>0.0 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 36,514.39<br>36,514.39<br>0.00<br>0.0 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 36,514.39<br>36,514.39<br>0.00<br>100.0 % | 36,514.39<br>36,514.39<br>0.00<br>100.0 %      |
|  | 4875 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Primavera, El Tránsito, San Miguel                      | P<br>E<br>D<br>% | 34,507.02<br>34,507.02<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 34,507.02<br>34,507.02<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %             | 34,507.02<br>34,507.02<br>0.00<br>100.0 %      |
|  | 4840 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador                             | P<br>E<br>D<br>% | 29,639.95<br>31,379.90<br>-1,739.95<br>105.9 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 29,639.95<br>31,379.90<br>-1,739.95<br>105.9 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %             | 29,639.95<br>31,379.90<br>-1,739.95<br>105.9 % |



|      |                                                                                                                                                    |                  |                                           |                               |                               |                                           |                               |                               |                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|      | Ampliación, Equipamiento,<br>Mejoras y/o Remodelación de<br>la Unidad de Salud El Palmar,<br>Santa Ana                                             | P<br>E<br>D<br>% | 28,879.11<br>28,879.11<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 28,879.11<br>28,879.11<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 28,879.11<br>28,879.11<br>0.00<br>100.0 % |
| 4845 | Ampliación, Equipamiento,<br>Mejoras y/o Remodelación de<br>la Unidad de Salud Popotlan,<br>Apopa, San Salvador                                    | P<br>E<br>D<br>% | 26,107.92<br>26,107.88<br>0.04<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 26,107.92<br>26,107.88<br>0.04<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 27,889.27<br>27,889.23<br>0.04<br>100.0 % |
| 4883 | Ampliación , Equipamiento,<br>Mejoras y/o Remodelación de<br>la Unidad de Salud La Palma,<br>Chalatenango                                          | P<br>E<br>D<br>% | 26,643.39<br>26,643.39<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 26,643.39<br>26,643.39<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 26,643.39<br>26,643.39<br>0.00<br>100.0 % |
| 4857 | Ampliación, Equipamiento,<br>Mejoras y/o Remodelación de<br>la Unidad de Salud de<br>Amatepec, Soyapango, San<br>Salvador                          | P<br>E<br>D<br>% | 20,131.17<br>20,131.17<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 20,131.17<br>20,131.17<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 20,722.17<br>20,722.17<br>0.00<br>100.0 % |
| 4846 | Ampliación, Equipamiento,<br>Mejoras y/o Remodelación de<br>la Unidad de Salud Villa<br>Mariona, Cuscatancingo, San<br>Salvador                    | P<br>E<br>D<br>% | 19,599.29<br>19,599.29<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 19,599.29<br>19,599.29<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 19,599.29<br>19,599.29<br>0.00<br>100.0 % |
| 4854 | Ampliación, Equipamiento,<br>Mejoras y/o Remodelación de<br>la Unidad de Salud de<br>Guazapa, San Salvador                                         | P<br>E<br>D<br>% | 18,167.50<br>18,167.50<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 18,167.50<br>18,167.50<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 19,012.15<br>19,012.15<br>0.00<br>100.0 % |
| 4851 | Ampliación,<br>Equipamiento, Mejoras y/o<br>Remodelación de la Unidad de<br>Salud de Tonacatepeque, San<br>Salvador                                | P<br>E<br>D<br>% | 18,056.69<br>18,056.69<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 18,056.69<br>18,056.69<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 18,608.69<br>18,608.69<br>0.00<br>100.0 % |
| 4922 | Construcción, Ampliación,<br>Equipamiento, Mejoras y/o<br>Remodelación a la Unidad de<br>Salud de San Jose Guayabal,<br>Cuscatlán                  | P<br>E<br>D<br>% | 17,894.20<br>17,894.20<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 17,894.20<br>17,894.20<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 17,894.20<br>17,894.20<br>0.00<br>100.0 % |
| 4849 | Ampliación, Equipamiento,<br>Mejoras y/o Remodelación de<br>la Unidad de Salud San<br>Marcos, San Salvador                                         | P<br>E<br>D<br>% | 12,986.97<br>12,986.97<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 12,986.97<br>12,986.97<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 13,760.07<br>13,760.07<br>0.00<br>100.0 % |
| 5129 | CONSTRUCCIÓN Y<br>EQUIPAMIENTO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA<br>DAÑADA POR LA TORMENTA<br>TROPICAL IDA DE LA<br>UNIDAD DE SALUD<br>VERAPAZ, SAN VICENTE | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 11,562.35<br>11,562.35<br>0.00<br>100.0 % |
| 5334 | EQUIPAMIENTO DE LA<br>UNIDAD DE SALUD DE LA<br>CANOA POR LA TORMENTA<br>TROPICAL IDA, USULUTÁN                                                     | P<br>E<br>D<br>% | 9,256.25<br>9,256.25<br>0.00<br>0.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 9,256.25<br>9,256.25<br>0.00<br>100.0 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 9,256.25<br>9,256.25<br>0.00<br>100.0 %   |
| 4853 | Construcción y Equipamiento<br>de La Unidad de Salud de San<br>Martín, San Salvador                                                                | P<br>E<br>D<br>% | 9,156.30<br>9,156.30<br>0.00<br>0.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 9,156.30<br>9,156.30<br>0.00<br>100.0 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 9,156.30<br>9,156.30<br>0.00<br>100.0 %   |
|      | EQUIPAMIENTO DE LA                                                                                                                                 |                  |                                           |                               |                               |                                           |                               |                               |                                           |

|      |                                                                                                                                          |   |          |          |      |      |      |      |      |          |          |          |      |      |      |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|---------|
| 5333 | UNIDAD DE SALUD DE SISIGUAYO POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN                                                                      | P | 6,802.10 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,802.10 | 6,802.10 | 6,802.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 % |
| 5335 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NUEVO AMANECER POR LA TORMENTA TROPICA IDA, USULUTÁN.                                              | P | 6,588.25 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,588.25 | 6,588.25 | 6,588.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 % |
| 5332 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NUEVA GRANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN                                               | P | 5,650.75 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,650.75 | 5,650.75 | 5,650.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 % |
| 5112 | REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD APOPA, SAN SALVADOR            | P | 5,352.20 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,352.20 | 5,352.20 | 5,352.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 % |
| 4848 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador                                         | P | 3,382.39 | 2,830.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00   | 552.00   | 3,382.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 % |
| 4856 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador                         | P | 2,961.35 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,961.35 | 2,961.35 | 2,961.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 % |
| 5119 | REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD SANTO TOMÁS, SAN SALVADOR      | P | 2,419.95 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,419.95 | 2,419.95 | 2,419.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 % |
| 5103 | REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA CASA DE SALUD BARRANCONES, PASAQUINA, LA UNIÓN | P | 2,415.64 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,415.64 | 2,415.64 | 2,415.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 % |
| 5331 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CORRAL DE MULAS POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN                                             | P | 2,088.85 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.85 | 2,088.85 | 2,088.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 % |
| 4894 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana                                                               | P | 689.30   | 689.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 689.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 % |
| 4850 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador                                      | P | 629.14   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.14   | 629.14   | 629.14   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 % |
|      | Ampliación, Equipamiento,                                                                                                                | P |          | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00   | 591.00   |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00  |

|      |                                                                                                                                                            |         |               |                                                      |                               |                               |                                                          |                                                          |                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4839 | Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes, San Salvador                                                                                       | E D %   | 591.00        | 0.00<br>0.00<br>0.0 %                                | 0.00<br>0.00<br>0.0 %         | 0.00<br>0.00<br>0.0 %         | 591.00<br>0.00<br>100.0 %                                | 591.00<br>0.00<br>100.0 %                                | 591.00<br>0.00<br>100.0 %                                |
| 5108 | REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD CONCEPCIÓN, SAN SALVADOR                         | P E D % | 539.10        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 539.10<br>539.10<br>0.00<br>100.0 %                      | 539.10<br>539.10<br>0.00<br>100.0 %                      | 539.10<br>539.10<br>0.00<br>100.0 %                      |
| 4852 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador                                      | P E D % | 525.90        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 525.90<br>525.90<br>0.00<br>100.0 %                      | 525.90<br>525.90<br>0.00<br>100.0 %                      | 525.90<br>525.90<br>0.00<br>100.0 %                      |
| 4858 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucia, Ilopango, San Salvador                                            | P E D % | 514.40        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 514.40<br>514.40<br>0.00<br>100.0 %                      | 514.40<br>514.40<br>0.00<br>100.0 %                      | 514.40<br>514.40<br>0.00<br>100.0 %                      |
| 4924 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán                                                                         | P E D % | 310.75        | 310.75<br>310.75<br>0.00<br>100.0 %                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 310.75<br>310.75<br>0.00<br>100.0 %                      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                            | 310.75<br>310.75<br>0.00<br>100.0 %                      |
| 5109 | REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD PANCHIMALCO, SAN SALVADOR                        | P E D % | 305.00        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 305.00<br>305.00<br>0.00<br>100.0 %                      | 305.00<br>305.00<br>0.00<br>100.0 %                      | 305.00<br>305.00<br>0.00<br>100.0 %                      |
| 5135 | REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA CASA DE SALUD DE JOYA GRANDE, SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR | P E D % | 162.50        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 162.50<br>162.50<br>0.00<br>100.0 %                      | 162.50<br>162.50<br>0.00<br>100.0 %                      | 162.50<br>162.50<br>0.00<br>100.0 %                      |
| MOP  |                                                                                                                                                            |         |               |                                                      |                               |                               |                                                          |                                                          |                                                          |
|      |                                                                                                                                                            |         | 38,902,634.50 | 7,166,142.85<br>6,640,966.44<br>525,176.41<br>92.7 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 31,621,736.40<br>27,549,413.11<br>4,072,323.29<br>87.1 % | 31,621,736.40<br>27,549,413.11<br>4,072,323.29<br>87.1 % | 38,787,879.25<br>34,190,379.55<br>4,597,499.70<br>88.1 % |
| 3737 | APERTURA BOULEVARD DIEGO DE HOLGUIN-SANTA TECLA TRAMO II                                                                                                   | P E D % | 22,270,153.56 | 2,236,979.95<br>2,204,287.03<br>32,692.92<br>98.5 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 19,918,418.36<br>16,623,193.77<br>3,295,224.59<br>83.5 % | 19,918,418.36<br>16,623,193.77<br>3,295,224.59<br>83.5 % | 22,155,398.31<br>18,827,480.80<br>3,327,917.51<br>85.0 % |
| 3091 | CONSTRUCCION BY PASS EN LA CIUDAD DE USULUTAN                                                                                                              | P E D % | 4,482,492.73  | 515,685.00<br>461,581.10<br>54,103.90<br>89.5 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 3,966,807.73<br>3,550,623.70<br>416,184.03<br>89.5 %     | 3,966,807.73<br>3,550,623.70<br>416,184.03<br>89.5 %     | 4,482,492.73<br>4,012,204.80<br>470,287.93<br>89.5 %     |
|      | RECONSTRUCCION DE PUENTE ATEOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN CAUCE                                                                              |         |               |                                                      |                               |                               |                                                          |                                                          |                                                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |   |                                                  |                              |                              |                              |                              |                              |                                                      |        |                                                      |                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 5652 | DEL RIO TALNIQUE, RUTA CA-08W MUNICIPIO DE SACACOCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                                                                                                                                                    | D           | 2,949,273.66 | % | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 0.01                                                 | 100.00 | 0.01                                                 | 100.00                                               |
| 5008 | REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PUENTES TULE (KM 45.48) Y COLIMA (KM 47.45), CARRETERA TRONCAL DEL NORTE (CA-4N), MUNICIPIO DE EL PAISNAL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR                                                               | P<br>E<br>D | 1,768,676.84 | % | 203,476.09<br>150,598.22<br>52,877.87<br>74.0 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 1,565,200.75<br>1,233,597.46<br>331,603.29<br>78.8 % | 100.00 | 1,565,200.75<br>1,233,597.46<br>331,603.29<br>78.8 % | 1,768,676.84<br>1,384,195.68<br>384,481.16<br>78.3 % |
| 5654 | CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE EL RÍO COLON Y REHABILITACION DE CALLE QUE CONDUCE DESDE LA INTERSEC. DE LA CARRETERA CA08W (KM. 29½) HACIA HDA. LAS SEISCIENTAS, CTÓN ENTRE RÍOS, MUNICIPIO DE COLON, DEPTO. DE LA LIBERTAD | P<br>E<br>D | 1,235,037.51 | % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 1,235,037.51<br>1,235,037.51<br>0.00<br>100.0 %      | 100.00 | 1,235,037.51<br>1,235,037.51<br>0.00<br>100.0 %      | 1,235,037.51<br>1,235,037.51<br>0.00<br>100.0 %      |
| 4563 | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MITIGACIÓN CÁRCAVAS DE JARDINES DE SAN BARTOLO (1° PRINCIPAL Y 2° SECUNDARIAS) ILOPANGO, SAN SALVADOR.                                                                                                     | P<br>E<br>D | 914,870.01   | % | 377,612.85<br>361,169.92<br>16,442.93<br>95.6 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 537,257.16<br>513,370.98<br>23,886.18<br>95.6 %      | 100.00 | 537,257.16<br>513,370.98<br>23,886.18<br>95.6 %      | 914,870.01<br>874,540.90<br>40,329.11<br>95.6 %      |
| 4557 | OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUD EN COMUNIDAD EL TRIUNFO CONCEPCIÓN DE ATACO, AHUACHAPAN                                                                                                                                   | P<br>E<br>D | 720,672.70   | % | 720,672.70<br>0.00<br>0.00<br>100.0 %            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 100.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 720,672.70<br>720,672.70<br>0.00<br>100.0 %          |
| 5411 | Mejoramiento Camino Vecinal, Tramo: La Laguna-Canton Cuevitas ET- CHA13N (Dulce Nombre de María-San Fernando) Departamento de Chalatenango.                                                                                         | P<br>E<br>D | 589,156.29   | % | 589,156.29<br>412,408.50<br>176,747.79<br>70.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 100.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 589,156.29<br>412,408.50<br>176,747.79<br>70.0 %     |
| 4558 | MUROS DE CONTENCIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD EL TRIUNFO SAN JULIAN, SONSONATE                                                                                                                                           | P<br>E<br>D | 580,000.00   | % | 580,000.00<br>580,000.00<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 100.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 580,000.00<br>580,000.00<br>0.00<br>100.0 %          |
| 5378 | Construcción de Bóveda y Muro de Contención del Parque Central de Soyapango, San Salvador.                                                                                                                                          | P<br>E<br>D | 545,572.29   | % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 545,572.29<br>541,458.43<br>4,113.86<br>99.2 %       | 100.00 | 545,572.29<br>541,458.43<br>4,113.86<br>99.2 %       | 545,572.29<br>541,458.43<br>4,113.86<br>99.2 %       |
| 5400 | OBRAS DE MITIGACION EN ZONA DE CÁRCAVA DE URBANIZACION LAS VICTORIAS, SOYAPANGO, SAN SALVADOR                                                                                                                                       | P<br>E<br>D | 476,327.32   | % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 476,327.32<br>476,327.32<br>0.00<br>100.0 %          | 100.00 | 476,327.32<br>476,327.32<br>0.00<br>100.0 %          | 476,327.32<br>476,327.32<br>0.00<br>100.0 %          |
|      | Mejoramiento de Caminos Rurales en los Municipios de Santa Elena, Jucuaran,                                                                                                                                                         | P<br>E      | 457,249.90   | % | 457,249.90<br>457,249.90                         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                                         | 100.00 | 0.00<br>0.00                                         | 457,249.90<br>457,249.90                             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |            |  |            |         |      |       |      |       |            |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|--|------------|---------|------|-------|------|-------|------------|---------|
| 5404 | Concepción Batres y San Buenaventura, Departamento de Usulután.                                                                                                                                                                                    | D | % | 457,249.90 |  | 0.00       | 100.0 % | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 0.00       | 100.0 % |
| 4535 | Rehabilitación de la Carretera CHA07E-CHA09S, Tramo del Et. CHA08E-Arcatao, Chalatenango                                                                                                                                                           | P | % | 435,235.22 |  | 435,235.22 | 100.0 % | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 435,235.22 | 100.0 % |
| 5410 | Mejoramiento de Calles entre la 11 Calle Oriente y Calle a San Jorge, Municipio de San Rafael, Departamento de San Miguel                                                                                                                          | P | % | 242,329.15 |  | 242,329.15 | 100.0 % | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 242,329.15 | 100.0 % |
| 5409 | Pavimentación de Calles en el Municipio y Departamento de Santa Ana.                                                                                                                                                                               | P | % | 230,505.83 |  | 230,505.83 | 100.0 % | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 230,505.83 | 100.0 % |
| 4562 | OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA COLONIA LLANO VERDE, (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO, SAN SALVADOR                                                                                                                                  | P | % | 222,679.81 |  | 222,679.81 | 100.0 % | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 222,679.81 | 100.0 % |
| 5412 | Mejoramiento del camión que conduce al Caserio Los Pérez del Ctn. Texipulco, Camino Vecinal Caserio Los Martínez del mismo Ctn, y al Camino Vecinal La Joya del Ctn. La Concepción, todos Jurisdicción de San Pedro Puxtla del Dpto. de Ahuachapán | P | % | 150,000.00 |  | 150,000.00 | 100.0 % | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 150,000.00 | 100.0 % |
| 5337 | Construcción de Obras para Mitigación en Quebrada Arenal Tutunichapa, Colonia Santa Eugenia, Barrio La Esperanza, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador                                                                          | P | % | 140,000.00 |  | 140,000.00 | 100.0 % | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 140,000.00 | 100.0 % |
| 5330 | Construcción de Obras de Mitigación en Urbanización La Campaña 2000, Municipio de Cuscatancingo, San Salvador                                                                                                                                      | P | % | 131,164.60 |  | 131,164.60 | 100.0 % | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 131,164.60 | 100.0 % |
| 5320 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN AGUAS ABAJO DEL PUENTE No. 2, ARENAL SECO, NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR                                                                                              | P | % | 96,540.50  |  | 96,540.50  | 100.0 % | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 96,540.50  | 100.0 % |
| 5413 | Mejoramiento Calles en la Colonia San Joaquín, Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador.                                                                                                                                              | P | % | 69,650.45  |  | 69,650.45  | 100.0 % | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 69,650.45  | 100.0 % |
| 5345 | Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Reparto El Carmen, Soyapango, San Salvador                                                                                                                                                          | P | % | 59,357.76  |  | 59,357.76  | 100.0 % | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 59,357.76  | 100.0 % |
|      | Reparación de Calles en el                                                                                                                                                                                                                         | P | % | 27,201.65  |  | 27,201.65  | 100.0 % | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 27,201.65  | 100.0 % |

|       |                                                                                                                                                                           |               |               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                                         |                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5407  | Municipio de Mejicanos,<br>Departamento de San Salvador                                                                                                                   | 27,201.65     | D %           | 0.00<br>0.0 %         | 0.00<br>0.0 %         | 0.00<br>0.0 %         | 0.00<br>0.0 %         | 0.00<br>0.0 %         | 0.00<br>0.0 %         | 0.00<br>100.0 %                                         | 0.00<br>100.0 %                                            |
| 5004  | CONSTRUCCIÓN PUENTE<br>SAN ISIDRO SOBRE RIO<br>LEMPA (KM. 75.5 LIB31N) LA<br>LIBERTAD - CHALATENANGO                                                                      | 26,427.59     | P<br>E<br>D % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 26,427.59<br>0.00<br>26,427.59<br>0.0 %                 | 26,427.59<br>0.00<br>26,427.59<br>0.0 %                    |
| 4630  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS<br>DE MURO DE RETENCIÓN<br>EN URBANIZACIÓN ALTOS<br>DEL BOULEVARD, SAN<br>SALVADOR                                                                  | 24,186.63     | P<br>E<br>D % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 24,186.63<br>0.00<br>24,186.63<br>0.00<br>100.0 %       | 24,186.63<br>0.00<br>24,186.63<br>0.00<br>100.0 %          |
| 5406  | Mejoramiento de calles en<br>Colonia Concepción, en el<br>Municipio y Departamento de<br>San Vicente.                                                                     | 19,999.40     | P<br>E<br>D % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 19,999.40<br>0.00<br>19,999.40<br>0.00<br>100.0 %       | 19,999.40<br>0.00<br>19,999.40<br>0.00<br>100.0 %          |
| 3603  | MEJORAMIENTO DE CAMINO<br>RURAL SAM28N,<br>TRAMO:CHAPELTIQUE -<br>SESORI, SAN MIGUEL                                                                                      | 14,081.15     | P<br>E<br>D % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 14,081.15<br>0.00<br>14,081.15<br>0.00<br>100.0 %       | 14,081.15<br>0.00<br>14,081.15<br>0.00<br>100.0 %          |
| 4626  | CONSTRUCCIÓN DE MURO<br>DE RETENCIÓN EN LA<br>QUERREDA LA LECHUZA EN<br>ZONA DE CASA<br>PRESIDENCIAL                                                                      | 12,468.49     | P<br>E<br>D % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 12,468.49<br>0.00<br>12,468.49<br>0.00<br>100.0 %       | 12,468.49<br>0.00<br>12,468.49<br>0.00<br>100.0 %          |
| 5463  | MEJORAMIENTO CAMINO<br>TERCIARIO LIB31N, TRAMO:<br>SAN PABLO TACACHICO -<br>CANTON SAN ISIDRO,<br>MUNICIPIO DE SAN PABLO<br>TACACHICO,<br>DEPARTAMENTO DE LA<br>LIBERTAD. | 10,443.46     | P<br>E<br>D % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 10,443.46<br>0.00<br>10,443.46<br>0.00<br>100.0 %       | 10,443.46<br>0.00<br>10,443.46<br>0.00<br>100.0 %          |
| 3180  | FORTEALECIMIENTO<br>INSTITUCIONAL BCIE 1556                                                                                                                               | 880.00        | P<br>E<br>D % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 880.00<br>0.00<br>880.00<br>0.00<br>100.0 %             | 880.00<br>0.00<br>880.00<br>0.00<br>100.0 %                |
| MINED |                                                                                                                                                                           | 23,492,427.31 | P<br>E<br>D % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 9,329,205.59<br>10,650,236.93<br>-721,031.34<br>107.3 % | 19,288,058.79<br>20,316,718.21<br>-1,028,659.42<br>105.3 % |
| 5268  | PROGRAMA DE<br>FORTEALECIMIENTO DE LA<br>COHESIÓN SOCIAL EN EL<br>SECTOR EDUCATIVO DE EL<br>SALVADOR (PRO-EDUCA)                                                          | 6,541,154.57  | P<br>E<br>D % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 6,541,154.57<br>6,541,154.57<br>100.0 %                 | 6,541,154.57<br>6,541,154.57<br>100.0 %                    |
| 5096  | Programa Espacios Educativos<br>Agradables, Armónicos y<br>Seguros para el Sistema<br>Educativo en El Salvador                                                            | 6,154,267.47  | P<br>E<br>D % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 3,182,608.18<br>3,903,639.52<br>-721,031.34<br>122.7 %  | 3,596,347.25<br>4,411,112.64<br>-814,765.39<br>122.7 %     |
| 4708  | REHABILITACION INSTITUTO<br>NACIONAL CATOLICO<br>NUESTRA SEÑORA DE<br>GUADALUPE,<br>SENSUNTEPEQUE                                                                         | 658,176.44    | P<br>E<br>D % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 658,176.44<br>658,176.44<br>100.0 %                     | 658,176.44<br>658,176.44<br>100.0 %                        |
|       | MEJORAMIENTO INSTITUTO                                                                                                                                                    | 589,280.66    | P<br>E        | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00          | 589,280.66<br>589,280.66                                | 589,280.66<br>589,280.66                                   |

[illegible]

|      |                                                                                          |   |   |   |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|
| 4710 | MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE SAN JUAN TEPEZONTES, LA PAZ                           | E | D | % | 244,034.92 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,017.46 | 0.00       | 0.00       |
| 4943 | CENTRO ESCOLAR BARRIO LA FATIMA, LA UNION                                                | P | E | D | %          | 234,836.00 | 58,709.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,709.00  | 152,643.40 | -93,934.40 |
| 4711 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR ANASTASIO AQUINO, SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ | P | E | D | %          | 232,382.79 | 116,191.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,191.40 | 116,191.39 | 50.0 %     |
| 4941 | CENTRO ESCOLAR HACIENDA LA CANADA, CONCHAGUA, LA UNION                                   | P | E | D | %          | 232,292.43 | 232,292.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,292.43 | 232,292.43 | 100.0 %    |
| 4718 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL TABURETE, JIQUILISCO, USULUTAN    | P | E | D | %          | 230,675.00 | 57,668.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,668.75  | 149,938.74 | -92,269.99 |
| 4675 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR JORGE LARDE, JUAYUA, SONSONATE              | P | E | D | %          | 228,001.14 | 219,107.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,107.22 | 106,006.64 | 113,100.58 |
| 4667 | REPARACION Y MEJORAMIENTO ESC. EDUCACION ESPECIAL DE CHALCHUAPA, SANTA ANA               | P | E | D | %          | 221,925.75 | 221,925.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,925.75 | 221,925.75 | 100.0 %    |
| 4944 | CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CUEVONA, LISLIQUE, LA UNION                                    | P | E | D | %          | 212,485.33 | 212,485.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,485.33 | 212,485.33 | 100.0 %    |
| 4679 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA EDUCACION PARVULARIA LUCILA TRUJILLO, CHALATENANGO | P | E | D | %          | 203,724.26 | 203,724.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,724.26 | 203,724.26 | 100.0 %    |
| 5271 | Reconstrucción y Rehabilitación de Centros Escolares Afectados por la Tormenta IDA       | P | E | D | %          | 200,841.07 | 200,841.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,841.07 | 200,841.07 | 100.0 %    |
| 4685 | REHABILITACION CENTRO ESCOLAR WALTER SOUNDY, SANTA TECLA, LA LIBERTAD                    | P | E | D | %          | 199,040.00 | 199,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,040.00 | 199,040.00 | 100.0 %    |
| 4942 | CENTRO ESCOLAR CANTON LOS CONEJOS, EL CARMEN, LA UNION                                   | P | E | D | %          | 192,961.57 | 48,240.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,240.39  | 96,480.78  | -48,240.39 |
| 4716 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR BRISAS DEL SOL, BERLIN, USULUTAN                             | P | E | D | %          | 178,772.14 | 44,693.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,693.04  | 89,386.08  | -44,693.04 |
|      | REHABILITACION Y                                                                         | P |   |   |            |            | 43,461.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,461.90  |            |            |



|      |                                                                                                         |         |            |                                                  |                               |                               |                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4701 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN CARLOS, J/ DOLORES, D/ CABANAS                                   | E D %   | 173,847.58 | 52,154.27<br>-8,692.37<br>120.0 %                | 0.00<br>0.00<br>0.0 %         | 0.00<br>0.00<br>0.0 %         | 52,154.27<br>-8,692.37<br>120.0 %                |
| 4704 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR ISABEL LA CATOLICA, CANTON LOS LLANITOS, ILOBASCO, CABANAS | P E D % | 168,799.02 | 168,799.02<br>168,799.02<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 168,799.02<br>168,799.02<br>0.00<br>100.0 %      |
| 4726 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR PARAISO REAL, SAN MIGUEL                                   | P E D % | 162,162.74 | 162,432.99<br>162,162.74<br>-9,729.75<br>106.4 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 162,432.99<br>162,162.74<br>-9,729.75<br>106.4 % |
| 4723 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CHAPULTIQUE, SAN MIGUEL                             | P E D % | 158,087.61 | 39,521.90<br>130,422.27<br>-90,900.37<br>330.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 39,521.90<br>130,422.27<br>-90,900.37<br>330.0 % |
| 4727 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL "DE ULUAZAPA", SAN MIGUEL                              | P E D % | 153,144.09 | 153,144.09<br>153,144.09<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 153,144.09<br>153,144.09<br>0.00<br>100.0 %      |
| 4939 | INSTITUTO NACIONAL DE OSICALA, MORAZAN                                                                  | P E D % | 152,655.43 | 152,655.43<br>152,655.43<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 152,655.43<br>152,655.43<br>0.00<br>100.0 %      |
| 4665 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO, JUJUTLA, AHUACHAPAN                                     | P E D % | 142,340.87 | 142,340.87<br>142,340.87<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 142,340.87<br>142,340.87<br>0.00<br>100.0 %      |
| 4700 | MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CINQUERA, CABANAS                                                    | P E D % | 140,125.99 | 140,125.99<br>140,125.99<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 140,125.99<br>140,125.99<br>0.00<br>100.0 %      |
| 4662 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO NUEVO NANCE AMARILLO, CANTON RIO FRIO, AHUACHAPAN                   | P E D % | 133,645.70 | 133,645.70<br>133,645.70<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 133,645.70<br>133,645.70<br>0.00<br>100.0 %      |
| 4728 | CENTRO ESCOLAR COLONIA CARRILLO, CANTON EL PAPALÓN, SAN MIGUEL                                          | P E D % | 124,980.02 | 31,245.01<br>81,237.00<br>-49,991.99<br>260.0 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 31,245.01<br>81,237.00<br>-49,991.99<br>260.0 %  |
| 4676 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SISIMITEPEC, NAHUIZALCO, SONSONATE                         | P E D % | 117,534.81 | 117,534.81<br>117,534.81<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 117,534.81<br>117,534.81<br>0.00<br>100.0 %      |
| 4702 | CENTRO ESCOLAR CASERIO CONCEPCION, CANTON LA QUESERA, ILOBASCO, CABANAS                                 | P E D % | 112,826.44 | 28,206.61<br>56,413.22<br>-28,206.61<br>200.0 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 28,206.61<br>56,413.22<br>-28,206.61<br>200.0 %  |
| 4671 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCATIVO HACIENDA SAN CAYETANO, SANTA ANA                       | P E D % | 106,866.86 | 106,866.86<br>106,866.86<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 106,866.86<br>106,866.86<br>0.00<br>100.0 %      |
|      | REPARACION Y                                                                                            | P       |            | 105,867.25                                       | 0.00                          | 0.00                          | 105,867.25                                       |

|  |      |                                                                                          |         |                                                 |                               |                               |                                                 |                               |                               |                                                 |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | 4663 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL SALITRERO, ATQUIZAYA, AHUACHAPAN                   | E D %   | 105,867.25<br>0.00<br>100.0 %                   | 0.00<br>0.00<br>0.0 %         | 0.00<br>0.00<br>0.0 %         | 105,867.25<br>0.00<br>100.0 %                   | 0.00<br>0.00<br>0.0 %         | 0.00<br>0.00<br>0.0 %         | 105,867.25<br>0.00<br>100.0 %                   |
|  | 4666 | REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON GUASCOTA, SAN LORENZO AHUACHAPAN                    | P E D % | 58,034.90<br>68,586.70<br>-10,551.80<br>118.2 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 58,034.90<br>68,586.70<br>-10,551.80<br>118.2 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 58,034.90<br>68,586.70<br>-10,551.80<br>118.2 % |
|  | 4709 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR FABIO IGNACIO MAGANA, EL ROSARIO, LA PAZ    | P E D % | 93,976.50<br>99,975.00<br>-5,998.50<br>106.4 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 93,976.50<br>99,975.00<br>-5,998.50<br>106.4 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 93,976.50<br>99,975.00<br>-5,998.50<br>106.4 %  |
|  | 4683 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTO ESCOLAR DE QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD                | P E D % | 99,698.35<br>99,698.35<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 99,698.35<br>99,698.35<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 99,698.35<br>99,698.35<br>0.00<br>100.0 %       |
|  | 4690 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR | P E D % | 65,076.69<br>54,702.15<br>10,374.54<br>84.1 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 65,076.69<br>54,702.15<br>10,374.54<br>84.1 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 65,076.69<br>54,702.15<br>10,374.54<br>84.1 %   |
|  | 4673 | REPARACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON CERRO ALTO, CALUCO, SONSONATE            | P E D % | 86,511.83<br>81,321.13<br>5,190.70<br>94.0 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 86,511.83<br>81,321.13<br>5,190.70<br>94.0 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 86,511.83<br>81,321.13<br>5,190.70<br>94.0 %    |
|  | 4682 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR JICALAPA, LA LIBERTAD                       | P E D % | 78,718.08<br>78,718.08<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 78,718.08<br>78,718.08<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 78,718.08<br>78,718.08<br>0.00<br>100.0 %       |
|  | 4678 | REPARACION ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "DE CHALATENANGO", CHALATENANGO                 | P E D % | 73,897.96<br>73,897.96<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 73,897.96<br>73,897.96<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 73,897.96<br>73,897.96<br>0.00<br>100.0 %       |
|  | 4940 | INSTITUTO NACIONAL DE SAN SIMON, MORAZAN                                                 | P E D % | 17,251.25<br>20,701.50<br>-3,450.25<br>120.0 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 17,251.25<br>20,701.50<br>-3,450.25<br>120.0 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 17,251.25<br>20,701.50<br>-3,450.25<br>120.0 %  |
|  | 4714 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN VICENTE               | P E D % | 64,948.86<br>64,948.86<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 64,948.86<br>64,948.86<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 64,948.86<br>64,948.86<br>0.00<br>100.0 %       |
|  | 4722 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE USULUTAN                  | P E D % | 46,192.73<br>46,192.73<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 46,192.73<br>46,192.73<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 46,192.73<br>46,192.73<br>0.00<br>100.0 %       |
|  | 4669 | REHABILITACION ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE METAPAN, SANTA ANA                       | P E D % | 20,244.62<br>20,244.62<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 20,244.62<br>20,244.62<br>0.00<br>100.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 20,244.62<br>20,244.62<br>0.00<br>100.0 %       |
|  | 4687 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL BARRILLO, ZARAGOZA, LA LIBERTAD                    | P E D % | 18,621.84<br>17,504.53<br>1,117.31<br>94.0 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 18,621.84<br>17,504.53<br>1,117.31<br>94.0 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 18,621.84<br>17,504.53<br>1,117.31<br>94.0 %    |

[illegible]

|      |                                                                                                                                                             |             |            |                                                  |                                      |                                      |                                                  |                                                   |                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4794 | Mejoramiento Camino Rural UN122N, Tramo Nueva Esparta - Poirós, La Unión                                                                                    | P<br>E<br>D | 822,771.12 | 94,655.10<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 94,655.10<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00        | 728,116.02<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00        | 822,771.12<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00        |
| 4771 | Mejoramiento Camino Rural AHU24/SHU25S, Entre: Km. 151 Carretera El Litoral (CA02W) - Garita Palmera. Huachapán.                                            | P<br>E<br>D | 795,817.24 | 147,558.00<br>78,533.93<br>69,024.07<br>53.2 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 147,558.00<br>78,533.93<br>69,024.07<br>53.2 %   | 648,259.24<br>604,106.91<br>44,152.33<br>93.2 %   | 795,817.24<br>682,640.84<br>113,176.40<br>85.8 %  |
| 5521 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN LA ZONA DEL PUENTE SOBRE EL RIO EL DESAGUE, EST. 31+720 DE LA CARRETERA RN03E, CANDELARIA, CUSCATLAN                 | P<br>E<br>D | 447,660.75 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00             | 447,660.75<br>447,378.79<br>281.96<br>99.9 %      | 447,660.75<br>447,378.79<br>281.96<br>99.9 %      |
| 5621 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION EN EST. 0+500 DE LA RUTA SAN19W/SAN21E-MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA                                               | P<br>E<br>D | 447,566.56 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00             | 372,615.90<br>364,132.59<br>8,483.31<br>97.7 %    | 372,615.90<br>364,132.59<br>8,483.31<br>97.7 %    |
| 5403 | Reparación de calle SAL22S, Tramo Puerta del Diablo(SAL07W)- Mil Cumbres, Municipio de Panchimalco,Departamento de San Salvador                             | P<br>E<br>D | 388,419.36 | 388,419.36<br>290,060.58<br>98,358.78<br>74.7 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 388,419.36<br>290,060.58<br>98,358.78<br>74.7 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00              | 388,419.36<br>290,060.58<br>98,358.78<br>74.7 %   |
| 5408 | Mejoramiento Camino Rural PAZ37E/PAZ10S, Tramo: Cantón el Nilo- Cantón El Garrapatero-Cantón San Francisco Los Reyes(PAZ10S)-CA:02E, Departamento de la Paz | P<br>E<br>D | 380,449.59 | 380,449.59<br>158,305.85<br>222,143.74<br>41.6 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 380,449.59<br>158,305.85<br>222,143.74<br>41.6 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00              | 380,449.59<br>158,305.85<br>222,143.74<br>41.6 %  |
| 5622 | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION EN EJE 73-B (BOULEVARD VENEZUELA), EST. 1+400, SAN SALVADOR                                                         | P<br>E<br>D | 370,961.96 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00             | 312,286.25<br>370,961.94<br>-58,675.69<br>118.8 % | 312,286.25<br>370,961.94<br>-58,675.69<br>118.8 % |
| 5515 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA EN VÍAS PAVIMENTADAS DEL DEPARTAMENTO DE USulután                                        | P<br>E<br>D | 191,486.56 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00             | 191,486.56<br>191,486.56<br>0.00<br>100.0 %       | 191,486.56<br>191,486.56<br>0.00<br>100.0 %       |
| 5280 | REPARACION DE OBRA DE PASO EN EST. 1+060 DE RUTA RN02E, SOYAPANGO, SAN SALVADOR                                                                             | P<br>E<br>D | 116,621.47 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00             | 116,621.47<br>102,385.70<br>14,235.77<br>87.8 %   | 116,621.47<br>102,385.70<br>14,235.77<br>87.8 %   |
| 5379 | REPARACIÓN DE CARCAVAS EN KM 17+400 Y KM 18+400 DE LA RUTA RN05S, SANTO TOMAS, SAN SALVADOR                                                                 | P<br>E<br>D | 109,653.69 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00             | 109,653.69<br>109,653.67<br>0.02<br>100.0 %       | 109,653.69<br>109,653.67<br>0.02<br>100.0 %       |
| 4488 | Administración del Programa                                                                                                                                 | P<br>E      | 74,660.00  | 34,406.68<br>34,929.66                           | 0.00<br>0.00                         | 0.00<br>0.00                         | 34,406.68<br>34,929.66                           | 39,730.34<br>39,730.33                            | 74,137.02<br>74,659.99                            |

|      | (Unidad Ejecutora)                                                                                                         |               | D | % | -522.98<br>101.5 %                                | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | -522.98<br>101.5 %                                | 0.01<br>100.0 %                                         | 0.00<br>0.0 % | 0.01<br>100.0 %                                         | -522.97<br>100.7 %                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 5516 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA EN VÍAS NO PAVIMENTADAS DEL DEPARTAMENTO DE USulután    | 52,269.40     | P | E | 0.00<br>0.0 %                                     | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 %                                     | 52,269.40<br>45,989.56<br>6,279.84<br>88.0 %            | 0.00<br>0.0 % | 52,269.40<br>45,989.56<br>6,279.84<br>88.0 %            | 52,269.40<br>45,989.56<br>6,279.84<br>88.0 %            |
| 5508 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA EN LA RUTA CA02E, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y LA PAZ | 45,260.48     | P | E | 0.00<br>0.0 %                                     | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 %                                     | 45,260.48<br>45,260.48<br>0.00<br>100.0 %               | 0.00<br>0.0 % | 45,260.48<br>45,260.48<br>0.00<br>100.0 %               | 45,260.48<br>45,260.48<br>0.00<br>100.0 %               |
| 4795 | Mejoramiento Camino Rural UN102S, Tramo: El Jagüey - El Tamarindo, Departamento de La Unión                                | 24,406.30     | P | E | 2,807.79<br>2,757.76<br>50.03<br>98.2 %           | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 2,807.79<br>2,757.76<br>50.03<br>98.2 %           | 21,598.51<br>21,213.50<br>385.01<br>98.2 %              | 0.00<br>0.0 % | 21,598.51<br>21,213.50<br>385.01<br>98.2 %              | 24,406.30<br>23,971.26<br>435.04<br>98.2 %              |
| 5541 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL UN39S: CA02E - EMBARCADERO LOS CORRALES, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN                                | 19,513.39     | P | E | 2,244.91<br>2,194.85<br>50.06<br>97.8 %           | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 2,244.91<br>2,194.85<br>50.06<br>97.8 %           | 17,268.48<br>16,883.47<br>385.01<br>97.8 %              | 0.00<br>0.0 % | 17,268.48<br>16,883.47<br>385.01<br>97.8 %              | 19,513.39<br>19,078.32<br>435.07<br>97.8 %              |
| 5509 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN KM 124+000 DE LA CARRETERA CA08W, FRONTERA LAS CHINAMAS                             | 19,015.36     | P | E | 0.00<br>0.0 %                                     | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 %                                     | 19,015.36<br>19,015.36<br>0.00<br>100.0 %               | 0.00<br>0.0 % | 19,015.36<br>19,015.36<br>0.00<br>100.0 %               | 19,015.36<br>19,015.36<br>0.00<br>100.0 %               |
| 5282 | REPARACION DE CARCAVA EN KM. 37+450 DE RUTA RN05S, SAN LUIS TALPA, LA PAZ                                                  | 8,283.79      | P | E | 0.00<br>0.0 %                                     | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 %                                     | 8,283.79<br>5,739.89<br>2,543.90<br>69.3 %              | 0.00<br>0.0 % | 8,283.79<br>5,739.89<br>2,543.90<br>69.3 %              | 8,283.79<br>5,739.89<br>2,543.90<br>69.3 %              |
| 4788 | Mejoramiento del Camino Rural USU27E, entre Cantón La Canoa (Et. USU08S) - Corral de Mulas, Usulután                       | 7,138.03      | P | E | 821.22<br>821.22<br>0.00<br>100.0 %               | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 821.22<br>821.22<br>0.00<br>100.0 %               | 6,316.81<br>6,316.81<br>0.00<br>100.0 %                 | 0.00<br>0.0 % | 6,316.81<br>6,316.81<br>0.00<br>100.0 %                 | 7,138.03<br>7,138.03<br>0.00<br>100.0 %                 |
| 5281 | REPARACION DE OBRA DE PASO EN EJE 81 (ZOOLOGICO NACIONAL), SAN SALVADOR                                                    | 3,989.37      | P | E | 0.00<br>0.0 %                                     | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 %                                     | 3,989.37<br>1,988.11<br>1,991.26<br>50.1 %              | 0.00<br>0.0 % | 3,989.37<br>1,988.11<br>1,991.26<br>50.1 %              | 3,989.37<br>1,988.11<br>1,991.26<br>50.1 %              |
| ANDA |                                                                                                                            | 11,268,121.61 | P | E | 1,168,410.25<br>1,168,236.17<br>174.08<br>100.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 1,168,410.25<br>1,168,236.17<br>174.08<br>100.0 % | 10,099,711.36<br>8,875,369.33<br>3,224,342.03<br>88.1 % | 0.00<br>0.0 % | 10,099,711.36<br>8,875,369.33<br>3,224,342.03<br>88.1 % | 11,268,121.61<br>8,043,605.50<br>3,224,516.11<br>71.4 % |
| 5134 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.            | 10,099,711.36 | P | E | 0.00<br>0.0 %                                     | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 %                                     | 10,099,711.36<br>6,875,369.33<br>3,224,342.03<br>68.1 % | 0.00<br>0.0 % | 10,099,711.36<br>6,875,369.33<br>3,224,342.03<br>68.1 % | 10,099,711.36<br>6,875,369.33<br>3,224,342.03<br>68.1 % |
| 5499 | INTRODUCCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A CANTÓN LOS MORANES, NEJAPA, SAN SALVADOR.                                       | 807,024.08    | P | E | 0.00<br>0.0 %                                     | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.0 %                                     | 807,024.08<br>807,024.08<br>0.00<br>100.0 %             | 0.00<br>0.0 % | 807,024.08<br>807,024.08<br>0.00<br>100.0 %             | 807,024.08<br>807,024.08<br>0.00<br>100.0 %             |

[illegible]

|     |      |                                                                                                                                                                                      |                  |                                                      |                               |                               |                               |                                                      |                                                |                               |                                                |                                                      |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |      | VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL                                                                                                                                                        | D %              | 8,097.75<br>94.6 %                                   | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 8,097.75<br>94.6 %                                   | 22,385.98<br>98.1 %                            | 0.00<br>0.0 %                 | 22,385.98<br>98.1 %                            | 30,483.73<br>97.7 %                                  |
|     | 5229 | PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE RIESGO                                                                                                                                             | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 710,880.37<br>100.0 %                          | 0.00<br>0.0 %                 | 710,880.37<br>100.0 %                          | 710,880.37<br>100.0 %                                |
|     | 2881 | PROGRAMA DE DESCONTAMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS                                                                                                                                       | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 255,835.43<br>100.0 %                          | 0.00<br>0.0 %                 | 255,835.43<br>100.0 %                          | 255,835.43<br>100.0 %                                |
| MAG |      |                                                                                                                                                                                      | P<br>E<br>D<br>% | 1,763,457.12<br>1,411,740.54<br>351,716.58<br>80.1 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 1,763,457.12<br>1,411,740.54<br>351,716.58<br>80.1 % | 491,428.18<br>488,765.50<br>2,662.68<br>99.5 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 491,428.18<br>488,765.50<br>2,662.68<br>99.5 % | 2,254,885.30<br>1,900,506.04<br>354,379.26<br>84.3 % |
|     | 4648 | Construcción de Obras de Mitigación en Cordillera El Bálsamo, al Sur de Santa Tecla, 2da. Etapa                                                                                      | P<br>E<br>D<br>% | 804,112.48<br>635,033.09<br>169,079.39<br>79.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 804,112.48<br>635,033.09<br>169,079.39<br>79.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                  | 804,112.48<br>635,033.09<br>169,079.39<br>79.0 %     |
|     | 4646 | Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de Control de Inundaciones                                                    | P<br>E<br>D<br>% | 333,609.66<br>188,198.66<br>145,411.00<br>56.4 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 333,609.66<br>188,198.66<br>145,411.00<br>56.4 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                  | 333,609.66<br>188,198.66<br>145,411.00<br>56.4 %     |
|     | 3752 | Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO)                                                                                                       | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 308,923.03<br>100.0 %                          | 0.00<br>0.0 %                 | 308,923.03<br>100.0 %                          | 308,923.03<br>100.0 %                                |
|     | 4650 | Construcción de Obras de Control de Inundaciones Ríos Thiupapa - Huiza, Depto. de La Libertad                                                                                        | P<br>E<br>D<br>% | 218,078.73<br>218,078.73<br>0.00<br>100.0 %          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 218,078.73<br>218,078.73<br>0.00<br>100.0 %          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                  | 218,078.73<br>218,078.73<br>0.00<br>100.0 %          |
|     | 4643 | Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador                                                                     | P<br>E<br>D<br>% | 190,859.00<br>189,245.36<br>1,613.64<br>99.2 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 190,859.00<br>189,245.36<br>1,613.64<br>99.2 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                  | 190,859.00<br>189,245.36<br>1,613.64<br>99.2 %       |
|     | 4651 | Construcción de Muro de Retención en Quebrada La Oscurana, Municipio de Berlín                                                                                                       | P<br>E<br>D<br>% | 167,587.87<br>131,975.32<br>35,612.55<br>78.7 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 167,587.87<br>131,975.32<br>35,612.55<br>78.7 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                  | 167,587.87<br>131,975.32<br>35,612.55<br>78.7 %      |
|     | 5300 | REACTIVACION DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION ACUICOLA Y ENTREGA DE POST-LARVAS DE CAMARON MARINO, A COOPERATIVAS CAMARONERAS DEL BAJO LEMPA AFECTADAS POR LA DEPRESION TROPICAL IDA | P<br>E<br>D<br>% | 147,965.95<br>147,965.95<br>0.00<br>0.0 %            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 147,965.95<br>147,965.95<br>0.00<br>0.0 %            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                  | 147,965.95<br>147,965.95<br>0.00<br>0.0 %            |
|     | 4647 | Obras de Control de Inundaciones en los Ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Goascorán (II Fase)                                                                           | P<br>E<br>D<br>% | 44,406.70<br>44,406.70<br>0.00<br>100.0 %            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 44,406.70<br>44,406.70<br>0.00<br>100.0 %            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                  | 44,406.70<br>44,406.70<br>0.00<br>100.0 %            |
|     |      | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN COOPERATIVAS                                                                                                                              | P<br>E           | 0.00<br>0.00                                         | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                                         | 34,256.52<br>34,126.52                         | 0.00<br>0.00                  | 34,256.52<br>34,126.52                         | 34,256.52<br>34,126.52                               |

|                |      | DE LA ZONA SUR DEL<br>DEPARTAMENTO DE SAN<br>VICENTE                                                                                                                         | 34,256.52    | D<br>%           | 0.00<br>0.0 %                               | 0.00<br>0.0 %                                   | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 130.00<br>99.6 %                                     | 0.00<br>0.0 %                 | 130.00<br>99.6 %                                     | 130.00<br>99.6 %                                     |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                | 5297 |                                                                                                                                                                              |              |                  |                                             |                                                 |                               |                               |                                                      |                               |                                                      |                                                      |
|                | 4649 | Reparación de Cárcava en<br>Asentamiento Bello Horizonte,<br>Comasagua, La Libertad                                                                                          | 4,681.61     | P<br>E<br>D<br>% | 4,681.61<br>0.00<br>0.00<br>100.0 %         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 4,681.61<br>4,681.61<br>0.00<br>100.0 %              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 4,681.61<br>4,681.61<br>0.00<br>100.0 %              | 4,681.61<br>4,681.61<br>0.00<br>100.0 %              |
|                | 5284 | REHABILITACION DE LA<br>INFRAESTRUCTURA DE LAS<br>OBRAS DE CONTROL DE<br>INUNDACIONES EN LOS<br>RIOS LEMPA, GRANDE DE<br>SAN MIGUEL, PAZ Y JIBOA                             | 282.68       | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 282.68<br>0.00<br>282.68<br>0.0 %                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 282.68<br>0.00<br>282.68<br>0.0 %                    | 282.68<br>0.00<br>282.68<br>0.0 %                    |
|                | 4644 | Fortalecimiento del Sector<br>Pecuano y Avícola en El<br>Salvador                                                                                                            | 121.07       | P<br>E<br>D<br>% | 121.07<br>121.07<br>0.00<br>100.0 %         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 121.07<br>121.07<br>0.00<br>100.0 %                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 121.07<br>121.07<br>0.00<br>100.0 %                  | 121.07<br>121.07<br>0.00<br>100.0 %                  |
| CEPA           |      |                                                                                                                                                                              | 1,591,043.23 | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %               | 177,004.07<br>126,208.72<br>50,795.35<br>71.3 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 1,414,039.16<br>1,226,835.71<br>187,203.45<br>86.8 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 1,591,043.23<br>1,353,044.43<br>237,998.80<br>85.0 % | 1,591,043.23<br>1,353,044.43<br>237,998.80<br>85.0 % |
|                | 4803 | Obras de Mitigación en el<br>Aeropuerto Internacional<br>Ilopango, FASE I.                                                                                                   | 1,414,039.16 | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 1,414,039.16<br>1,226,835.71<br>187,203.45<br>86.8 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 1,414,039.16<br>1,226,835.71<br>187,203.45<br>86.8 % | 1,414,039.16<br>1,226,835.71<br>187,203.45<br>86.8 % |
|                | 5610 | CONSTRUCCIÓN DE<br>GRADAS E INSTALACIÓN DE<br>ASCENSOR EN EL EDIFICIO<br>TERMINAL DE PASAJEROS<br>DEL AEROPUERTO<br>INTERNACIONAL EL<br>SALVADOR                             | 177,004.07   | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %               | 177,004.07<br>126,208.72<br>50,795.35<br>71.3 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 177,004.07<br>126,208.72<br>50,795.35<br>71.3 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 177,004.07<br>126,208.72<br>50,795.35<br>71.3 %      | 177,004.07<br>126,208.72<br>50,795.35<br>71.3 %      |
| CNR            |      |                                                                                                                                                                              | 1,307,281.08 | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %               | 151,226.21<br>150,523.50<br>702.71<br>99.5 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 1,156,054.87<br>1,150,849.45<br>5,405.42<br>99.5 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 1,307,281.08<br>1,301,172.95<br>6,108.13<br>99.5 %   | 1,307,281.08<br>1,301,172.95<br>6,108.13<br>99.5 %   |
|                | 3541 | PLAN NACIONAL DE<br>MODERNIZACIÓN DEL<br>REGISTRO INMOBILIARIO Y<br>DEL CATASTRO FASE II                                                                                     | 1,307,281.08 | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %               | 151,226.21<br>150,523.50<br>702.71<br>99.5 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 1,156,054.87<br>1,150,849.45<br>5,405.42<br>99.5 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 1,307,281.08<br>1,301,172.95<br>6,108.13<br>99.5 %   | 1,307,281.08<br>1,301,172.95<br>6,108.13<br>99.5 %   |
| DGCP -<br>MJSP |      |                                                                                                                                                                              | 459,736.48   | P<br>E<br>D<br>% | 459,736.48<br>459,736.48<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 459,736.48<br>459,736.48<br>0.00<br>100.0 %          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 459,736.48<br>459,736.48<br>0.00<br>100.0 %          | 459,736.48<br>459,736.48<br>0.00<br>100.0 %          |
|                | 5520 | Obras de Reforzamiento de<br>Seguridad Pasiva y Control del<br>Centro Penal de Zacatecoluca                                                                                  | 187,782.01   | P<br>E<br>D<br>% | 187,782.01<br>187,782.01<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 187,782.01<br>187,782.01<br>0.00<br>100.0 %          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 187,782.01<br>187,782.01<br>0.00<br>100.0 %          | 187,782.01<br>187,782.01<br>0.00<br>100.0 %          |
|                | 5582 | Construcción y readecuación<br>de instalaciones del Centro de<br>Formación de la Escuela<br>Penitenciaria en la<br>Penitenciaría Central La<br>Esperanza, Dpto. San Salvador | 113,552.81   | P<br>E<br>D<br>% | 113,552.81<br>113,552.81<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 113,552.81<br>113,552.81<br>0.00<br>100.0 %          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 113,552.81<br>113,552.81<br>0.00<br>100.0 %          | 113,552.81<br>113,552.81<br>0.00<br>100.0 %          |
|                |      | Readecuación del Área de<br>Visitas de los Centros                                                                                                                           | 84,530.26    | P                | 84,530.26                                   | 0.00                                            | 0.00                          | 0.00                          | 84,530.26                                            | 0.00                          | 84,530.26                                            | 84,530.26                                            |



|           |      |                                                                                                                                                                                                       |            |   |            |      |      |      |      |            |      |            |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|------|------|------|------|------------|------|------------|
|           | 5518 | Penitenciaros de<br>Quezaltepeque y Ciudad<br>Barrios                                                                                                                                                 | 84,530.26  | E | 84,530.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,530.26  | 0.00 | 84,530.26  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                       | D          | % | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 100.0 %    |
|           | 5519 | Reparación e<br>impermeabilización de techos<br>en el Centro Penitenciario de<br>Zacatecoluca                                                                                                         | 73,871.40  | P | 73,871.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,871.40  | 0.00 | 73,871.40  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                       | E          | % | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 100.0 %    |
|           |      |                                                                                                                                                                                                       | D          | % | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 100.0 %    |
| MIGOB     |      |                                                                                                                                                                                                       | 413,306.59 | P | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413,306.59 | 0.00 | 413,306.59 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                       | E          | % | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 100.0 %    |
|           | 5277 | Mejoramiento de Infraestructura<br>de 9 Gobernaciones<br>Departamentales a nivel<br>nacional                                                                                                          | 327,520.20 | P | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,520.20 | 0.00 | 327,520.20 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                       | E          | % | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 100.0 %    |
|           | 5275 | Adquisición de equipo par las<br>Gobernaciones<br>Departamentales, Dirección de<br>Protección Civil, Prevención y<br>Mitigación de Desastres y<br>Cuerpo de Bomberos del<br>Ministerio de Gobernación | 85,786.39  | P | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,786.39  | 0.00 | 85,786.39  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                       | E          | % | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 100.0 %    |
| SE - MJSP |      |                                                                                                                                                                                                       | 350,941.96 | P | 40,373.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,568.10 | 0.00 | 350,941.96 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                       | E          | % | 40,373.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,568.10 | 0.00 | 350,941.96 |
|           | 5136 | Programa de Prevención de la<br>Violencia y la Delincuencia                                                                                                                                           | 350,941.96 | P | 40,373.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,568.10 | 0.00 | 350,941.96 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                       | E          | % | 40,373.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,568.10 | 0.00 | 350,941.96 |
| ISNA      |      |                                                                                                                                                                                                       | 264,479.12 | P | 264,479.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,479.12 | 0.00 | 264,479.12 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                       | E          | % | 264,479.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,479.12 | 0.00 | 264,479.12 |
|           | 4830 | REPARACION EDIFICIO LA<br>ESTRELLA, DELEGACION<br>CENTRAL ISNA (FASE II)                                                                                                                              | 179,864.26 | P | 179,864.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,864.26 | 0.00 | 179,864.26 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                       | E          | % | 179,864.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,864.26 | 0.00 | 179,864.26 |
| AL        |      |                                                                                                                                                                                                       | 233,091.29 | P | 233,091.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,091.29 | 0.00 | 233,091.29 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                       | E          | % | 233,091.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,091.29 | 0.00 | 233,091.29 |
|           | 4511 | REPARACIONES Y MEJORAS<br>EN CENTRO DE<br>REINSENCION EL ESPINO,<br>AHUACHAPAN (Primera Fase)                                                                                                         | 84,614.86  | P | 84,614.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,614.86  | 0.00 | 84,614.86  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                       | E          | % | 84,614.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,614.86  | 0.00 | 84,614.86  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                       | 233,091.29 | P | 233,091.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,091.29 | 0.00 | 233,091.29 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                       | E          | % | 233,091.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,091.29 | 0.00 | 233,091.29 |
|           | 5222 | PROGRAMA DE<br>MODERNIZACION DEL<br>ORGANO LEGISLATIVO II                                                                                                                                             | 200,641.40 | P | 200,641.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,641.40 | 0.00 | 200,641.40 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                       | E          | % | 200,641.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,641.40 | 0.00 | 200,641.40 |
| MH        |      |                                                                                                                                                                                                       | 200,641.40 | P | 200,641.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,641.40 | 0.00 | 200,641.40 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                       | E          | % | 200,641.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,641.40 | 0.00 | 200,641.40 |
|           |      | REPARACIÓN EN                                                                                                                                                                                         |            |   |            |      |      |      |      |            |      |            |



[illegible]

|      |                                                                                                                |              |         |                                                  |                               |                               |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4661 | Atención y Hospitales del MSPAS.                                                                               | 1,608,874.26 | D %     | 1,179,172.87<br>10.4 %                           | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 1,179,172.87<br>10.4 %                           | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 1,179,172.87<br>10.4 %                           |
| 4654 | Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"             | 1,502,767.83 | P E D % | 653,977.58<br>114,381.00<br>539,596.58<br>17.5 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 653,977.58<br>114,381.00<br>539,596.58<br>17.5 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 653,977.58<br>114,381.00<br>539,596.58<br>17.5 % |
| 4908 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás Pineda Martínez, Santa Ana                             | 964,895.25   | P E D % | 949,301.25<br>6,820.89<br>942,480.36<br>0.7 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 949,301.25<br>6,820.89<br>942,480.36<br>0.7 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 949,301.25<br>6,820.89<br>942,480.36<br>0.7 %    |
| 4853 | Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martín, San Salvador                                  | 877,669.08   | P E D % | 650,065.85<br>28,611.60<br>621,454.25<br>4.4 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 650,065.85<br>28,611.60<br>621,454.25<br>4.4 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 650,065.85<br>28,611.60<br>621,454.25<br>4.4 %   |
| 4836 | Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de Ayutxtepeque, San Salvador                                | 660,504.25   | P E D % | 554,060.85<br>0.00<br>554,060.85<br>0.0 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 554,060.85<br>0.00<br>554,060.85<br>0.0 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 554,060.85<br>0.00<br>554,060.85<br>0.0 %        |
| 4918 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Candelaria, Cuscatlán | 505,522.25   | P E D % | 486,138.95<br>48,920.84<br>437,218.11<br>10.1 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 486,138.95<br>48,920.84<br>437,218.11<br>10.1 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 486,138.95<br>48,920.84<br>437,218.11<br>10.1 %  |
| 4887 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Ciudad Arce, La Libertad                                     | 497,960.25   | P E D % | 497,960.25<br>15,594.00<br>482,366.25<br>3.1 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 497,960.25<br>15,594.00<br>482,366.25<br>3.1 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 497,960.25<br>15,594.00<br>482,366.25<br>3.1 %   |
| 4907 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Bárbara, Santa Ana              | 445,000.00   | P E D % | 374,123.42<br>19,266.50<br>354,856.92<br>5.1 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 374,123.42<br>19,266.50<br>354,856.92<br>5.1 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 374,123.42<br>19,266.50<br>354,856.92<br>5.1 %   |
| 4924 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán                             | 436,073.75   | P E D % | 392,670.00<br>0.00<br>392,670.00<br>0.0 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 392,670.00<br>0.00<br>392,670.00<br>0.0 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 392,670.00<br>0.00<br>392,670.00<br>0.0 %        |
| 4911 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Nahuizalco, Sonsonate                                     | 435,000.50   | P E D % | 422,409.30<br>11,509.27<br>410,900.03<br>2.7 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 422,409.30<br>11,509.27<br>410,900.03<br>2.7 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 422,409.30<br>11,509.27<br>410,900.03<br>2.7 %   |
| 4862 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Carlos, La Unión                                      | 435,000.25   | P E D % | 433,414.60<br>0.00<br>433,414.60<br>0.0 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 433,414.60<br>0.00<br>433,414.60<br>0.0 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 433,414.60<br>0.00<br>433,414.60<br>0.0 %        |
| 4866 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las Marías, Chinameca, San Miguel                            | 435,000.25   | P E D % | 362,483.35<br>15,594.00<br>346,889.35<br>4.3 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 362,483.35<br>15,594.00<br>346,889.35<br>4.3 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 362,483.35<br>15,594.00<br>346,889.35<br>4.3 %   |
| 4910 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio, San Antonio del Monte, Sonsonate                | 435,000.25   | P E D % | 395,522.62<br>0.00<br>395,522.62<br>0.0 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 395,522.62<br>0.00<br>395,522.62<br>0.0 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 395,522.62<br>0.00<br>395,522.62<br>0.0 %        |
| 4913 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Ahuachapán, Ahuachapán             | 435,000.25   | P E D % | 345,741.13<br>141,220.05<br>204,521.08<br>40.8 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 345,741.13<br>141,220.05<br>204,521.08<br>40.8 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 345,741.13<br>141,220.05<br>204,521.08<br>40.8 % |
|      |                                                                                                                |              | P       | 248,667.20                                       | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                          | 248,667.20                                       | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                          | 248,667.20                                       |

|      |                                                                                                                       |   |            |   |                                                 |                       |                       |                       |                       |                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 4927 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guacotecti, Cabañas                                                 | E | 435,000.25 | % | 15,594.00<br>233,073.20<br>6.3 %                | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 15,594.00<br>233,073.20<br>6.3 %                |
| 4876 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Usulután, Usulután                                               | P | 435,000.00 | % | 15,594.00<br>15,594.00<br>100.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 15,594.00<br>15,594.00<br>100.0 %               |
| 3346 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA                                                 | P | 434,726.25 | % | 415,884.41<br>15,594.00<br>400,290.41<br>3.7 %  | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 415,884.41<br>15,594.00<br>400,290.41<br>3.7 %  |
| 4894 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana                                            | P | 419,810.95 | % | 419,810.95<br>16,780.50<br>403,030.45<br>4.0 %  | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 419,810.95<br>16,780.50<br>403,030.45<br>4.0 %  |
| 4874 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Rafael, San Miguel                                              | P | 403,382.93 | % | 401,687.93<br>63,364.15<br>338,323.78<br>15.8 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 401,687.93<br>63,364.15<br>338,323.78<br>15.8 % |
| 4884 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango                                      | P | 400,000.25 | % | 348,915.80<br>0.00<br>348,915.80<br>0.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 348,915.80<br>0.00<br>348,915.80<br>0.0 %       |
| 4850 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador                   | P | 333,525.26 | % | 240,797.36<br>91,498.93<br>149,298.43<br>38.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 240,797.36<br>91,498.93<br>149,298.43<br>38.0 % |
| 4880 | Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud El Espino, Jucuarán, Usulután                                      | P | 309,193.25 | % | 202,799.79<br>1,695.00<br>201,104.79<br>0.8 %   | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 202,799.79<br>1,695.00<br>201,104.79<br>0.8 %   |
| 4912 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Salcoatitán, Sonsonate                    | P | 302,938.01 | % | 221,526.50<br>19,831.50<br>201,695.00<br>9.0 %  | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 221,526.50<br>19,831.50<br>201,695.00<br>9.0 %  |
| 4858 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilopango, San Salvador       | P | 285,171.10 | % | 175,275.10<br>22,358.32<br>152,916.78<br>12.8 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 175,275.10<br>22,358.32<br>152,916.78<br>12.8 % |
| 4885 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Arracac, Nueva Concepción, Chalatenango   | P | 265,500.25 | % | 223,474.99<br>3,729.00<br>219,745.99<br>1.7 %   | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 223,474.99<br>3,729.00<br>219,745.99<br>1.7 %   |
| 4852 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador | P | 240,500.25 | % | 237,931.73<br>3,641.35<br>234,290.38<br>1.5 %   | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 237,931.73<br>3,641.35<br>234,290.38<br>1.5 %   |
| 4884 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Llanos Patos, Conchagua, La Unión            | P | 222,000.50 | % | 222,000.50<br>17,406.98<br>204,593.52<br>7.8 %  | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.0 % | 222,000.50<br>17,406.98<br>204,593.52<br>7.8 %  |
| 4879 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de                                                                 | P | 222,000.25 | % | 199,210.16<br>3,032.86                          | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00          | 199,210.16<br>3,032.86                          |

|      |  | la Unidad de Salud California, Usulután                                                                               | D %              | 196,177.30<br>1.5 % | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 196,177.30<br>1.5 %                            | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 196,177.30<br>1.5 %                            |
|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 4839 |  | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes, San Salvador                        | P<br>E<br>D<br>% | 218,021.96          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 156,444.42<br>4,919.81<br>151,524.61<br>3.1 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 156,444.42<br>4,919.81<br>151,524.61<br>3.1 %  |
| 4932 |  | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Mercedes La Ceiba, La Paz    | P<br>E<br>D<br>% | 167,000.75          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 121,719.36<br>1,695.00<br>120,024.36<br>1.4 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 121,719.36<br>1,695.00<br>120,024.36<br>1.4 %  |
| 4919 |  | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de El Carmen, Cuscatlán         | P<br>E<br>D<br>% | 167,000.25          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 121,099.50<br>0.00<br>121,099.50<br>0.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 121,099.50<br>0.00<br>121,099.50<br>0.0 %      |
| 4935 |  | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Juan Talpa, La Paz       | P<br>E<br>D<br>% | 145,065.93          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 103,051.50<br>14,373.02<br>88,678.48<br>13.9 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 103,051.50<br>14,373.02<br>88,678.48<br>13.9 % |
| 4928 |  | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco del Monte, Ilobasco, Cabañas | P<br>E<br>D<br>% | 141,406.25          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 133,778.83<br>4,576.50<br>129,202.33<br>3.4 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 133,778.83<br>4,576.50<br>129,202.33<br>3.4 %  |
| 4881 |  | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Cruz, Usulután                            | P<br>E<br>D<br>% | 135,169.75          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 169.50<br>0.00<br>169.50<br>0.0 %              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 169.50<br>0.00<br>169.50<br>0.0 %              |
| 3345 |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CHALATENANGO                                                     | P<br>E<br>D<br>% | 134,000.00          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 42,875.16<br>16,040.53<br>26,834.63<br>37.4 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 42,875.16<br>16,040.53<br>26,834.63<br>37.4 %  |
| 4873 |  | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Silva, San Miguel                | P<br>E<br>D<br>% | 128,624.25          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 95,859.71<br>208.71<br>95,651.00<br>0.2 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 95,859.71<br>208.71<br>95,651.00<br>0.2 %      |
| 4872 |  | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Milagro de la Paz, San Miguel                | P<br>E<br>D<br>% | 125,234.25          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 93,545.03<br>0.00<br>93,545.03<br>0.0 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 93,545.03<br>0.00<br>93,545.03<br>0.0 %        |
| 4893 |  | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Tamanique, La Libertad                                           | P<br>E<br>D<br>% | 113,830.30          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 9,492.00<br>9,442.73<br>49.27<br>99.5 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 9,492.00<br>9,442.73<br>49.27<br>99.5 %        |
| 4938 |  | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guadalupe, San Vicente                                              | P<br>E<br>D<br>% | 113,211.62          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 20,864.20<br>11,865.00<br>8,999.20<br>56.9 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 20,864.20<br>11,865.00<br>8,999.20<br>56.9 %   |
| 4867 |  | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Uluazapa, San Miguel                                                | P<br>E<br>D<br>% | 110,417.12          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 23,722.14<br>6,780.00<br>16,942.14<br>28.6 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 23,722.14<br>6,780.00<br>16,942.14<br>28.6 %   |
| 4859 |  | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de                                                                  | P<br>E           | 106,519.11          | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 106,519.11<br>9,295.16                         | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 106,519.11<br>9,295.16                         |

|  |      |                                                                                                                            |         |                                             |                               |                               |                                             |                               |                               |                                             |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|  |      | Bobadilla, San Alejo, La Unión                                                                                             | D %     | 97,223.95<br>8.7 %                          | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 97,223.95<br>8.7 %                          | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 97,223.95<br>8.7 %                          |
|  | 4882 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Dorado, Chalatenango                          | P E D % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %               |
|  | 4891 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Matías, La Libertad                                                  | P E D % | 10,023.06<br>10,023.06<br>0.00<br>100.0 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 10,023.06<br>10,023.06<br>0.00<br>100.0 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 10,023.06<br>10,023.06<br>0.00<br>100.0 %   |
|  | 4860 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Carmen, La Unión                                                   | P E D % | 20,000.00<br>20,000.00<br>0.00<br>0.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 20,000.00<br>20,000.00<br>0.00<br>0.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 20,000.00<br>20,000.00<br>0.00<br>0.0 %     |
|  | 4861 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Faro, Conchagua, La Unión                                          | P E D % | 9,483.16<br>9,483.16<br>0.00<br>100.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 9,483.16<br>9,483.16<br>0.00<br>100.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 9,483.16<br>9,483.16<br>0.00<br>100.0 %     |
|  | 4930 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Jutiapa, Cabañas        | P E D % | 8,898.75<br>6,780.00<br>2,118.75<br>76.2 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 8,898.75<br>6,780.00<br>2,118.75<br>76.2 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 8,898.75<br>6,780.00<br>2,118.75<br>76.2 %  |
|  | 4902 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Jose Ingenio, Metapán, Santa Ana                                     | P E D % | 0.06<br>0.00<br>0.06<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.06<br>0.00<br>0.06<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.06<br>0.00<br>0.06<br>0.0 %               |
|  | 4926 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Sensuntepeque, Cabañas            | P E D % | 6,780.00<br>6,780.00<br>0.00<br>100.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 6,780.00<br>6,780.00<br>0.00<br>100.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 6,780.00<br>6,780.00<br>0.00<br>100.0 %     |
|  | 4920 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de Concepción, Cuscatlán | P E D % | 8,475.00<br>8,475.00<br>0.00<br>100.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 8,475.00<br>8,475.00<br>0.00<br>100.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 8,475.00<br>8,475.00<br>0.00<br>100.0 %     |
|  | 4868 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel              | P E D % | 10,170.00<br>8,475.00<br>1,695.00<br>83.3 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 10,170.00<br>8,475.00<br>1,695.00<br>83.3 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 10,170.00<br>8,475.00<br>1,695.00<br>83.3 % |
|  | 4922 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Jose Guayabal, Cuscatlán      | P E D % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %               |
|  | 4659 | Remodelación y equipamiento del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales                                   | P E D % | 62,761.54                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 62,761.54                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 62,761.54                                   |
|  | 4899 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad        | P E D % | 6,780.00<br>6,739.09<br>40.91<br>99.4 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 6,780.00<br>6,739.09<br>40.91<br>99.4 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 6,780.00<br>6,739.09<br>40.91<br>99.4 %     |

[illegible]



|  |      | Peruapía, Cuscatán                                                                                                       |           | %                | 0.0 %                                        | 0.0 %                         | 0.0 %                         | 0.0 %                         | 0.0 %                         | 0.0 %                         | 0.0 %                         | 0.0 %                                        |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|  | 4903 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Juan las Minas, Metapán, Santa Ana          | 47,459.95 | P<br>E<br>D<br>% | 10,615.94<br>10,615.94<br>0.00<br>100.0 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 10,615.94<br>10,615.94<br>0.00<br>100.0 %    |
|  | 4865 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Piche, El Carmen, La Unión                   | 46,231.05 | P<br>E<br>D<br>% | 6,780.00<br>6,756.62<br>23.38<br>99.7 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 6,780.00<br>6,756.62<br>23.38<br>99.7 %      |
|  | 4931 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyutitán, La Paz                             | 45,047.41 | P<br>E<br>D<br>% | 9,009.48<br>0.00<br>9,009.48<br>0.0 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 9,009.48<br>0.00<br>9,009.48<br>0.0 %        |
|  | 4856 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador         | 44,726.25 | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                |
|  | 4890 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La Libertad                                                         | 44,623.56 | P<br>E<br>D<br>% | 42,132.90<br>40,832.90<br>1,300.00<br>96.9 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 42,132.90<br>40,832.90<br>1,300.00<br>96.9 % |
|  | 4923 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Ramon, Cuscatán             | 42,638.54 | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                |
|  | 4904 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Sebastián Salitrillo, Santa Ana             | 40,391.81 | P<br>E<br>D<br>% | 8,475.00<br>8,475.00<br>0.00<br>100.0 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 8,475.00<br>8,475.00<br>0.00<br>100.0 %      |
|  | 4898 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa Ana | 37,726.22 | P<br>E<br>D<br>% | 5,424.00<br>5,085.00<br>339.00<br>93.8 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 5,424.00<br>5,085.00<br>339.00<br>93.8 %     |
|  | 4851 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Tonacatepeque, San Salvador                  | 37,149.99 | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                |
|  | 4871 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Cuco, Chirilagua, San Miguel                 | 35,508.00 | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                |
|  | 4847 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Ciudad Delgado, San Salvador                    | 35,234.25 | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                |
|  | 4888 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Manuel Gallardo, Colón, La Libertad             | 35,000.25 | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                |
|  | 4846 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Villa                                           | 27,770.27 | P<br>E<br>D      | 0.00<br>0.00<br>0.00                         | 0.00<br>0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00<br>0.00                         |



|      |                                                                                                               |             |           |                                         |                               |                               |                               |                               |                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 4857 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador | P<br>E<br>% | 16,479.29 | 86.41<br>0.00<br>86.41<br>0.0 %         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 86.41<br>0.00<br>86.41<br>0.0 %         |
| 4883 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Palma, Chalatenango              | P<br>E<br>% | 16,035.95 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           |
| 4869 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Comacarán, San Miguel               | P<br>E<br>% | 15,630.10 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           |
| 4896 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Planes de la Laguna, Santa Ana       | P<br>E<br>% | 15,500.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           |
| 4875 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Primavera, El Tránsito, San Miguel  | P<br>E<br>% | 14,628.45 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           |
| 4858 | Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Red de Establecimientos de Salud.                        | P<br>E<br>% | 12,139.56 | 5,566.89<br>5,566.89<br>0.00<br>100.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 5,566.89<br>5,566.89<br>0.00<br>100.0 % |
| 4841 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador        | P<br>E<br>% | 11,487.56 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           |
| 4843 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilares, San Salvador              | P<br>E<br>% | 11,379.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           |
| 4844 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador         | P<br>E<br>% | 11,346.32 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           |
| 4886 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Azacualpa, Chalatenango          | P<br>E<br>% | 11,266.98 | 1,500.00<br>0.00<br>1,500.00<br>0.0 %   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 1,500.00<br>0.00<br>1,500.00<br>0.0 %   |
| 4877 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Triunfo, Usulután                | P<br>E<br>% | 10,454.80 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           |
| 4934 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz    | P<br>E<br>% | 10,282.45 | 241.94<br>0.00<br>241.94<br>0.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 241.94<br>0.00<br>241.94<br>0.0 %       |
| 4848 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador              | P<br>E<br>% | 9,721.29  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %           |
| 4838 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de                                                         | P<br>E      | 9,113.54  | 9,113.54<br>0.00                        | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 9,113.54<br>0.00                        |

|      | la Unidad de Salud de<br>Monserat, San Salvador                                                                       |               | D<br>%           | 9,113.54<br>0.0 %                                         | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 9,113.54<br>0.0 %                                         | 0.00<br>0.0 %                 | 9,113.54<br>0.0 %                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 4842 | Ampliación, Equipamiento,<br>Mejoras y/o Remodelación de<br>la Unidad de Salud Barrios,<br>San Salvador               | 8,056.57      | P<br>E<br>D<br>% | 20.74<br>0.00<br>20.74<br>0.0 %                           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 20.74<br>0.00<br>20.74<br>0.0 %                           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 20.74<br>0.00<br>20.74<br>0.0 %                           |
| 4860 | Remodelación y equipamiento<br>del Hospital Nacional de<br>Chalchuapa                                                 | 6,732.70      | P<br>E<br>D<br>% | 6,732.70<br>6,729.83<br>2.87<br>100.0 %                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 6,732.70<br>6,729.83<br>2.87<br>100.0 %                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 6,732.70<br>6,729.83<br>2.87<br>100.0 %                   |
| 4870 | Ampliación, Equipamiento,<br>Mejoras y/o Remodelación de<br>la Unidad de Salud Lolotique,<br>San Miguel               | 2,939.58      | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                             |
| MOP  |                                                                                                                       | 30,811,733.17 | P<br>E<br>D<br>% | 24,972,585.25<br>11,504,264.15<br>13,468,321.10<br>46.1 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 24,972,585.25<br>11,504,264.15<br>13,468,321.10<br>46.1 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 24,972,585.25<br>11,504,264.15<br>13,468,321.10<br>46.1 % |
| 4529 | Mejoramiento de Camino Rural<br>LIB16S Tramo LIB22S -<br>Tamanique, La Libertad                                       | 8,178,351.56  | P<br>E<br>D<br>% | 8,178,351.56<br>2,313,342.24<br>5,865,009.32<br>28.3 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 8,178,351.56<br>2,313,342.24<br>5,865,009.32<br>28.3 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 8,178,351.56<br>2,313,342.24<br>5,865,009.32<br>28.3 %    |
| 4532 | Mejoramiento de Camino Rural<br>LIB18N: Tramo LIB22S -<br>Chilitupan, La Libertad                                     | 6,262,138.81  | P<br>E<br>D<br>% | 6,262,138.81<br>1,878,641.64<br>4,383,497.17<br>30.0 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 6,262,138.81<br>1,878,641.64<br>4,383,497.17<br>30.0 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 6,262,138.81<br>1,878,641.64<br>4,383,497.17<br>30.0 %    |
| 4638 | MEJORAMIENTO CAMINO<br>RURAL AHU16S TRAMO:<br>APANACA - QUEZALAPA -<br>HACIA SAN PEDRO PUXTLA,<br>APANACA, AHUACHAPAN | 4,144,929.03  | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>1,243,478.71<br>-1,243,478.71<br>0.0 %            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>1,243,478.71<br>-1,243,478.71<br>0.0 %            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>1,243,478.71<br>-1,243,478.71<br>0.0 %            |
| 4530 | Mejoramiento de Camino Rural<br>LIB19N Tramo LIB22S -<br>Jayaque, La Libertad                                         | 3,874,886.67  | P<br>E<br>D<br>% | 3,874,886.67<br>3,542,191.96<br>332,694.71<br>91.4 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 3,874,886.67<br>3,542,191.96<br>332,694.71<br>91.4 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 3,874,886.67<br>3,542,191.96<br>332,694.71<br>91.4 %      |
| 4531 | Ampliación de un Tramo del<br>Camino Terciario LIB05W:<br>Tramo CA04S-LIB15S. (Desvío<br>a Comasagua), La Libertad    | 2,403,282.55  | P<br>E<br>D<br>% | 2,403,282.55<br>639,806.44<br>1,763,476.11<br>26.6 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 2,403,282.55<br>639,806.44<br>1,763,476.11<br>26.6 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 2,403,282.55<br>639,806.44<br>1,763,476.11<br>26.6 %      |
| 3603 | MEJORAMIENTO DE CAMINO<br>RURAL SAM28N<br>TRAMO:CHAPELTIQUE -<br>SESORI, SAN MIGUEL                                   | 1,943,287.54  | P<br>E<br>D<br>% | 1,943,287.54<br>1,086,730.75<br>856,556.79<br>55.9 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 1,943,287.54<br>1,086,730.75<br>856,556.79<br>55.9 %      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 1,943,287.54<br>1,086,730.75<br>856,556.79<br>55.9 %      |
| 4640 | MEJORAMIENTO CAMINO<br>RURAL TRAMO:<br>COMASAGUA HACIA BELLO<br>HORIZONTE, LA LIBERTAD                                | 1,519,393.08  | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>455,817.92<br>-455,817.92<br>0.0 %                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>455,817.92<br>-455,817.92<br>0.0 %                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>455,817.92<br>-455,817.92<br>0.0 %                |
| 4624 | CONSTRUCCIÓN DE MURO<br>DE RETENCIÓN EN COLONIA<br>LAS MARGARITAS, BARRIO<br>SAN JACINTO, SAN<br>SALVADOR             | 775,000.00    | P<br>E<br>D<br>% | 678,125.00<br>0.00<br>678,125.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 678,125.00<br>0.00<br>678,125.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 678,125.00<br>0.00<br>678,125.00<br>0.0 %                 |
| 4562 | OBRAS DE MITIGACIÓN EN<br>ZONA DE CARCAVA<br>COLONIA LLANO VERDE, (1                                                  | 422,027.91    | P<br>E           | 412,027.93<br>58,494.87                                   | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                  | 412,027.93<br>58,494.87                                   | 0.00<br>0.00                  | 412,027.93<br>58,494.87                                   |

|  |      |                                                                                                                                                                           |                  |                                                 |                               |                               |                               |                               |                               |                                                 |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|  |      | PRINCIPAL Y 3<br>SECUNDARIAS; ILOPANGO,<br>SAN SALVADOR                                                                                                                   | D<br>%           | 353,533.06<br>14.2 %                            | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 353,533.06<br>14.2 %                            |
|  | 4559 | PROYECTO DE MITIGACIÓN<br>DE RIESGOS A FAMILIAS EN<br>ZONAS VULNERABLES DE LA<br>COMUNIDAD NUEVO ISRAEL,<br>SAN SALVADOR                                                  | P<br>E<br>D<br>% | 305,839.09<br>0.00<br>305,839.09<br>0.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 305,839.09<br>0.00<br>305,839.09<br>0.0 %       |
|  | 4641 | OBRAS DE MITIGACION EN<br>ZONA DE QUEBRADA LA<br>LECHUZA, ALEDAÑO AL<br>MINISTERIO DE OBRAS<br>PUBLICAS, SAN SALVADOR                                                     | P<br>E<br>D<br>% | 285,936.10<br>66,107.32<br>219,828.78<br>23.1 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 285,936.10<br>66,107.32<br>219,828.78<br>23.1 % |
|  | 4565 | CONSTRUCCIÓN DE MURO<br>DE RETENCIÓN EN 8a - 10a,<br>Y CALLE PARAGUAY, SAN<br>SALVADOR                                                                                    | P<br>E<br>D<br>% | 243,055.31<br>0.00<br>243,055.31<br>0.0 %       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 243,055.31<br>0.00<br>243,055.31<br>0.0 %       |
|  | 4535 | Rehabilitación de la Carretera<br>CHA07E-CHA09S, Tramo del<br>Et. CHA08E-Arcatao,<br>Chalatenango                                                                         | P<br>E<br>D<br>% | 219,652.30<br>219,652.30<br>0.00<br>100.0 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 219,652.30<br>219,652.30<br>0.00<br>100.0 %     |
|  | 4563 | OBRAS COMPLEMENTARIAS<br>DE MITIGACIÓN CÁRCAVAS<br>DE JARDINES DE SAN<br>BARTOLO (1 PRINCIPAL Y 2<br>SECUNDARIAS) ILOPANGO,<br>SAN SALVADOR.                              | P<br>E<br>D<br>% | 63,856.81<br>0.00<br>63,856.81<br>0.0 %         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 63,856.81<br>0.00<br>63,856.81<br>0.0 %         |
|  | 4566 | CONSTRUCCIÓN DE MURO<br>DE RETENCIÓN EN<br>QUEBRADA LA LECHUZA EN<br>ZONA DEL CENTRO DE<br>CONFERENCIAS Y<br>CONVENCIONES<br>INTERNACIONALES ( EX<br>FERIA INTERNACIONAL) | P<br>E<br>D<br>% | 14,087.79<br>0.00<br>14,087.79<br>0.0 %         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 14,087.79<br>0.00<br>14,087.79<br>0.0 %         |
|  | 4564 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS<br>GUARDANIVELES Y<br>REPARACIÓN DE MURO<br>GUARDANIVEL EN RÍO LAS<br>CAÑAS ILOPANGO, SAN<br>SALVADOR                                               | P<br>E<br>D<br>% | 48,390.02<br>0.00<br>48,390.02<br>0.0 %         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 48,390.02<br>0.00<br>48,390.02<br>0.0 %         |
|  | 4626 | CONSTRUCCIÓN DE MURO<br>DE RETENCIÓN EN LA<br>QUEBRADA LA LECHUZA EN<br>ZONA DE CASA<br>PRESIDENCIAL                                                                      | P<br>E<br>D<br>% | 6,235.70<br>0.00<br>6,235.70<br>0.0 %           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 6,235.70<br>0.00<br>6,235.70<br>0.0 %           |
|  | 4630 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS<br>DE MURO DE RETENCIÓN<br>EN URBANIZACIÓN ALTOS<br>DEL BOULEVARD, SAN<br>SALVADOR                                                                  | P<br>E<br>D<br>% | 33,332.07<br>0.00<br>33,332.07<br>0.0 %         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 33,332.07<br>0.00<br>33,332.07<br>0.0 %         |
|  | 4639 | MEJORAMIENTO CAMINO<br>TERCIARIO SAV29S, TRAMO:<br>SAN CARLOS LEMPA (SAV<br>09S) HACIA LA PITA,<br>TECOLUCA, SAN VICENTE                                                  | P<br>E<br>D<br>% | 100.00<br>0.00<br>100.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 100.00<br>0.00<br>100.00<br>0.0 %               |
|  |      | CONSTRUCCION DE                                                                                                                                                           |                  |                                                 |                               |                               |                               |                               |                               |                                                 |

[illegible]

|      |                                                                                                                       |   |            |  |            |       |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |            |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------------|---------|
| 4594 | INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTON TUTULTEPEQUE EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA, SAN SALVADOR.                                 | P | 554,785.78 |  | 554,785.78 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 554,785.78 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 554,785.78 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | E |            |  | 554,785.78 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 554,785.78 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 554,785.78 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | D |            |  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.0 %   |
|      |                                                                                                                       | % |            |  | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 %   |
| 4595 | PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTON JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR.        | P | 521,359.71 |  | 521,359.71 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 521,359.71 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 521,359.71 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | E |            |  | 521,359.71 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 521,359.71 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 521,359.71 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | D |            |  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.0 %   |
|      |                                                                                                                       | % |            |  | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 %   |
| 4621 | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUJAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.         | P | 469,218.14 |  | 469,218.14 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 469,218.14 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 469,218.14 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | E |            |  | 469,218.14 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 469,218.14 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 469,218.14 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | D |            |  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.0 %   |
|      |                                                                                                                       | % |            |  | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 %   |
| 4611 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.            | P | 434,056.75 |  | 434,056.75 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 434,056.75 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 434,056.75 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | E |            |  | 434,056.75 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 434,056.75 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 434,056.75 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | D |            |  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.0 %   |
|      |                                                                                                                       | % |            |  | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 %   |
| 4592 | PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUILARES.                                        | P | 398,720.63 |  | 398,720.63 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 398,720.63 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 398,720.63 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | E |            |  | 398,720.63 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 398,720.63 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 398,720.63 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | D |            |  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.0 %   |
|      |                                                                                                                       | % |            |  | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 %   |
| 4619 | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. | P | 357,026.38 |  | 357,026.38 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 357,026.38 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 357,026.38 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | E |            |  | 357,026.38 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 357,026.38 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 357,026.38 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | D |            |  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.0 %   |
|      |                                                                                                                       | % |            |  | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 %   |
| 4631 | INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES EL SINGUIL, SANTA RITA Y EL CERRÓN, EL PORVENIR, SANTA ANA   | P | 350,000.00 |  | 350,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 350,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 350,000.00 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | E |            |  | 350,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 350,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 350,000.00 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | D |            |  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.0 %   |
|      |                                                                                                                       | % |            |  | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 %   |
| 4603 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN PABLO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL. | P | 348,592.11 |  | 348,592.11 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 348,592.11 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 348,592.11 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | E |            |  | 348,592.11 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 348,592.11 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 348,592.11 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | D |            |  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.0 %   |
|      |                                                                                                                       | % |            |  | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 %   |
| 4602 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, LA UNION.              | P | 341,846.08 |  | 341,846.08 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 341,846.08 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 341,846.08 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | E |            |  | 341,846.08 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 341,846.08 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 341,846.08 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | D |            |  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.0 %   |
|      |                                                                                                                       | % |            |  | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 %   |
| 4608 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, USULUTÁN.                    | P | 314,280.27 |  | 314,280.27 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 314,280.27 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 314,280.27 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | E |            |  | 314,280.27 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 314,280.27 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 314,280.27 | 100.0 % |
|      |                                                                                                                       | D |            |  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.0 %   |
|      |                                                                                                                       | % |            |  | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 %    | 0.0 %   |

|      |                                                                                                                                                                                            |                  |            |                               |                                                  |                               |                               |                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4574 | PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO GEMELO EN ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA-LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE.                                                               | P<br>E<br>D<br>% | 300,000.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 277,000.00<br>0.00<br>277,000.00<br>0.0 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 277,000.00<br>0.00<br>277,000.00<br>0.0 %        |
| 4614 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE EL TRANSITO, SAN MIGUEL.                                                                                                           | P<br>E<br>D<br>% | 296,925.69 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 296,925.69<br>275,511.42<br>21,414.27<br>92.8 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 296,925.69<br>275,511.42<br>21,414.27<br>92.8 %  |
| 4601 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD HERMOSA PROVINCIA DEL MUNICIPIO DE JICALAPA, LA LIBERTAD.                                                                                        | P<br>E<br>D<br>% | 292,343.59 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 292,343.59<br>269,477.08<br>22,866.51<br>92.2 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 292,343.59<br>269,477.08<br>22,866.51<br>92.2 %  |
| 4583 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M3 Y LA INSTALACION DE UN ANILLO DE DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE | P<br>E<br>D<br>% | 286,827.56 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 286,827.56<br>136,688.30<br>150,139.26<br>47.7 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 286,827.56<br>136,688.30<br>150,139.26<br>47.7 % |
| 4591 | REFABILITACION DEL POZO NO.2 EN PLANTA DE BOMBEO EL TINTERAL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.                                                                           | P<br>E<br>D<br>% | 263,376.49 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 263,376.49<br>263,207.27<br>169.22<br>99.9 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 263,376.49<br>263,207.27<br>169.22<br>99.9 %     |
| 4612 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARAN, MUNICIPIO DE JUCUARAN DEPARTAMENTO DE USulután.                                                                    | P<br>E<br>D<br>% | 240,165.12 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 240,165.12<br>70,479.03<br>169,686.09<br>29.3 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 240,165.12<br>70,479.03<br>169,686.09<br>29.3 %  |
| 4578 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE DE SANTA ANA.                                                                                                  | P<br>E<br>D<br>% | 240,027.88 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 240,027.88<br>178,804.30<br>61,223.58<br>74.5 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 240,027.88<br>178,804.30<br>61,223.58<br>74.5 %  |
| 4618 | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAROLINA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.                                                                            | P<br>E<br>D<br>% | 163,929.64 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 163,929.64<br>107,827.64<br>56,102.00<br>65.8 %  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 163,929.64<br>107,827.64<br>56,102.00<br>65.8 %  |
| 4585 | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS BRISAS DE CANTARRANA Y BARCELONA, UBICADAS EN CANTON CANTARRANA,                                                    | P<br>E<br>D<br>% | 161,749.91 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 161,749.91<br>161,320.61<br>429.30<br>99.7 %     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 161,749.91<br>161,320.61<br>429.30<br>99.7 %     |



[illegible]

[illegible]

|     |      |                                                                                                                                                                                       |   |               |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |              |        |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|--------------|--------|
|     | 4607 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE OZATLÁN, USULUTÁN.                                                                                                                                  | E | 14,775.54     | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,775.54     | 0.00         | 0.00   |
|     | 4579 | CAMBIO Y PROFUNDIZACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CANTON EL TINTERAL, MUNICIPIO DE COATEPEQUE.                                                                                    | P | 6,331.13      | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,331.13      | 6,037.97     | 95.4 % |
|     | 4606 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER, USULUTÁN.                                                                         | P | 305.37        | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00   |
|     | 4570 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 DE CAPACIDAD, EN PLANTA EL MIRADOR, PLANES DE RENDEROS, SAN SALVADOR.                                                              | P | 11.87         | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00   |
|     | 4572 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE REBOMBEO, MUNICIPIO DE APOPA.                                                                                                                           | P | 0.01          | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00   |
| UES |      |                                                                                                                                                                                       | P | 14,579,238.55 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,217,350.02 | 2,587,097.04 | 19.6 % |
|     | 3762 | CONSTRUCCION DE BOVEDA                                                                                                                                                                | P | 6,500,000.00  | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,687,500.00  | 5,687,500.00 | 0.0 %  |
|     | 5025 | FORTELECIMIENTO DEL PROGRAMA JÓVENES TALENTO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR                                                                                                         | P | 2,000,000.00  | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775,000.00  | 1,775,000.00 | 0.0 %  |
|     | 5024 | FORTELECIMIENTO AL PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES GENERANDO OPORTUNIDADES DE ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CON PERSPECTIVAS HACIA EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL | P | 1,643,792.03  | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479,403.50  | 1,437,982.45 | 97.2 % |
|     | 5013 | Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias Económicas                                                                                                             | P | 755,571.47    | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755,571.47    | 755,571.47   | 0.0 %  |
|     | 5015 | Construcción de Edificio para Instituto de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas                                                                    | P | 653,846.00    | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573,846.00    | 573,846.00   | 0.0 %  |
|     |      |                                                                                                                                                                                       | P | 573,846.00    | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573,846.00    | 573,846.00   | 0.0 %  |

[illegible]

|       |      | de Química de la Facultad<br>Multidisciplinaria de Occidente.                                                                              |              | D                | 290.75<br>83.1 %                                         | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 290.75<br>83.1 %                                         | 0.00<br>0.0 %                 | 0.00<br>0.0 %                 | 290.75<br>83.1 %                                         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
|       | 5010 | Fortalecimiento de<br>Infraestructura en la Facultad<br>de Odontología.                                                                    | 37.73        | P<br>E<br>D<br>% | 37.73<br>0.00<br>37.73<br>0.0 %                          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 37.73<br>0.00<br>37.73<br>0.0 %                          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 37.73<br>0.00<br>37.73<br>0.0 %                          |
| MINED |      |                                                                                                                                            | 5,256,020.06 | P<br>E<br>D<br>% | 1,395,296.22<br>3,994,209.07<br>-2,598,912.85<br>286.3 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 1,395,296.22<br>3,994,209.07<br>-2,598,912.85<br>286.3 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 1,395,296.22<br>3,994,209.07<br>-2,598,912.85<br>286.3 % |
|       | 4635 | PROGRAMA DE<br>REPARACIONES MENORES<br>EN CENTROS ESCOLARES A<br>NIVEL NACIONAL                                                            | 1,131,631.28 | P<br>E<br>D<br>% | 841,917.69<br>851,917.69<br>-10,000.00<br>101.2 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 841,917.69<br>851,917.69<br>-10,000.00<br>101.2 %        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 841,917.69<br>851,917.69<br>-10,000.00<br>101.2 %        |
|       | 5755 | MEJORAMIENTO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA EN 16<br>CENTROS EDUCATIVOS EN<br>EL DEPARTAMENTO DE<br>SONSONATE                                    | 780,663.00   | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>780,663.00<br>-780,663.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>780,663.00<br>-780,663.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>780,663.00<br>-780,663.00<br>0.0 %               |
|       | 4680 | REHABILITACION Y<br>MEJORAMIENTO ESCUELA<br>DE EDUCACION ESPECIAL<br>DE SAN JACINTO, SAN<br>SALVADOR                                       | 696,205.02   | P<br>E<br>D<br>% | 310,021.87<br>310,021.87<br>0.0 %                        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 310,021.87<br>310,021.87<br>0.0 %                        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 310,021.87<br>310,021.87<br>0.0 %                        |
|       | 5759 | MEJORAMIENTO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA EN 10<br>CENTROS EDUCATIVOS EN<br>EL DEPARTAMENTO DE<br>USulután                                     | 527,500.00   | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>527,500.00<br>-527,500.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>527,500.00<br>-527,500.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>527,500.00<br>-527,500.00<br>0.0 %               |
|       | 5756 | MEJORAMIENTO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA EN 8<br>CENTROS EDUCATIVOS EN<br>LOS DEPARTAMENTOS DE<br>CHALATENANGO, LA<br>LIBERTAD Y SAN SALVADOR | 344,261.00   | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>344,261.00<br>-344,261.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>344,261.00<br>-344,261.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>344,261.00<br>-344,261.00<br>0.0 %               |
|       | 5758 | MEJORAMIENTO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA EN 6<br>CENTROS EDUCATIVOS EN<br>LOS DEPARTAMENTOS DE<br>LA PAZ Y SAN VICENTE                        | 266,200.00   | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>266,200.00<br>-266,200.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>266,200.00<br>-266,200.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>266,200.00<br>-266,200.00<br>0.0 %               |
|       | 5761 | MEJORAMIENTO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA EN 5<br>CENTROS EDUCATIVOS EN<br>LOS DEPARTAMENTOS DE<br>MORAZAN Y LA UNION                          | 217,586.00   | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>217,586.00<br>-217,586.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>217,586.00<br>-217,586.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>217,586.00<br>-217,586.00<br>0.0 %               |
|       | 4636 | PROGRAMA DE DOTACION<br>DE MOBILIARIO ESCOLAR<br>DE CENTROS ESCOLARES A<br>NIVEL NACIONAL                                                  | 212,740.61   | P<br>E<br>D<br>% | 67,740.61<br>138,720.61<br>-70,980.00<br>204.8 %         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 67,740.61<br>138,720.61<br>-70,980.00<br>204.8 %         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 67,740.61<br>138,720.61<br>-70,980.00<br>204.8 %         |
|       | 5754 | MEJORAMIENTO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA EN 4<br>CENTROS EDUCATIVOS EN<br>EL DEPARTAMENTO DE<br>SANTA ANA                                     | 193,200.00   | P<br>E<br>D<br>% | 0.00<br>193,200.00<br>-193,200.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>193,200.00<br>-193,200.00<br>0.0 %               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 % | 0.00<br>193,200.00<br>-193,200.00<br>0.0 %               |
|       |      | MEJORAMIENTO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA EN 4                                                                                                 |              | P                | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                     | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                                                     |

|      |                                                                                                          |   |            |             |      |      |      |      |      |      |      |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 5757 | CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCATLÁN Y CABANAS                                           | E | 179,000.00 | 179,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,000.00  |
|      |                                                                                                          | D |            | -179,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -179,000.00 |
|      |                                                                                                          | % |            | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 5760 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL              | P | 173,900.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
|      |                                                                                                          | E |            | 173,900.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,900.00  |
|      |                                                                                                          | D |            | -173,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -173,900.00 |
|      |                                                                                                          | % |            | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 5753 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN              | P | 167,800.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
|      |                                                                                                          | E |            | 167,800.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,800.00  |
|      |                                                                                                          | D |            | -167,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -167,800.00 |
|      |                                                                                                          | % |            | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 4725 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR LA CARMENZA, SAN MIGUEL                                                      | P | 121,862.99 | 58,056.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,056.61   |
|      |                                                                                                          | E |            | 59,214.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,214.58   |
|      |                                                                                                          | D |            | -1,157.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,157.97   |
|      |                                                                                                          | % |            | 102.0       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.0       |
| 4707 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO CERRO EL TORO, C/LA TRINIDAD, SENSUNTEPQUE, CABANAS | P | 51,367.14  | 23,049.84   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,049.84   |
|      |                                                                                                          | E |            | 11,342.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,342.28   |
|      |                                                                                                          | D |            | 11,707.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,707.56   |
|      |                                                                                                          | % |            | 49.2        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2        |
| 4721 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR EL MARQUEZADO, SANTIAGO DE MARIA, USULUTAN                  | P | 27,829.00  | 13,123.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,123.77   |
|      |                                                                                                          | E |            | 20,721.75   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,721.75   |
|      |                                                                                                          | D |            | -7,597.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,597.98   |
|      |                                                                                                          | % |            | 157.9       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.9       |
| 4701 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON SAN CARLOS, J/ DOLORES, D/ CABANAS                   | P | 27,176.94  | 25,546.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,546.34   |
|      |                                                                                                          | E |            | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
|      |                                                                                                          | D |            | 25,546.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,546.34   |
|      |                                                                                                          | % |            | 0.0         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0         |
| 4716 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR BRISAS DEL SOL, BERLIN, USULUTAN                                             | P | 26,950.69  | 12,801.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,801.58   |
|      |                                                                                                          | E |            | 13,475.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,475.34   |
|      |                                                                                                          | D |            | -673.76     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -673.76     |
|      |                                                                                                          | % |            | 105.3       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.3       |
| 4723 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CHAPELTIQUE, SAN MIGUEL                              | P | 26,093.75  | 13,046.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,046.88   |
|      |                                                                                                          | E |            | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
|      |                                                                                                          | D |            | 100.0       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0       |
| 4942 | CENTRO ESCOLAR CANTON LOS CONEJOS, EL CARMEN, LA UNION                                                   | P | 23,783.00  | 5,945.75    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,945.75    |
|      |                                                                                                          | E |            | 11,891.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,891.50   |
|      |                                                                                                          | D |            | -5,945.75   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,945.75   |
|      |                                                                                                          | % |            | 200.0       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.0       |
| 4728 | CENTRO ESCOLAR COLONIA CARRILLO, CANTON EL PAPALÓN, SAN MIGUEL                                           | P | 16,943.58  | 8,471.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,471.80    |
|      |                                                                                                          | E |            | 8,471.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,471.80    |
|      |                                                                                                          | D |            | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
|      |                                                                                                          | % |            | 100.0       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0       |
| 4943 | CENTRO ESCOLAR BARRIO LA FATIMA, LA UNION                                                                | P | 10,192.11  | 2,548.03    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,548.03    |
|      |                                                                                                          | E |            | 5,096.06    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,096.06    |
|      |                                                                                                          | D |            | -2,548.03   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,548.03   |
|      |                                                                                                          | % |            | 200.0       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.0       |
| 4718 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL TABURETE, JIQUILISCO,                             | P | 10,168.53  | 2,542.13    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,542.13    |
|      |                                                                                                          | E |            | 5,084.26    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,084.26    |
|      |                                                                                                          | D |            | -2,542.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,542.13   |

|               |      | USULUTAN                                                                                                                          |                  | %                | 200.0 %                                                      | 0.0 %                                                     | 0.0 %                                                | 200.0 %                                                      | 0.0 %                                                       | 0.0 %                                                        | 200.0 %                                                        |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|               | 4940 | INSTITUTO NACIONAL DE SAN SIMON, MORAZAN                                                                                          | P<br>E<br>D<br>% | 9,500.00         | 2,375.00<br>0.00<br>2,375.00<br>0.0 %                        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 2,375.00<br>0.00<br>2,375.00<br>0.0 %                        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                                | 2,375.00<br>0.00<br>2,375.00<br>0.0 %                          |
|               | 4702 | CENTRO ESCOLAR CASERIO CONCEPCION, CANTON LA QUESERA, ILOBASCO, CABAÑAS                                                           | P<br>E<br>D<br>% | 6,865.27         | 1,716.32<br>1,716.32<br>0.00<br>100.0 %                      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 1,716.32<br>1,716.32<br>0.00<br>100.0 %                      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                                | 1,716.32<br>1,716.32<br>0.00<br>100.0 %                        |
|               | 4666 | REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON GUASCOTA, SAN LORENZO AHUACHAPAN                                                             | P<br>E<br>D<br>% | 6,799.99         | 6,392.00<br>3,400.00<br>2,992.00<br>53.2 %                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 6,392.00<br>3,400.00<br>2,992.00<br>53.2 %                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                                | 6,392.00<br>3,400.00<br>2,992.00<br>53.2 %                     |
|               | 4687 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL BARILLO, ZARAGOZA, LA LIBERTAD                                                              | P<br>E<br>D<br>% | 0.16             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                                  |
| MAG           |      |                                                                                                                                   | P<br>E<br>D<br>% | 985,844.80       | 854,893.82<br>445,874.29<br>409,019.53<br>52.2 %             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 854,893.82<br>445,874.29<br>409,019.53<br>52.2 %             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                                | 854,893.82<br>445,874.29<br>409,019.53<br>52.2 %               |
|               | 4643 | Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador                  | P<br>E<br>D<br>% | 885,120.57       | 811,579.59<br>442,864.31<br>368,715.28<br>54.6 %             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 811,579.59<br>442,864.31<br>368,715.28<br>54.6 %             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                                | 811,579.59<br>442,864.31<br>368,715.28<br>54.6 %               |
|               | 4651 | Construcción de Muro de Retención en Quebrada La Oscurana, Municipio de Berlín                                                    | P<br>E<br>D<br>% | 37,410.00        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                                  |
|               | 4647 | Obras de Control de Inundaciones en los Ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Goascorán (II Fase)                        | P<br>E<br>D<br>% | 33,310.36        | 33,310.36<br>0.00<br>33,310.36<br>0.0 %                      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 33,310.36<br>0.00<br>33,310.36<br>0.0 %                      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                                | 33,310.36<br>0.00<br>33,310.36<br>0.0 %                        |
|               | 4646 | Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de Control de Inundaciones | P<br>E<br>D<br>% | 10,003.87        | 10,003.87<br>3,009.98<br>6,993.89<br>30.1 %                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 10,003.87<br>3,009.98<br>6,993.89<br>30.1 %                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                                | 10,003.87<br>3,009.98<br>6,993.89<br>30.1 %                    |
| PEIS          |      |                                                                                                                                   | P<br>E<br>D<br>% | 114,956,959.03   | 86,823,470.44<br>39,007,851.94<br>47,815,618.50<br>44.9 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                        | 86,823,470.44<br>39,007,851.94<br>47,815,618.50<br>44.9 %    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 %                                | 86,823,470.44<br>39,007,851.94<br>47,815,618.50<br>44.9 %      |
| TOTAL GENERAL |      |                                                                                                                                   | P<br>E<br>D<br>% | 1,230,804,578.44 | 478,210,331.91<br>366,486,600.15<br>111,723,731.76<br>76.6 % | 63,895,144.31<br>43,653,913.88<br>20,241,230.43<br>68.3 % | 6,142,258.79<br>816,395.64<br>5,325,863.15<br>13.3 % | 275,527,019.48<br>119,624,631.26<br>155,902,388.22<br>43.4 % | 195,671,449.81<br>152,053,774.76<br>43,617,675.05<br>77.7 % | 471,198,469.29<br>271,678,406.02<br>199,520,063.27<br>57.7 % | 1,019,446,204.30<br>682,635,315.69<br>336,810,888.61<br>67.0 % |

\* Los datos relativos del mes que se informa se actualizan durante los primeros 5 días hábiles del mes posterior a este.

\* P = Programado, E = Ejecutado, D = Diferencia de Ejecución

\* Cifras base devengado
