

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN Y CRÉDITO PÚBLICO



INFORME DE AVANCE DEL PAIP 2012 AL MES DE OCTUBRE

NOVIEMBRE 2012

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA **AL MES DE OCTUBRE DE 2012**

I. GENERALIDADES DEL PAIP TOTAL

Para el presente ejercicio fiscal, el PAIP vigente al mes de octubre asciende a \$1,247.0 millones, que equivale al 5.2% del PIB¹; reportando un incremento de \$4.2 millones, con respecto al PAIP vigente al mes de septiembre; debido a la modificación de los programas institucionales de FOMILENIO, MINED, MAG y MARN que incrementaron y FIDSL, MOP, MH y MIGOB que disminuyeron y a la incorporación de un proyecto de FOPROLYD. Dicho programa financia total o parcialmente la ejecución de 535 programas y/o proyectos.

Los \$1,247.0 millones programados incorporan \$724.7 millones para proyectos regulares, \$115.0 millones de recursos del Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS), \$5.2 millones de recursos post Tormenta IDA, \$7.8 millones de recursos por Depresión Tropical 12E, \$170.0 millones de provisiones 2011 y \$224.4 millones del FODES, como se indica en el siguiente cuadro, que además presenta el avance del PAIP al mes de octubre:

CUADRO No.1
PAIP 2012: CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA
(En millones de dólares y porcentajes)

PROGRAMA / PRESUPUESTO	Programado vigente anual	Programado a octubre	Ejecutado a octubre	% de Avance	COMPROMETIDO			% DE LO COMPROMETIDO RESPECTO A LO PROGRAMADO	NO COMPROMETIDO		
					TOTAL	EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE	PENDIENTE DE EJECUTAR		TOTAL	EN PROCESOS ADMINIST.	SIN INICIAR PROCESOS ADMINIST.
	1	2	3	4=(3/2)	5	6	7=5-6	8=5/1	9	10	11=9-10
PROYECTOS REGULARES	724.71	489.03	263.50	53.1	398.23	263.50	134.73	55.0	326.49	119.05	207.44
IDA	5.19	3.82	0.16	4.2	1.67	0.16	1.51	32.2	3.52	-	3.52
Depresión Tropical 12E	7.79	7.79	2.21	28.4	5.41	2.21	3.20	69.4	2.38	-	2.38
PROVISIONES 2011	169.97	157.75	126.53	80.2	169.97	126.53	43.44	100.0	-	-	-
PEIS	114.96	74.80	30.68	41.0	41.08	30.68	10.40	35.7	73.88	42.00	31.88
Subtotal	1,022.62	733.19	423.08	57.7	616.36	423.08	193.28	60.3	406.27	161.05	245.22
FODES	224.37	186.98	186.98	100.0	224.37	186.98	37.395	100.0	-	-	-
TOTAL	1,246.99	920.17	610.06	✓ 66.3	840.73	610.06	230.67	67.4	406.27	161.05	245.22


PROVISIONES 2011	Programado vigente anual	Programado a octubre	Ejecutado a octubre	% de Avance
	1	2	3	4=(3/2)
PROYECTOS REGULARES	117.92	112.12	86.63	77.3
IDA	8.22	7.96	7.00	87.9
PEIS	39.64	33.48	28.71	85.8
Depresión Tropical 12E	4.19	4.19	4.19	100.0
TOTAL	169.97	157.75	126.53	80.2

¹ PIB: US\$23,844.2 millones.

Del monto total del PAIP, al mes de octubre se programó ejecutar \$920.2 millones, de los cuales se ejecutaron \$610.1 millones, que representan el 66.3% de lo programado al mes y el 48.9% del programado anual.


En el siguiente gráfico se presenta un comparativo de la inversión programada/ejecutada durante enero - octubre de 2007 - 2012, período en el cual el mayor monto de inversión ejecutada es de \$610.1 millones, que corresponde al ejercicio 2012, siendo superior en \$158.9 millones al promedio (\$451.2 millones) de los 6 años.

Grafico No.1
INVERSION PROGRAMADA/EJECUTADA, ENERO - OCTUBRE 2007 - 2012
(En millones de \$)

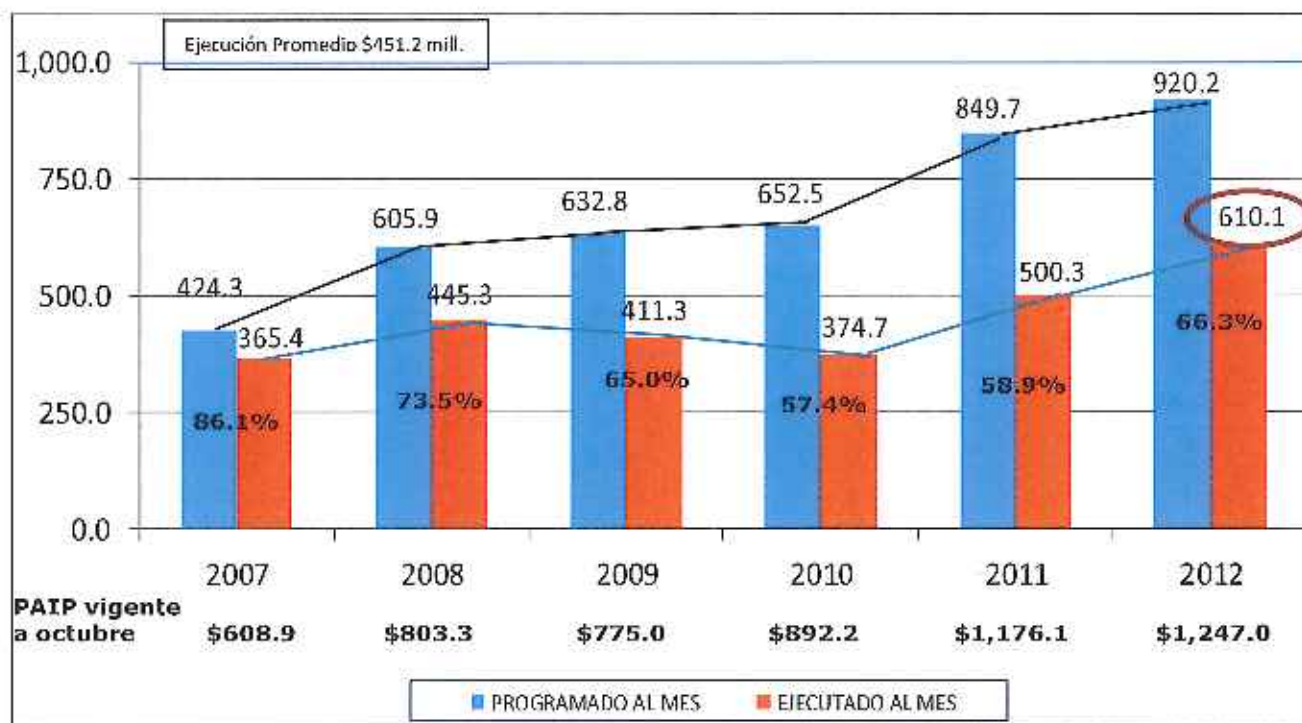

De los \$1,247.0 millones del PAIP vigente, al mes de octubre se ha comprometido el 67.4%, es decir \$840.7 millones, quedando pendientes de comprometer \$406.3 millones, (32.6%), de los cuales de acuerdo a lo registrado por las diferentes instituciones, \$161.1 millones están en procesos administrativos, y los restantes \$245.2 millones no han iniciado dichos procesos.

Grafico No.2
AVANCE EN EL USO DE LOS RECURSOS DEL PAIP A OCTUBRE 2012
(En millones de \$ y %)

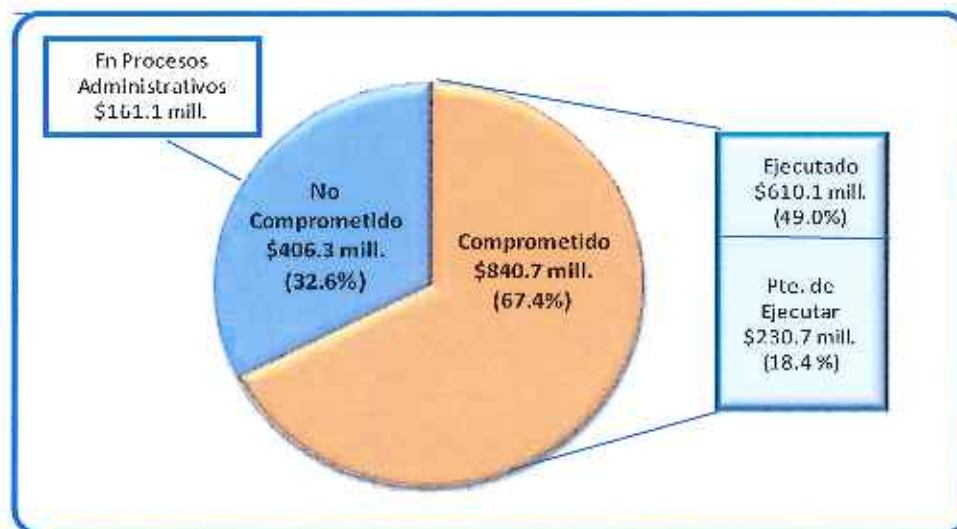

En los siguientes apartados del informe, se presenta la inversión programada/ejecutada, sin incluir la transferencia del FODES a las municipalidades, que al mes de octubre fue de \$187.0 millones.

II. COMPORTAMIENTO DEL PAIP 2012 SIN FODES AL MES DE OCTUBRE:


Sin FODES, el PAIP vigente al mes de octubre es de **\$1,022.6 millones**, que representa el 4.3% del PIB, de los cuales están comprometidos \$616.4 millones (60.3%), y ejecutados **\$423.1 millones**, que equivalen al 57.7% de lo programado al mes (\$733.2 millones). El monto programado al mes y no ejecutado es de **\$310.1 millones**, que corresponden a asignaciones del Presupuesto/2012, Tormenta IDA, PEIS, Depresión Tropical 12E y a Provisiones 2011.

Del total de recursos comprometidos (\$616.4 millones), las instituciones con los mayores montos y que representan el 86.0% de los mismos son: FOMILENIO \$120.0 millones (19.5%), MOP \$92.3 millones (15.0%), FISDL \$91.3 millones (14.8%), MINSAL \$72.9 millones (11.8%), FOVIAL \$45.9 millones (7.4%), CEL \$38.2 millones (6.2%), MINED \$35.5 millones (5.8%), y ANDA \$34.2 millones (5.5%).

Del monto ejecutado al mes de octubre que totaliza **\$423.1 millones**, \$263.5 millones (62.3%) corresponden a proyectos de la Ley de Presupuesto 2012, \$126.5 millones (29.9%) a provisiones 2011 (\$86.6 millones de proyectos regulares, \$7.0 millones de recursos IDA, \$28.7 millones del PEIS y \$4.2 millones de la Depresión Tropical 12E), \$30.7 millones (7.3%) al PEIS, \$2.2 millones (0.5%) a la Depresión Tropical 12E y \$0.2 millones a Tormenta IDA.

De los recursos pendientes de comprometer al mes de octubre por valor de **\$406.3 millones**, de acuerdo a lo manifestado por las diferentes instituciones **\$161.1 millones** se encuentran en procesos administrativos y **\$245.2 millones** sin iniciar procesos.

Gráfico No.3
AVANCE DEL USO DE LOS RECURSOS DEL PAIP, SIN FODES, A OCTUBRE 2012
(En millones de \$ y %)

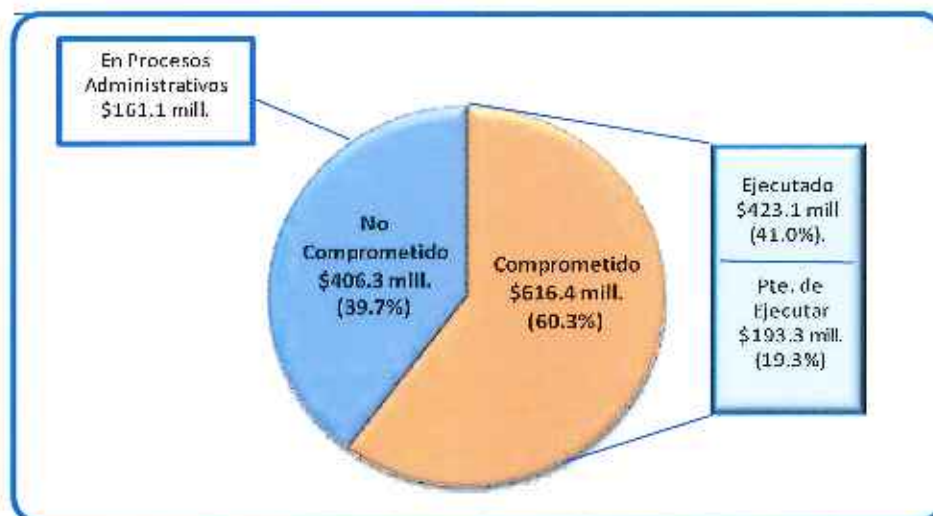

De los \$161.1 millones que se encuentran en procesos administrativos, \$52.3 millones son de MINSAL, \$29.2 millones de MOP, \$19.5 millones del MINED, \$14.7 millones de ANDA, \$10.4 millones de FISDL, \$9.4 millones de la CSJ y \$5.3 millones de CNR, que en conjunto representan el 87.4% del total; y del monto de \$161.1 millones, de acuerdo a lo registrado por las instituciones ejecutoras, se tiene que: \$19.0 millones (11.8%) están en Elaboración de Términos de Referencia o de Bases de Licitación, \$13.3 millones (8.3%) en Publicaciones, \$4.0 millones (2.5%) en Elaboración de Ofertas, \$13.4 millones (8.3%) en Apertura de Ofertas, \$46.7 millones (29.0%) en Evaluación de Ofertas, \$34.3 millones (21.3%) en Adjudicación, \$28.3 millones (17.6%) en Procesos de Contratación y \$2.1 millones (1.3%) Declarados Desiertos, conforme al siguiente detalle:


CUADRO No.2
PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR INSTITUCION
(En millones \$)

INSTITUCION	PROCESO ADMINISTRATIVO	MONTO
AL (\$0.6 MILL.)	Elaboración de Términos de Referencia	0.28
	Evaluación de Ofertas	0.18
	Adjudicación	0.15
ANDA (\$14.7 MILL.)	Elaboración de Términos de Referencia	0.78
	Elaboración Bases de Licitación	3.28
	Publicación	3.83
	Evaluación de Ofertas	2.06
	Adjudicación	3.34
ANSP - MJSP (\$0.5 MILL.)	Declaratoria de Desierto	1.45
	Publicación	0.18
CEPA (\$4.4 MILL.)	Evaluación de Ofertas	2.55
	Adjudicación	1.83
CI - MJSP (\$0.04 MILL.)	Elaboración de Términos de Referencia	0.02
	Evaluación de Ofertas	0.02
CNR (\$5.3 MILL.)	Elaboración Bases de Licitación	0.18
	Elaboración de Ofertas	1.21
	Evaluación de Ofertas	3.87
CSJ (\$9.4 MILL.)	Elaboración de Términos de Referencia	0.49
	Publicación	8.64
	Adjudicación	0.24
FISDL (\$10.4 MILL.)	Elaboración de Términos de Referencia	2.85
	Adjudicación	7.59
FONAVIPO (\$1.4 MILL.)	Declaratoria de Desierto	0.04
	Proceso de Contratación	1.32
FOPROLYD (\$0.2 MILL.)	Publicación	0.16
FOVIAL (\$0.7 MILL.)	Elaboración de Ofertas	0.19
	Adjudicación	0.50
FSV (\$0.02 MILL.)	Elaboración de Términos de Referencia	0.01
	Adjudicación	0.01
ISSS (\$0.2 MILL.)	Adjudicación	0.23
MAG (\$1.9 MILL.)	Elaboración de Términos de Referencia	0.01
	Elaboración Bases de Licitación	0.26
	Publicación	0.02
	Evaluación de Ofertas	0.51
	Adjudicación	0.30
	Proceso de Contratación	0.81
MARN (\$3.2 MILL.)	Elaboración Bases de Licitación	0.25
	Elaboración de Ofertas	1.84
	Evaluación de Ofertas	0.37
	Adjudicación	0.15
MIGOB (\$0.4 MILL.)	Proceso de Contratación	0.59
	Evaluación de Ofertas	0.37
MINED (\$19.5 MILL.)	Elaboración Bases de Licitación	0.50
	Publicación	0.15
	Evaluación de Ofertas	6.63
	Adjudicación	11.46
	Proceso de Contratación	0.76
MINSAL (\$52.3 MILL.)	Elaboración de Términos de Referencia	0.93
	Elaboración Bases de Licitación	1.62
	Elaboración de Ofertas	0.01
	Apertura de Ofertas	13.31
	Evaluación de Ofertas	17.72
	Adjudicación	8.26
	Declaratoria de Desierto	0.60
	Proceso de Contratación	9.89
MOP (\$29.2 MILL.)	Elaboración Bases de Licitación	4.58
	Elaboración de Ofertas	0.16
	Evaluación de Ofertas	11.12
	Proceso de Contratación	13.32
PNC - MJSP (\$0.3 MILL.)	Evaluación de Ofertas	0.33
Secr. de Cultura (\$0.5 MILL.)	Elaboración de Ofertas	0.52
Secr. de Incl. Soc. (\$1.1 MILL.)	Elaboración de Términos de Referencia	0.82
	Adjudicación	0.24
VMVDU (\$4.9 MILL.)	Elaboración de Términos de Referencia	0.21
	Elaboración Bases de Licitación	1.89
	Publicación	0.02
	Elaboración de Ofertas	0.03
	Apertura de Ofertas	0.09
	Evaluación de Ofertas	0.04
	Proceso de Contratación	1.67
TOTAL		161.1

III. AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION PUBLICA POR INSTITUCION, EXCLUYENDO FODES A OCTUBRE 2012.

De las 42 instituciones que tienen proyectos incluidos en el PAIP 2012, la ejecución financiera al mes de octubre es la siguiente: FOMILENIO \$115.7 millones, FISDL \$74.2 millones, MOP \$46.2 millones, MINSAL \$31.0 millones, CEL \$29.9 millones, MINED \$26.3 millones, ANDA \$21.4 millones, FOVIAL \$21.2 millones, FONAVIPO \$13.6 millones, PNC-MJSP \$12.0 millones, MAG \$8.9 millones, CNR \$3.6 millones, MARN \$2.9 millones, CI-MJSP \$2.8 millones, VMVDU \$2.2 millones, UES \$1.6 millones, ISSS \$1.5 millones, CEPA \$1.5 millones, FONAES \$0.95 millones, MTYPS \$0.8 millones, SE-MJSP \$0.7 millones, AL \$0.6 millones, MIREX \$0.5 millones, MH \$0.5 millones, DGCP-MSPJ \$0.5 millones, MIGOB \$0.4 millones, CSJ \$0.3 millones, ISNA \$0.3 millones, BOMBEROS - MIGOB \$0.2 millones, DC \$0.2 millones, ILEA \$0.2 millones, SIS \$0.2 millones, SEC. DE LA CULTURA \$0.1 millones, CENTA \$0.07 millones, ISDEMU \$0.04 millones, y CORSATUR \$0.02 millones, totalizando en su conjunto \$423.1 millones.

Gráfico No.4
INSTITUCIONES CON MAYOR INVERSION EJECUTADA A OCTUBRE
(En millones de \$)

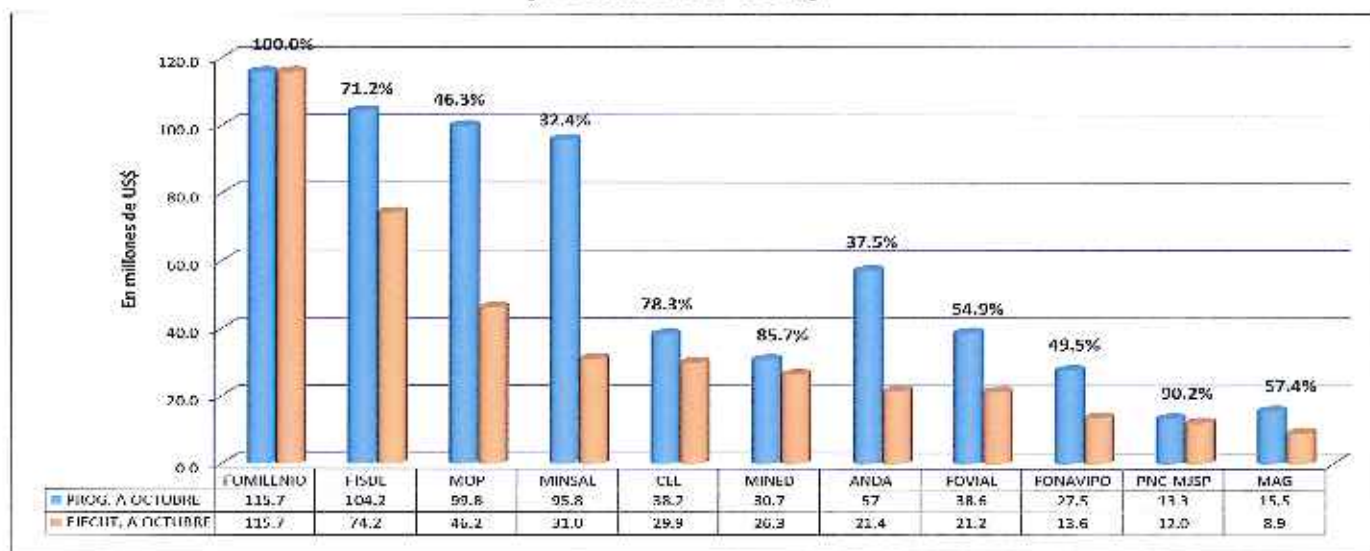

En el presente gráfico se reportan las principales ejecutoras del período y además se puede visualizar algunas de las instituciones con mayor inversión programada al mes de octubre y no ejecutada en su totalidad, cuyo monto asciende a \$310.1 millones, siendo las de mayor incidencia: MINSAL (\$64.8 millones), MOP (\$53.7 millones), ANDA (\$35.6 millones), FISDL (\$30.0 millones), FOVIAL (\$17.4 millones), CSJ (\$17.1 millones), FONAVIPO (\$13.9 millones), VMVDU (\$10.8 millones), CNR (\$10.5 millones), UES (\$10.2 millones), CEL (\$8.3 millones), MAG (\$6.5 millones), VMT (\$4.6 millones), MH (\$4.5 millones), y CI-MJSP (\$4.5 millones), que en conjunto totalizan \$292.4 millones y representan el 94.3% de la inversión programada y no ejecutada.

En el siguiente cuadro, se detalla por cada una de las instituciones ejecutoras, el número de proyectos, el monto de inversión programado y el avance financiero, montos de recursos comprometidos y los recursos asociados a proyectos en procesos administrativos registrados en el SAFI y SIIP por las ejecutoras, al mes de octubre.

Cuadro No.3
EJECUCION FINANCIERA DEL PAIP 2012 AL MES DE OCTUBRE, SIN FODES, POR INSTITUCION*
(En millones de dólares y porcentajes)

INSTITUCIONES	No. de Programas/ Proyectos	PROGRAMA VIGENTE ANUAL	PROGRANADO AL MES DE OCTUBRE	EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE	% DE AVANCE	COMPROMETIDO			% DE LO COMPROMETIDO RESPECTO A LO PROGRAMADO	PENDIENTE DE COMPROMETER		
		1	2	3	4=3/2	TOTAL	EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE	PENDIENTE DE EJECUTAR	8=5/1	TOTAL	EN PROCESOS ADMINIST.	SIN INICIAR PROCESOS ADMINIST.
		1	2	3	4=3/2	5	6	7=5-6	8=5/1	9	10	11=9-10
GOBIERNO CENTRAL	350	485.09	316.84	137.26	43.3	256.32	137.26	119.06	52.8	228.77	123.31	105.46
MOP	67	154.49	99.85	46.17	46.2	92.29	46.17	46.12	59.7	62.20	29.19	33.01
MINSAL	130	127.94	95.83	30.99	32.3	72.93	30.99	41.94	57.0	55.01	52.35	2.66
MINED	77	65.76	30.67	26.32	85.8	35.48	26.32	9.16	54.0	30.28	19.50	10.78
PHC - MJSP	4	19.76	13.27	11.98	90.3	13.41	11.98	1.43	67.9	6.35	0.33	6.01
CSJ	10	18.72	17.42	0.27	1.5	1.30	0.27	1.03	6.9	17.43	9.37	8.05
VMVDU	4	20.83	13.01	2.19	16.8	6.87	2.19	4.68	33.0	13.96	4.85	9.11
MAG	21	19.52	15.46	8.92	57.7	8.82	8.92	- 0.09	45.2	10.70	1.91	8.79
MH	7	12.32	4.99	0.53	10.7	2.75	0.53	2.22	22.3	9.57	-	9.57
CI - MJSP	1	9.04	7.32	2.81	38.4	8.47	2.81	5.65	93.7	0.57	0.05	0.53
MARN	5	7.75	5.36	2.85	53.2	3.49	2.85	0.64	45.0	4.26	3.20	1.05
ILEA	1	5.66	3.52	0.25	7.1	5.62	0.25	5.37	99.3	0.05	-	0.05
SEC. INC. SOCIAL	3	3.11	0.46	0.25	53.5	0.42	0.25	0.17	13.5	2.69	1.06	1.63
AL	1	1.38	1.32	0.64	48.5	0.78	0.64	0.14	56.5	0.61	0.61	-
MIGOB	4	1.37	0.75	0.43	57.4	0.63	0.43	0.20	46.0	0.74	0.37	0.36
SE - MJSP	1	1.13	0.99	0.65	65.8	0.99	0.65	0.34	87.6	0.14	-	0.14
MTYPS	3	0.77	0.77	0.76	98.7	0.77	0.76	0.01	100.0	-	-	-
MIREX	1	0.47	0.47	0.47	100.0	0.47	0.47	-	100.0	-	-	-
DGCP - MJSP	4	0.46	0.46	0.46	100.0	0.46	0.46	-	100.0	-	-	-
BOMBER - MIGOB	2	0.20	0.20	0.20	100.0	0.20	0.20	0.00	100.0	0.00	-	0.00
VMT	1	12.73	4.56	-	0.0	-	-	-	0.0	12.73	-	12.73
CONJUVE	1	0.90	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.90	-	0.90
SEC. DE CULTURA	2	0.79	0.15	0.12	83.3	0.19	0.12	0.06	24.1	0.60	0.52	0.08
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	79	226.19	172.72	102.76	59.5	147.99	102.76	45.22	65.4	78.20	17.09	61.11
FISDL	13	137.50	104.19	74.24	71.3	91.27	74.24	17.02	66.4	46.23	10.44	35.79
FOVIAL	26	51.58	38.59	21.19	54.9	45.88	21.19	24.69	89.9	5.70	0.69	5.01
CHR	1	16.45	14.10	3.63	25.7	3.81	3.63	0.17	23.2	12.64	5.26	7.39
UES	20	14.58	11.85	1.61	13.6	2.70	1.61	1.09	18.5	11.88	-	11.88
ISSS	8	3.68	2.47	1.49	60.3	3.44	1.49	1.95	93.5	0.24	0.23	0.01
ISTU	1	0.80	0.63	-	0.0	-	-	-	0.0	0.80	-	0.80
DC	1	0.49	0.40	0.21	53.1	0.41	0.21	0.20	83.7	0.08	-	0.08
ANSP-MJSP a/	2	0.51	0.01	0.00	9.7	0.03	0.00	0.03	5.9	0.48	0.48	0.00
ISNA	2	0.31	0.31	0.26	84.7	0.26	0.26	0.00	83.9	0.05	-	0.05
CORSATUR	1	0.10	0.02	0.02	114.3	0.03	0.02	0.01	30.0	0.07	-	0.07
CENTA	1	0.07	0.07	0.07	100.0	0.07	0.07	-	100.0	-	-	-
ISDEMU	3	0.13	0.09	0.04	41.5	0.09	0.04	0.05	69.2	0.04	-	0.04
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	77	131.68	97.89	52.74	53.9	74.19	52.74	21.45	56.3	57.50	19.11	38.39
ANDA	64	83.87	57.02	21.38	37.5	34.21	21.38	12.83	40.8	49.67	14.73	34.93
CEL	7	41.54	38.16	29.86	78.2	38.15	29.86	0.29	91.8	3.39	-	3.39
CEPA	6	6.27	2.71	1.50	55.5	1.83	1.50	0.33	29.2	4.44	4.38	0.06
OTRAS	28	179.66	145.74	130.31	89.4	137.86	130.31	7.55	76.7	41.80	1.54	40.26
FOMILENIO	13	145.88	115.74	115.75	100.0	120.03	115.75	4.29	82.3	25.85	-	25.85
FONAVIPO	11	30.84	27.47	13.62	49.6	16.87	13.62	3.25	54.7	13.98	1.36	12.62
FSV	1	1.51	1.11	-	-	-	-	-	0.0	1.51	0.03	1.49
FONAES	2	1.07	1.07	0.95	88.8	0.96	0.95	0.01	89.7	0.11	-	0.11
FOPROLYD a/	1	0.35	0.35	0.00	0.5	0.00	0.00	-	0.0	0.35	0.16	0.20
TOTAL	534	1,022.62	733.19	423.08	54.6	616.36	423.08	193.28	60.3	406.27	161.05	245.22

* Esta clasificación Institucional, obedece a la aplicación Informática del cubo SAFI.

a/ En ambos casos la ejecución es inferior a \$2.0 mli.


IV. AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION PUBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SIN FODES.

Clasificada por **Fuentes de Financiamiento**, la inversión ejecutada al mes de octubre se ha financiado en un 33.3% con recursos de donaciones, que fundamentalmente son fondos del FOMILENIO, 23.2% de desembolsos de préstamos externos, 33.4% con recursos de fondo general y el 10.0% restante con recursos propios, como se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

Cuadro No.4
SITUACION FINANCIERA DEL PAIP, SIN FODES, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En millones de dólares y porcentajes)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA VIGENTE A OCTUBRE/12	PROGRAMADO A OCTUBRE/12	EJECUTADO A OCTUBRE/12	% EJECUCION A OCTUBRE/12	% RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO	NO EJECUTADO DE LO PROGRAMADO A OCTUBRE/12
Fondo General	339.0	245.6	141.4	57.6	33.4	104.2
Recursos Propios	83.7	65.9	42.4	64.3	10.0	23.5
TOTAL INTERNO	422.7	311.5	183.8	59.0	43.4	127.7
Préstamos Externos	366.5	241.5	98.3	40.7	23.2	143.2
Donaciones	233.4	180.2	141.0	78.2	33.3	39.2
TOTAL EXTERNO	599.9	421.7	239.3	56.7	56.6	182.4
TOTAL	1,022.6	733.2	423.1	57.4	100.0	310.1

Gráfico No.5
AVANCE DEL PAIP, SIN FODES, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, A OCTUBRE 2012
(En millones de dólares)

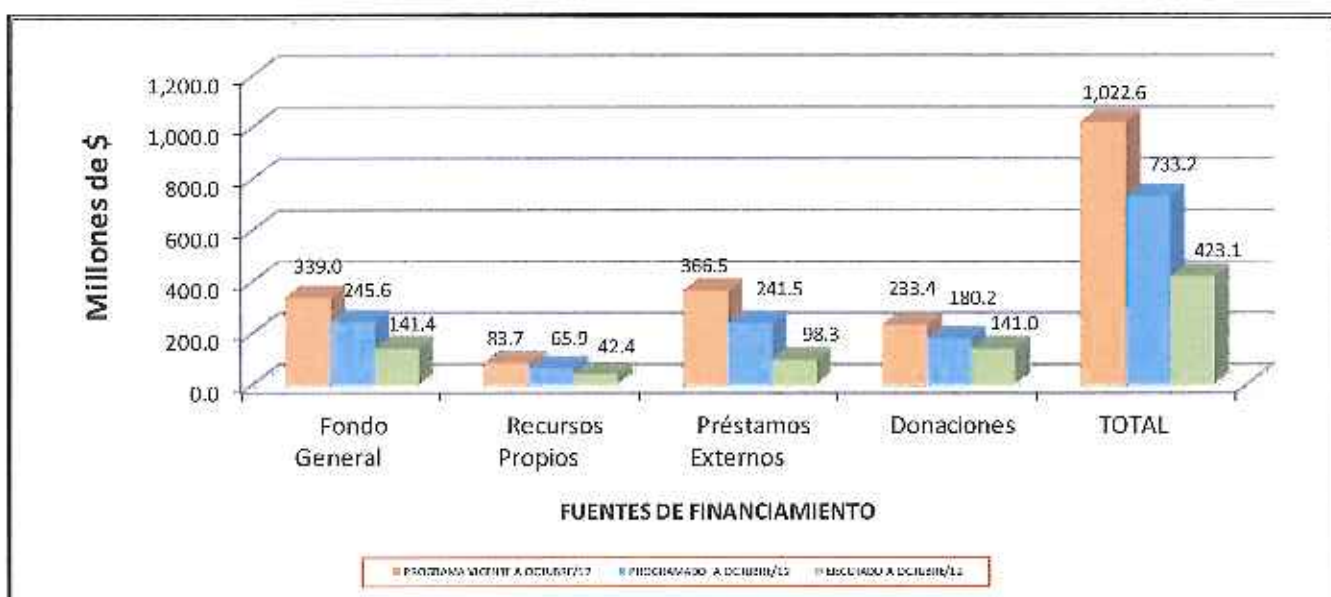


V. AVANCE DE LA INVERSION PUBLICA POR ESTRUCTURA DEL SPNF, SIN FODES.

De la inversión registrada al mes de octubre, el 32.4% es inversión en proyectos ejecutados por las instituciones del Gobierno Central, 24.3% de proyectos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales, entre las cuales destaca FISDL y FOVIAL; 12.5% de inversión de las Empresas Públicas no Financieras, principalmente ANDA, y 30.8% de otras entidades, que básicamente corresponde a proyectos de FOMILENIO; siendo importante que las diversas instituciones públicas realicen un mayor esfuerzo para elevar el nivel de la inversión y contribuir a dinamizar la economía; dado que en conjunto, el porcentaje de ejecución financiera de lo programado al mes de octubre equivale al 57.7%.

Cuadro No.5
SITUACION FINANCIERA DEL PAIP, SIN FODES, POR ESTRUCTURA DEL SPNF
(En Millones de dólares y porcentajes)

ESTRUCTURA	PROGRAMA VIGENTE A OCTUBRE/12	PROGRAMADO A OCTUBRE/12	EJECUTADO A OCTUBRE/12	% EJECUCION A OCTUBRE/12	% RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO	NO EJECUTADO DE LO PROGRAMADO A OCTUBRE/12
GOBIERNO CENTRAL	485.1	316.8	137.3	43.3	32.4	179.5
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	226.2	172.7	102.8	59.5	24.3	69.9
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	131.7	97.9	52.7	53.8	12.5	45.2
OTROS	179.6	145.8	130.3	89.4	30.8	15.5
TOTAL	1022.6	733.2	423.1	57.7	100.0	310.1

Gráfico No.6
AVANCE DEL PAIP, SIN FODES, POR ESTRUCTURA DEL SPNF, A OCTUBRE 2012
(En Millones de dólares)

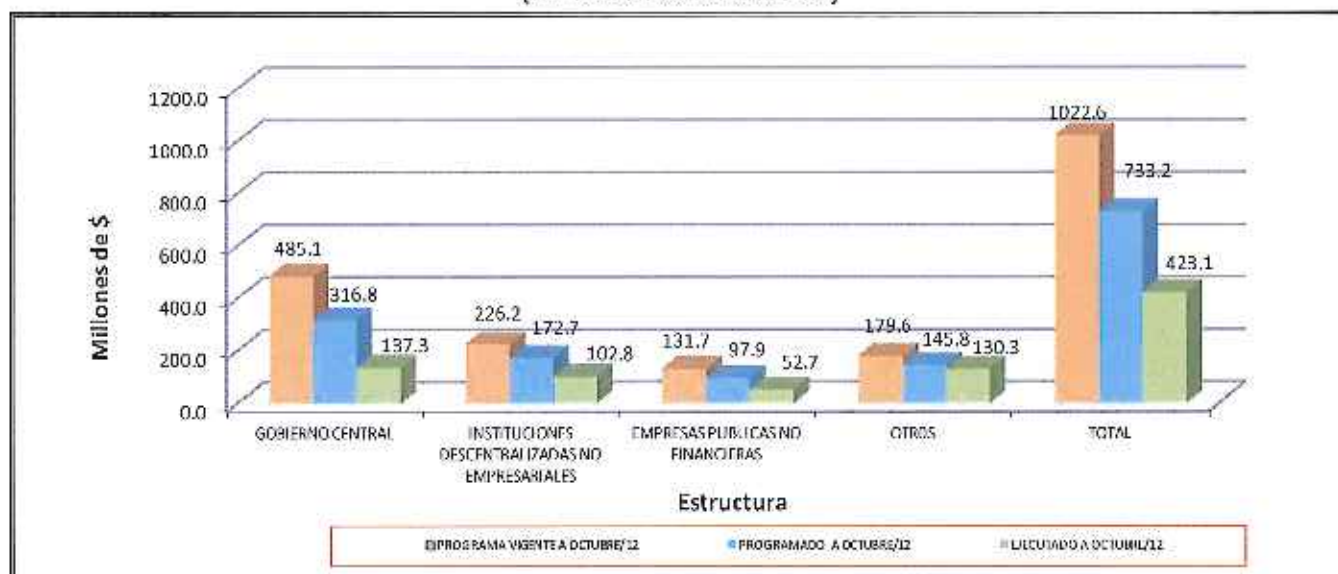


VI. AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION PUBLICA POR SECTOR DE ACTIVIDAD, SIN FODES.

A continuación se presenta el comportamiento de la inversión ejecutada a octubre 2012 por sector de actividad, de la cual al sector social corresponden \$247.2 millones, al sector económico \$158.8 millones, y el sector seguridad y justicia presenta una ejecución al mes de octubre de \$17.1 millones.

Cuadro No.6
SITUACION FINANCIERA DE LA INVERSION DEL SPNF, SIN FODES, POR SECTOR DE ACTIVIDAD
 (En millones de dólares y porcentajes)


SECTORES	PROGRAMA VIGENTE A OCTUBRE/12	PROGRAMADO A OCTUBRE/12	EJECUTADO A OCTUBRE/12	% EJECUCION A OCTUBRE/12	% RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO	NO EJECUTADO DE LO PROGRAMADO A OCTUBRE/12
SOCIAL	674.2	478.7	247.2	51.6	58.4	231.5
ECONOMICO	291.5	210.5	158.8	75.4	37.5	51.7
SEGURIDAD Y JUSTICIA	56.9	44.0	17.1	38.9	4.1	26.9
TOTAL	1022.6	733.2	423.1	57.7	100.0	310.1

Gráfico No.7
AVANCE DEL PAIP, SIN FODES, POR SECTOR DE ACTIVIDAD A OCTUBRE 2012
 (En millones de dólares)

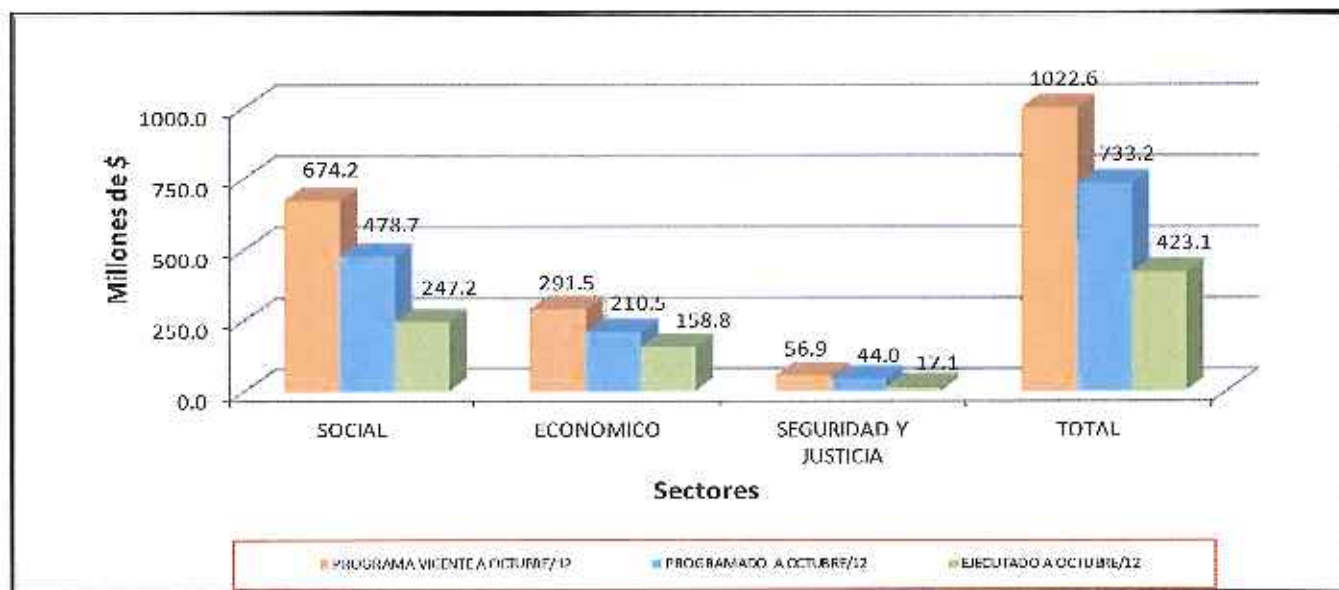


La inversión ejecutada a octubre 2012 en proyectos del **sector social** por valor de \$247.2 millones, se distribuyó en los siguientes subsectores: (i) Desarrollo Urbano y Comunal \$94.8 millones, (38.3%), (ii) Salud \$32.5 millones, (13.2%), (iii) Educación y Cultura \$28.0 millones, (11.3%), (iv) Agua Potable y Alcantarillado \$25.2 millones, (10.2%), (v) Asistencia y Previsión Social \$21.9 millones, (8.9%), (vi) Vivienda \$15.0 millones, (6.1%), (vii) Medio Ambiente \$3.8 millones (1.5%) y (viii) Multisectorial \$26.0 millones, (10.5%).

Gráfico No.8
COMPOSICION DE LA INVERSION DEL SECTOR SOCIAL, SIN FODES, POR SUBSECTOR A OCTUBRE 2012

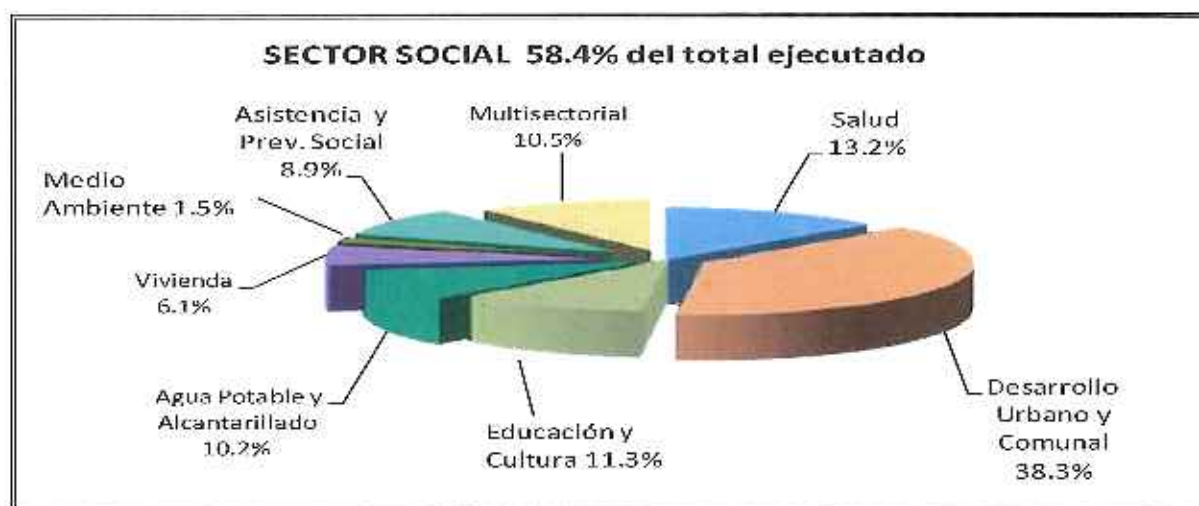

La inversión ejecutada al mes de octubre en proyectos del **Sector Económico** por valor de \$158.8 millones, se distribuyó en los siguientes subsectores: (i) Transporte y Almacenaje \$119.1 millones (75.0%), (ii) Energía \$30.5 millones (19.2%), (iii) Silvoagropecuario \$9.0 millones (5.7%) y (iv) Industria, Comercio y Turismo \$0.2 millones (0.1%).

Gráfico No.9
COMPOSICION DE LA INVERSION DEL SECTOR ECONOMICO, SIN FODES, POR SUBSECTOR A OCTUBRE 2012

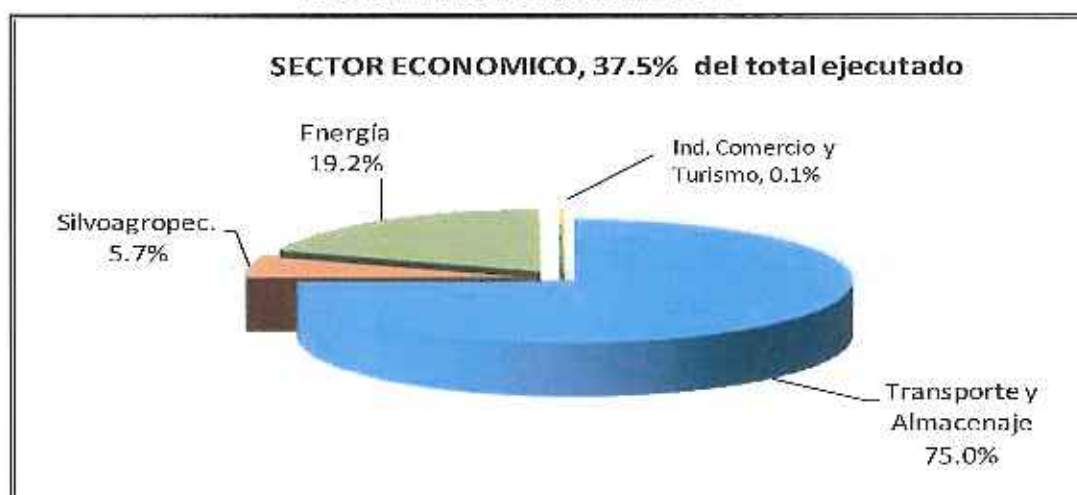

Para el **Sector Seguridad Pública y Justicia** la ejecución al mes de octubre fue de \$17.1 millones, de los cuales \$12.9 millones (75.4%) corresponden a proyectos del área de seguridad y \$4.2 millones (24.6%) al área de justicia.

Gráfico No.10
COMPOSICION DEL SECTOR SEGURIDAD Y JUSTICIA, SIN FODES A OCTUBRE 2012



VII. AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION EJECUTADA CON RECURSOS PEIS

El PAIP 2012 vigente al mes de octubre contiene proyectos del MINSAL, MOP, ANDA, MAG, MINED y UES, que se financian con recursos del Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS), por un monto de \$154.6 millones, (incluyen \$39.6 millones de provisiones 2011), de los cuales se programaron a octubre \$108.3 millones y se ejecutaron \$59.4 millones, representando el 54.8% de lo programado al mes.

Cuadro No.7
INVERSION FINANCIERA DE RECURSOS PEIS POR INSTITUCION
(En millones de dólares y porcentajes)

Instituciones	Programa vigente a octubre/12	Programado a octubre/12	Ejecutado a octubre/12	% de Ejecución a octubre/12	No ejecutado del programado a octubre/12
	1	2	3	4= (3/2)	5=(2-3)
MINSAL	69.4	49.4	20.1	40.7	29.3
MOP	33.2	19.7	12.9	6.5	6.8
ANDA	18.9	15.1	13.5	89.4	1.6
MAG	2.7	2.6	1.6	61.5	1.0
MINED	15.8	9.7	9.7	100.0	0.0
UES	14.6	11.8	1.6	13.6	10.2
TOTAL	154.6	108.3	59.4	54.8	48.9

VIII. AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION EJECUTADA CON RECURSOS POST TORMENTA IDA

El PAIP 2012 vigente a octubre incorpora \$13.4 millones de recursos destinados a financiar proyectos por daños de la Tormenta IDA, (incluye \$8.2 millones de provisiones 2011), de los cuales se han ejecutado \$7.2 millones, equivalente al 61.0% del monto de \$11.8 millones programado al mes, como se muestra a continuación:

Cuadro No.8
INVERSION FINANCIERA DE RECURSOS POST TORMENTA IDA POR INSTITUCION
(En millones de dólares y porcentajes)

Instituciones	Programa vigente a octubre/12	Programado a octubre/12	Ejecutado a octubre/12	% de Ejecución a octubre/12	No ejecutado del programado a octubre/12
	1	2	3	4= (3/2)	5=(2-3)
MOP	2.0	2.0	1.8	90.0	0.2
FOVIAL	3.3	1.8	1.7	94.4	0.1
MINSAL	1.3	1.3	0.5	38.5	0.8
MARN	0.7	0.7	0.7	100.0	0.0
FONAVIPO	3.6	3.5	0.2	5.7	3.3
MIGOB	0.4	0.4	0.4	100.0	0.0
MAG	0.2	0.2	0.2	100.0	0.0
CENTA	0.06	0.06	0.06	100.0	0.0
CEPA	1.4	1.4	1.2	85.7	0.2
MINED	0.2	0.2	0.2	100.0	0.0
BOMBER - MIGOB	0.2	0.2	0.2	100.0	0.0
TOTAL	13.4	11.8	7.2	61.0	4.6

IX. ALGUNOS PROYECTOS FINALIZADOS FISICAMENTE AL MES DE OCTUBRE/2012

A continuación se presentan algunos proyectos finalizados físicamente al mes de octubre:

Cuadro No.9
PROYECTOS FINALIZADOS FISICAMENTE AL MES DE OCTUBRE

INSTITUCION	NOMBRE DEL PROYECTO
FISDL	Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana (FISDL V): 1 proyecto finalizado: "Introducción de agua potable a Caserío El Caragal, Cantón Santa Bárbara, Jutiapa, Cabañas".
FISDL	Programa Sistema de Protección Social Universal: 1 proyecto finalizado: "Electrificación en varios Caseríos del Municipio de Santa Clara, Santa Clara, San Vicente".

**Programa Desarrollo Local y Gobernanza
Municipal (FSDL IV)**



**Programa Sistema de Protección
Social Universal**



A continuación se presenta el detalle de los proyectos que conforman el PAIP 2012, agrupados por Institución Ejecutora.



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
GOBIERNO CENTRAL						
	MOP	67	154,491,461.67	99,847,478.87	46,174,512.16	46.25
3737	APERTURA BOULEVARD DIEGO DE HOLGUIN-SANTA TECLA TRAMO II		44,862,335.56	24,913,602.11	17,394,619.27	69.87
5567	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NTE DE EL SALVADOR. MANTTO DE LA CARRETERA CA03 TRAMO 2A: NVA CONCEPCION CHALATENANGO, RUTA CA03E TRAMO: CA04N (DV AMAYO) - CHALATENANGO, DEPTO DE CHALATENANGO		13,751,760.00	7,481,625.00	-	0.00
5098	PROGRAMA OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS		13,319,946.00	10,609,466.00	-	0.00
4529	Mejoramiento de Camino Rural LIB16S Tramo LIB22S - Tomanique, La Libertad		8,178,351.56	5,012,441.41	2,313,342.24	46.15
5741	PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD EN LA CUENCA BAJA DEL RIO LEMPA, MUNICIPIOS DE TECOLUCA, BERLIN Y JIQUILISCO, DEPARTAMENTOS DE SAN VICENTE Y USulután		7,653,901.00	7,653,901.00	2,212,834.62	28.91
4532	Mejoramiento de Camino Rural LIB18N: Tramo LIB22S - Chiltiupan, La Libertad		6,262,138.81	4,070,390.23	1,878,641.64	46.15
5566	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NTE DE EL SALVADOR. MANTTO DE LA CARRETERA CA03 TRAMO 2A: NVA CONCEPCION, CHALATENANGO, RUTA CA03W TRAMO: CA04N (DV AMAYO)- NVA CONCEPCION, DEPTO DE CHALATENANGO		6,099,920.00	2,121,160.00	-	0.00
5457	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO CHA25N, TRAMO: NUEVA CONCEPCION - LD. LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO		5,724,110.00	521,935.00	-	0.00
5458	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO LIB22S: ET. LIB05W (DV. COMASAGUA) - DV. LIB18S (CHILTUPAN), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		5,291,402.00	5,010,157.63	-	0.00
3091	CONSTRUCCION BY PASS EN LA CIUDAD DE USULUTAN		4,482,492.73	4,482,492.73	4,012,204.80	89.51
4038	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AHU16S TRAMO: APAHECA - QUEZALAPA - HACIA SAN PEDRO PUXTLA, APAHECA, AHUACHAPAN		4,144,929.03	0.00	1,243,478.71	-
4530	Mejoramiento de Camino Rural LIB19N Tramo LIB22S - Jaysaque, La Libertad		3,874,886.67	2,715,680.51	3,542,191.96	130.43
5463	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO LIB31N, TRAMO: SAN PABLO TACACHICO - CANTON SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.		3,597,758.46	2,364,953.46	-	0.00
5652	RECONSTRUCCION DE PUENTE ATEOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN CAUCE DEL RIO TALNIQUE, RUTA CA08W MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		2,949,273.66	2,949,273.66	2,949,273.65	100.00
4531	Ampliación de un Tramo del Camino Terciario LIB05W: Tramo CA04S-LIB15S. (Desvío a Comasagua), La Libertad		2,403,282.55	1,386,247.29	-	0.00
3603	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAM28N, TRAMO: CHAPELTIQUE - SESORI, SAN MIGUEL		1,957,368.69	1,957,368.69	995,590.65	50.86
5008	REPARACION Y REFORZAMIENTO DE PUENTES TULE (KM 45.48) Y COLIMA (KM 47.45), CARRETERA TRONCAL DEL NORTE (CA-1N), MUNICIPIO DE EL PATSAL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		1,837,979.84	1,837,979.84	1,384,195.68	75.31
4040	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO: COMASAGUA HACIA BELLO HORIZONTE, LA LIBERTAD		1,519,393.08	-	455,817.92	-
5633	RECONSTRUCCION DE PUENTES CUITIQUE, AZAMBIO Y BOVEDA ENTRADA A CHALATENANGO, RUTA CA03 TRAMO: DVTO AMAYO - CHALATENANGO, MUNICIPIOS DE SANTA RITA Y CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO		1,372,210.00	1,257,620.00	-	0.00
5654	CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION SOBRE EL RIO COLON Y REHABILITACION DE CALLE QUE CONDUCE DESDE LA INTERSEC. DE LA CARRETERA CA08W (KM. 29½) HACIA HDA. LAS SEISCIENTAS, CTÓN ENTRE RÍOS, MUNICIPIO DE COLON, DEPTO. DE LA LIBERTAD		1,235,037.51	1,235,037.51	1,235,037.51	100.00
4563	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MITIGACIÓN CÁRCAVAS DE JARDINES DE SAN BARTOLO (1 PRINCIPAL Y 2 SECUNDARIAS) ILOPANGO, SAN SALVADOR.		983,543.47	978,726.82	768,803.00	78.55
5511	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369		925,835.00	925,835.00	219,055.01	23.66
5459	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO SAV29S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE.		868,246.00	-	-	-
4624	CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN COLONIA LAS MARGARITAS, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR		775,000.00	581,250.00	-	0.00



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE (MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
5351	Reconstrucción de Obras de Protección y de Mitigación en Quebrada Chilismuya, Av. Washington, Colonia Ciudad Satélite, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador		730,016.00	496,730.73	208,292.47	41.93
4557	OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUD EN COMUNIDAD EL TRIUNFO CONCEPCIÓN DE ATACO, AHUACHAPÁN		720,672.70	720,672.70	720,672.70	100.00
1535	Rehabilitación de la Carretera CIA07E-CIA09S, Tramo del EL CHA08E-Arcatao, Chalatenango		654,887.52	654,887.52	654,887.52	100.00
4562	OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁNCERA COLONIA LIANO VERDE, (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILIOPANGO, SAN SALVADOR		644,707.72	634,707.74	95,855.02	15.10
5411	Mejoramiento Caminos Vecinal, Tramo: La Laguna-Canton Quevilas ET-CHA13N (Dulce Nombre de María-San Fernando) Departamento de Chalatenango.		589,156.29	589,156.29	412,408.50	70.00
4558	MUROS DE CONTENCIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LUVIAS COMUNIDAD EL TRIUNFO SAN JULIAN, SONSONATE		580,000.00	580,000.00	580,000.00	100.00
5378	Construcción de Bóveda y Muro de Contención del Parque Central de Soyapango, San Salvador.		545,572.29	545,572.29	541,458.43	99.25
5655	CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE QUEBRADA LA LECHUZA, ALEDAÑO AL PARQUEO DE LA UDEF (VMOP), MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		491,854.00	347,728.38	192,280.12	55.30
5400	OBRAS DE MITIGACION EN ZONA DE CARCABA DE URBANIZACION LAS VICTORIAS, SOYAPANGO, SAN SALVADOR		476,327.32	476,327.32	476,327.32	100.00
5404	Mejoramiento de Caminos Rurales en los Municipios de Santa Elena, Jucuaran, Concepción Batres y San Buenaventura, Departamento de Usulután.		457,249.90	457,249.90	385,045.42	84.21
5681	Rehabilitación de calle entre el desvío de Cantón Guarjila hacia Municipio Las Vueltas, Departamento de Chalatenango		400,000.00	400,000.00	12,595.94	3.15
5682	Rehabilitación de calle entre Caserio El Mozote, Cantón La Guacamaya, Colonia Altamiro y Comunidad El Barrial del Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán		400,000.00	400,000.00	4,098.76	1.02
4559	PROYECTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A FAMILIAS EN ZONAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD NUEVO ISRAEL, SAN SALVADOR		305,839.09	305,839.09	-	0.00
5684	Pavimentación de Calle entre Cantón Los Lagartos, Municipio de San Julián hacia el Cantón El Sunza, Municipio de Izalco, en el Departamento de Sonsonate.		303,570.00	303,570.00	11,826.95	3.90
4641	OBRAS DE MITIGACION EN ZONA DE QUEBRADA LA LECHUZA, ALEDAÑO AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SAN SALVADOR		285,936.10	285,936.10	45,972.38	16.08
5623	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2067		257,415.00	182,490.00	10,185.00	5.58
4565	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN 8a - 10a. Y CALLE PARAGUAY, SAN SALVADOR		243,055.31	243,055.31	-	0.00
5410	Mejoramiento de Calles entre la 11 Calle Oriente y Calle a San Jorge, Municipio de San Rafael, Departamento de San Miguel		242,329.15	242,329.15	214,302.84	88.47
5109	Pavimentación de Calles en el Municipio y Departamento de Santa Ana.		230,505.83	230,505.83	218,200.59	94.66
5688	Mejoramiento de calle entre el desvío Caserio Camalote, Municipio El Carrizal hacia carretera CHA06N (La Montañona); Municipio de La Laguna, en el Departamento de Chalatenango.		200,000.00	200,000.00	10,282.15	5.14
5690	Mejoramiento de calle entre los Municipios de San Rafael Oriente y San Jorge, Departamento de San Miguel.		200,000.00	200,000.00	-	0.00
5743	Construcción de Obras de Protección del Puente La Chapina en el Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate.		160,615.00	103,550.00	-	0.00
5412	Mejoramiento del camino que conduce al Caserio Los Pérez del Ctn. Texipulco, Camino Vecinal Caserio Los Martínez del mismo Ctn. y al Camino Vecinal La Joya del Ctn. La Concepción, todos Jurisdicción de San Pedro Puxtla del Dpto. de Ahuachapán		150,000.00	150,000.00	149,999.98	100.00
5337	Construcción de Obras para Mitigación en Quebrada Arrenal Tutunchapa, Colonia Santa Eugenia, Barrio La Esperanza, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador		140,000.00	140,000.00	140,000.00	100.00
5653	RECONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES S/ RIO COPAPAYO, RUTA CA:08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD - DIVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.		132,577.00	132,577.00	-	0.00
5330	Construcción de Obras de Mitigación en Urbanización La Campiña 2000, Municipio de Cuscatancingo, San Salvador		131,164.60	131,164.60	131,164.60	100.00



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE (MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
5320	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN AGUAS ABAJO DEL PUENTE No. 2, ARENAL SECO, NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.		96,510.50	96,510.50	96,540.50	100.00
5685	Construcción de Empedrado y Fraguado de calle San Martín, Municipio Guaymango, Ahuachapán		80,000.00	80,000.00	16,316.22	20.40
5687	Construcción de Empedrado y Fraguado de calle en el Municipio de San Lorenzo, Ahuachapán		80,000.00	80,000.00	9,780.14	12.23
5413	Mejoramiento Calles en la Colonia San Joaquín, Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador.		69,650.45	69,650.45	69,650.45	100.00
5345	Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Reparto El Carmen, Soyapango, San Salvador		59,357.76	59,357.76	58,016.43	97.79
4630	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MURO DE RETENCIÓN EN URBANIZACIÓN ALTOS DEL BOULEVARD, SAN SALVADOR		57,518.70	57,518.70	74,186.63	42.05
5686	Rehabilitación de calles en los Cantones Calzontes Arriba y Potrero Grande, Municipio de Santa Ana, Santa Ana.		52,000.00	52,000.00	6,960.70	13.39
4566	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DEL CENTRO DE CONFERENCIAS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES (EX FERIA INTERNACIONAL)		48,843.02	14,087.79	-	0.00
4564	CONSTRUCCIÓN DE MUROS GUARDANIVELES Y REPARACIÓN DE MURO GUARDANIVEL EN RÍO LAS CAÑAS ILOPANGO, SAN SALVADOR		48,390.02	-	-	-
4626	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DE CASA PRESIDENCIAL		46,983.14	18,704.19	-	0.00
5407	Reparación de Calles en el Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador		27,201.65	27,201.65	27,201.65	100.00
5004	CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RÍO LEMPA (KM. 75.5 LIB31R), LA LIBERTAD - CHALATENANGO		26,427.59	26,427.59	-	0.00
1506	AMPLIACION DE ALAMEDA JUAN PABLO II E/ 75 AV. NORTE Y AV. MASFERRER, SAN SALVADOR.		23,917.00	23,917.00	23,916.89	100.00
5406	Mejoramiento de calles en Colonia Concepción, en el Municipio y Departamento de San Vicente.		19,999.40	19,999.40	19,999.40	100.00
3180	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOIF 1556		880.00	880.00	880.00	100.00
4642	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LUVIAS CON SU DESCARGA EN COLONIA EL MATAZANO, ILOPANGO, SAN SALVADOR		100.00	-	-	-
4639	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO SAV20S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA ILIA, TECOLUCA, SAN VICENTE		100.00	-	-	-
MINSAL		130	127,942,083.67	95,828,779.18	30,990,612.72	32.34
5131	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR		30,643,387.09	27,658,446.09	3,356,944.40	12.14
5128	Programa Integrado de Salud		26,644,077.29	17,505,076.59	6,842,691.48	39.09
401	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION		13,691,149.77	3,672,982.25	216,230.79	5.89
4657	Programa de Extensión de Cobertura en la Zona Rural (período 2009-2011)		8,786,918.56	7,254,653.32	7,981,931.44	110.02
4651	Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"		7,871,430.23	6,587,222.24	443,886.08	6.74
4656	Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"		5,847,945.74	4,898,904.88	1,286,117.41	26.25
4653	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"		4,505,476.67	2,118,351.14	1,494,538.79	70.55
4651	Apoyo al Primer Nivel de Atención y Hospitales del MSPAS.		2,959,641.60	2,529,469.95	1,461,553.86	57.78
4655	Remodelación y Equipamiento de la Tercera Planta del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales		2,891,955.00	1,618,775.00	75,145.00	4.64
4890	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La Libertad, La Libertad		1,105,409.83	1,105,409.83	353,600.27	31.99
4908	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás Pineda Martínez, Santa Ana		964,895.25	884,855.20	2,316.50	0.76
4853	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martín, San Salvador		819,520.30	719,502.06	36,072.90	5.01



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE (MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
4836	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Ayutlaxtepec, San Salvador		660,504.25	421,960.00	-	0.00
4916	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Candelaria, Oaxaca		505,522.25	484,556.95	18,652.53	3.85
4058	Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Red de Establecimientos de Salud.		502,807.01	502,807.01	490,667.43	97.59
4887	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Ciudad Arco, La Libertad		497,960.25	447,350.00	15,594.00	3.53
4938	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guadalupe, San Vicente		462,313.70	462,313.70	279,788.11	60.52
4907	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Barbara, Santa Ana		445,000.00	429,406.00	-	0.00
4924	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Oaxaca		416,384.50	209,395.75	310.75	0.15
4911	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Nahuizalco, Sonsonate		435,000.50	431,610.50	9,814.27	2.27
4913	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Ahuachapán, Ahuachapán		435,000.25	363,780.05	54,267.63	14.97
4910	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio, San Antonio del Monte, Sonsonate		435,000.25	264,971.66	-	0.00
4859	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Bobadilla, San Mateo, La Unión		435,000.25	347,785.58	308,817.06	90.09
4862	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Carlos, La Unión		435,000.25	390,974.98	-	0.00
4866	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las Marias, Chimalameca, San Miguel		435,000.25	364,069.00	15,594.00	4.28
4927	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guacotecl, Cabañas		435,000.25	268,605.07	15,594.00	5.40
4876	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Usulután, Usulután		435,000.00	291,594.10	15,594.00	5.35
3345	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CHALATENANGO		435,000.00	394,085.16	209,447.40	53.15
3346	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA		434,726.25	397,042.48	15,594.00	3.93
4867	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Uruapan, San Miguel		431,095.38	431,095.38	327,458.20	75.96
4894	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana		420,500.25	371,013.06	17,469.80	4.71
4861	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Faro, Chichagua, La Unión		405,494.42	405,494.42	290,391.40	71.61
4874	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Rafael, San Miguel		403,382.93	383,352.44	24,401.01	6.37
4884	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango		400,000.25	348,915.80	-	0.00
4891	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Mateo, La Libertad		353,957.70	353,957.70	263,612.62	74.48
4893	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Tamanique, La Libertad		350,000.25	350,000.25	237,046.35	67.73
4850	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador		341,158.39	338,260.49	28,772.19	8.51
4858	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucía, Tlapano, San Salvador		314,654.65	311,714.65	3,356.40	1.08
4860	Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud El Espino, Jucuarán, Usulután		309,193.25	309,193.25	-	0.00
4897	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana		309,183.70	309,183.70	260,723.03	84.33
4912	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Salazar, Sonsonate		307,938.01	244,864.40	18,136.50	7.41
4878	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután		300,593.19	300,593.19	283,456.10	94.30
4660	Remodelación y equipamiento del Hospital Nacional de Chihuahua		280,356.88	280,356.88	463,419.23	165.30



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
4885	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Arrascaes, Nueva Concepción, Chalatenango		265,500.25	223,471.99	2,034.00	0.91
4906	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Lucía, Santa Ana		250,500.25	250,500.25	169,833.40	75.78
4917	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán		250,500.25	250,500.25	193,120.89	77.09
4889	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad		250,500.00	250,500.00	190,785.26	76.16
4839	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes, San Salvador		249,944.90	249,944.90	3,172.50	1.39
4852	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepecque, San Salvador		241,026.15	238,314.15	1,881.90	0.79
4863	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Playa, La Unión		238,700.00	238,700.00	116,372.40	48.75
4864	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Llano los Palos, Conchagua, La Unión		222,000.50	210,525.16	3,277.00	1.56
4879	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud California, Usulután		222,000.25	222,000.25	-	0.00
4868	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel		220,906.70	220,906.70	163,274.65	73.91
4926	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Sensuntepeque, Cabañas		217,376.00	217,376.00	152,729.00	70.26
4898	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa Ana		197,986.72	197,986.72	126,245.30	63.78
4931	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyulitán, La Paz		197,335.29	197,335.29	151,828.68	76.94
4920	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de Concepción, Cuscatlán		196,489.45	196,489.45	136,788.17	69.62
4904	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Sebastian Salitrillo, Santa Ana		181,331.11	181,331.11	143,550.97	79.17
4903	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Juan las Minas, Metapán, Santa Ana		176,609.61	176,609.61	139,765.60	79.14
4905	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana		173,679.89	173,679.89	116,430.36	67.04
4929	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilobasco, Cabañas		167,906.45	167,906.45	65,769.61	39.17
4932	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Mercedes La Ceiba, La Paz		167,000.75	133,780.75	-	0.00
4919	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de El Carmen, Cuscatlán		167,000.25	73,790.05	-	0.00
4892	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad		166,230.61	166,230.61	116,072.83	69.83
4936	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Rafael Obrajuelo, La Paz		164,457.50	164,457.50	120,421.53	73.22
4935	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Juan Talpa, La Paz		145,065.93	123,819.56	2,881.50	2.33
4900	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Congo, Santa Ana		142,684.96	142,684.96	115,131.35	80.90
4928	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco del Monte, Ilobasco, Cabañas		141,406.25	141,406.25	7,881.50	2.04
4937	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitán, San Vicente		138,478.21	138,478.21	58,347.88	42.14
4881	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Cruz, Usulután		135,169.75	106,745.80	-	0.00
4885	Ampliación ,Equipamiento Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Hicho, El Carmen, La Unión		134,726.25	134,726.25	95,251.82	70.70
4873	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Silva, San Miguel		128,621.25	104,199.85	-	0.00
4930	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Juliapa, Cabañas		125,606.50	125,606.50	51,654.63	41.12



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
4872	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Milagro de la Paz, San Miguel		125,234.25	83,826.85	-	0.00
4909	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio Pajonal, Santa Ana		113,530.02	113,530.02	84,461.58	74.40
4916	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Chinamas, Ahuachapán		112,632.80	112,632.80	87,736.59	77.90
4882	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Dorado, Chalatenango		105,395.00	50,000.00	-	0.00
4923	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Ramon, Cuscatlán		103,127.88	103,127.88	58,239.98	56.47
4860	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Carmen, La Unión		100,000.00	100,000.00	-	0.00
4914	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Lorenzo, Ahuachapán		89,199.93	89,199.93	61,314.60	68.74
4901	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Belen Guitán, Metapán, Santa Ana		89,056.33	89,056.33	65,847.15	73.94
4915	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Jose Naranjo, Jujutla, Ahuachapán		87,656.10	87,656.10	60,149.37	68.62
4843	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilaes, San Salvador		85,692.17	85,692.17	74,313.17	86.72
4922	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Jose Guayabal, Cuscatlán		83,636.80	83,636.80	17,894.70	21.40
4837	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador		80,775.04	80,775.04	59,871.43	74.12
4902	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Jose Ingenio, Metapán, Santa Ana		75,000.25	75,000.25	-	0.00
4844	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador		72,302.94	72,302.94	60,936.02	84.31
4934	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz		71,399.82	71,399.82	61,117.34	85.60
4659	Remodelación y equipamiento del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales		62,761.54	62,761.54	-	0.00
4855	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Paisnal, San Salvador		60,500.25	60,500.25	-	0.00
4809	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Comacaran, San Miguel		55,840.28	55,840.28	40,010.18	71.65
4851	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Tinacatepeque, San Salvador		55,758.68	55,758.68	18,608.69	33.37
4870	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lolotique, San Miguel		53,137.02	53,137.02	48,041.44	90.41
4838	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Monserrat, San Salvador		51,826.19	43,616.89	42,712.65	97.93
4877	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Triunfo, Usulután		50,601.99	50,601.99	40,147.19	79.34
4840	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador		50,074.96	46,595.06	31,379.90	67.35
4933	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucia Orcoyo, Olocuilta, La Paz		50,000.50	50,000.50	-	0.00
4875	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Primavera, El Tránsito, San Miguel		49,135.47	49,135.47	34,507.02	70.23
4921	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Pedro Perulapán, Cuscatlán		49,040.00	49,040.00	-	0.00
4841	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador		48,691.31	41,950.58	37,203.73	88.68
4925	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Perulapia, Cuscatlán		48,390.75	48,390.75	-	0.00
4886	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Azacualpa, Chalatenango		48,320.15	48,320.15	37,053.17	76.68
4856	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador		47,687.60	47,687.60	2,961.35	6.21



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
4846	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Villa Marióna, Cuscatancingo, San Salvador		47,369.56	47,369.56	19,599.29	41.38
4845	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Popollan, Atepe, San Salvador		46,770.50	46,770.50	27,889.23	59.63
4842	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Barrios, San Salvador		45,486.88	45,486.88	37,430.31	82.29
4883	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Palma, Chalatenango		42,679.34	42,679.34	26,643.39	62.43
4854	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Guazapa, San Salvador		38,170.64	38,170.64	19,012.15	49.81
4849	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Marcos, San Salvador		38,084.63	38,084.63	13,760.07	36.13
4857	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador		37,201.46	37,201.46	20,772.17	55.70
5124	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD SAN LUIS TALPA, LA PAZ.		36,514.39	36,514.39	36,514.39	100.00
4871	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Cuco, Chirilagua, San Miguel		35,508.00	35,508.00	-	0.00
4847	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Ciudad Delgado, San Salvador		35,234.25	35,234.25	-	0.00
4888	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Manuel Gallardo, Colón, La Libertad		35,000.25	35,000.25	-	0.00
4895	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Palmar, Santa Ana		28,879.11	28,879.11	28,879.11	100.00
4899	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Sabancas, Chalchuapa, Santa Ana		25,000.25	25,000.25	-	0.00
4896	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Planes de la Laguna, Santa Ana		15,500.00	15,500.00	-	0.00
4848	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador		13,103.68	13,103.68	3,382.39	25.81
5179	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD VERAPAZ, SAN VICENTE		11,562.35	11,562.35	11,562.35	100.00
5334	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA CANOA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USulután		9,256.25	9,256.25	9,256.25	100.00
5333	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SISIGUAYO POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USulután		6,802.10	6,802.10	6,802.10	100.00
5335	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NUEVO AMANECER POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USulután.		6,588.25	6,588.25	6,588.25	100.00
5332	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NUEVA GRANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USulután		5,650.75	5,650.75	5,650.75	100.00
5112	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD APOPA, SAN SALVADOR		5,352.20	5,352.20	5,352.20	100.00
5119	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD SANTO TOMÁS, SAN SALVADOR		2,419.95	2,419.95	2,419.95	100.00
5103	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA CASA DE SALUD BARRIARCONES, PASAQUINA, LA UNIÓN		2,415.64	2,415.64	2,415.64	100.00
5331	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CORRAL DE MULAS POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USulután		2,088.85	2,088.85	2,088.85	100.00
5106	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD CONCEPCIÓN, SAN SALVADOR		539.10	539.10	539.10	100.00
5109	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD PANCHIMALCO, SAN SALVADOR		305.00	305.00	305.00	100.00
5135	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA CASA DE SALUD DE JOYA GRANDE, SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR		162.50	162.50	162.50	100.00



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
	MINED	77	65,758,237.37	30,665,797.68	26,320,188.86	85.83
5096	Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador		26,663,767.47	2,608,078.70	3,386,807.32	129.86
5268	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO EDUCA)		19,120,005.57	18,012,652.92	13,013,365.11	72.25
5768	Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACES) - Componente Educación.		2,217,310.00	-	-	-
5813	Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.		1,171,508.00	-	-	-
4690	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR		1,070,000.00	369,078.81	54,702.15	14.82
4635	PROGRAMA DE REPARACIONES MENORES EN CENTROS ESCOLARES A NIVEL NACIONAL		851,017.69	841,917.69	851,917.69	101.19
5755	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 16 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE		780,663.00	-	-	-
4708	REHABILITACION INSTITUTO NACIONAL CATOLICO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SENSUNTEPEQUE		658,176.44	658,176.44	658,176.44	100.00
4688	MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE SAN MARCOS , SAN SALVADOR		589,280.66	589,280.66	589,280.66	100.00
5759	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 10 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE USulután		527,500.00	-	-	-
5620	Programa de Infraestructura Educativa 2012		500,000.00	139,062.61	-	0.00
4692	MEJORAMIENTO DE INSTITUTO NACIONAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS , SAN SALVADOR		467,792.45	467,792.45	467,792.45	100.00
4706	MEJORAMIENTO ESCUELA PARVULARIA MISAEL RAMOS, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS		415,975.85	415,975.85	415,975.85	100.00
4712	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR AGUSTIN SANCHEZ, APASTEPEQUE, SAN VICENTE		404,232.95	379,978.98	404,232.95	106.38
4703	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR "CANTON SAN JOSE LOMAS DE PEÑA", ILORASCO, CABAÑAS		390,239.08	377,811.97	390,239.08	103.29
4694	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANDIARTO CUELLAR, M/COJUTEPEQUE, D/CUSCATLAN.		366,278.42	366,278.42	344,301.73	94.00
5756	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 8 CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHALATENANGO, LA LIBERTAD Y SAN SALVADOR		344,261.00	-	-	-
4664	REPARACION Y MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCATIVO COL. NUEVA, CANTON GUYAPA ABAJO, JUJUTLA, AHUACHAPAN		341,394.00	170,697.00	341,394.00	200.00
4721	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR EL MANQUEZADO, SANTIAGO DE MARIA, USULUTAN		314,000.00	83,898.77	141,379.75	168.51
4695	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR COLONIA FÁTIMA, M/COJUTEPEQUE, D/CUSCATLAN.		313,808.97	235,356.73	294,980.42	125.33
4705	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO HUISCOYOL , CANTON TRINIDAD, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS		312,854.16	237,772.65	291,042.91	122.40
4715	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE		307,020.26	230,265.20	153,510.14	66.67
4677	REHABILITACION Y MEJORAS CENTRO ESCOLAR HEROES DEL 11 DE ENERO, CHALATENANGO		282,850.97	233,352.05	282,025.67	120.86
5758	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 6 CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y SAN VICENTE		266,200.00	-	-	-
4943	CENTRO ESCOLAR BARRIO LA FATIMA, LA UNION		245,036.00	2,548.03	114,095.13	4,477.78
4710	MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE SAN JUAN TEPEZONTES, LA PAZ		244,034.92	122,017.46	-	0.00
4718	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL TABURETE, ITQUITISCO, USULUTAN		240,865.00	60,210.88	112,112.75	186.20
4711	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR ANASTASIO AQUINO, SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ		237,387.79	204,496.88	116,191.40	56.82
4941	CENTRO ESCOLAR HACIENDA LA CAÑADA, CONCHAGUA, LA UNION		232,292.43	232,292.43	232,292.43	100.00
4675	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR JORGE LAURE, JUJUTLA, SONSONATE		228,001.14	163,006.93	106,006.64	65.03



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
4067	REPARACION Y MEJORAMIENTO ESC. EDUCACION ESPECIAL DE CHALCHUAPA, SANTA ANA		221,925.75	221,925.75	221,925.75	100.00
5761	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 5 CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE MORAZÁN Y LA UNIÓN		217,586.00	-	-	-
1942	CENTRO ESCOLAR CANTON LOS CUREJOS, EL CARMEN, LA UNION		217,320.00	5,915.75	54,186.14	911.34
1944	CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CUEVONA, LISIQUE, LA UNION		212,485.33	212,485.33	208,735.33	98.24
4716	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR BRISAS DEL SOL, BERLIN, USulután		207,000.00	57,494.62	51,430.71	89.45
4079	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA EDUCACION PARVULARIA LUCILA TRUJILLO, CHALATENANGO		203,724.26	203,724.26	203,724.26	100.00
4701	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN CARLOS, J/ DOLORES, D/ CABAÑAS		201,160.00	63,841.62	52,154.27	81.69
5271	Reconstrucción y Rehabilitación de Centros Escolares Afectados por la tormenta JDA		200,841.07	200,841.07	200,841.07	100.00
4085	REHABILITACION CENTRO ESCOLAR WALTER SOURDY, SANTA TECLA, LA LIBERTAD		199,040.00	199,040.00	199,040.00	100.00
5754	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		193,200.00	-	-	-
4723	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CHAPELTIQUE, SAN MIGUEL		187,250.00	46,045.34	115,803.82	251.50
5757	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCATLÁN Y CABAÑAS		179,000.00	-	-	-
5760	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL		173,900.00	-	-	-
4704	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR ISABEL LA CATÓLICA, CANTON LOS LLANITOS, TILOASCO, CABAÑAS		168,799.02	168,799.02	168,799.02	100.00
5753	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN		167,800.00	-	-	-
4726	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR PARAISO REAL, SAN MIGUEL		162,162.74	121,622.07	162,162.74	133.33
4707	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO CERRO EL TORO, C/ LA TRINIDAD, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS		160,500.00	23,049.84	11,342.28	49.21
4727	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL "DE ULUAZAPA", SAN MIGUEL		153,144.09	153,144.09	153,144.09	100.00
4939	INSTITUTO NACIONAL DE OSICALA, MORAZAN		152,655.43	152,655.43	152,655.43	100.00
4725	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR LA CARMENZA, SAN MIGUEL		146,801.00	56,339.69	30,465.75	54.08
4728	CENTRO ESCOLAR COLONIA CARRILLO, CANTON EL PAPALÓN, SAN MIGUEL		147,800.00	35,480.91	63,601.40	179.26
4065	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO, JIJUTIA, AHUACHAPAN		142,340.87	142,340.87	142,340.87	100.00
4700	MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CINQUERA, CABAÑAS		140,125.99	140,125.99	140,125.99	100.00
4662	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO NUEVO NANCE AMARILLO, CANTON RIO FRIO, AHUACHAPAN		133,645.70	133,645.70	133,645.70	100.00
4702	CENTRO ESCOLAR CASERIO CONCEPCION, CANTON LA QUIESERA, TILOASCO, CABAÑAS		119,840.00	79,922.93	28,206.61	94.26
4676	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SISIMITEPEC, NAHUIZALCO, SONSONATE		117,534.81	117,534.81	117,534.81	100.00
4666	REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON GUASCOTA, SAN LORENZO AHUACHAPAN		112,350.00	63,134.90	71,986.70	114.02
4671	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCATIVO HACIENDA SAN CAJETANO, SANTA ANA		106,866.86	106,866.86	106,866.86	100.00
4663	REPARACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL SAITREFO, ATIQUEZAYA, AHUACHAPAN		105,867.25	105,867.25	105,867.25	100.00
4709	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR FABIO IGNACIO MAGAÑA, EL ROSARIO, LA PAZ		99,975.00	74,981.25	99,075.00	133.33
4683	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR DE QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD		99,698.35	99,698.35	99,698.35	100.00
4673	REPARACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON CERRO ALTO, CALUJO, SONSONATE		86,511.83	86,511.83	81,371.13	94.00
4940	INSTITUTO NACIONAL DE SAN SIMÓN, MORAZAN		80,250.00	-	20,701.50	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
4682	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR JICALAPA, LA LIBERTAD		78,718.08	78,718.08	78,718.08	100.00
4678	REPARACION ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "DE CHALATENANGO", CHALATENANGO		73,897.96	73,897.96	73,897.96	100.00
4636	PROGRAMA DE DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE CENTROS ESCOLARES A NIVEL NACIONAL		67,740.61	67,740.61	67,740.61	100.00
4714	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN VICENTE		64,948.86	64,948.86	64,948.86	100.00
4722	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE USulután		46,192.73	46,192.73	-	0.00
4186	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS ESCOLARES EN DPTOS. DE AHUACHAPAN, CHALATENANGO, SAN MIGUEL, Y MORAZAN		37,821.00	34,068.00	5,200.00	15.26
4669	REHABILITACION ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE METAPAN, SANTA ANA		20,244.62	20,244.62	20,244.62	100.00
4687	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL BARILLO, ZARAGOZA, LA LIBERTAD		18,622.00	18,621.84	13,035.29	70.00
4699	REHABILITACION COMPLEJO EDUCATIVO RAFAEL CABRERA, M/SAN RAMON, D/CUSCATLAN.		18,574.97	18,574.97	18,574.97	100.00
4686	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON SAN SEBASTIAN, ZARAGOZA, LA LIBERTAD		14,608.84	14,608.84	14,608.84	100.00
4698	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN CERRO COLORADO, M/SAN RAFAEL CEDROS, D/CUSCATLAN.		954.70	954.70	954.70	100.00
4684	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ZAPOTE, CANTON CASTILLO, SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD		749.87	749.87	749.87	100.00
4693	MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL GENERAL ADOLFO BLANDÓN, M/COJUTUPÉQUE, D/CUSCATLAN.		712.91	712.91	712.91	100.00
4672	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO VALLE NUEVO, CANTON METALIO, ACAJUTLA, SONSONATE		696.65	696.65	696.65	100.00
PNC - MJSP		4	19,755,325.33	13,272,317.81	11,981,377.67	90.27
5099	Suministro e Instalación del Sistema Integral para los Centros de Atención de Emergencias 911 y AVL/CPS de la Policía Nacional Civil de El Salvador.		16,788,583.33	10,826,387.51	10,743,095.85	99.23
4766	Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil		1,700,000.00	1,649,543.96	1,234,815.50	74.86
5436	Equipamiento e instalación de un sistema para el registro del Expediente Único Digital de la Policía Nacional Civil.		1,100,000.00	620,645.32	3,466.32	0.55
5778	Construcción de Estacionamiento en Instalaciones de la Subdirección de Tránsito Terrestre de la PNC.		166,742.00	166,741.02	-	0.00
CSJ		10	18,723,845.00	17,423,374.30	267,606.25	1.54
4344	Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador		8,153,725.00	7,127,793.78	-	0.00
3831	Construcción Centro Judicial Integrado de La Unión		2,570,120.00	2,570,120.00	5,818.00	0.23
4225	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENEZDEZ, SAN SALVADOR		2,168,000.00	2,168,000.00	6,722.00	0.34
3385	Construcción Centro Judicial Integrado de Apopa, San Salvador		2,000,000.00	1,997,630.70	-	0.00
5637	Construcción y Equipamiento de Salas de Audiencia en Tribunales a Nivel Nacional		1,500,000.00	1,363,830.32	-	0.00
5638	Remodelaciones, Ampliaciones, Readecuaciones y Mejoras Institucionales a Nivel Nacional.		1,500,000.00	1,467,000.00	255,066.25	17.39
3386	"Construcción Centro Judicial Integrado de San Marcos, San Salvador".		350,000.00	301,000.00	-	0.00
3465	Remodelación y Ampliación Centro Judicial Integrado de Sonsonate		350,000.00	301,000.00	-	0.00
5444	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE LA CIRCUNSCRIPCION DE SAN RAFAEL, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO		66,000.00	66,000.00	-	0.00
5445	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE LA CIRCUNSCRIPCION DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.		66,000.00	66,000.00	-	0.00



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE (MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
VMVDU		4	20,828,088.00	13,011,723.24	2,185,252.60	16.79
5132	PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS		10,500,000.00	7,006,740.24	1,389,629.60	19.83
5100	DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA		7,445,585.00	5,187,190.00	-	0.00
5709	Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios-PACSES, a nivel Nacional.		2,086,880.00	20,170.00	-	0.00
5781	Programa de fortalecimiento de las capacidades asociativas para la generación de empleo intensivo en Comunidades Solidarias Urbanas, a nivel Nacional.		795,623.00	795,623.00	795,623.00	100.00
MAG		21	19,520,223.57	15,461,514.70	8,916,231.75	57.67
3752	Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO)		4,936,628.03	3,968,564.76	3,289,383.46	82.89
4377	PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LA REGION CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR-Central)		4,903,835.00	3,734,157.14	2,218,382.96	59.41
5725	CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA REGIÓN ORIENTAL CEDAF MORAZAN		2,050,000.00	1,699,297.00	84,699.60	4.98
5730	Fortalecimiento de las Capacidades Productivas de Productores y Productoras de Hortalizas y Frutas, en 46 Municipios de 10 Departamentos Atendidos por el Programa PAF Cadenas Productivas del Plan de Agricultura Familiar		1,466,130.30	874,087.40	-	0.00
5731	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS FAMILIAS RURALES PARA MEJORAR SUS INGRESOS, EN MUNICIPIOS DE LAS REGIONES CENTRAL Y OCCIDENTAL DE EL SALVADOR		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00
5783	Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de Riego del Bajo Lempa, en los Departamentos de San Vicente, La Paz y Usulután		1,223,123.17	490,373.17	-	0.00
4643	Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador		1,075,979.57	941,933.73	560,192.62	59.49
4648	Construcción de Obras de Mitigación en Cordillera El Bálsamo, al Sur de Santa Tecla, Zda. Elapa		804,112.48	804,112.48	423,958.03	52.72
4646	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de Control de Inundaciones		343,613.53	343,613.53	191,208.64	55.65
4650	Construcción de Obras de Control de Inundaciones Ríos Tihuapa - Huiza, Depto. de La Libertad		218,078.73	218,078.73	218,078.73	100.00
5729	Construcción y Equipamiento de Infraestructura para la Producción de Camarón Marino y Cultivo de Tilapia, como Apoyo a Organizaciones Acuícolas en el Departamento de Usulután.		200,000.00	89,574.00	18,164.47	20.28
4651	Construcción de Muro de Retención en Quebrada La Oscurana, Municipio de Berlin		167,587.87	167,587.87	131,975.32	78.75
2963	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION RURAL (IREMODEIRO)		155,000.00	155,000.00	149,936.07	96.73
5300	REACTIVACION DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION ACUICOLA Y ENTREGA DE POST-LARVAS DE CAMARON MARINO, A COOPERATIVAS CAMARONERAS DEL BAJO LEMPA AFECTADAS POR LA DEPRESION TROPICAL IDA		147,965.95	147,965.95	145,715.95	98.48
5764	Fortalecimiento Institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológicas en Sanidad Animal, Análisis de Riesgo de Plagas y Sistema de Inteligencia de Mercados Agropecuarios en El Salvador		143,700.00	143,700.00	-	0.00
5763	Remodelación y Equipamiento del Laboratorio de Microbiología de Alimentos sede El Matazano para la Inspección Sanitaria de la Carne		130,000.00	129,000.00	1,000.00	0.78
4647	Obras de Control de Inundaciones en los Ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Goascorán (II Fase)		115,127.06	115,127.06	44,400.70	38.57
5297	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN COOPERATIVAS DE LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE		34,256.52	34,256.52	34,126.52	99.62
4649	Reparación de Cárcava en Asentamiento Belio Horizonte, Comasagua, La Libertad		4,681.61	4,681.61	4,681.61	100.00
5284	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS RIOS LEMPA, GRANDE DE SAN MIGUEL, PAZ Y JIBOA		282.68	282.68	-	0.00
4644	Fortalecimiento del Sector Pecuario y Avícola en El Salvador		121.07	121.07	121.07	100.00



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
MH			12,322,517.40	4,989,613.91	532,450.50	10.67
4958	Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV.		11,300,000.00	1,691,062.51	282,610.00	6.02
4204	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TRIBUTARIA		726,966.00	-	-	-
5522	REPARACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE CERCA DE MALLA CÍCLON EN EL CENTRO RECREATIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, SAN BARTOLO, ILOPANGO.		87,284.77	87,284.77	87,284.77	100.00
5631	EQUIPAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS SEIS ADUANAS DE FRONTERA DE EL SALVADOR.		80,574.65	80,574.65	80,574.65	100.00
5747	REPARACIÓN DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA		49,710.00	49,710.00	49,199.10	98.97
5736	PROTECCIÓN PERIMETRAL DE DOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE HACIENDA		45,200.00	45,200.00	-	0.00
5513	Reparaciones en Infraestructura de la Aduana en Frontera Las Chinamas, Departamento de Ahuachapán.		32,781.98	32,781.98	32,781.98	100.00
Centros Intermedios (CI - MJSP)		1	9,040,000.00	7,317,164.10	2,811,591.57	38.42
5137	Granja de Rehabilitación para Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil de Ilobasco, Departamento de Cabañas		9,040,000.00	7,317,164.10	2,811,591.57	38.42
MARN		5	7,746,361.92	5,363,390.27	2,852,991.74	53.19
5102	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL		5,429,646.12	3,867,909.47	1,610,303.11	41.63
5563	Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias - Programa de Agua y Saneamiento Rural		850,000.00	84,822.00	41,050.39	48.40
5229	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE RIESGO		710,880.37	710,880.37	710,880.37	100.00
5742	PROGRAMA DE MANEJO DE ECOSISTEMAS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD		500,000.00	443,943.00	234,922.44	52.97
2881	PROGRAMA DE DESCONTAMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS		255,835.43	255,835.43	255,835.43	100.00
ILEA		1	5,663,685.00	3,524,524.88	249,141.67	7.07
4493	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, ILEA SAN SALVADOR"		5,663,685.00	3,524,524.88	249,141.67	7.07
Secretaría de Inclusión Social (SIS)		3	3,111,560.00	464,103.22	248,378.74	53.52
5644	PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL, PROMOCION COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CIUDAD MUJER		1,756,085.00	412,928.22	248,378.74	60.15
5785	Fortalecimiento de las redes Ciudad Mujer Usulután, Santa Ana y San Martín		1,304,300.00	-	-	-
5740	CONSTRUCCION DE KIOSCO DE MADERA PARA OFICINA DE SOLVENCIAS DE LA PNC EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO DE CIUDAD MUJER, COLOR		51,175.00	51,175.00	-	0.00
AL		1	1,383,091.29	1,317,577.29	638,440.88	48.46
5222	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO II		1,383,091.29	1,317,577.29	638,440.88	48.46
MIGOB		4	1,365,353.91	751,056.66	431,478.66	57.45
5277	Mejoramiento de Infraestructura de 9 Gobernaciones Departamentales a nivel nacional		941,776.20	452,557.98	343,855.12	75.98
5775	Construcción de la Infraestructura para albergar la Gobernación Política Departamental de San Vicente.		175,744.00	50,664.97	1,837.15	3.63
5572	Suministro e Instalación de Sub Estación Eléctrica de 1000kva para Imprenta Nacional.		162,047.32	162,047.32	-	0.00
5275	Adquisición de equipo por las Gobernaciones Departamentales, Dirección de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y Cuerpo de Bomberos del Ministerio de Gobernación		85,786.39	85,786.39	85,786.39	100.00
Secretaría de Estado (SE - MJSP)		1	1,130,000.96	994,692.40	654,231.14	65.77
5136	Programa de Prevención de la Violencia y la Delincuencia		1,130,000.96	994,692.40	654,231.14	65.77



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
MTYS		3	769,619.96	769,619.96	759,259.43	98.65
5625	REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA CENTRO DE RECREACION OBRERA DR. MARIO ZAMORA RIVAS LA PALMA-CHALATENANGO, MTYS		500,000.00	500,000.00	492,681.07	98.54
5626	REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA CENTRO DE RECREACION OBRERA CONSTITUCION 1950, COATEPEQUE-SANTA ANA II ETAPA, MTYS		200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
5191	Construcción, Reconstrucción, Modernización y Equipamiento en Centro de Recreación Obrera, Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Constitución 1950, Lago de Coatepeque Santa Ana		69,619.96	69,619.96	66,578.36	95.63
MIREX		1	467,000.00	467,000.00	467,000.00	100.00
5557	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ESPAÑA EL SALVADOR (FTI) - APOYO FI. SALVADOR		467,000.00	467,000.00	467,000.00	100.00
Dirección General de Centros Penales (DGCP - MJSP)		4	459,736.48	459,736.48	459,736.48	100.00
5520	Obras de Reforzamiento de Seguridad Pasiva y Control del Centro Penal de Zacatecoluca		187,782.01	187,782.01	187,782.01	100.00
5582	Construcción y readecuación de instalaciones del Centro de Formación de la Escuela Penitenciaria en la Penitenciaría Central La Esperanza, Dpto. San Salvador		113,552.81	113,552.81	113,552.81	100.00
5518	Readecuación del Área de Visitas de los Centros Penitenciarios de Quezaltepeque y Ciudad Barrios		84,530.26	84,530.26	84,530.26	100.00
5519	Reparación e impermeabilización de techos en el Centro Penitenciario de Zacatecoluca		73,871.40	73,871.40	73,871.40	100.00
BOMBER - MIGOB		2	198,046.01	198,046.01	198,035.69	99.99
5270	Adquisición de equipo para el Cuerpo de Bomberos de El Salvador a nivel nacional		157,228.95	157,228.95	157,228.95	100.00
4999	Construcción y Equipamiento de dormitorios para el personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Estación Central.		40,817.06	40,817.06	40,806.74	99.97
VMT			12,725,525.00	4,558,998.00	-	0.00
5478	Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador		12,725,525.00	4,558,998.00	-	0.00
CONJUVE		1	900,531.00	-	-	-
5770	Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias - FOCAP		900,531.00	-	-	-
Secr. de Cultura		2	792,060.00	149,254.03	124,398.16	83.35
5796	MEJORAMIENTO, ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE LA CULTURA A NIVEL NACIONAL, PARA LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR		605,630.00	-	-	-
5647	RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL SANTA LUCÍA DE SUCHITOTO, SEGUNDA FASE		186,430.00	149,254.03	124,398.16	83.35
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES						
FISDL		13	137,499,559.95	104,185,750.26	74,244,652.05	71.26
4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL		54,844,951.18	45,185,310.65	39,792,829.91	87.18
5629	PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y EMPLEABILIDAD		26,608,330.00	22,527,940.00	14,665,779.96	65.10
5384	PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS		13,500,000.00	8,139,732.00	4,560,040.59	56.02
5628	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER		11,085,875.00	9,164,213.61	6,196,603.38	67.62
5630	COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN EDUCACIÓN		8,449,016.00	2,527,545.00	0	0.00
4996	PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FISDL V)		6,658,772.96	6,056,207.96	3,972,577.23	65.60
4160	FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNANZA (FISDL / KPW IV)		4,581,920.00	4,202,985.00	2,326,361.17	55.35



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE **(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
2660	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL		3,900,000.00	2,119,276.03	710,475.87	33.57
4184	PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA DE EL SALVADOR (PAPE)		3,094,739.86	1,820,337.85	1,641,365.25	90.17
5627	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR, COMPONENTE 1		3,000,000.00	1,442,643.00	51,521.24	3.57
4472	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV		1,600,000.00	823,604.00	567,417.71	68.89
5648	Rehabilitación de Infraestructura Básica en Municipios Afectados por la Depresión Tropical 12 E		114,585.00	114,585.00	98,959.79	85.64
5045	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES DE SALUD EN COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES		61,369.95	61,369.95	61,369.95	100.00
FOVIAL		26	51,576,121.28	38,588,937.03	21,193,145.05	54.92
4784	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2012		18,618,000.00	12,218,000.00	2,752,953.78	22.53
4783	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2011		12,933,982.28	12,933,982.28	11,310,809.14	87.52
4795	Mejoramiento Camino Rural UNI025, Tramo: El Jagüey - El Tamarindo, Departamento de La Unión		4,387,437.65	1,639,296.30	56,578.32	3.45
4774	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2012		2,090,000.00	748,730.37	44,751.53	5.98
4778	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2011		1,938,393.57	1,938,393.57	1,926,560.17	99.39
4771	Mejoramiento Camino Rural A11U745/A11U755, Entre: Km. 151 Carretera El Litoral (CA02W) - Garita Palmera, Ahuachapán.		1,793,170.39	1,793,170.39	1,140,326.72	63.59
5509	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN KM 124+000 DE LA CARRETERA CA08W, FRONTERA LAS CHINAMAS		1,500,064.67	310,064.67	19,015.36	6.13
5541	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL UNI395: CA02E - EMBARCADERO LOS CORRALES, DEPARTAMENTO DE LA UNION		1,471,497.77	973,653.39	19,078.32	1.96
4773	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2011		1,303,858.58	1,303,858.58	1,159,982.05	88.97
5405	Reparación de Calle entre Urbanización Plan del Pino Municipio de Soyapango y Municipio de Ciudad Delgado, Depto de San Salvador.		1,139,782.24	1,139,782.24	524,879.29	46.05
4794	Mejoramiento Camino Rural UNI22N, Tramo Nueva España - Polarós, La Unión		822,771.12	822,771.12	-	0.00
4779	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2012		500,000.00	185,000.00	-	0.00
5571	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN LA ZONA DEL PUENTE SOBRE EL RIO EL DESAGUE, EST. 31+720 DE LA CARRETERA RN03E, CANDELAJUA, CUSCATLAN		447,660.75	447,660.75	447,378.79	99.94
5621	CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCIÓN EN EST. 01500 DE LA RUTA SAN19W:SAN21E-MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		447,586.56	302,121.11	364,132.59	120.53
4488	Administración del Programa (Unidad Ejecutora)		447,382.00	327,485.35	132,482.33	40.45
5403	Reparación de calle SAL225,Tramo Puerta del Diablo(SAL07W)- Mil Cumbres, Municipio de Panchimalco,Departamento de San Salvador		388,419.36	388,419.36	290,060.58	74.68
5408	Mejoramiento Camino Rural PA737F/PA7105, Tramo: Cantón el Nilo -Cantón El Garapatero-Cantón San Francisco Los Reyes(PAZ105)-CA:02E, Departamento de la Paz		380,449.59	327,186.65	158,305.85	48.38
5622	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION EN EJE 73-B (BOULEVARD VENEZUELA), EST. 1+400, SAN SALVADOR		370,961.96	255,158.11	370,961.94	145.39
5515	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS PAVIMENTADAS DEL DEPARTAMENTO DE USulután		191,486.56	191,486.56	154,356.92	80.61
5280	REPARACION DE OBRA DE PASO EN EST. 1+060 DE RUTA RN02E, SOYAPANGO, SAN SALVADOR		116,621.47	116,621.47	102,385.70	87.79
5379	REPARACIÓN DE CÁRCAVAS EN KM 17+400 Y KM 18+400 DE LA RUTA RN05S, SANTO TOMAS, SAN SALVADOR		109,653.69	109,653.69	109,653.67	100.00
5516	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS NO PAVIMENTADAS DEL DEPARTAMENTO DE USulután		52,269.40	52,269.40	39,355.49	75.29
5508	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN LA RUTA CA02E, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y LA PAZ		45,260.48	45,260.48	45,260.48	100.00
5282	REPARACION DE CARCAVA EN KM. 371450 DE RUTA RN05S, SAN LUIS TALPA, LA PAZ		8,283.79	8,283.79	5,739.89	69.29
4788	Mejoramiento del Camino Rural USU27E, entre Cantón La Canoa (Et. USU08S) - Corral de Mulas, Usulután		7,138.03	7,138.03	7,138.03	100.00



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
5281	REPARACION DE OBRA DE PASO EN EJE 81 (ZOOLOGICO NACIONAL), SAN SALVADOR		3,989.37	3,989.37	1,998.11	50.09
CNR		1	16,449,466.08	14,104,578.40	3,630,358.60	25.74
3541	PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMORTIARIO Y DEL CATASTRO FASE II		16,449,466.08	14,104,578.40	3,630,358.60	25.74
UES		20	14,579,238.55	11,845,461.50	1,605,261.63	13.55
3762	CONSTRUCCION DE ROVEDA		6,500,000.00	4,875,000.00	-	0.00
5025	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA JOVENES TALENTO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR		2,000,000.00	1,550,000.00	-	0.00
5024	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES GENERANDO OPORTUNIDADES DE ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CON PERSPECTIVAS HACIA EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL		1,643,792.03	1,315,014.98	482,380.49	36.68
5013	Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias Economicas		755,571.47	755,571.47	-	0.00
5015	Construcción de Edificio para Instituto de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas		653,846.00	488,846.00	-	0.00
5016	Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias y Humanidades.		653,846.00	488,846.00	-	0.00
5012	Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente		457,702.67	457,702.67	22,917.10	5.01
5014	Construcción de Edificio de Usos Múltiples para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.		457,697.38	457,697.38	-	0.00
5023	Modernización de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.		269,042.23	269,042.23	268,993.32	99.98
5011	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL		251,433.78	251,433.78	251,433.78	100.00
5018	Construcción de Edificio de Posgrados en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.		236,416.01	236,416.01	-	0.00
5009	Fortalecimiento de los Laboratorios del area Básica de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas		181,792.93	181,792.93	179,106.11	98.52
5026	Fortalecimiento de la Radio Universitaria		175,000.00	175,000.00	174,966.00	99.98
5017	Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la Facultad de Medicina.		117,894.22	117,894.22	70,365.92	59.69
5019	Construcción de Muro Perimetral en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.		92,232.69	92,232.69	48,048.59	52.09
5027	Modernización de la Administración Académica		66,737.04	66,737.04	51,285.15	76.85
5020	Modernización de el Sistema de Energía Eléctrica en el Campus Central		44,409.40	44,409.40	44,409.40	100.00
5022	Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia.		20,062.62	20,062.62	9,892.17	49.31
5021	Modernización de los Laboratorios del Departamento de Química de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.		1,724.35	1,724.35	1,433.60	83.14
5010	Fortalecimiento de Infraestructura en la Facultad de Odontología.		37.73	37.73	-	0.00
ISSS		8	3,682,420.00	2,465,255.00	1,486,881.25	60.31
862	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ZACAMIL		1,074,405.00	-	1,074,403.96	-
5386	READECUACION DE LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL AMATEPEC, SAN SALVADOR.		847,875.00	847,875.00	146,036.16	17.22
5326	MEJORAMIENTO DE FARMACIAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL		488,615.00	488,615.00	-	0.00
5323	REMEDIACIÓN DEL ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS GENERALES EN CIUDADELA MONSERRAT, SAN SALVADOR.		400,000.00	360,000.00	-	0.00
5325	REMEDIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA ATLACATL, SAN SALVADOR.		370,000.00	370,000.00	-	0.00
4398	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA		231,209.00	128,449.00	-	0.00



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
5183	REMEDIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DE SANTA ANA.		180,000.00	180,000.00	176,158.81	97.87
5300	SUSTITUCION DE LA CUBIERTA DE TECHO DE LA TORRE ONCOLOGICA DEL ISSS		90,316.00	90,316.00	90,282.32	99.96
ISTU		1	800,000.00	626,175.00	-	0.00
5624	MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS RECREATIVOS DEL ISTU A NIVEL NACIONAL		800,000.00	626,175.00	-	0.00
Def. del Consum.		1	490,272.00	400,408.31	212,493.72	53.07
5133	FORTALECIENDO LA ATENCIÓN A CONSUMIDORES; DESCENTRALIZANDO SERVICIOS Y MEJORANDO LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA		490,272.00	400,408.31	212,493.72	53.07
ANSP - MJSP		2	507,300.00	12,100.00	1,177.88	9.73
5827	REFORZAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SUR DE LA ANSP, SEDE SANTA TECLA.		495,200.00	-	-	-
5430	REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA PROVISIONAL Y REMODELACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ANSP, SEDE SANTA TECLA		12,100.00	12,100.00	1,177.88	9.73
ISNA		2	312,084.12	312,084.12	264,474.00	84.74
4830	REPARACION EDIFICIO LA ESTRELLA, DELEGACION CENTRAL ISNA (FASE II)		214,800.26	214,800.26	179,864.26	83.74
4911	REPARACIONES Y MEJORAS EN CENTRO DE REINTEGRACION EL ESPINO, AMUJIAPAN (Primera Fase)		97,283.86	97,283.86	84,609.74	86.97
CORSATUR		1	100,000.00	18,235.50	20,845.66	114.31
5680	Mejoramiento del muelle artesanal del Puerto de La Libertad, en el departamento de La Libertad		100,000.00	18,235.50	20,845.66	114.31
CENTA		1	65,991.00	65,991.00	65,991.00	100.00
5290	Rehabilitación de la Producción y Comercialización de Hortalizas en Zonas Afectadas por el Huracán Ida		65,991.00	65,991.00	65,991.00	100.00
ISDEMU		3	129,649.06	92,402.56	38,348.06	41.50
5765	Adecuación de Centros de Atención para la Gestión Territorial para la Igualdad y la Prevención social de la violencia de Género en 11 Municipios de Comunidades Solidarias Urbanas		91,301.00	54,054.50	-	0.00
5555	Readecuación de Espacio y Acabados de Cocina y Oficinas de ISDEMU San Salvador		29,992.81	29,992.81	29,992.81	100.00
5556	MEJORA DE LA OFICINA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		8,355.25	8,355.25	8,355.25	100.00
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS						
ANDA		64	83,874,379.57	57,020,279.98	21,378,646.70	37.49
5584	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.		21,401,958.75	10,242,055.00	-	0.00
5034	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR.		15,759,868.00	10,744,178.00	182,721.87	1.70
5134	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.		14,673,696.36	13,369,188.93	6,518,846.08	48.76
4567	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN.		5,052,292.83	3,244,377.70	3,244,377.70	100.00
5588	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, BAJO GESTIÓN DESCENTRALIZADA A NIVEL NACIONAL FASE II		3,101,000.00	1,300,000.00	-	0.00
4620	MEJORAS EN LA LINEA DE IMPELENCIA Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LA UNION.		1,899,242.35	1,835,592.48	1,795,064.26	97.79
5596	Construcción de línea de impelencia desde Planta Guluchapa a estación de prebombeo Solt Sutt.		1,893,000.00	800,000.00	-	0.00



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
5591	Proyecto de Instalación de 6 km de tubería de 8" entre Km. 6 a Km. 12 en la ciudad de Apopa.		1,500,000.00	700,000.00	-	0.00
4586	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		1,263,815.01	1,049,089.58	764,221.95	72.85
5600	PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE AYUDA MUTUA EN COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL.		1,250,000.00	775,000.00	-	0.00
5587	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTÓN GUAYCUME Y COMUNIDAD ALTOS DE LAS FLORES, TONACATEPEQUE, SAN SALVADOR.		1,200,000.00	700,000.00	-	0.00
5613	Construcción de Edificio de Oficinas administrativas de la Región Metropolitana, Municipio de San Salvador		1,000,000.00	675,000.00	-	0.00
5586	MEJORAMIENTO E INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES Y ZONA PLAYAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO DEL PUERTO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.		1,000,000.00	675,000.00	-	0.00
5499	INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A CANTÓN LOS MORANES, NEJAPA, SAN SALVADOR.		807,024.08	807,024.08	807,024.08	100.00
4573	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES EL PORVENIR, EL MILAGRO, VILANOVA, LAS TORRES Y LOMAS DE CANDELAJA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN.		787,574.04	326,837.43	326,837.43	100.00
4588	CAMBIO DE LÍNEA DE IMPERMEABILIDAD DE 16" PVC A 8" HDPE L=3,000 METROS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PATONAL.		748,769.10	274,940.75	274,940.75	100.00
4598	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO A SISTEMA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS, CUSCATLÁN.		636,975.68	386,308.76	386,308.76	100.00
4597	PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN LOS AMATES DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, CHALATENANGO.		613,589.46	613,589.46	613,589.46	100.00
4594	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTON TUTULTEPEQUE EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA, SAN SALVADOR.		554,785.78	554,785.78	554,785.78	100.00
4595	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTON JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR.		521,359.71	521,359.71	515,845.65	98.94
5599	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 3,500 M3 SAN MIGUELITO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.		500,000.00	400,000.00	-	0.00
4621	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután.		469,218.14	469,218.14	458,171.20	97.71
4611	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.		434,056.75	434,056.75	366,338.90	84.40
4592	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUILARES.		398,720.63	398,720.63	235,220.29	58.99
5497	INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL CANTÓN LA LAGUNITA, SANTIAGO DE CHILE, SAN JUAN NONUALCO, LA PAZ.		361,386.17	361,386.17	361,212.09	99.95
4619	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.		357,026.38	357,026.38	313,147.20	87.71
4631	INTRODUCCIÓN Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES EL SINGUIL, SANTA RITA Y EL CERRON, EL PORVENIR, SANTA ANA		350,000.00	350,000.00	263,197.67	75.20
4603	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN PABLO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL.		348,592.11	348,592.11	337,085.65	95.26
4602	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE ITMA, LA UNION.		341,846.08	341,846.08	341,846.08	100.00
4608	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, USULUTÁN.		314,280.27	90,038.16	90,038.16	100.00
4574	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO GEMELO EN ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA-LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE.		300,000.00	197,000.00	-	0.00
4614	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE EL TRANSITO, SAN MIGUEL.		296,925.69	265,899.27	265,899.27	100.00
4601	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD HERMOSA PROVINCIA DEL MUNICIPIO DE IICALAPA, LA LIBERTAD.		292,343.59	292,343.59	269,477.08	92.18



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
4583	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M3 Y LA INSTALACION DE UN ANILLO DE DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE.		286,827.56	286,827.56	136,688.30	47.66
4591	REHABILITACION DEL POZO NO.2 EN PLANTA DE BOMBEO EL TINTERAL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.		263,376.49	263,376.49	263,207.27	99.94
4612	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARAN, MUNICIPIO DE JUCUARAN DEPARTAMENTO DE USulután.		240,165.12	240,165.12	70,479.03	29.35
4578	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE DE SANTA ANA.		240,027.88	240,027.88	178,804.30	74.49
5592	Construcción de colector de aguas negras en Colonia Jardines del Pepeto III del Municipio de Soyapango.		200,000.00	170,000.00	-	0.00
5057	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS PLANES DE RENDERO, MEDIANTE LA PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE UN NUEVO POZO EN PLANTA BALBOA, SAN SALVADOR.		179,000.00	150,000.00	-	0.00
5060	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE ALTAVISTA II, MEDIANTE LA UNIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL DE LAS ETAPAS I, II Y III DE ALTAVISTA II, ILOPANGO, SAN SALVADOR.		178,000.00	150,000.00	-	0.00
4618	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAROLINA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.		163,929.64	163,929.64	107,827.64	65.78
4585	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS BRISAS DE CANTARRANA Y BARCIONA, UBICADAS EN CANTÓN CANTARRANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.		161,749.91	161,320.61	161,320.61	100.00
4600	PERFORACION E INCORPORACION DE POZO EN LA ANTENA II DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS.		155,577.05	123,577.05	123,577.05	100.00
4615	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NOR-ORIENTE DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL.		153,777.31	153,777.31	67,757.29	44.06
4576	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA # 10 HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCION DE SANTA ANA.		149,276.53	44,132.50	-	0.00
4587	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE METAPAN.		148,076.50	148,076.50	147,697.00	99.74
4596	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO EN PLANTA LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, LA PAZ.		141,883.12	141,883.12	138,826.64	97.85
4590	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN CRISTOBAL DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.		138,643.75	138,643.75	137,705.49	99.32
4616	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, ASI COMO CAMBIO DE LA LINEA DE IMPELENCIA EN EL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE, LA UNIÓN.		135,443.88	135,443.88	94,877.19	70.05
4580	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO JARDINES DE SONSONATE.		133,403.58	133,403.58	133,403.58	100.00
4575	RECONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIREADORES DE LA CAMARA HUMEDA DE LA ESTACION DE BOMBEO LA TOMA DE QUEZALTEPEQUE, DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE.		78,518.95	78,518.95	78,518.95	100.00
4593	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE.		62,456.50	62,456.50	55,778.32	89.31
4584	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M3 Y CERCADO PERIMETRAL EN PLANTA DE BOMBEO COLONIAS UNIDAS, MUNICIPIO DE SANTA ANA.		42,366.21	41,999.23	41,999.23	100.00
4604	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PASAQUINA Y FRONTERA EL AMATILLO, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.		41,489.07	41,489.07	41,489.07	100.00
4581	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO BARRIO EL PILAR DE SONSONATE.		38,824.74	38,824.74	38,824.74	100.00
4609	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA LLANO LOS PATOS, CAMBIO LINEA DE IMPELENCIA DE Ø 8" A Ø 10", MUNICIPIO DE CONCHAGUA, LA UNIÓN.		30,920.34	30,920.34	30,920.34	100.00
4577	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE DIFERENTES DIAMETROS PARA AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCION EN EL CANTON PRIMAVERA E INCORPORACION DE FUENTE CON EL FIN DE AUMENTAR LA COBERTURA EN LA ZONA.		22,732.85	22,732.85	22,732.33	100.00
4633	CAMBIO Y RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAÑERIAS DE AGUA POTABLE (700 MTS.) CANTON LAS MARIAS, CHINAMECA, SAN MIGUEL.		18,677.01	18,677.00	18,677.00	100.00



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
4605	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE USulután, MEDIANTE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN TANQUES EL MANZAL, MUNICIPIO DE USULUTÁN.		18,514.70	18,514.70	-	0.00
4607	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE OZATLÁN, USULUTÁN.		14,775.54	14,775.54	-	0.00
4579	CAMBIO Y PROFUNDIZACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN CANTON EL TINTRAL, MUNICIPIO DE COATEPEQUE.		6,331.13	6,331.13	6,037.97	95.37
4606	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER, USULUTÁN.		305.37	-	-	0.00
4570	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 DE CAPACIDAD, EN PLANTA EL MIRADOR, PLANES DE RENDEROS, SAN SALVADOR.		11.87	-	-	0.00
4572	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE REBOMBEO, MUNICIPIO DE APOPA.		0.01	-	-	0.00
CEL		7	41,536,345.17	38,164,135.17	29,860,247.69	78.24
3119	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHIPARRAI		34,854,755.00	32,124,395.00	28,802,771.91	89.66
4400	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.		2,511,755.00	2,241,045.00	1,023,206.32	45.66
5504	Suministro e Instalación de tres generadores fotovoltaicos con una capacidad total de aproximadamente 540 kw, con conexión a la red en las Centrales Hidroeléctricas Cerrón Grande y 15 de Septiembre.		2,195,985.00	2,195,985.00	-	0.00
622	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON		1,230,565.00	1,058,265.00	32,404.96	3.06
5570	Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana.		436,140.00	246,300.00	1,861.50	0.76
373	3A. UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CERRON GRANDE (MUNICIPIO DE JUTIAPA)		253,130.00	253,130.00	-	0.00
3684	Suministro e Instalación de una micro unidad generadora en la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.		45,015.17	45,015.17	-	0.00
CEPA		6	6,271,043.23	2,708,043.23	1,502,435.42	55.48
5728	Adquisición de Puentes de Abordaje para el Aeropuerto Internacional El Salvador		2,100,000.00	420,000.00	-	0.00
3951	REHABILITACION DE LAS TABIESTACAS Y PILOTES METALICOS DE LOS MUELLES "A" Y "B" DEL PUERTO DE ACAJUITA		1,830,000.00	-	-	0.00
4803	Obras de Mitigación en el Aeropuerto Internacional Ilopango, FASE I.		1,414,039.16	1,414,039.16	1,226,835.71	86.76
5583	Rehabilitación del pavimento asfáltico de calle perimetral entre SEI y acceso a del Aeropuerto Internacional El Salvador, Fase I		450,000.00	397,000.00	-	0.00
5632	Remodelación y Equipamiento de Servicios Sanitarios del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional El Salvador		300,000.00	300,000.00	149,390.99	49.80
5610	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR		177,004.07	177,004.07	126,208.72	71.30
OTRAS						
FOMILENIO		13	145,882,580.22	115,741,346.39	115,746,064.31	100.00
40388	Proyecto de Conectividad - Carretera Longitudinal del Norte - Sub-actividad de Construcción		86,676,380.93	73,669,621.15	73,675,111.39	100.01
40637	Subactividad Contingencias - Conectividad		13,000,000.00	326,241.32	326,241.32	100.00
40394	Proyecto de Conectividad - Caminos Rurales - Sub-actividad de Contrapartida Conectividad		11,415,924.24	10,130,212.77	10,135,230.84	100.05
40386	Proyecto de Conectividad - Carretera Longitudinal del Norte - Sub-actividad de Adquisición de Derechos de Vía		9,289,458.52	8,108,649.69	8,103,542.33	99.94
40371	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Electrificación		9,083,116.61	8,192,547.10	8,192,547.10	100.00
40389	Proyecto de Conectividad - Carretera Longitudinal del Norte - Sub-actividad de Supervisión de Construcción		4,921,600.82	3,959,499.06	3,959,499.03	100.00
40372	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Agua y Saneamiento		3,722,223.49	3,722,106.96	3,722,106.96	100.00
40373	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Infraestructura Comunitaria		1,964,769.52	1,921,674.14	1,921,674.14	100.00



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012, EJECUCION AL MES DE OCTUBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
40374	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Contrapartida Desarrollo Comunitario		1,820,550.89	1,752,110.11	1,752,110.11	100.00
40367	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Educación Formal		1,540,359.96	1,537,486.10	1,537,486.10	100.00
40368	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Educación Informal		1,236,047.67	1,211,050.42	1,211,050.42	100.00
40369	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Asistencia Técnica		949,837.31	949,837.31	949,837.31	100.00
40370	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Contrapartida Educación y Capacitación		260,310.26	260,310.26	259,627.20	99.74
FONAVIPO		11	30,843,498.52	27,471,455.53	13,619,123.52	49.58
5503	CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS ALMERDIROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		10,404,708.14	8,395,883.72	2,603,905.90	31.01
5085	CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACIÓN SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		10,131,291.12	9,439,945.85	7,045,948.71	74.64
5396	CONSTRUCCIÓN DE 308 VIVIENDAS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACIÓN LOS MANANTIALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE		3,687,201.97	3,313,166.85	2,682,569.28	80.97
5192	CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACIÓN PROCAVIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		2,773,213.53	2,597,221.32	1,020,883.51	39.31
5371	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de San Vicente		1,352,103.36	1,352,103.36	64,374.48	4.76
5738	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PERMANENTES EN EL MUNICIPIO DE VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE		944,250.00	877,119.06	-	0.00
5370	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Nuevo Verapaz, Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente		514,268.22	514,268.22	85,260.13	16.58
5735	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN EL PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LA TOMA, MUNICIPIO DE AGUILARES, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		354,600.00	354,600.00	-	0.00
5744	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PROYECTO HABITACIONAL DOS QUEBRADAS, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE		350,000.00	350,000.00	-	0.00
5028	CONSTRUCCIÓN DE 501 VIVIENDAS EN URBANIZACIÓN NUEVO BELEN, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL		197,115.70	192,400.67	102,825.49	53.44
5245	CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACIÓN LA VICTORIA, MUNICIPIO DE APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.		134,746.48	134,746.48	13,356.07	9.91
FSV		1	1,510,000.00	1,107,500.00	-	0.00
4513	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RECURSOS LOGISTICOS, COMEDOR DEL PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV, SAN SALVADOR.		1,510,000.00	1,107,500.00	-	0.00
FONAES		2	1,066,973.72	1,066,973.72	947,701.10	88.82
5777	Programa Techo y Agua 2012-2013		850,000.00	850,000.00	730,727.38	85.97
5047	TECHO Y AGUA FASE 2011		216,973.72	216,973.72	216,973.72	100.00
FOPROLYD		1	352,445.00	352,445.00	1,683.72	0.48
5641	ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLE EN DONDE FUNCIONARÁ EL TALLER DE PRÓTESIS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO (FOPROLYD) Y SU EQUIPAMIENTO.		352,445.00	352,445.00	1,683.72	0.48
SUBTOTAL		534	1,022,623,721.01	733,185,450.00	423,082,448.03	57.70
FODES		1	224,370,540.00	186,975,450.00	186,975,450.00	100.00
5088	Inversión Municipal a través del FODES 2012		224,370,540.00	186,975,450.00	186,975,450.00	100.00
TOTAL GENERAL		535	1,246,994,261.01	920,160,770.69	610,057,898.03	66.30



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2012
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO PROG. ANUAL		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
FOMILENIO			145,862,580.22	P	12,468,874.46	0.00	0.00	12,468,874.46	0.00	103,272,471.93	103,272,471.93	115,741,346.39
				E	12,473,209.53	0.00	0.00	12,473,209.53	0.00	103,272,854.78	103,272,854.78	115,746,064.31
				D	-4,335.07	0.00	0.00	-4,335.07	0.00	-382.85	-382.85	-4,717.92
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
	40366	Proyecto de Conectividad - Carretera Longitudinal del Norte - Sub-actividad de Construcción	86,676,390.93	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,669,621.15	73,669,621.15	73,669,621.15
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675,111.39	73,675,111.39	73,675,111.39
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,490.24	-5,490.24	-5,490.24
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
	40637	Subactividad Contingencias - Conectividad	13,000,000.00	P	326,241.32	0.00	0.00	326,241.32	0.00	0.00	0.00	326,241.32
				E	326,241.32	0.00	0.00	326,241.32	0.00	0.00	0.00	326,241.32
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	40394	Proyecto de Conectividad - Caminos Rurales - Sub-actividad de Contrapartida Conectividad	11,415,924.24	P	10,130,212.77	0.00	0.00	10,130,212.77	0.00	0.00	0.00	10,130,212.77
				E	10,135,230.84	0.00	0.00	10,135,230.84	0.00	0.00	0.00	10,135,230.84
				D	-5,018.07	0.00	0.00	-5,018.07	0.00	0.00	0.00	-5,018.07
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	40386	Proyecto de Conectividad - Carretera Longitudinal del Norte - Sub-actividad de Adquisición de Derechos de Vía	9,289,458.52	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,108,649.89	8,108,649.89	8,108,649.89
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103,542.33	8,103,542.33	8,103,542.33
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,107.36	5,107.36	5,107.36
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	99.9 %	99.9 %	99.9 %
	40371	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Electrificación	9,083,116.61	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,192,547.10	8,192,547.10	8,192,547.10
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,192,547.10	8,192,547.10	8,192,547.10
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
	40389	Proyecto de Conectividad - Carretera Longitudinal del Norte - Sub-actividad de Supervisión de Construcción	4,921,600.82	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959,499.06	3,959,499.06	3,959,499.06
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959,499.03	3,959,499.03	3,959,499.03
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
	40372	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Agua y Saneamiento	3,722,223.49	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722,106.96	3,722,106.96	3,722,106.96
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722,106.96	3,722,106.96	3,722,106.96
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
	40373	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Infraestructura Comunitaria	1,964,789.52	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,674.14	1,921,674.14	1,921,674.14
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,674.14	1,921,674.14	1,921,674.14
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
	40374	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Contrapartida Desarrollo Comunitario	1,820,550.89	P	1,752,110.11	0.00	0.00	1,752,110.11	0.00	0.00	0.00	1,752,110.11
				E	1,752,110.11	0.00	0.00	1,752,110.11	0.00	0.00	0.00	1,752,110.11
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %

	40367	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Educación Formal	1,540,359.90	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,537,486.10 1,537,486.10 0.00 100.0 %	1,537,486.10 1,537,486.10 0.00 100.0 %	1,537,486.10 1,537,486.10 0.00 100.0 %
	40368	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Educación Informal	1,238,047.87	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,211,050.42 1,211,050.42 0.00 100.0 %	1,211,050.42 1,211,050.42 0.00 100.0 %	1,211,050.42 1,211,050.42 0.00 100.0 %
	40369	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Asistencia Técnica	949,837.31	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	949,837.31 949,837.31 0.00 100.0 %	949,837.31 949,837.31 0.00 100.0 %	949,837.31 949,837.31 0.00 100.0 %
	40370	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Contrapartida Educación y Capacitación	250,310.26	P E D %	250,310.26 259,627.26 883.00 99.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	250,310.26 259,627.26 883.00 99.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	250,310.26 259,627.26 883.00 99.7 %
FISDL			127,387,001.00	P E D %	36,119,807.62 31,879,618.97 4,240,248.65 88.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,119,276.03 710,475.87 1,408,800.18 33.5 %	36,119,807.62 31,879,618.97 4,240,248.65 88.3 %	37,462,595.81 23,381,807.34 14,080,989.47 62.4 %	18,371,450.85 9,789,538.50 8,581,612.29 53.3 %	55,834,047.86 33,171,445.90 22,662,601.76 59.4 %	94,073,191.31 65,761,540.74 28,311,650.57 69.9 %
	4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL	46,738,268.00	P E D %	36,119,807.62 31,879,618.97 4,240,248.65 88.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	36,119,807.62 31,879,618.97 4,240,248.65 88.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,958,759.85 2,480,816.08 477,943.77 83.8 %	2,958,759.85 2,480,816.08 477,943.77 83.8 %	39,078,627.47 34,360,435.05 4,718,192.42 87.9 %
	5529	PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y EMPLEABILIDAD	26,808,330.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	15,475,263.00 10,247,050.96 5,228,152.04 66.2 %	7,052,677.00 4,418,649.00 2,634,028.00 62.7 %	22,527,940.00 14,665,729.96 7,862,210.04 65.1 %	22,527,940.00 14,665,729.96 7,862,210.04 65.1 %
	5384	PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS	13,500,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,139,732.00 4,580,040.59 3,579,691.41 58.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,139,732.00 4,580,040.59 3,579,691.41 58.0 %	8,139,732.00 4,580,040.59 3,579,691.41 58.0 %
	5628	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER	11,085,875.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	9,164,213.81 6,196,803.38 2,967,610.43 67.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	9,164,213.81 6,196,803.38 2,967,610.43 67.6 %	9,164,213.81 6,196,803.38 2,967,610.43 67.6 %
	5630	COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN EDUCACIÓN	8,449,016.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,527,545.00 0.00 2,527,545.00 0.0 %	2,527,545.00 0.00 2,527,545.00 0.0 %	2,527,545.00 0.00 2,527,545.00 0.0 %
	4460	FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNANZA (FISDL / KFW IV)	4,581,920.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,202,985.00 2,326,361.17 1,876,623.83 55.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,202,985.00 2,326,361.17 1,876,623.83 55.4 %	4,202,985.00 2,326,361.17 1,876,623.83 55.4 %
	4996	PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FISDL V)	4,535,265.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,932,700.00 2,209,465.59 1,723,234.41 56.2 %	3,932,700.00 2,209,465.59 1,723,234.41 56.2 %	3,932,700.00 2,209,465.59 1,723,234.41 56.2 %
	2680	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL	3,900,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,119,276.03 710,475.87 1,408,800.18 33.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,119,276.03 710,475.87 1,408,800.18 33.5 %
	5627	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR	3,000,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	480,403.00 51,521.24 428,881.76	962,240.00 0.00 962,240.00	1,442,843.00 51,521.24 1,391,121.76	1,442,843.00 51,521.24 1,391,121.76

		COMPONENTE I		%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	10.7 %	0.0 %	3.6 %	3.6 %
	4472	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV	1,600,000.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,604.00	823,604.00	823,604.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,417.71	567,417.71	567,417.71
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,188.29	258,188.29	258,188.29
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	68.9 %	68.9 %	68.9 %
	4184	PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA DE EL SALVADOR (PAPE\$)	1,388,327.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,925.00	113,925.00	113,925.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,490.18	113,490.18	113,490.18
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.82	434.82	434.82
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	99.6 %	99.6 %	99.6 %
MOP			54,777,094.00	P	12,632,075.16	0.00	0.00	12,632,075.16	31,748,225.58	0.00	31,748,225.58	44,380,300.74
				E	3,245,321.38	0.00	0.00	3,245,321.38	582,557.30	0.00	582,557.30	3,827,878.68
				D	9,386,753.78	0.00	0.00	9,386,753.78	31,165,668.28	0.00	31,165,668.28	40,552,422.06
				%	25.7 %	0.0 %	0.0 %	25.7 %	1.8 %	0.0 %	1.8 %	8.6 %
	3737	APERTURA BOULEVARD DIEGO DE HOLGUIN-SANTA TECLA TRAMO II	22,592,182.00	P	387,955.00	0.00	0.00	387,955.00	2,984,270.00	0.00	2,984,270.00	3,372,225.00
				E	889,453.91	0.00	0.00	889,453.91	0.00	0.00	0.00	889,453.91
				D	-501,498.91	0.00	0.00	-501,498.91	2,984,270.00	0.00	2,984,270.00	2,482,771.09
				%	229.3 %	0.0 %	0.0 %	229.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	26.4 %
	5587	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NTE DE EL SALVADOR. MANTTO DE LA CARRETERA CA03 TRAMO 2A: NVA CONCEPCION CHALATENANGO, RUTA CA03E TRAMO: CA04N (DV AMAYO) - CHALATENANGO, DEPTO DE CHALATENANGO	13,751,780.00	P	863,375.00	0.00	0.00	863,375.00	6,618,250.00	0.00	6,618,250.00	7,481,625.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	863,375.00	0.00	0.00	863,375.00	6,618,250.00	0.00	6,618,250.00	7,481,625.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5098	PROGRAMA OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS	13,319,946.00	P	1,220,556.00	0.00	0.00	1,220,556.00	9,388,910.00	0.00	9,388,910.00	10,609,466.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	1,220,556.00	0.00	0.00	1,220,556.00	9,388,910.00	0.00	9,388,910.00	10,609,466.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5741	PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD EN LA CUENCA BAJA DEL RIO LEMPA, MUNICIPIOS DE TECOLUCA, BERLIN Y JIQUILISCO, DEPARTAMENTOS DE SAN VICENTE Y USulután	7,653,901.00	P	7,653,901.00	0.00	0.00	7,653,901.00	0.00	0.00	0.00	7,653,901.00
				E	2,212,834.62	0.00	0.00	2,212,834.62	0.00	0.00	0.00	2,212,834.62
				D	5,441,066.38	0.00	0.00	5,441,066.38	0.00	0.00	0.00	5,441,066.38
				%	28.9 %	0.0 %	0.0 %	28.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	28.9 %
	5586	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NTE DE EL SALVADOR. MANTTO DE LA CARRETERA CA03 TRAMO 2A: NVA CONCEPCION, CHALATENANGO, RUTA CA03W TRAMO: CA04N (DV AMAYO) - NVA CONCEPCION, DEPTO DE CHALATENANGO	8,009,920.00	P	246,685.00	0.00	0.00	246,685.00	1,874,475.00	0.00	1,874,475.00	2,121,180.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	246,685.00	0.00	0.00	246,685.00	1,874,475.00	0.00	1,874,475.00	2,121,180.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5457	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO CHA25N, TRAMO: NUEVA CONCEPCION - I.D. LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO	5,724,110.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	521,935.00	0.00	521,935.00	521,935.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	521,935.00	0.00	521,935.00	521,935.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %

5458	MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO LIB22S: ET. LIB05W (DV. COMASAGUA) - DV. LIB18S (CHILTIUPAN); DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	5,291,402.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,010,157.63 0.00 5,010,157.63 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,010,157.63 0.00 5,010,157.63 0.0 %	5,010,157.63 0.00 5,010,157.63 0.0 %
5453	MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO LIB31N, TRAMO: SAN PABLO TACACHICO - CANTON SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	3,587,315.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,354,510.00 0.00 2,354,510.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,354,510.00 0.00 2,354,510.00 0.0 %	2,354,510.00 0.00 2,354,510.00 0.0 %
5633	RECONSTRUCCION DE PUENTES CUINIKIL, AZAMBIO Y BOVEDA ENTRADA A CHALATENANGO, RUTA CA03 TRAMO: D.VIO AMAYO - CHALATENANGO, MUNICIPIOS DE SANTA RITA Y CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO	1,372,210.00	P E D %	157,865.00 0.00 157,865.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	157,865.00 0.00 157,865.00 0.0 %	1,099,755.00 0.00 1,099,755.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,099,755.00 0.00 1,099,755.00 0.0 %	1,257,620.00 0.00 1,257,620.00 0.0 %
5511	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369	925,835.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	925,835.00 219,055.01 706,779.99 23.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	925,835.00 219,055.01 706,779.99 23.7 %	925,835.00 219,055.01 706,779.99 23.7 %
5459	MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO SAV29S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE.	868,246.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
5351	Reconstrucción de Obras de Protección y de Mitigación en Quebrada Chilismuyo, Av. Washington, Colonia Ciudad Satélite, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador	739,016.00	P E D %	57,146.01 23,962.85 33,183.16 41.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	57,146.01 23,962.85 33,183.16 41.9 %	439,584.72 184,329.62 255,255.10 41.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	439,584.72 184,329.62 255,255.10 41.9 %	496,730.73 208,292.47 288,438.26 41.9 %
5655	CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE QUEBRADA LA LECHUZA, ALEDAÑO AL PARQUEO DE LA UIDV (VMOP), MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	491,854.00	P E D %	40,004.15 22,120.72 17,883.43 55.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	40,004.15 22,120.72 17,883.43 55.3 %	307,724.23 170,159.40 137,564.83 55.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	307,724.23 170,159.40 137,564.83 55.3 %	347,728.38 192,260.12 155,448.26 55.3 %
5681	Rehabilitación de calle entre el desvío de Cantón Guarjila hacia Municipio Las Vueltas, Departamento de Chalatenango	400,000.00	P E D %	400,000.00 12,595.94 387,404.06 3.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	400,000.00 12,595.94 387,404.06 3.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	400,000.00 12,595.94 387,404.06 3.1 %
5682	Rehabilitación de calle entre Caserio El Mozote, Cantón La Guacamaya, Colonia Altamiro y Comunidad El Barrial del	400,000.00	P E D %	400,000.00 4,098.26 395,901.74	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	400,000.00 4,098.26 395,901.74	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	400,000.00 4,098.26 395,901.74

		Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán		%	1.0 %	0.0 %	0.0 %	1.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	1.0 %
	5684	Pavimentación de Calle entre Cantón Los Lagartos, Municipio de San Julián hacia el Cantón El Sunza, Municipio de Izalco, en el Departamento de Sonsonate.	303,570.00	P E D %	303,570.00 11,826.95 291,743.05 3.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	303,570.00 11,826.95 291,743.05 3.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	303,570.00 11,826.95 291,743.05 3.9 %
	5623	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2037	257,415.00	P E D %	21,000.00 1,171.73 19,828.27 5.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	21,000.00 1,171.73 19,828.27 5.6 %	161,490.00 9,013.27 152,476.73 5.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	161,490.00 9,013.27 152,476.73 5.6 %	182,490.00 10,185.00 172,305.00 5.6 %
	5688	Mejoramiento de calle entre el desvfo Caserio Camalote, Municipio El Carrizal hacia carretera CHA06N (La Montañana); Municipio de La Laguna, en el Departamento de Chalatenango.	200,000.00	P E D %	200,000.00 10,282.45 189,717.55 5.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,000.00 10,282.45 189,717.55 5.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,000.00 10,282.45 189,717.55 5.1 %
	5690	Mejoramiento de calle entre los Municipios de San Rafael Oriente y San Jorge, Departamento de San Miguel	200,000.00	P E D %	200,000.00 0.00 200,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,000.00 0.00 200,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,000.00 0.00 200,000.00 0.0 %
	5743	Construcción de Obras de Protección del Puente La Chapina en el Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate.	160,615.00	P E D %	103,550.00 0.00 103,550.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	103,550.00 0.00 103,550.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	103,550.00 0.00 103,550.00 0.0 %
	5653	RECONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES S/ RIO COPAPAYO. RUTA CA:08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD - DVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.	132,577.00	P E D %	132,577.00 0.00 132,577.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	132,577.00 0.00 132,577.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	132,577.00 0.00 132,577.00 0.0 %
	5685	Construcción de Empedrado y Fraguado de calle San Martín, Municipio Guaymango, Ahuachapán	80,000.00	P E D %	80,000.00 16,316.22 63,683.78 20.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	80,000.00 16,316.22 63,683.78 20.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	80,000.00 16,316.22 63,683.78 20.4 %
	5687	Construcción de Empedrado y Fraguado de calle en el Municipio de San Lorenzo, Ahuachapán	80,000.00	P E D %	80,000.00 9,780.14 70,219.86 12.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	80,000.00 9,780.14 70,219.86 12.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	80,000.00 9,780.14 70,219.86 12.2 %
	5008	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PUENTES TULE (KM 45.48) Y COLIMA (KM 47.45), CARRETERA TRONCAL DEL NORTE (CA:4N), MUNICIPIO DE EL PAISNAL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	69,303.30	P E D %	7,974.00 0.00 7,974.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	7,974.00 0.00 7,974.00 0.0 %	61,329.00 0.00 61,329.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	61,329.00 0.00 61,329.00 0.0 %	69,303.00 0.00 69,303.00 0.0 %
	5688	Rehabilitación de calles en los Cantones Calzontes Arriba y Potrero Grande, Municipio de	52,000.00	P E D %	52,000.00 6,960.70 45,039.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	52,000.00 6,960.70 45,039.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	52,000.00 6,960.70 45,039.30

		Santa Ana, Santa Ana.		%	13.4 %	0.0 %	0.0 %	13.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	13.4 %
	1506	AMPLIACION DE ALAMEDA JUAN PABLO II E/ 75 AV. NORTE Y AV. MASFERRER, SAN SALVADOR.	23,917.00	P E D %	23,917.00 23,916.88 0.11 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	23,917.00 23,916.88 0.11 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	23,917.00 23,916.88 0.11 100.0 %
ANDA			53,735,811.75	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,495,000.00 0.00 6,495,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,495,000.00 0.00 6,495,000.00 0.0 %	9,887,135.00 182,721.87 9,704,413.13 1.8 %	14,438,347.57 475,046.34 13,963,301.23 3.3 %	24,325,482.57 657,708.21 23,667,714.36 2.7 %	30,820,482.57 657,708.21 30,162,714.36 2.1 %
	5584	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.	21,401,958.75	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	10,142,055.00 0.00 10,142,055.00 0.0 %	10,142,055.00 0.00 10,142,055.00 0.0 %	10,142,055.00 0.00 10,142,055.00 0.0 %
	5034	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR.	15,759,868.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	9,887,135.00 182,721.87 9,704,413.13 1.8 %	857,043.00 0.00 857,043.00 0.0 %	10,744,178.00 182,721.87 10,561,456.13 1.7 %	10,744,178.00 182,721.87 10,561,456.13 1.7 %
	5134	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.	4,573,985.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,439,249.57 475,046.34 2,964,203.23 13.8 %	3,439,249.57 475,046.34 2,964,203.23 13.8 %	3,439,249.57 475,046.34 2,964,203.23 13.8 %
	5588	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO, BAJO GESTIÓN DESCENTRALIZADA A NIVEL NACIONAL FASE II	3,101,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 0.0 %
	5586	Construcción de línea de impulsión desde Planta Guluchapa a estación de prebombeo Selt Sult.	1,893,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	800,000.00 0.00 800,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	800,000.00 0.00 800,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	800,000.00 0.00 800,000.00 0.0 %
	5584	Proyecto de Instalación de 6 km de tubería de 8" entre Km. 6 a Km. 12 en la ciudad de Apopa.	1,500,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	700,000.00 0.00 700,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	700,000.00 0.00 700,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	700,000.00 0.00 700,000.00 0.0 %
	5600	PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE AYUDA MUTUA EN COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL.	1,250,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	775,000.00 0.00 775,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	775,000.00 0.00 775,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	775,000.00 0.00 775,000.00 0.0 %
	5587	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTÓN GUAYCUME Y COMUNIDAD ALTOS DE LAS FLORES, TONACATEPEQUE, SAN SALVADOR.	1,200,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	700,000.00 0.00 700,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	700,000.00 0.00 700,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	700,000.00 0.00 700,000.00 0.0 %
		MEJORAMIENTO E INTRODUCCIÓN DEL										

	5585	SERVICIO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES Y ZONA PLAYAS TURISTICAS DEL MUNICIPIO DEL PUERTO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	1,000,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	675,000.00 0.00 675,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	675,000.00 0.00 675,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	675,000.00 0.00 675,000.00 0.0 %	
	5613	Construcción de Edificio de Oficinas administrativas de la Región Metropolitana, Municipio de San Salvador	1,000,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	675,000.00 0.00 675,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	675,000.00 0.00 675,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	675,000.00 0.00 675,000.00 0.0 %	
	5599	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 3,500 M3 SAN MIGUELITO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.	500,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	400,000.00 0.00 400,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	400,000.00 0.00 400,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	400,000.00 0.00 400,000.00 0.0 %	
	5592	Construcción de colector de aguas negras en Colonia Jardines del Pepeto III del Municipio de Soyapango.	200,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	170,000.00 0.00 170,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	170,000.00 0.00 170,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	170,000.00 0.00 170,000.00 0.0 %	
	5057	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS PLANES DE RENDEROS, MEDIANTE LA PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE UN NUEVO POZO EN PLANTA BALBOA, SAN SALVADOR.	179,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 0.00 150,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 0.00 150,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 0.00 150,000.00 0.0 %	
	5060	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE ALTAVISTA II, MEDIANTE LA UNIFICACIÓN DE LOS PANELES DE CONTROL DE LAS ETAPAS I, II Y III DE ALTAVISTA II, ILOPANGO, SAN SALVADOR	178,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 0.00 150,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 0.00 150,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 0.00 150,000.00 0.0 %	
MINSAL			44,201,625.00	P E D %	2,309,279.00 345,961.78 1,963,317.22 15.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,309,279.00 345,961.78 1,963,317.22 15.0 %	30,137,030.59 3,672,900.24 26,464,138.35 12.2 %	0.00 183,085.22 -183,085.22 0.0 %	30,137,030.59 3,855,965.48 26,281,073.13 12.6 %	32,446,317.59 4,201,927.24 28,244,390.35 13.0 %
	5120	Programa Integrado de Salud	23,145,410.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	14,375,043.59 3,517,638.35 10,857,405.24 24.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	14,375,043.59 3,517,638.35 10,857,405.24 24.5 %	14,375,043.59 3,517,638.35 10,857,405.24 24.5 %
	5131	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR	21,058,215.00	P E D %	2,309,279.00 345,961.78 1,963,317.22 15.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,309,279.00 345,961.78 1,963,317.22 15.0 %	15,761,995.00 155,261.89 15,606,733.11 1.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	15,761,995.00 155,261.89 15,606,733.11 1.0 %	18,071,274.00 501,223.67 17,570,050.33 2.8 %
CEL			41,491,330.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	27,378,425.00 25,171,535.78 2,206,889.22 91.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	27,378,425.00 25,171,535.78 2,206,889.22 91.9 %	10,740,695.00 4,688,711.91 6,051,983.09 43.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	10,740,695.00 4,688,711.91 6,051,983.09 43.7 %	38,119,120.00 29,850,247.69 8,258,872.31 78.3 %
		PROYECTO		P E	0.00 0.00	21,383,700.00 24,114,060.00	0.00 0.00	21,383,700.00 24,114,060.00	10,740,695.00 4,688,711.91	0.00 0.00	10,740,695.00 4,688,711.91	32,124,395.00 28,802,771.91

	3119	HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL	34,854,755.00	D	0.00	-2,730,360.00	0.00	-2,730,360.00	0.051,983.09	0.00	8,051,983.09	3,321,623.09
				%	0.0 %	112.0 %	0.0 %	112.8 %	43.7 %	0.0 %	43.7 %	89.7 %
	4400	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.	2,511,755.00	P	0.00	2,241,045.00	0.00	2,241,045.00	0.00	0.00	0.00	2,241,045.00
				E	0.00	1,023,206.32	0.00	1,023,206.32	0.00	0.00	0.00	1,023,206.32
				D	0.00	1,217,838.68	0.00	1,217,838.68	0.00	0.00	0.00	1,217,838.68
				%	0.0 %	45.7 %	0.0 %	45.7 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	45.7 %
	5504	Suministro e instalación de tres generadores fotovoltaicos con una capacidad total de aproximadamente 540 kw, con conexión a la red en las Centrales Hidroeléctricas Cerrón Grande y 15 de Septiembre.	2,195,985.00	P	0.00	2,195,985.00	0.00	2,195,985.00	0.00	0.00	0.00	2,195,985.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	2,195,985.00	0.00	2,195,985.00	0.00	0.00	0.00	2,195,985.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	622	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON	1,239,565.00	P	0.00	1,058,265.00	0.00	1,058,265.00	0.00	0.00	0.00	1,058,265.00
				E	0.00	32,404.96	0.00	32,404.96	0.00	0.00	0.00	32,404.96
				D	0.00	1,025,860.04	0.00	1,025,860.04	0.00	0.00	0.00	1,025,860.04
				%	0.0 %	3.1 %	0.0 %	3.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	3.1 %
	5570	Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana.	436,140.00	P	0.00	246,300.00	0.00	246,300.00	0.00	0.00	0.00	246,300.00
				E	0.00	1,864.50	0.00	1,864.50	0.00	0.00	0.00	1,864.50
				D	0.00	244,435.50	0.00	244,435.50	0.00	0.00	0.00	244,435.50
				%	0.0 %	0.8 %	0.0 %	0.8 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.8 %
	373	3A. UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CERRON GRANDE (MUNICIPIO DE JUTIAPA)	253,130.00	P	0.00	253,130.00	0.00	253,130.00	0.00	0.00	0.00	253,130.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	253,130.00	0.00	253,130.00	0.00	0.00	0.00	253,130.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
MINED			37,009,790.00	P	139,062.61	0.00	0.00	139,062.61	0.00	11,500,366.35	11,500,366.35	11,639,426.98
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472,210.54	6,472,210.54	6,472,210.54
				D	139,062.61	0.00	0.00	139,062.61	0.00	5,028,155.81	5,028,155.81	5,167,218.42
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	50.3 %	56.3 %	55.6 %
	5098	Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador	20,509,500.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5268	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO-EDUCA)	12,578,851.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,471,498.35	11,471,498.35	11,471,498.35
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472,210.54	6,472,210.54	6,472,210.54
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,287.81	4,999,287.81	4,999,287.81
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	58.4 %	56.4 %	56.4 %
	5768	Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES) - Componente Educación.	2,217,310.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5813	Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.	1,171,508.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5620	Programa de Infraestructura Educativa 2012	500,000.00	P	139,062.61	0.00	0.00	139,062.61	0.00	0.00	0.00	139,062.61
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	139,062.61	0.00	0.00	139,062.61	0.00	0.00	0.00	139,062.61
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4188	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS ESCOLARES EN DPTOS. DE AHUACHAPAN.	32,821.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,868.00	28,868.00	28,868.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,868.00	28,868.00	28,868.00

		CHALATENANGO, SAN MIGUEL, Y MORAZAN		%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
FOVIAL			26,393,090.00	P	13,822,637.11	0.00	0.00	13,822,637.11	3,151,468.41	0.00	3,151,468.41	16,974,105.52
				E	2,911,933.03	0.00	0.00	2,911,933.03	433,887.58	0.00	433,887.58	3,345,820.59
				D	10,910,704.08	0.00	0.00	10,910,704.08	2,717,580.55	0.00	2,717,580.55	13,628,284.93
				%	21.1 %	0.0 %	0.0 %	21.1 %	13.6 %	0.0 %	13.6 %	19.7 %
	4754	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2012	18,618,000.00	P	12,218,000.00	0.00	0.00	12,218,000.00	0.00	0.00	0.00	12,218,000.00
				E	2,752,953.78	0.00	0.00	2,752,953.78	0.00	0.00	0.00	2,752,953.78
				D	9,465,046.22	0.00	0.00	9,465,046.22	0.00	0.00	0.00	9,465,046.22
				%	22.5 %	0.0 %	0.0 %	22.5 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	22.5 %
	4795	Mejoramiento Camino Rural UN102S, Tramo: El Jagüey - El Tamarindo, Departamento de La Unión	4,363,031.35	P	188,035.00	0.00	0.00	188,035.00	1,426,855.00	0.00	1,426,855.00	1,614,890.00
				E	3,751.25	0.00	0.00	3,751.25	28,855.81	0.00	28,855.81	32,607.06
				D	184,283.75	0.00	0.00	184,283.75	1,397,999.19	0.00	1,397,999.19	1,582,282.94
				%	2.0 %	0.0 %	0.0 %	2.0 %	2.0 %	0.0 %	2.0 %	2.0 %
	4774	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PULNTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2012	2,090,000.00	P	748,230.37	0.00	0.00	748,230.37	0.00	0.00	0.00	748,230.37
				E	44,751.53	0.00	0.00	44,751.53	0.00	0.00	0.00	44,751.53
				D	703,478.84	0.00	0.00	703,478.84	0.00	0.00	0.00	703,478.84
				%	6.0 %	0.0 %	0.0 %	6.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	6.0 %
	5541	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL UN138S: CA02E - EMBARCADERO LOS CORRALES, DEPARTAMENTO DE LA UNION	1,451,984.38	P	112,140.00	0.00	0.00	112,140.00	842,000.00	0.00	842,000.00	954,140.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	112,140.00	0.00	0.00	112,140.00	842,000.00	0.00	842,000.00	954,140.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4771	Mejoramiento Camino Rural AHU24S/AHU25S, Entre. Km. 151 Carretera El Litoral (CA02W) - Garita Palmera, Ahuachapán.	997,353.15	P	114,739.74	0.00	0.00	114,739.74	682,613.41	0.00	682,613.41	997,353.15
				E	52,654.13	0.00	0.00	52,654.13	405,031.75	0.00	405,031.75	457,685.88
				D	62,085.61	0.00	0.00	62,085.61	477,581.66	0.00	477,581.66	539,667.27
				%	45.9 %	0.0 %	0.0 %	45.9 %	45.9 %	0.0 %	45.9 %	45.9 %
	4779	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2012	500,000.00	P	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4488	Administración del Programa (Unidad Ejecutora)	3/2,722.00	P	256,492.00	0.00	0.00	256,492.00	0.00	0.00	0.00	256,492.00
				E	57,822.34	0.00	0.00	57,822.34	0.00	0.00	0.00	57,822.34
				D	198,669.66	0.00	0.00	198,669.66	0.00	0.00	0.00	198,669.66
				%	22.5 %	0.0 %	0.0 %	22.5 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	22.5 %
FONAVIPO			27,193,530.46	P	0.00	23,938,618.41	0.00	23,938,618.41	0.00	0.00	0.00	23,938,618.41
				E	0.00	13,456,132.89	0.00	13,456,132.89	0.00	0.00	0.00	13,456,132.89
				D	0.00	10,482,485.52	0.00	10,482,485.52	0.00	0.00	0.00	10,482,485.52
				%	0.0 %	56.2 %	0.0 %	56.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	56.2 %
	5503	CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	10,404,708.14	P	0.00	8,395,683.72	0.00	8,395,683.72	0.00	0.00	0.00	8,395,683.72
				E	0.00	2,603,905.90	0.00	2,603,905.90	0.00	0.00	0.00	2,603,905.90
				D	0.00	5,791,977.82	0.00	5,791,977.82	0.00	0.00	0.00	5,791,977.82
				%	0.0 %	31.0 %	0.0 %	31.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	31.0 %
	5085	CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	10,131,281.12	P	0.00	9,439,945.85	0.00	9,439,945.85	0.00	0.00	0.00	9,439,945.85
				E	0.00	7,045,948.71	0.00	7,045,948.71	0.00	0.00	0.00	7,045,948.71
				D	0.00	2,393,997.14	0.00	2,393,997.14	0.00	0.00	0.00	2,393,997.14
				%	0.0 %	74.6 %	0.0 %	74.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	74.6 %

	5396	CONSTRUCCIÓN DE 308 VIVIENDAS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LOS MANANTIALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE	3,687,201.97	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,313,166.85 2,682,569.28 630,597.57 81.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,313,166.85 2,682,569.28 630,597.57 81.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,313,166.85 2,682,569.28 630,597.57 81.0 %
	5192	CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION PROCAVIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	2,773,213.53	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,597,221.32 1,020,883.51 1,576,337.81 39.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,597,221.32 1,020,883.51 1,576,337.81 39.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,597,221.32 1,020,883.51 1,576,337.81 39.3 %
	5028	CONSTRUCCIÓN DE 501 VIVIENDAS EN URBANIZACION NUEVO BELEN, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL	197,115.70	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	192,400.67 102,825.49 89,575.18 53.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	192,400.67 102,825.49 89,575.18 53.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	192,400.67 102,825.49 89,575.18 53.4 %
VMVDU			20,528,008.00	P E D %	856,570.00 0.00 856,570.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	856,570.00 0.00 856,570.00 0.0 %	11,539,360.24 1,389,829.60 10,149,730.84 12.0 %	815,793.00 795,823.00 20,170.00 97.5 %	12,355,153.24 2,185,252.60 10,169,900.64 17.7 %	13,011,723.24 2,185,252.60 10,826,470.64 16.8 %
	5132	PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS	10,500,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	7,008,740.24 1,389,829.60 5,619,110.64 19.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	7,008,740.24 1,389,829.60 5,619,110.64 19.8 %	7,008,740.24 1,389,829.60 5,619,110.64 19.8 %
	5100	DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA	7,445,585.00	P E D %	856,570.00 0.00 856,570.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	856,570.00 0.00 856,570.00 0.0 %	4,530,820.00 0.00 4,530,820.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,530,820.00 0.00 4,530,820.00 0.0 %	5,187,190.00 0.00 5,187,190.00 0.0 %
	5769	Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios- PACSES, a nivel Nacional.	2,086,880.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	20,170.00 0.00 20,170.00 0.0 %	20,170.00 0.00 20,170.00 0.0 %	20,170.00 0.00 20,170.00 0.0 %
	5781	Programa de fortalecimiento de las capacidades asociativas para la generación de empleo intensivo en Comunidades Solidarias Urbanas, a nivel Nacional.	795,823.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	795,823.00 795,823.00 0.00 100.0 %	795,823.00 795,823.00 0.00 100.0 %	795,823.00 795,823.00 0.00 100.0 %
CSJ			18,723,845.00	P E D %	17,423,374.30 267,606.25 17,155,768.05 1.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	17,423,374.30 267,606.25 17,155,768.05 1.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	17,423,374.30 267,606.25 17,155,768.05 1.5 %
	4344	Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador	8,153,725.00	P E D %	7,127,793.78 0.00 7,127,793.78 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	7,127,793.78 0.00 7,127,793.78 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	7,127,793.78 0.00 7,127,793.78 0.0 %
	3931	Construcción Centro Judicial Integrado de La Unión	2,570,120.00	P E D %	2,570,120.00 5,818.00 2,564,302.00 0.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,570,120.00 5,818.00 2,564,302.00 0.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,570,120.00 5,818.00 2,564,302.00 0.2 %

	4225	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR	2,168,000.00	P E D %	2,168,000.00 6,722.00 2,161,278.00 0.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,168,000.00 6,722.00 2,161,278.00 0.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,168,000.00 6,722.00 2,161,278.00 0.3 %
	3385	Construcción Centro Judicial Integrado de Apopa, San Salvador	2,000,000.00	P E D %	1,992,630.20 0.00 1,992,630.20 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,992,630.20 0.00 1,992,630.20 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,992,630.20 0.00 1,992,630.20 0.0 %
	5637	Construcción y Equipamiento de Salas de Audiencia en Tribunales a Nivel Nacional	1,500,000.00	P E D %	1,363,830.32 0.00 1,363,830.32 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,363,830.32 0.00 1,363,830.32 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,363,830.32 0.00 1,363,830.32 0.0 %
	5638	Remodelaciones, Ampliaciones, Readecuaciones y Mejoras Institucionales a Nivel Nacional	1,500,000.00	P E D %	1,467,000.00 255,066.25 1,211,933.75 17.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,467,000.00 255,066.25 1,211,933.75 17.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,467,000.00 255,066.25 1,211,933.75 17.4 %
	3386	"Construcción Centro Judicial Integrado de San Marcos, San Salvador"	350,000.00	P E D %	301,000.00 0.00 301,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	301,000.00 0.00 301,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	301,000.00 0.00 301,000.00 0.0 %
	3485	Remodelación y Ampliación Centro Judicial Integrado de Sonsonate	350,000.00	P E D %	301,000.00 0.00 301,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	301,000.00 0.00 301,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	301,000.00 0.00 301,000.00 0.0 %
	5444	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE LA CIRCUNSCRIPCION DE SAN RAFAEL, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO	66,000.00	P E D %	66,000.00 0.00 66,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	66,000.00 0.00 66,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	66,000.00 0.00 66,000.00 0.0 %
	5445	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE LA CIRCUNSCRIPCION DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.	66,000.00	P E D %	66,000.00 0.00 66,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	66,000.00 0.00 66,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	66,000.00 0.00 66,000.00 0.0 %
MAG			16,269,493.47	P E D %	828,870.00 344,593.05 484,276.95 41.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	828,870.00 344,593.05 484,276.95 41.6 %	5,402,883.87 4,855,001.58 1,547,882.29 75.8 %	5,143,075.57 1,853,048.90 3,490,027.67 32.1 %	11,545,960.44 6,508,050.48 5,037,909.96 56.4 %	12,374,830.44 6,852,043.53 5,522,786.91 55.4 %
	4377	PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LA REGION CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR-Central)	4,903,835.00	P E D %	301,660.00 80,148.11 221,511.89 26.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	301,660.00 80,148.11 221,511.89 26.6 %	3,432,497.14 2,138,234.85 1,294,262.29 62.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,432,497.14 2,138,234.85 1,294,262.29 62.3 %	3,734,157.14 2,218,382.96 1,515,774.18 59.4 %
	3752	Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO)	4,627,705.00	P E D %	477,210.00 219,394.94 257,815.06 48.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	477,210.00 219,394.94 257,815.06 48.0 %	2,815,386.73 2,566,830.66 248,556.07 91.2 %	367,045.00 194,234.83 172,810.17 52.9 %	3,182,431.73 2,761,085.49 421,346.24 86.8 %	3,659,641.73 2,980,460.43 679,181.30 81.4 %

5725	CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA REGIÓN ORIENTAL CEDAF MORAZAN	2,050,000.00	P E D %	50,000.00 45,050.00 4,950.00 90.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	50,000.00 45,050.00 4,950.00 90.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,649,297.00 39,649.80 1,609,647.40 2.4 %	1,649,297.00 39,649.80 1,609,647.40 2.4 %	1,699,297.00 84,899.80 1,814,597.40 5.0 %
5730	Fortalecimiento de las Capacidades Productivas de Productores y Productoras de Hortalizas y Frutas, en 46 Municipios de 10 Departamentos Atendidos por el Programa PAF Cadonas Productivas del Plan de Agricultura Familiar	1,408,130.30	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	874,087.40 0.00 874,087.40 0.0 %	874,087.40 0.00 874,087.40 0.0 %	874,087.40 0.00 874,087.40 0.0 %
5731	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS FAMILIAS RURALES PARA MEJORAR SUS INGRESOS, EN MUNICIPIOS DE LAS REGIONES CENTRAL Y OCCIDENTAL DE EL SALVADOR	1,400,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 100.0 %	1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 100.0 %	1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 100.0 %
5783	Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de Riego del Bajo Lempa, en los Departamentos de San Vicente, La Paz y Usulután	1,223,123.17	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	490,373.17 0.00 490,373.17 0.0 %	490,373.17 0.00 490,373.17 0.0 %	490,373.17 0.00 490,373.17 0.0 %
5720	Construcción y Equipamiento de Infraestructura para la Producción de Camarón Marino y Cultivo de Tilapia, como Apoyo a Organizaciones Acuícolas en el Departamento de Usulután.	200,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	89,574.00 18,164.47 71,409.53 20.3 %	89,574.00 18,164.47 71,409.53 20.3 %	89,574.00 18,164.47 71,409.53 20.3 %
2983	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION RURAL (PREMODER)	155,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	155,000.00 149,936.07 5,063.93 96.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	155,000.00 149,936.07 5,063.93 96.7 %	155,000.00 149,936.07 5,063.93 96.7 %
5704	Fortalecimiento Institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológicas en Sanidad Animal, Análisis de Riesgo de Plagas y Sistema de Inteligencia de Mercados Agropecuarios en El Salvador	143,700.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	143,700.00 0.00 143,700.00 0.0 %	143,700.00 0.00 143,700.00 0.0 %	143,700.00 0.00 143,700.00 0.0 %
5763	Remodelación y Equipamiento del Laboratorio de Microbiología de Alimentos sede El Matizano para la Inspección Sanitaria de la Carne	130,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	129,000.00 1,000.00 128,000.00 0.8 %	129,000.00 1,000.00 128,000.00 0.8 %	129,000.00 1,000.00 128,000.00 0.8 %
CNR		15,142,185.00	P E D %	0.00 0.00 0.00	1,502,863.77 649,160.54 853,703.23	0.00 0.00 0.00	1,502,863.77 649,160.54 853,703.23	11,294,433.55 1,718,053.20 9,576,380.35	0.00 0.00 0.00	11,294,433.55 1,718,053.20 9,576,380.35	12,797,297.32 2,387,213.74 10,430,083.58

				%	0.0 %	43.2 %	0.0 %	43.2 %	15.2 %	0.0 %	15.2 %	18.5 %
	3541	PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II	15,142,185.00	P	0.00	1,502,863.77	0.00	1,502,863.77	11,294,433.55	0.00	11,294,433.55	12,797,297.32
				E	0.00	849,180.54	0.00	849,180.54	1,718,053.20	0.00	1,718,053.20	2,367,213.74
				D	0.00	853,703.23	0.00	853,703.23	8,576,380.35	0.00	8,576,380.35	10,430,083.58
				%	0.0 %	43.2 %	0.0 %	43.2 %	15.2 %	0.0 %	15.2 %	18.5 %
VMT			12,725,525.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558,998.00	0.00	4,558,998.00	4,558,998.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558,998.00	0.00	4,558,998.00	4,558,998.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5478	Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador	12,725,525.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558,998.00	0.00	4,558,998.00	4,558,998.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558,998.00	0.00	4,558,998.00	4,558,998.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
MH			12,121,876.00	P	94,910.00	0.00	0.00	94,910.00	4,694,082.51	0.00	4,694,082.51	4,788,972.51
				E	49,199.10	0.00	0.00	49,199.10	282,610.00	0.00	282,610.00	331,809.10
				D	45,710.90	0.00	0.00	45,710.90	4,411,452.51	0.00	4,411,452.51	4,457,163.41
				%	51.8 %	0.0 %	0.0 %	51.8 %	6.0 %	0.0 %	6.0 %	6.9 %
	4950	Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desarrollo del Sector Público. Préstamo BIRF 7512-SV.	11,300,000.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694,082.51	0.00	4,694,082.51	4,694,082.51
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	282,610.00	0.00	282,610.00	282,610.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411,452.51	0.00	4,411,452.51	4,411,452.51
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	6.0 %	0.0 %	6.0 %	6.0 %
	4204	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TRIBUTARIA	726,066.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5747	REPARACIÓN DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA	49,710.00	P	49,710.00	0.00	0.00	49,710.00	0.00	0.00	0.00	49,710.00
				E	49,199.10	0.00	0.00	49,199.10	0.00	0.00	0.00	49,199.10
				D	510.90	0.00	0.00	510.90	0.00	0.00	0.00	510.90
				%	99.0 %	0.0 %	0.0 %	99.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	99.0 %
	5736	PROTECCIÓN PERIMETRAL DE DOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE HACIENDA	45,200.00	P	45,200.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	45,200.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
PNC - MJSP			12,008,742.00	P	2,800,013.98	0.00	0.00	2,800,013.98	2,723,720.50	0.00	2,723,720.50	5,523,734.48
				E	1,582,753.27	0.00	0.00	1,582,753.27	2,650,011.07	0.00	2,650,011.07	4,232,794.34
				D	1,217,230.71	0.00	0.00	1,217,230.71	73,709.43	0.00	73,709.43	1,290,940.14
				%	56.5 %	0.0 %	0.0 %	56.5 %	97.3 %	0.0 %	97.3 %	75.6 %
	5099	Suministro e Instalación del Sistema Integral para los Centros de Atención de Emergencias 911 y AVL/GPS de la Policía Nacional Civil de El Salvador.	9,040,000.00	P	354,083.68	0.00	0.00	354,083.68	2,723,720.50	0.00	2,723,720.50	3,077,804.18
				E	344,501.45	0.00	0.00	344,501.45	2,650,011.07	0.00	2,650,011.07	2,994,512.52
				D	9,582.23	0.00	0.00	9,582.23	73,709.43	0.00	73,709.43	83,291.68
				%	97.3 %	0.0 %	0.0 %	97.3 %	97.3 %	0.0 %	97.3 %	97.3 %
	4788	Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil	1,700,000.00	P	1,649,543.96	0.00	0.00	1,649,543.96	0.00	0.00	0.00	1,649,543.96
				E	1,234,815.50	0.00	0.00	1,234,815.50	0.00	0.00	0.00	1,234,815.50
				D	414,728.46	0.00	0.00	414,728.46	0.00	0.00	0.00	414,728.46
				%	74.9 %	0.0 %	0.0 %	74.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	74.9 %
	5436	Equipamiento e instalación de un sistema para el registro del Expediente Único Digital de la Policía Nacional Civil	1,100,000.00	P	629,645.32	0.00	0.00	629,645.32	0.00	0.00	0.00	629,645.32
				E	3,466.32	0.00	0.00	3,466.32	0.00	0.00	0.00	3,466.32
				D	626,179.00	0.00	0.00	626,179.00	0.00	0.00	0.00	626,179.00
				%	0.6 %	0.0 %	0.0 %	0.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.6 %
	5778	Construcción de Estacionamiento en Instalaciones de la	166,742.00	P	166,741.02	0.00	0.00	166,741.02	0.00	0.00	0.00	166,741.02
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Subdirección de Tránsito Terrestre de la PNC		D %	166,741.02 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	166,741.02 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	166,741.02 0.0 %
ILEA			5,824,785.00	P E D %	391,386.31 171,451.49 219,934.82 43.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	391,386.31 171,451.49 219,934.82 43.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,094,238.57 38,790.18 3,055,448.39 1.3 %	3,094,238.57 38,790.18 3,055,448.39 1.3 %	3,485,624.88 210,241.67 3,275,383.21 6.0 %
	4403	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, ILEA SAN SALVADOR"	5,824,785.00	P E D %	391,386.31 171,451.49 219,934.82 43.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	391,386.31 171,451.49 219,934.82 43.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,094,238.57 38,790.18 3,055,448.39 1.3 %	3,094,238.57 38,790.18 3,055,448.39 1.3 %	3,485,624.88 210,241.67 3,275,383.21 6.0 %
MARN			5,480,215.00	P E D %	298,304.75 43,861.81 254,442.94 14.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	298,304.75 43,861.81 254,442.94 14.7 %	2,798,938.60 613,371.43 2,185,567.17 21.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,798,938.60 613,371.43 2,185,567.17 21.9 %	3,097,243.35 657,233.24 2,440,010.11 21.2 %
	5102	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL	4,130,215.00	P E D %	298,304.75 43,861.81 254,442.94 14.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	298,304.75 43,861.81 254,442.94 14.7 %	2,270,173.60 337,398.60 1,932,775.00 14.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,270,173.60 337,398.60 1,932,775.00 14.9 %	2,588,478.85 381,260.41 2,187,217.94 14.8 %
	5563	Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias - Programa de Agua y Saneamiento Rural	850,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	84,822.00 41,050.39 43,771.61 40.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	84,822.00 41,050.39 43,771.61 40.4 %	84,822.00 41,050.39 43,771.61 40.4 %
	5742	PROGRAMA DE MANEJO DE ECOSISTEMAS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD	500,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	443,943.00 234,922.44 209,020.56 52.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	443,943.00 234,922.44 209,020.56 52.9 %	443,943.00 234,922.44 209,020.56 52.9 %
CEPA			4,880,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,117,000.00 149,390.99 967,609.01 13.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,117,000.00 149,390.99 967,609.01 13.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,117,000.00 149,390.99 967,609.01 13.4 %
	5728	Adquisición de Puentes de Abordaje para el Aeropuerto Internacional El Salvador	2,100,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	420,000.00 0.00 420,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	420,000.00 0.00 420,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	420,000.00 0.00 420,000.00 0.0 %
	3951	REHABILITACION DE LAS TABLERESTACAS Y PILOTES METALICOS DE LOS MUELLES "A" Y "B" DEL PUERTO DE ACAJUTLA	1,830,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
	5583	Rehabilitación del pavimento asfáltico de calle perimetral entre SEI y acceso 6 del Aeropuerto Internacional El Salvador. Fase I	450,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	397,000.00 0.00 397,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	397,000.00 0.00 397,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	397,000.00 0.00 397,000.00 0.0 %
	5632	Remodelación y Equipamiento de Servicios Sanitarios del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional El Salvador	300,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	300,000.00 149,390.99 150,609.01 49.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	300,000.00 149,390.99 150,609.01 49.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	300,000.00 149,390.99 150,609.01 49.8 %
ISSS			3,682,420.00	P E	0.00 0.00	2,465,255.00 1,486,881.25	0.00 0.00	2,465,255.00 1,486,881.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,465,255.00 1,486,881.25

				D	0.00	978,373.75	0.00	978,373.75	0.00	0.00	0.00	978,373.75
				%	0.0 %	60.3 %	0.0 %	60.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	60.3 %
	862	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ZACAMIL	1,074,403.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				E	0.00	1,074,403.96	0.00	1,074,403.96	0.00	0.00	0.00	1,074,403.96
				D	0.00	-1,074,403.96	0.00	-1,074,403.96	0.00	0.00	0.00	-1,074,403.96
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5386	READECUACION DE LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL AMATEPEC, SAN SALVADOR.	847,875.00	P	0.00	847,875.00	0.00	847,875.00	0.00	0.00	0.00	847,875.00
				E	0.00	146,036.16	0.00	146,036.16	0.00	0.00	0.00	146,036.16
				D	0.00	701,838.84	0.00	701,838.84	0.00	0.00	0.00	701,838.84
				%	0.0 %	17.2 %	0.0 %	17.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	17.2 %
	5326	MEJORAMIENTO DE FARMACIAS EN CENTROS DE ATENCION A NIVEL NACIONAL	488,615.00	P	0.00	488,615.00	0.00	488,615.00	0.00	0.00	0.00	488,615.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	488,615.00	0.00	488,615.00	0.00	0.00	0.00	488,615.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5323	REMEDIACIÓN DEL ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS GENERALES EN CIUDADELA MONSERRAT, SAN SALVADOR.	400,000.00	P	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5325	REMEDIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA ATLACATL, SAN SALVADOR.	370,000.00	P	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4398	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA	231,209.00	P	0.00	128,449.00	0.00	128,449.00	0.00	0.00	0.00	128,449.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	128,449.00	0.00	128,449.00	0.00	0.00	0.00	128,449.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5183	REMEDIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DE SANTA ANA.	180,000.00	P	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
				E	0.00	176,158.81	0.00	176,158.81	0.00	0.00	0.00	176,158.81
				D	0.00	3,841.19	0.00	3,841.19	0.00	0.00	0.00	3,841.19
				%	0.0 %	97.9 %	0.0 %	97.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	97.9 %
	5308	SUSTITUCION DE LA CUBIERTA DE TECHO DE LA TORRE ONCOLOGICA DEL ISSS	90,316.00	P	0.00	90,316.00	0.00	90,316.00	0.00	0.00	0.00	90,316.00
				E	0.00	90,282.32	0.00	90,282.32	0.00	0.00	0.00	90,282.32
				D	0.00	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00	33.68
				%	0.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
Secr. de Inclu. Soc.			3,111,560.00	P	51,175.00	0.00	0.00	51,175.00	412,928.22	0.00	412,928.22	464,103.22
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	248,378.74	0.00	248,378.74	248,378.74
				D	51,175.00	0.00	0.00	51,175.00	164,549.48	0.00	164,549.48	215,724.48
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	60.2 %	0.0 %	60.2 %	53.5 %
	5844	PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL, PROMOCION COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CIUDAD MUJER.	1,758,085.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	412,928.22	0.00	412,928.22	412,928.22
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	248,378.74	0.00	248,378.74	248,378.74
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	164,549.48	0.00	164,549.48	164,549.48
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	60.2 %	0.0 %	60.2 %	60.2 %
	5785	Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer Usulután, Santa Ana y San Martín	1,304,300.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
		CONSTRUCCION DE KIOSCO DE MADERA PARA OFICINA DE SOLVENCIAS		P	51,175.00	0.00	0.00	51,175.00	0.00	0.00	0.00	51,175.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	5740	DE LA PNC EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO DE CIUDAD MUJER, COLON	51,175.00	P E D %	51,175.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	51,175.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	51,175.00 0.0 %
FSV			1,510,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,107,500.00 0.00 1,107,500.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,107,500.00 0.00 1,107,500.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,107,500.00 0.00 1,107,500.00 0.0 %
	4513	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RECURSOS LOGISTICOS, COMEDOR DEL PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV, SAN SALVADOR.	1,510,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,107,500.00 0.00 1,107,500.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,107,500.00 0.00 1,107,500.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,107,500.00 0.00 1,107,500.00 0.0 %
CI - MJSP			1,293,850.00	P E D %	57,585.64 15,069.13 42,516.51 28.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	57,585.64 15,069.13 42,516.51 28.2 %	442,966.46 115,916.32 327,050.14 26.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	442,966.46 115,916.32 327,050.14 26.2 %	500,552.10 130,985.45 369,566.65 26.2 %
	5137	Granja de Rehabilitacion para Jovenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil de Ilobasco, Departamento de Cabañas.	1,293,850.00	P E D %	57,585.64 15,069.13 42,516.51 28.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	57,585.64 15,069.13 42,516.51 28.2 %	442,966.46 115,916.32 327,050.14 26.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	442,966.46 115,916.32 327,050.14 26.2 %	500,552.10 130,985.45 369,566.65 26.2 %
AL			1,150,000.00	P E D %	150,000.00 57,348.02 92,651.98 38.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 57,348.02 92,651.98 38.2 %	934,486.00 353,466.41 581,019.59 37.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	934,486.00 353,466.41 581,019.59 37.8 %	1,084,486.00 410,814.43 673,671.57 37.9 %
	5222	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO II	1,150,000.00	P E D %	150,000.00 57,348.02 92,651.98 38.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 57,348.02 92,651.98 38.2 %	934,486.00 353,466.41 581,019.59 37.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	934,486.00 353,466.41 581,019.59 37.8 %	1,084,486.00 410,814.43 673,671.57 37.9 %
FONAES			1,066,973.72	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,066,973.72 947,701.10 119,272.62 88.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,066,973.72 947,701.10 119,272.62 88.8 %	1,066,973.72 947,701.10 119,272.62 88.8 %
	5777	Programa Techo y Agua 2012-2013	850,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	850,000.00 730,727.38 119,272.62 86.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	850,000.00 730,727.38 119,272.62 86.0 %	850,000.00 730,727.38 119,272.62 86.0 %
	5047	TECHO Y AGUA FASE 2011	216,973.72	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	216,973.72 216,973.72 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	216,973.72 216,973.72 0.00 100.0 %	216,973.72 216,973.72 0.00 100.0 %
MIGOB			952,047.32	P E D %	337,750.07 18,172.07 319,578.00 5.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	337,750.07 18,172.07 319,578.00 5.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	337,750.07 18,172.07 319,578.00 5.4 %
	5277	Mejoramiento de Infraestructura de 9 Gobernaciones Departamentales a nivel nacional	614,256.00	P E D %	125,037.78 16,334.92 108,702.86 13.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	125,037.78 16,334.92 108,702.86 13.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	125,037.78 16,334.92 108,702.86 13.1 %
	5775	Construcción de la Infraestructura para albergar la Gobernación Política Departamental de San Vicente.	175,744.00	P E D %	50,664.97 1,837.15 48,827.82 3.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	50,664.97 1,837.15 48,827.82 3.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	50,664.97 1,837.15 48,827.82 3.6 %

	5572	Suministro e Instalación de Sub-Estación Eléctrica de 1000kva para Imprenta Nacional.	162,047.32	P E D %	162,047.32 0.00 162,047.32 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	162,047.32 0.00 162,047.32 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	162,047.32 0.00 162,047.32 0.0 %
CONJUE			900,531.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
	5770	Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias - FOCAP	900,531.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
ISTU			800,000.00	P E D %	626,175.00 0.00 626,175.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	626,175.00 0.00 626,175.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	626,175.00 0.00 626,175.00 0.0 %
	5624	MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS RECREATIVOS DEL ISTU A NIVEL NACIONAL	800,000.00	P E D %	626,175.00 0.00 626,175.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	626,175.00 0.00 626,175.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	626,175.00 0.00 626,175.00 0.0 %
Secr. de Cultura			792,080.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	149,254.03 124,398.16 24,855.87 83.3 %	149,254.03 124,398.16 24,855.87 83.3 %	149,254.03 124,398.16 24,855.87 83.3 %
	5795	MEJORAMIENTO, ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE LA CULTURA A NIVEL NACIONAL, PARA LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR	605,630.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
	5647	RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL SANTA LUCÍA DE SUCHITOTO, SEGUNDA FASE	188,430.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	149,254.03 124,398.16 24,855.87 83.3 %	149,254.03 124,398.16 24,855.87 83.3 %	149,254.03 124,398.16 24,855.87 83.3 %
SE - MJSP			779,059.00	P E D %	74,059.77 41,510.88 32,548.89 56.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	74,059.77 41,510.88 32,548.89 56.1 %	569,690.67 319,314.54 250,376.13 56.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	643,750.44 360,825.42 282,925.02 56.1 %
	5136	Programa de Prevención de la Violencia y la Delincuencia	779,059.00	P E D %	74,059.77 41,510.88 32,548.89 56.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	74,059.77 41,510.88 32,548.89 56.1 %	569,690.67 319,314.54 250,376.13 56.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	643,750.44 360,825.42 282,925.02 56.1 %
MTYPS			700,000.00	P E D %	700,000.00 692,681.07 7,318.93 99.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	700,000.00 692,681.07 7,318.93 99.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	700,000.00 692,681.07 7,318.93 99.0 %
	5625	REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA CENTRO DE RECREACION OBRERA DR. MARIO	500,000.00	P E D %	500,000.00 492,681.07 7,318.93	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	500,000.00 492,681.07 7,318.93	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	500,000.00 492,681.07 7,318.93

		ZAMORA RIVAS LA PALMA- CHALATENANGO, MTPS		%	98.5 %	0.0 %	0.0 %	98.5 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	98.5 %
	5626	REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA CENTRO DE RECREACION OBRERA CONSTITUCION 1950, COATEPEQUE-SANTA ANA II ETAPA, MTPS	200,000.00	P E D %	200,000.00 200,000.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,000.00 200,000.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,000.00 200,000.00 0.00 100.0 %
ANSP - MJSP			507,300.00	P E D %	12,100.00 1,177.88 10,922.12 9.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,100.00 1,177.88 10,922.12 9.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,100.00 1,177.88 10,922.12 9.7 %
	5827	REFORZAMIENTO Y REMEDIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SUR DE LA ANSP, SEDE SANTA TECLA.	495,200.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
	5430	REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA PROVISIONAL Y REMEDIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ANSP, SEDE SANTA TECLA	12,100.00	P E D %	12,100.00 1,177.88 10,922.12 9.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,100.00 1,177.88 10,922.12 9.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,100.00 1,177.88 10,922.12 9.7 %
Def. del Consum.			490,272.00	P E D %	46,064.68 24,446.19 21,618.49 53.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	46,064.68 24,446.19 21,618.49 53.1 %	354,343.63 188,047.53 166,296.10 53.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	354,343.63 188,047.53 166,296.10 53.1 %	400,408.31 212,493.72 187,914.59 53.1 %
	5133	FORTALECIENDO LA ATENCION A CONSUMIDORES: DESCENTRALIZANDO SERVICIOS Y MEJORANDO LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA	490,272.00	P E D %	46,064.68 24,446.19 21,618.49 53.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	46,064.68 24,446.19 21,618.49 53.1 %	354,343.63 188,047.53 166,296.10 53.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	354,343.63 188,047.53 166,296.10 53.1 %	400,408.31 212,493.72 187,914.59 53.1 %
MIREX			467,000.00	P E D %	467,000.00 467,000.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	467,000.00 467,000.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	467,000.00 467,000.00 0.00 100.0 %
	5557	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ESPAÑA EL SALVADOR (FFI) - APOORTE EL SALVADOR	467,000.00	P E D %	467,000.00 467,000.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	467,000.00 467,000.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	467,000.00 467,000.00 0.00 100.0 %
FOPROLYD			352,445.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	352,445.00 1,683.72 350,761.28 0.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	352,445.00 1,683.72 350,761.28 0.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	352,445.00 1,683.72 350,761.28 0.5 %
	5841	ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLE EN DONDE FUNCIONARA EL TALLER DE PROTESIS DEL FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL	352,445.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	352,445.00 1,683.72 350,761.28 0.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	352,445.00 1,683.72 350,761.28 0.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	352,445.00 1,683.72 350,761.28 0.5 %

		CONFLICTO ARMADO (FOPROLYD) Y SU EQUIPAMIENTO.										
CORSATUR			100,000.00	P	18,235.50	0.00	0.00	18,235.50	0.00	0.00	0.00	18,235.50
				E	20,845.66	0.00	0.00	20,845.66	0.00	0.00	0.00	20,845.66
				D	-2,610.16	0.00	0.00	-2,610.16	0.00	0.00	0.00	-2,610.16
				%	114.3 %	0.0 %	0.0 %	114.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	114.3 %
	5689	Mejoramiento del muelle artesanal del Puerto de La Libertad, en el departamento de La Libertad	100,000.00	P	18,235.50	0.00	0.00	18,235.50	0.00	0.00	0.00	18,235.50
				E	20,845.66	0.00	0.00	20,845.66	0.00	0.00	0.00	20,845.66
				D	-2,610.16	0.00	0.00	-2,610.16	0.00	0.00	0.00	-2,610.16
				%	114.3 %	0.0 %	0.0 %	114.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	114.3 %
ISDEMU			91,301.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.50	54,054.50	54,054.50
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.50	54,054.50	54,054.50
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5785	Adecuación de Centros de Atención para la Gestión Territorial para la Igualdad y la Prevención social de la violencia de Género en 11 Municipios de Comunidades Solidarias Urbanas	91,301.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.50	54,054.50	54,054.50
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.50	54,054.50	54,054.50
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
ISNA			47,605.00	P	47,605.00	0.00	0.00	47,605.00	0.00	0.00	0.00	47,605.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	47,605.00	0.00	0.00	47,605.00	0.00	0.00	0.00	47,605.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4830	REPARACION EDIFICIO LA ESTRELLA, DELEGACION CENTRAL ISNA (FASE II)	34,936.00	P	34,936.00	0.00	0.00	34,936.00	0.00	0.00	0.00	34,936.00
				L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	34,936.00	0.00	0.00	34,936.00	0.00	0.00	0.00	34,936.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4511	REPARACIONES Y MEJORAS EN CENTRO DE REINSENCION EL ESPINO, AHUACHAPAN (Primera Fase)	12,669.00	P	12,669.00	0.00	0.00	12,669.00	0.00	0.00	0.00	12,669.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	12,669.00	0.00	0.00	12,669.00	0.00	0.00	0.00	12,669.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
BOMBER - MIGOB			3,520.05	P	0.00	3,520.05	0.00	3,520.05	0.00	0.00	0.00	3,520.05
				E	0.00	3,520.04	0.00	3,520.04	0.00	0.00	0.00	3,520.04
				D	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
				%	0.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	4999	Construcción y Equipamiento de dormitorios para el personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Estación Central.	3,520.05	P	0.00	3,520.05	0.00	3,520.05	0.00	0.00	0.00	3,520.05
				E	0.00	3,520.04	0.00	3,520.04	0.00	0.00	0.00	3,520.04
				D	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
				%	0.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
PROYECTOS REGULARES			732,503,551.87	P	102,572,975.96	64,260,627.23	2,119,276.03	166,933,603.19	166,853,971.84	167,906,027.09	327,759,998.73	496,812,877.95
				E	54,653,790.50	40,318,305.21	710,475.87	85,572,095.77	45,676,186.64	123,752,576.78	169,428,783.42	265,711,335.06
				D	47,919,185.40	23,442,322.02	1,408,800.16	71,361,507.42	124,177,785.00	34,153,450.31	158,531,235.31	231,101,542.89
				%	53.3 %	53.6 %	33.6 %	57.3 %	26.9 %	78.4 %	51.7 %	53.5 %
FONAVIPO			3,649,968.00	P	0.00	0.00	1,531,719.06	1,531,719.06	2,001,118.00	0.00	2,001,118.06	3,532,837.12
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	162,990.83	0.00	162,990.83	162,990.83
				D	0.00	0.00	1,531,719.06	1,531,719.06	1,838,127.43	0.00	1,838,127.43	3,389,846.49
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	8.1 %	0.0 %	8.1 %	4.6 %
	5371	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de San Vicente	1,352,103.36	P	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,103.36	0.00	1,352,103.36	1,352,103.36
				L	0.00	0.00	0.00	0.00	64,374.48	0.00	64,374.48	64,374.48
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,728.88	0.00	1,287,728.88	1,287,728.88
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	4.8 %	0.0 %	4.8 %	4.8 %

	5738	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PERMANENTES EN EL MUNICIPIO DE VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	944,250.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	827,119.08 0.00 827,119.08 0.0 %	827,119.08 0.00 827,119.08 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	827,119.08 0.00 827,119.08 0.0 %
	5370	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Nuevo Verapaz, Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente	514,268.22	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	514,268.22 85,260.13 429,008.09 16.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	514,268.22 85,260.13 429,008.09 16.6 %	514,268.22 85,260.13 429,008.09 16.6 %
	5735	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN EL PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LA TOMA, MUNICIPIO DE AGUILARLES, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	354,600.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	354,600.00 0.00 354,600.00 0.0 %	354,600.00 0.00 354,600.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	354,600.00 0.00 354,600.00 0.0 %
	5744	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PROYECTO HABITACIONAL DOS QUEBRADAS, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	350,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	350,000.00 0.00 350,000.00 0.0 %	350,000.00 0.00 350,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	350,000.00 0.00 350,000.00 0.0 %
	5245	CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	134,746.48	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	134,746.48 13,356.02 121,390.46 9.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	134,746.48 13,356.02 121,390.46 9.9 %	134,746.48 13,356.02 121,390.46 9.9 %
FOVIAL			1,541,049.31	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	291,049.31 0.00 291,049.31 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	291,049.31 0.00 291,049.31 0.0 %	291,049.31 0.00 291,049.31 0.0 %
	5509	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN KM 124+000 DE LA CARRETERA CA08W, FRONTERA LAS CHINAMAS	1,541,049.31	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	291,049.31 0.00 291,049.31 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	291,049.31 0.00 291,049.31 0.0 %	291,049.31 0.00 291,049.31 0.0 %
IDA			5,191,017.37	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,531,719.06 0.00 1,531,719.06 0.0 %	1,531,719.06 0.00 1,531,719.06 0.0 %	2,292,167.37 162,990.63 2,129,176.74 7.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,292,167.37 162,990.63 2,129,176.74 7.1 %	3,823,886.43 162,990.63 3,660,895.80 4.3 %
FODES	5068	Inversión Municipal a través del FODES 2012	224,370,540.00	P E D %	186,975,450.00 186,975,450.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	186,975,450.00 0.00 186,975,450.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	186,975,450.00 0.00 186,975,450.00 100.0 %
TOTAL PAIP SIN PROVISIONES			962,065,109.24	P E D %	289,546,425.96 241,629,240.56 47,919,185.40 83.5 %	64,560,827.23 40,918,305.21 23,442,322.02 63.6 %	3,650,895.08 710,475.87 2,940,519.22 19.5 %	355,440,772.25 282,547,545.77 72,893,226.48 79.5 %	172,146,139.01 45,839,177.27 126,306,961.74 20.0 %	157,906,027.09 123,752,576.78 34,153,450.31 78.4 %	330,052,166.10 169,591,754.05 160,460,412.05 51.4 %	687,612,214.38 452,849,775.69 234,762,438.69 65.9 %
MINSAL			39,285,762.43	P E D %	21,719,949.16 16,868,257.58 4,851,691.58 77.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	21,719,949.16 16,868,257.58 4,851,691.58 77.7 %	13,304,151.93 8,420,583.63 4,883,568.30 48.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	13,304,151.93 8,420,583.63 4,883,568.30 48.3 %	35,024,101.09 23,288,841.21 11,735,259.88 68.5 %

5131	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR	9,587,172.09	P E D %	690,543.20 297,114.55 393,428.65 43.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	690,543.20 297,114.55 393,428.65 43.0 %	8,896,628.89 2,558,606.18 6,338,022.71 28.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,896,628.89 2,558,606.18 6,338,022.71 28.8 %	9,587,172.09 2,655,720.73 6,731,451.38 29.8 %
4654	Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"	6,368,662.40	P E D %	5,436,782.00 333,200.08 5,103,581.92 6.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,436,782.00 333,200.08 5,103,581.92 6.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,436,782.00 333,200.08 5,103,581.92 6.1 %
4657	Programa de Extensión de Cobertura en la Zona Rural (período 2009-2011)	5,847,129.71	P E D %	4,721,500.00 5,712,494.89 -990,994.89 121.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,721,500.00 5,712,494.89 -990,994.89 121.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,721,500.00 5,712,494.89 -990,994.89 121.0 %
5128	Programa Integrado de Salud	3,409,417.29	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,130,033.00 3,325,053.13 -195,020.13 106.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,130,033.00 3,325,053.13 -195,020.13 106.2 %	3,130,033.00 3,325,053.13 -195,020.13 106.2 %
4650	Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"	2,794,673.42	P E D %	2,300,934.68 1,183,622.44 1,117,312.24 51.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,300,934.68 1,183,622.44 1,117,312.24 51.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,300,934.68 1,183,622.44 1,117,312.24 51.4 %
4653	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"	1,444,027.79	P E D %	615,000.00 1,444,027.79 -829,027.79 234.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	615,000.00 1,444,027.79 -829,027.79 234.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	615,000.00 1,444,027.79 -829,027.79 234.8 %
4661	Apoyo al Primer Nivel de Atención y Hospitales del MSPAS.	1,350,767.34	P E D %	959,300.00 1,350,767.34 -391,467.34 140.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	959,300.00 1,350,767.34 -391,467.34 140.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	959,300.00 1,350,767.34 -391,467.34 140.8 %
4890	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La Libertad, La Libertad	1,060,766.27	P E D %	37,075.00 29,961.84 7,113.36 80.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	37,075.00 29,961.84 7,113.36 80.8 %	1,023,711.27 284,105.73 739,605.54 27.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,023,711.27 284,105.73 739,605.54 27.8 %	1,060,766.27 314,067.37 746,718.90 29.6 %
4656	Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Red de Establecimientos de Salud.	490,667.43	P E D %	490,667.43 490,667.43 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	490,667.43 490,667.43 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	490,667.43 490,667.43 0.00 100.0 %
4938	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guadalupe, San Vicente	349,102.08	P E D %	349,102.08 267,923.11 81,178.97 78.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	349,102.08 267,923.11 81,178.97 78.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	349,102.08 267,923.11 81,178.97 78.7 %
4659	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Bobadilla, San Alejo, La Unión	328,481.14	P E D %	246,358.00 299,521.90 -53,163.90 121.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	246,358.00 299,521.90 -53,163.90 121.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	246,358.00 299,521.90 -53,163.90 121.6 %
4667	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Uluazapa, San Miguel	320,678.26	P E D %	320,678.26 320,678.26 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	320,678.26 320,678.26 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	320,678.26 320,678.26 0.00 100.0 %
4861	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El	308,263.30	P E	308,263.30 200,908.24	0.00 0.00	0.00 0.00	308,263.30 200,908.24	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	308,263.30 200,908.24

		Faro, Conchagua, La Unión		P	27,355.06	0.00	0.00	27,355.06	0.00	0.00	0.00	27,355.06
				%	91.1 %	0.0 %	0.0 %	91.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	91.1 %
	3345	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CHALATENANGO	301,000.00	P	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00
				E	193,406.87	0.00	0.00	193,406.87	0.00	0.00	0.00	193,406.87
				D	107,593.13	0.00	0.00	107,593.13	0.00	0.00	0.00	107,593.13
				%	64.3 %	0.0 %	0.0 %	64.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	64.3 %
	4878	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután	273,728.94	P	132,265.64	0.00	0.00	132,265.64	141,463.30	0.00	141,463.30	273,728.94
				E	132,265.64	0.00	0.00	132,265.64	140,503.12	0.00	140,503.12	272,768.76
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	960.18	0.00	960.18	960.18
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	99.3 %	0.0 %	99.3 %	99.0 %
	4060	Remodelación y equipamiento del Hospital Nacional de Chalchuapa	273,624.18	P	273,624.18	0.00	0.00	273,624.18	0.00	0.00	0.00	273,624.18
				E	273,624.18	0.00	0.00	273,624.18	0.00	0.00	0.00	273,624.18
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	4891	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Matías, La Libertad	253,589.56	P	253,589.56	0.00	0.00	253,589.56	0.00	0.00	0.00	253,589.56
				E	253,589.56	0.00	0.00	253,589.56	0.00	0.00	0.00	253,589.56
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	4897	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana	252,250.45	P	252,250.45	0.00	0.00	252,250.45	0.00	0.00	0.00	252,250.45
				E	252,248.03	0.00	0.00	252,248.03	0.00	0.00	0.00	252,248.03
				D	2.42	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	4893	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Tamanihue, La Libertad	236,169.95	P	236,169.95	0.00	0.00	236,169.95	0.00	0.00	0.00	236,169.95
				E	227,603.62	0.00	0.00	227,603.62	0.00	0.00	0.00	227,603.62
				D	8,566.33	0.00	0.00	8,566.33	0.00	0.00	0.00	8,566.33
				%	96.4 %	0.0 %	0.0 %	96.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	96.4 %
	4917	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán	195,565.46	P	195,565.46	0.00	0.00	195,565.46	0.00	0.00	0.00	195,565.46
				E	177,922.45	0.00	0.00	177,922.45	0.00	0.00	0.00	177,922.45
				D	17,643.01	0.00	0.00	17,643.01	0.00	0.00	0.00	17,643.01
				%	91.0 %	0.0 %	0.0 %	91.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	91.0 %
	4908	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Lucía, Santa Ana	194,095.91	P	194,095.91	0.00	0.00	194,095.91	0.00	0.00	0.00	194,095.91
				E	178,040.05	0.00	0.00	178,040.05	0.00	0.00	0.00	178,040.05
				D	16,055.86	0.00	0.00	16,055.86	0.00	0.00	0.00	16,055.86
				%	91.7 %	0.0 %	0.0 %	91.7 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	91.7 %
	4899	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad	188,609.79	P	188,609.79	0.00	0.00	188,609.79	0.00	0.00	0.00	188,609.79
				E	184,046.17	0.00	0.00	184,046.17	0.00	0.00	0.00	184,046.17
				D	4,563.62	0.00	0.00	4,563.62	0.00	0.00	0.00	4,563.62
				%	97.6 %	0.0 %	0.0 %	97.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	97.6 %
	4883	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Playa, La Unión	178,623.51	P	178,623.51	0.00	0.00	178,623.51	0.00	0.00	0.00	178,623.51
				E	104,356.82	0.00	0.00	104,356.82	0.00	0.00	0.00	104,356.82
				D	74,266.69	0.00	0.00	74,266.69	0.00	0.00	0.00	74,266.69
				%	58.4 %	0.0 %	0.0 %	58.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	58.4 %
	4898	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa Ana	160,260.50	P	160,260.50	0.00	0.00	160,260.50	0.00	0.00	0.00	160,260.50
				E	121,160.30	0.00	0.00	121,160.30	0.00	0.00	0.00	121,160.30
				D	39,100.20	0.00	0.00	39,100.20	0.00	0.00	0.00	39,100.20
				%	75.6 %	0.0 %	0.0 %	75.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	75.6 %
	4865	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel	154,799.65	P	154,799.65	0.00	0.00	154,799.65	0.00	0.00	0.00	154,799.65
				E	154,799.65	0.00	0.00	154,799.65	0.00	0.00	0.00	154,799.65
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
		Ampliación, Equipamiento,		P	152,287.88	0.00	0.00	152,287.88	0.00	0.00	0.00	152,287.88

4931	Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyultán, La Paz	151,828.88	P	151,828.88	0.00	0.00	151,828.88	0.00	0.00	0.00	151,828.88
			D	459.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	459.00
			%	99.7 %	0.0 %	0.0 %	99.7 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	99.7 %
4926	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Sensutopoque, Cabañas	146,883.38	P	146,883.38	0.00	0.00	146,883.38	0.00	0.00	0.00	146,883.38
			E	145,949.00	0.00	0.00	145,949.00	0.00	0.00	0.00	145,949.00
			D	934.38	0.00	0.00	934.38	0.00	0.00	0.00	934.38
			%	99.4 %	0.0 %	0.0 %	99.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	99.4 %
4904	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Sebastian Salitrillo, Santa Ana	140,939.30	P	140,939.30	0.00	0.00	140,939.30	0.00	0.00	0.00	140,939.30
			E	135,075.97	0.00	0.00	135,075.97	0.00	0.00	0.00	135,075.97
			D	5,863.33	0.00	0.00	5,863.33	0.00	0.00	0.00	5,863.33
			%	95.8 %	0.0 %	0.0 %	95.8 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	95.8 %
4903	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Juan las Minas, Molapán, Santa Ana	129,149.66	P	129,149.66	0.00	0.00	129,149.66	0.00	0.00	0.00	129,149.66
			E	129,149.66	0.00	0.00	129,149.66	0.00	0.00	0.00	129,149.66
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4920	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de Concepción, Cuscatlán	128,313.17	P	128,313.17	0.00	0.00	128,313.17	0.00	0.00	0.00	128,313.17
			E	128,313.17	0.00	0.00	128,313.17	0.00	0.00	0.00	128,313.17
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4900	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Congo, Santa Ana	123,134.01	P	123,134.01	0.00	0.00	123,134.01	0.00	0.00	0.00	123,134.01
			E	115,431.35	0.00	0.00	115,431.35	0.00	0.00	0.00	115,431.35
			D	7,702.66	0.00	0.00	7,702.66	0.00	0.00	0.00	7,702.66
			%	93.7 %	0.0 %	0.0 %	93.7 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	93.7 %
4905	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana	116,430.36	P	116,430.36	0.00	0.00	116,430.36	0.00	0.00	0.00	116,430.36
			E	116,430.36	0.00	0.00	116,430.36	0.00	0.00	0.00	116,430.36
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4936	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Rafael Obrajuelo, La Paz	112,985.40	P	112,985.40	0.00	0.00	112,985.40	0.00	0.00	0.00	112,985.40
			E	112,985.40	0.00	0.00	112,985.40	0.00	0.00	0.00	112,985.40
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4929	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilohasco, Cabañas	108,920.41	P	108,920.41	0.00	0.00	108,920.41	0.00	0.00	0.00	108,920.41
			E	57,294.61	0.00	0.00	57,294.61	0.00	0.00	0.00	57,294.61
			D	51,625.80	0.00	0.00	51,625.80	0.00	0.00	0.00	51,625.80
			%	52.6 %	0.0 %	0.0 %	52.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	52.6 %
4892	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad	108,527.35	P	108,527.35	0.00	0.00	108,527.35	0.00	0.00	0.00	108,527.35
			E	108,527.35	0.00	0.00	108,527.35	0.00	0.00	0.00	108,527.35
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4909	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio Pajonal, Santa Ana	94,012.39	P	94,012.39	0.00	0.00	94,012.39	0.00	0.00	0.00	94,012.39
			E	84,461.58	0.00	0.00	84,461.58	0.00	0.00	0.00	84,461.58
			D	9,550.81	0.00	0.00	9,550.81	0.00	0.00	0.00	9,550.81
			%	89.8 %	0.0 %	0.0 %	89.8 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	89.8 %
4916	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Chinamas, Ahuachapán	89,902.24	P	89,902.24	0.00	0.00	89,902.24	0.00	0.00	0.00	89,902.24
			E	87,736.59	0.00	0.00	87,736.59	0.00	0.00	0.00	87,736.59
			D	2,165.65	0.00	0.00	2,165.65	0.00	0.00	0.00	2,165.65
			%	97.6 %	0.0 %	0.0 %	97.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	97.6 %
4895	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Piche, El	88,495.20	P	88,495.20	0.00	0.00	88,495.20	0.00	0.00	0.00	88,495.20
			E	88,495.20	0.00	0.00	88,495.20	0.00	0.00	0.00	88,495.20
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Carmen, La Unión		%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	4937	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitán, San Vicente	57,633.07	P	87,633.07	0.00	0.00	87,633.07	0.00	0.00	0.00	87,633.07
				E	58,347.88	0.00	0.00	58,347.88	0.00	0.00	0.00	58,347.88
				D	29,285.19	0.00	0.00	29,285.19	0.00	0.00	0.00	29,285.19
				%	86.6 %	0.0 %	0.0 %	86.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	86.6 %
	4843	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilar, San Salvador	74,313.17	P	74,313.17	0.00	0.00	74,313.17	0.00	0.00	0.00	74,313.17
				E	74,313.17	0.00	0.00	74,313.17	0.00	0.00	0.00	74,313.17
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	4914	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Lorenzo, Ahuachapán	70,844.93	P	70,844.93	0.00	0.00	70,844.93	0.00	0.00	0.00	70,844.93
				E	61,314.60	0.00	0.00	61,314.60	0.00	0.00	0.00	61,314.60
				D	9,530.33	0.00	0.00	9,530.33	0.00	0.00	0.00	9,530.33
				%	86.5 %	0.0 %	0.0 %	86.5 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	86.5 %
	4901	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Belén Guizat, Metapán, Santa Ana	70,468.91	P	70,468.91	0.00	0.00	70,468.91	0.00	0.00	0.00	70,468.91
				E	65,847.15	0.00	0.00	65,847.15	0.00	0.00	0.00	65,847.15
				D	4,621.76	0.00	0.00	4,621.76	0.00	0.00	0.00	4,621.76
				%	93.4 %	0.0 %	0.0 %	93.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	93.4 %
	4915	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San José Naranjo, Jujutla, Ahuachapán	69,700.18	P	69,700.18	0.00	0.00	69,700.18	0.00	0.00	0.00	69,700.18
				E	60,149.37	0.00	0.00	60,149.37	0.00	0.00	0.00	60,149.37
				D	9,550.81	0.00	0.00	9,550.81	0.00	0.00	0.00	9,550.81
				%	86.3 %	0.0 %	0.0 %	86.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	86.3 %
	4837	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador	61,189.25	P	60,598.25	0.00	0.00	60,598.25	591.00	0.00	591.00	61,189.25
				E	59,279.43	0.00	0.00	59,279.43	591.00	0.00	591.00	59,870.43
				D	1,318.82	0.00	0.00	1,318.82	0.00	0.00	0.00	1,318.82
				%	97.8 %	0.0 %	0.0 %	97.8 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	97.8 %
	4934	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz	61,117.37	P	61,117.37	0.00	0.00	61,117.37	0.00	0.00	0.00	61,117.37
				E	61,117.34	0.00	0.00	61,117.34	0.00	0.00	0.00	61,117.34
				D	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	4844	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador	60,958.82	P	60,958.82	0.00	0.00	60,958.82	0.00	0.00	0.00	60,958.82
				E	60,958.82	0.00	0.00	60,958.82	0.00	0.00	0.00	60,958.82
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	4923	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Ramón, Cuscatlán	60,489.34	P	60,489.34	0.00	0.00	60,489.34	0.00	0.00	0.00	60,489.34
				E	58,239.98	0.00	0.00	58,239.98	0.00	0.00	0.00	58,239.98
				D	2,249.36	0.00	0.00	2,249.36	0.00	0.00	0.00	2,249.36
				%	96.3 %	0.0 %	0.0 %	96.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	96.3 %
	4870	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lolotique, San Miguel	50,197.44	P	50,197.44	0.00	0.00	50,197.44	0.00	0.00	0.00	50,197.44
				E	48,041.44	0.00	0.00	48,041.44	0.00	0.00	0.00	48,041.44
				D	2,156.00	0.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00
				%	95.7 %	0.0 %	0.0 %	95.7 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	95.7 %
	4930	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Jutiapa, Cabañas	44,874.63	P	44,874.63	0.00	0.00	44,874.63	0.00	0.00	0.00	44,874.63
				E	44,874.63	0.00	0.00	44,874.63	0.00	0.00	0.00	44,874.63
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	4838	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Monserrat, San Salvador	42,712.65	P	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	1,703.35	0.00	1,703.35	34,503.35
				E	41,009.30	0.00	0.00	41,009.30	1,703.35	0.00	1,703.35	42,712.65
				D	-8,209.30	0.00	0.00	-8,209.30	0.00	0.00	0.00	-8,209.30
				%	125.0 %	0.0 %	0.0 %	125.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	125.0 %
	4877	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Triunfo,	40,147.19	P	40,147.19	0.00	0.00	40,147.19	0.00	0.00	0.00	40,147.19
				E	40,147.19	0.00	0.00	40,147.19	0.00	0.00	0.00	40,147.19
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Usulután		%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	4869	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Comacaran, San Miguel	40,010.18	P	40,010.18	0.00	0.00	40,010.18	0.00	0.00	0.00	40,010.18
				E	40,010.18	0.00	0.00	40,010.18	0.00	0.00	0.00	40,010.18
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	4842	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Barrios, San Salvador	37,430.31	P	36,671.71	0.00	0.00	36,671.71	758.60	0.00	758.60	37,430.31
				E	36,671.71	0.00	0.00	36,671.71	758.60	0.00	758.60	37,430.31
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %
	4841	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador	37,203.73	P	30,330.00	0.00	0.00	30,330.00	133.00	0.00	133.00	30,463.00
				E	37,070.73	0.00	0.00	37,070.73	133.00	0.00	133.00	37,203.73
				D	-6,740.73	0.00	0.00	-6,740.73	0.00	0.00	0.00	-6,740.73
				%	122.2 %	0.0 %	0.0 %	122.2 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	122.1 %
	4886	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Azacualpa, Chalatenango	37,053.17	P	37,053.17	0.00	0.00	37,053.17	0.00	0.00	0.00	37,053.17
				E	37,053.17	0.00	0.00	37,053.17	0.00	0.00	0.00	37,053.17
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	5124	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICALIDA DE LA UNIDAD DE SALUD SAN LUIS TALPA, LA PAZ	36,514.39	P	0.00	0.00	0.00	0.00	36,514.39	0.00	36,514.39	36,514.39
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	36,514.39	0.00	36,514.39	36,514.39
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %
	4875	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Primavera, El Tránsito, San Miguel	34,507.02	P	34,507.02	0.00	0.00	34,507.02	0.00	0.00	0.00	34,507.02
				E	34,507.02	0.00	0.00	34,507.02	0.00	0.00	0.00	34,507.02
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	4840	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador	31,379.90	P	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00
				E	31,379.90	0.00	0.00	31,379.90	0.00	0.00	0.00	31,379.90
				D	-3,479.90	0.00	0.00	-3,479.90	0.00	0.00	0.00	-3,479.90
				%	112.5 %	0.0 %	0.0 %	112.5 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	112.5 %
	4896	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Palmar, Santa Ana	28,879.11	P	28,879.11	0.00	0.00	28,879.11	0.00	0.00	0.00	28,879.11
				E	28,879.11	0.00	0.00	28,879.11	0.00	0.00	0.00	28,879.11
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	4845	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Popolán, Apopa, San Salvador	27,889.27	P	26,107.92	0.00	0.00	26,107.92	1,781.35	0.00	1,781.35	27,889.27
				E	26,107.88	0.00	0.00	26,107.88	1,781.35	0.00	1,781.35	27,889.23
				D	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %
	4883	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Palma, Chalatenango	26,643.39	P	26,643.39	0.00	0.00	26,643.39	0.00	0.00	0.00	26,643.39
				E	26,643.39	0.00	0.00	26,643.39	0.00	0.00	0.00	26,643.39
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	4857	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador	20,722.17	P	20,131.17	0.00	0.00	20,131.17	591.00	0.00	591.00	20,722.17
				E	20,131.17	0.00	0.00	20,131.17	591.00	0.00	591.00	20,722.17
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %
	4846	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Villa Mariona, Cuscatancingo, San Salvador	19,599.29	P	19,599.29	0.00	0.00	19,599.29	0.00	0.00	0.00	19,599.29
				E	19,599.29	0.00	0.00	19,599.29	0.00	0.00	0.00	19,599.29
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
		Ampliación, Equipamiento,		P	18,167.50	0.00	0.00	18,167.50	844.65	0.00	844.65	19,012.15

4854	Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Guazapa, San Salvador	18,012.15	E D %	18,167.50 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	18,167.50 0.00 100.0 %	844.65 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.0 %	844.65 0.00 100.0 %	19,012.15 0.00 100.0 %
4851	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Tonacatepeque, San Salvador	18,808.89	P E D %	18,056.69 18,056.69 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	18,056.69 18,056.69 0.00 100.0 %	552.00 552.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	552.00 552.00 0.00 100.0 %	18,808.89 18,808.89 0.00 100.0 %
4922	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Jose Guayabal, Cuscatlán	17,894.20	P L D %	17,894.20 17,894.20 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	17,894.20 17,894.20 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	17,894.20 17,894.20 0.00 100.0 %
4849	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Marcos, San Salvador	13,760.07	P E D %	12,986.97 12,986.97 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,986.97 12,986.97 0.00 100.0 %	773.10 773.10 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	773.10 773.10 0.00 100.0 %	13,760.07 13,760.07 0.00 100.0 %
5129	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD VERAPAZ, SAN VICENTE	11,562.35	P F D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	11,562.35 11,562.35 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	11,562.35 11,562.35 0.00 100.0 %	11,562.35 11,562.35 0.00 100.0 %
5324	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA CANOA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN	9,256.25	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	9,256.25 9,256.25 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	9,256.25 9,256.25 0.00 100.0 %	9,256.25 9,256.25 0.00 100.0 %
4853	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martín, San Salvador	9,156.30	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	9,156.30 9,156.30 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	9,156.30 9,156.30 0.00 100.0 %	9,156.30 9,156.30 0.00 100.0 %
5333	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SISIGUAYO POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN	6,802.10	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,802.10 6,802.10 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,802.10 6,802.10 0.00 100.0 %	6,802.10 6,802.10 0.00 100.0 %
5335	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NUEVO AMANEER POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN	6,588.25	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,588.25 6,588.25 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,588.25 6,588.25 0.00 100.0 %	6,588.25 6,588.25 0.00 100.0 %
5332	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NUEVA GRANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN	5,650.75	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,650.75 5,650.75 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,650.75 5,650.75 0.00 100.0 %	5,650.75 5,650.75 0.00 100.0 %
5112	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD APOPA, SAN SALVADOR	5,352.20	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,352.20 5,352.20 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,352.20 5,352.20 0.00 100.0 %	5,352.20 5,352.20 0.00 100.0 %
	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de		P E	2,830.39 2,830.39	0.00 0.00	0.00 0.00	2,830.39 2,830.39	552.00 552.00	0.00 0.00	552.00 552.00	3,382.39 3,382.39

	4848	la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador	3,382.39	D %	0.00 100.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 100.0 %	0.00 100.0 %	0.00 0.0 %	0.00 100.0 %	0.00 100.0 %
	4850	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador	2,961.35	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,961.35 2,961.35 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,961.35 2,961.35 0.00 100.0 %	2,961.35 2,961.35 0.00 100.0 %
	5119	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD SANTO TOMÁS, SAN SALVADOR	2,419.95	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,419.95 2,419.95 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,419.95 2,419.95 0.00 100.0 %	2,419.95 2,419.95 0.00 100.0 %
	5103	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA CASA DE SALUD BARRANCONES, PASAQUINA, LA UNIÓN	2,415.64	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,415.64 2,415.64 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,415.64 2,415.64 0.00 100.0 %	2,415.64 2,415.64 0.00 100.0 %
	5331	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CORRAL DE MULAS POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USulután	2,088.85	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,088.85 2,088.85 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,088.85 2,088.85 0.00 100.0 %	2,088.85 2,088.85 0.00 100.0 %
	4894	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana	689.30	P E D %	689.30 689.30 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	689.30 689.30 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	689.30 689.30 0.00 100.0 %	689.30 689.30 0.00 100.0 %
	4850	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador	629.14	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	629.14 629.14 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	629.14 629.14 0.00 100.0 %	629.14 629.14 0.00 100.0 %
	4839	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes, San Salvador	591.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	591.00 591.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	591.00 591.00 0.00 100.0 %	591.00 591.00 0.00 100.0 %
	5106	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD CONCEPCIÓN, SAN SALVADOR	539.10	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	539.10 539.10 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	539.10 539.10 0.00 100.0 %	539.10 539.10 0.00 100.0 %
	4852	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Itala, Tonacatepeque, San Salvador	525.90	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	525.90 525.90 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	525.90 525.90 0.00 100.0 %	525.90 525.90 0.00 100.0 %
	4858	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilopango, San Salvador	514.40	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	514.40 514.40 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	514.40 514.40 0.00 100.0 %	514.40 514.40 0.00 100.0 %

4924	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán	310.75	P E D %	310.75 310.75 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310.75 310.75 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310.75 310.75 0.00 100.0 %
5109	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD PANCHIMALCO, SAN SALVADOR	305.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	305.00 305.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	305.00 305.00 0.00 100.0 %	305.00 305.00 0.00 100.0 %
5135	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA CASA DE SALUD DE JOYA GRANDE, SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR	162.50	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	162.50 162.50 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	162.50 162.50 0.00 100.0 %	162.50 162.50 0.00 100.0 %
MOP		38,902,634.50	P E D %	6,651,167.04 6,208,923.45 442,243.59 93.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,651,167.04 6,208,923.45 442,243.59 93.4 %	31,522,691.01 25,453,261.97 6,069,429.04 80.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	31,522,691.01 25,453,261.97 6,069,429.04 80.7 %	38,173,858.05 31,862,155.42 6,511,672.63 82.9 %
3737	APERTURA BOULEVARD DIEGO DE HOLGUIN-SANTA TEGUA TRAMO II	22,270,153.58	P E D %	1,722,004.14 1,872,384.83 -150,380.69 108.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,722,004.14 1,872,384.83 -150,380.69 108.7 %	19,819,372.97 14,632,780.53 5,186,592.44 73.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	19,819,372.97 14,632,780.53 5,186,592.44 73.8 %	21,541,377.11 16,505,165.35 5,036,211.75 76.6 %
3091	CONSTRUCCION BY PASS EN LA CIUDAD DE USulután	4,482,492.73	P E D %	515,685.00 461,581.10 54,103.90 89.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	515,685.00 461,581.10 54,103.90 89.5 %	3,966,807.73 3,550,623.70 416,184.03 89.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,966,807.73 3,550,623.70 416,184.03 89.5 %	4,482,492.73 4,012,204.80 470,287.93 89.5 %
5652	RECONSTRUCCION DE PUENTE ATEOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN CAUCE DEL RIO TALNIQUE, RUTA CA-008W MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2,949,273.66	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,949,273.66 2,949,273.65 0.01 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,949,273.66 2,949,273.65 0.01 100.0 %	2,949,273.66 2,949,273.65 0.01 100.0 %
5008	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PUENTES TULE (KM 45.48) Y COLIMA (KM 47.45), CARRETERA TRONCAL DEL NORTE (CA-4N), MUNICIPIO DE EL PAISNAL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	1,768,876.84	P E D %	203,476.09 150,598.22 52,877.87 74.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	203,476.09 150,598.22 52,877.87 74.0 %	1,565,200.75 1,233,597.46 331,603.29 78.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,565,200.75 1,233,597.46 331,603.29 78.8 %	1,768,876.84 1,384,195.68 384,681.16 78.3 %
5654	CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE EL RIO COLON Y REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE DESDE LA INTERSEC. DE LA CARRETERA CA008W (KM. 29%) HACIA HDA. LAS	1,235,037.51	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,235,037.51 1,235,037.51 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,235,037.51 1,235,037.51 0.00 100.0 %	1,235,037.51 1,235,037.51 0.00 100.0 %

		SEISCIENTAS. CTÓN ENTRE RÍOS, MUNICIPIO DE COLÓN, DEPTO. DE LA LIBERTAD		%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %
4563		OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MITIGACIÓN CÁRCAVAS DE JARDINES DE SAN BARTOLO (1 PRINCIPAL Y 2 SECUNDARIAS) ILOPANGO, SAN SALVADOR.	914,870.01	P E D %	377,612.85 361,169.92 16,442.93 95.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	377,612.85 361,169.92 16,442.93 95.6 %	537,257.16 407,633.08 129,624.08 75.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	537,257.16 407,633.08 129,624.08 75.9 %	914,870.01 768,803.00 146,067.01 84.0 %
4557		OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUD EN COMUNIDAD EL TRIUNFO CONCEPCIÓN DE ATACÓ, AHUACHAPÁN	720,672.70	P E D %	720,672.70 720,672.70 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	720,672.70 720,672.70 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	720,672.70 720,672.70 0.00 100.0 %
5411		Mejoramiento Camino Vecinal, Tramo: La Laguna-Canton Cuovilas ET- CHA13N (Dulce Nombre de María-San Fernando) Departamento de Chalatenango.	589,156.29	P E D %	589,156.29 412,408.50 176,747.79 70.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	589,156.29 412,408.50 176,747.79 70.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	589,156.29 412,408.50 176,747.79 70.0 %
4558		MUROS DE CONTENCIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD EL TRIUNFO SAN JULIAN, SONSONATE	580,000.00	P E D %	580,000.00 580,000.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	580,000.00 580,000.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	580,000.00 580,000.00 0.00 100.0 %
5378		Construcción de Bóveda y Muro de Contención del Parque Central de Soyapango, San Salvador.	545,572.29	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	545,572.29 541,458.43 4,113.86 99.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	545,572.29 541,458.43 4,113.86 99.2 %	545,572.29 541,458.43 4,113.86 99.2 %
5400		OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CARCAVA DE URBANIZACIÓN LAS VICTORIAS, SOYAPANGO, SAN SALVADOR	476,327.32	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	476,327.32 476,327.32 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	476,327.32 476,327.32 0.00 100.0 %	476,327.32 476,327.32 0.00 100.0 %
5404		Mejoramiento de Caminos Rurales en los Municipios de Santa Elena, Jucuarán, Concepción Batres y San Buenaventura, Departamento de Usulután.	457,249.90	P E D %	457,249.90 385,045.42 72,204.48 84.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	457,249.90 385,045.42 72,204.48 84.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	457,249.90 385,045.42 72,204.48 84.2 %
4535		Rehabilitación de la Carretera CHA07E-CHA09S, Tramo del EL CHA08E-Arcatao, Chalatenango	435,235.22	P E D %	435,235.22 435,235.22 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	435,235.22 435,235.22 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	435,235.22 435,235.22 0.00 100.0 %
5410		Mejoramiento de Calles entre la 11 Calle Oriente y Calle a San Jorge, Municipio de San Rafael, Departamento de San Miguel	242,329.15	P E D %	242,329.15 214,392.84 27,936.31 88.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	242,329.15 214,392.84 27,936.31 88.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	242,329.15 214,392.84 27,936.31 88.5 %
5409		Pavimentación de Calles en el Municipio y Departamento de Santa Ana.	230,505.83	P E D %	230,505.83 218,200.59 12,305.24 94.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	230,505.83 218,200.59 12,305.24 94.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	230,505.83 218,200.59 12,305.24 94.7 %
		OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA		P	222,679.81	0.00	0.00	222,679.81	0.00	0.00	0.00	222,679.81

4562	COLONIA LLANO VERDE, (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO, SAN SALVADOR	222,679.81	E D %	92,013.61 130,666.20 41.3 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	92,013.61 130,666.20 41.3 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	92,013.61 130,666.20 41.3 %
5412	Mejoramiento del camino que conduce al Caserio Los Pérez del Ctn. Texipulco, Camino Vecinal Caserio Los Martínez del mismo Ctn, y al Camino Vecinal La Joya del Ctn. La Concepción, todos Jurisdicción de San Pedro Puxtla del Dpto. de Ahuachapán	150,000.00	P E D %	150,000.00 149,999.98 0.02 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 149,999.98 0.02 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 149,999.98 0.02 100.0 %
5337	Construcción de Obras para Mitigación en Quebrada Arenal Tutunichapa, Colonia Santa Eugenia, Barrio La Esperanza, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador	140,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	140,000.00 140,000.00 0.00 100.0 %	140,000.00 140,000.00 0.00 100.0 %	140,000.00 140,000.00 0.00 100.0 %
5330	Construcción de Obras de Mitigación en Urbanización La Campaña 2000, Municipio de Cuscatancingo, San Salvador	131,164.60	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 131,164.60 131,164.60 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	131,164.60 131,164.60 0.00 100.0 %	131,164.60 131,164.60 0.00 100.0 %	131,164.60 131,164.60 0.00 100.0 %
5320	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN AGUAS ABAJO DEL PUENTE No. 2, ARENAL SECO, NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	96,540.50	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 96,540.50 96,540.50 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	96,540.50 96,540.50 0.00 100.0 %	96,540.50 96,540.50 0.00 100.0 %	96,540.50 96,540.50 0.00 100.0 %
5413	Mejoramiento Calles en la Colonia San Joaquín, Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador	69,650.45	P E D %	69,650.45 69,650.45 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	69,650.45 69,650.45 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	69,650.45 69,650.45 0.00 100.0 %
5345	Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Reparto El Carmen, Soyapango, San Salvador	59,357.76	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 59,357.76 58,046.43 1,311.33 97.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	59,357.76 58,046.43 1,311.33 97.8 %	59,357.76 58,046.43 1,311.33 97.8 %	59,357.76 58,046.43 1,311.33 97.8 %
5407	Reparación de Calles en el Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador	27,201.65	P E D %	27,201.65 27,201.65 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	27,201.65 27,201.65 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	27,201.65 27,201.65 0.00 100.0 %
5004	CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RÍO LLMPA (KM. 75.5 LIB31N), LA LIBERTAD - CHALATENANGO	26,427.59	P E D %	26,427.59 0.00 26,427.59 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	26,427.59 0.00 26,427.59 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	26,427.59 0.00 26,427.59 0.0 %
4630	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MURO DE RETENCIÓN EN URBANIZACIÓN ALTOS DEL BOULEVARD, SAN SALVADOR	24,186.63	P E D %	24,186.63 24,186.63 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	24,186.63 24,186.63 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	24,186.63 24,186.63 0.00 100.0 %
	Mejoramiento de calles en Colonia Concepción, en el		P E	19,999.40 19,999.40	0.00 0.00	0.00 0.00	19,999.40 19,999.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	19,999.40 19,999.40

	5406	Municipio y Departamento de San Vicente.	19,999.40	P E D %	0.00 100.0 % 0.00 0.0 %	0.00 0.0 % 0.00 0.0 %	0.00 100.0 % 0.00 0.0 %	0.00 0.0 % 0.00 0.0 %	0.00 0.0 % 0.00 0.0 %	0.00 100.0 % 0.00 0.0 %
	3803	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAM28N, TRAMO: CHAPETIQUE - SESORI, SAN MIGUEL	14,081.15	P E D %	14,081.15 14,081.15 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	14,081.15 14,081.15 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	14,081.15 14,081.15 0.00 100.0 %
	4628	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DE CASA PRESIDENCIAL	12,468.49	P E D %	12,468.49 0.00 12,468.49 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,468.49 0.00 12,468.49 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,468.49 0.00 12,468.49 0.0 %
	5463	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO LIB31N, TRAMO: SAN PABLO TACACHICO - CANTON SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	10,443.46	P E D %	10,443.46 0.00 10,443.46 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	10,443.46 0.00 10,443.46 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	10,443.46 0.00 10,443.46 0.0 %
	3180	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 1556	880.00	P E D %	101.24 101.24 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	101.24 101.24 0.00 100.0 %	778.76 778.76 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	880.00 880.00 0.00 100.0 %
MINED			23,492,427.31	P E D %	8,603,769.48 9,097,376.35 -493,606.87 105.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,603,769.48 9,097,376.35 -493,606.87 105.7 %	2,508,875.31 3,198,015.69 -689,140.38 127.5 %	6,545,750.34 6,545,750.34 0.00 100.0 %	9,054,631.65 9,743,772.03 -689,140.38 107.6 %
	5268	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO-EDUCA)	6,541,154.57	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,541,154.57 6,541,154.57 0.00 100.0 %	6,541,154.57 6,541,154.57 0.00 100.0 %
	5096	Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador	6,154,207.47	P E D %	300,044.46 389,632.70 -89,588.24 129.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	300,044.46 389,632.70 -89,588.24 129.9 %	2,308,034.24 2,997,174.62 -689,140.38 129.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,308,034.24 2,997,174.62 -689,140.38 129.9 %
	4708	REHABILITACION INSTITUTO NACIONAL CATOLICO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SENSUNTEPEQUE	658,176.44	P E D %	658,176.44 658,176.44 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	658,176.44 658,176.44 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	658,176.44 658,176.44 0.00 100.0 %
	4688	MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE SAN MARCOS, SAN SALVADOR	589,280.66	P E D %	589,280.66 589,280.66 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	589,280.66 589,280.66 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	589,280.66 589,280.66 0.00 100.0 %
	4692	MEJORAMIENTO DE INSTITUTO NACIONAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR	467,792.45	P E D %	467,792.45 467,792.45 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	467,792.45 467,792.45 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	467,792.45 467,792.45 0.00 100.0 %
	4706	MEJORAMIENTO ESCUELA PARVULARIA MISAEI RAMOS, SENSUNTEPEQUE, CARAÑAS	415,975.85	P E D %	415,975.85 415,975.85 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	415,975.85 415,975.85 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	415,975.85 415,975.85 0.00 100.0 %
		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO		P E	379,978.98 404,232.95	0.00 0.00	379,978.98 404,232.95	0.00 0.00	0.00 0.00	379,978.98 404,232.95

4712	ESCOLAR AGUSTIN SANCHEZ, APASTEPEQUE, SAN VICENTE	404,232.95	D	%	-24,253.97 106.4 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	-24,253.97 106.4 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	-24,253.97 106.4 %
4703	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR "CANTON SAN JOSE LOMAS DE PEÑA", ILOBASCO, CABAÑAS	390,239.08	P E D	%	377,811.97 390,239.08 -12,427.11 103.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	377,811.97 390,239.08 -12,427.11 103.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	377,811.97 390,239.08 -12,427.11 103.3 %
4694	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANDELARIO CUELLAR, MICOJUTEPEQUE, D/CUSCATLAN.	366,278.42	P E D	%	366,278.42 344,301.73 21,976.69 94.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	366,278.42 344,301.73 21,976.69 94.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	366,278.42 344,301.73 21,976.69 94.0 %
4684	REPARACION Y MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCATIVO COL. NUEVA, CANTON GUYAPA ABAJO, JUJUTLA, AHUACHAPAN	341,394.00	P E D	%	170,697.00 341,394.00 -170,697.00 200.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	170,697.00 341,394.00 -170,697.00 200.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	170,697.00 341,394.00 -170,697.00 200.0 %
4685	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR COLONIA FATIMA, MICOJUTEPEQUE, D/CUSCATLAN.	313,808.97	P E D	%	235,356.73 294,980.42 -59,623.69 125.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	235,356.73 294,980.42 -59,623.69 125.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	235,356.73 294,980.42 -59,623.69 125.3 %
4705	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO HUISCOYOL, CANTON TRINIDAD, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS	312,854.18	P E D	%	237,772.65 291,042.91 -53,270.26 122.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	237,772.65 291,042.91 -53,270.26 122.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	237,772.65 291,042.91 -53,270.26 122.4 %
4715	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE	307,020.28	P E D	%	230,265.20 153,510.14 76,755.06 66.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	230,265.20 153,510.14 76,755.06 66.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	230,265.20 153,510.14 76,755.06 66.7 %
4721	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR EL MARQUEZADO, SANTIAGO DE MARIA, USULUTAN	283,100.00	P E D	%	70,775.00 134,472.50 -63,697.50 190.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	70,775.00 134,472.50 -63,697.50 190.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	70,775.00 134,472.50 -63,697.50 190.0 %
4677	REHABILITACION Y MEJORAS CENTRO ESCOLAR HEROES DEL 11 DE ENERO, CHALATENANGO	282,850.97	P E D	%	233,352.05 282,025.67 -48,673.62 120.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	233,352.05 282,025.67 -48,673.62 120.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	233,352.05 282,025.67 -48,673.62 120.9 %
4710	MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE SAN JUAN TEPEZONTLES, LA PAZ	244,034.82	P E D	%	122,017.46 0.00 122,017.46 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	122,017.46 0.00 122,017.46 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	122,017.46 0.00 122,017.46 0.0 %
4643	CENTRO ESCOLAR BARRIO LA FATIMA, LA UNION	234,836.00	P E D	%	0.00 111,547.10 -111,547.10 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 111,547.10 -111,547.10 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 111,547.10 -111,547.10 0.0 %
4711	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR ANASTASIO AQUINO, SANTIAGO	232,382.78	P E D	%	204,496.88 116,191.40 88,305.48	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	204,496.88 116,191.40 88,305.48	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	204,496.88 116,191.40 88,305.48

		NONUALCO, LA PAZ		%	58.8 %	0.0 %	0.0 %	58.8 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	58.8 %
4941		CENTRO ESCOLAR HACIENDA LA CAÑADA, CONCHAGUA, LA UNION	232,292.43	P	232,292.43	0.00	0.00	232,292.43	0.00	0.00	0.00	232,292.43
				E	232,292.43	0.00	0.00	232,292.43	0.00	0.00	0.00	232,292.43
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4718		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL TABURETE, JIQUILISCO, USULUTAN	230,575.00	P	57,668.75	0.00	0.00	57,668.75	0.00	0.00	0.00	57,668.75
				E	109,570.62	0.00	0.00	109,570.62	0.00	0.00	0.00	109,570.62
				D	-51,901.87	0.00	0.00	-51,901.87	0.00	0.00	0.00	-51,901.87
				%	190.0 %	0.0 %	0.0 %	190.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	190.0 %
4675		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR JORGE LARDE, JUAYUA, SONSONATE	228,001.14	P	163,006.93	0.00	0.00	163,006.93	0.00	0.00	0.00	163,006.93
				E	106,008.64	0.00	0.00	106,008.64	0.00	0.00	0.00	106,008.64
				D	57,000.29	0.00	0.00	57,000.29	0.00	0.00	0.00	57,000.29
				%	65.0 %	0.0 %	0.0 %	65.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	65.0 %
4867		REPARACION Y MEJORAMIENTO ESC. EDUCACION ESPECIAL DE CHALCHUAPA, SANTA ANA	221,925.75	P	221,925.75	0.00	0.00	221,925.75	0.00	0.00	0.00	221,925.75
				E	221,925.75	0.00	0.00	221,925.75	0.00	0.00	0.00	221,925.75
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4944		CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CUEVONA, LISIQUE, LA UNION	212,485.33	P	212,485.33	0.00	0.00	212,485.33	0.00	0.00	0.00	212,485.33
				E	208,735.33	0.00	0.00	208,735.33	0.00	0.00	0.00	208,735.33
				D	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
				%	98.2 %	0.0 %	0.0 %	98.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	98.2 %
4679		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA EDUCACION PARVULARIA LUCILA TRUJILLO, CHALATENANGO	203,724.26	P	203,724.26	0.00	0.00	203,724.26	0.00	0.00	0.00	203,724.26
				E	203,724.26	0.00	0.00	203,724.26	0.00	0.00	0.00	203,724.26
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
5271		Reconstrucción y Rehabilitación de Centros Escolares Afectados por la Tormenta Ida	200,841.07	P	0.00	0.00	0.00	0.00	200,841.07	0.00	200,841.07	200,841.07
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	200,841.07	0.00	200,841.07	200,841.07
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %
4985		REHABILITACION CENTRO ESCOLAR WALTER SOUNDY, SANTA TECLA, LA LIBERTAD	199,040.00	P	199,040.00	0.00	0.00	199,040.00	0.00	0.00	0.00	199,040.00
				E	199,040.00	0.00	0.00	199,040.00	0.00	0.00	0.00	199,040.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4942		CENTRO ESCOLAR CANTON LOS CONEJOS, EL CARMEN, LA UNION	192,961.57	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				E	48,240.39	0.00	0.00	48,240.39	0.00	0.00	0.00	48,240.39
				D	-48,240.39	0.00	0.00	-48,240.39	0.00	0.00	0.00	-48,240.39
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
4716		MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR BRISAS DEL SOL, BERLIN, USULUTAN	178,772.14	P	44,693.04	0.00	0.00	44,693.04	0.00	0.00	0.00	44,693.04
				E	44,693.04	0.00	0.00	44,693.04	0.00	0.00	0.00	44,693.04
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4701		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON SAN CARLOS, JI DOLORES, DI CABAÑAS	173,847.58	P	43,461.90	0.00	0.00	43,461.90	0.00	0.00	0.00	43,461.90
				E	52,154.27	0.00	0.00	52,154.27	0.00	0.00	0.00	52,154.27
				D	-8,692.37	0.00	0.00	-8,692.37	0.00	0.00	0.00	-8,692.37
				%	120.0 %	0.0 %	0.0 %	120.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	120.0 %
4704		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR ISABEL, LA CATOLICA, CANTON LOS LLANITOS, ILOBASCO, CABAÑAS	168,799.02	P	168,799.02	0.00	0.00	168,799.02	0.00	0.00	0.00	168,799.02
				E	168,799.02	0.00	0.00	168,799.02	0.00	0.00	0.00	168,799.02
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
		REHABILITACION Y		P	121,622.07	0.00	0.00	121,622.07	0.00	0.00	0.00	121,622.07

4726	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR PARAISO REAL, SAN MIGUEL	162,162.74	P	162,162.74	0.00	0.00	162,162.74	0.00	0.00	0.00	162,162.74
			E	-40,540.87	0.00	0.00	-40,540.87	0.00	0.00	0.00	-40,540.87
			D	133.3 %	0.0 %	0.0 %	133.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	133.3 %
4723	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CHAPULTIQUE, SAN MIGUEL	158,087.61	P	39,521.90	0.00	0.00	39,521.90	0.00	0.00	0.00	39,521.90
			E	102,756.94	0.00	0.00	102,756.94	0.00	0.00	0.00	102,756.94
			D	-63,235.04	0.00	0.00	-63,235.04	0.00	0.00	0.00	-63,235.04
			%	260.0 %	0.0 %	0.0 %	260.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	260.0 %
4727	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL "DE ULUAZAPA", SAN MIGUEL	153,144.09	P	153,144.09	0.00	0.00	153,144.09	0.00	0.00	0.00	153,144.09
			E	153,144.09	0.00	0.00	153,144.09	0.00	0.00	0.00	153,144.09
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4939	INSTITUTO NACIONAL DE OSICALA, MORAZAN	152,655.43	P	152,655.43	0.00	0.00	152,655.43	0.00	0.00	0.00	152,655.43
			E	152,655.43	0.00	0.00	152,655.43	0.00	0.00	0.00	152,655.43
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4665	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO, JUJUTLA, AHUACHAPAN	142,340.87	P	142,340.87	0.00	0.00	142,340.87	0.00	0.00	0.00	142,340.87
			E	142,340.87	0.00	0.00	142,340.87	0.00	0.00	0.00	142,340.87
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4700	MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CINQUERA, CABAÑAS	140,125.99	P	140,125.99	0.00	0.00	140,125.99	0.00	0.00	0.00	140,125.99
			E	140,125.99	0.00	0.00	140,125.99	0.00	0.00	0.00	140,125.99
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4662	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO NUEVO NANCE AMARILLO, CANTON RIO FRIO, AHUACHAPAN	133,645.70	P	133,645.70	0.00	0.00	133,645.70	0.00	0.00	0.00	133,645.70
			E	133,645.70	0.00	0.00	133,645.70	0.00	0.00	0.00	133,645.70
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4728	CENTRO ESCOLAR COLONIA CARRILLO, CANTON EL PAPALÓN, SAN MIGUEL	124,980.02	P	31,245.01	0.00	0.00	31,245.01	0.00	0.00	0.00	31,245.01
			E	59,365.50	0.00	0.00	59,365.50	0.00	0.00	0.00	59,365.50
			D	-28,120.49	0.00	0.00	-28,120.49	0.00	0.00	0.00	-28,120.49
			%	190.0 %	0.0 %	0.0 %	190.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	190.0 %
4676	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SISIMITEPEC, NAHUIZALCO, SONSONATE	117,534.81	P	117,534.81	0.00	0.00	117,534.81	0.00	0.00	0.00	117,534.81
			E	117,534.81	0.00	0.00	117,534.81	0.00	0.00	0.00	117,534.81
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4702	CENTRO ESCOLAR CASERIO CONCEPCION, CANTON LA QUESERA, ILOBASCO, CABAÑAS	112,826.44	P	28,206.61	0.00	0.00	28,206.61	0.00	0.00	0.00	28,206.61
			E	28,206.61	0.00	0.00	28,206.61	0.00	0.00	0.00	28,206.61
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4671	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCATIVO HACIENDA SAN CAYETANO, SANTA ANA	106,866.86	P	106,866.86	0.00	0.00	106,866.86	0.00	0.00	0.00	106,866.86
			E	106,866.86	0.00	0.00	106,866.86	0.00	0.00	0.00	106,866.86
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4663	REPARACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL SALITRERO, ATQUIZAYA, AHUACHAPAN	105,867.25	P	105,867.25	0.00	0.00	105,867.25	0.00	0.00	0.00	105,867.25
			E	105,867.25	0.00	0.00	105,867.25	0.00	0.00	0.00	105,867.25
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4666	REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON GUASCOTA, SAN LORENZO AHUACHAPAN	105,518.00	P	58,034.90	0.00	0.00	58,034.90	0.00	0.00	0.00	58,034.90
			E	68,586.70	0.00	0.00	68,586.70	0.00	0.00	0.00	68,586.70
			D	-10,551.80	0.00	0.00	-10,551.80	0.00	0.00	0.00	-10,551.80
			%	118.2 %	0.0 %	0.0 %	118.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	118.2 %
4709	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR FABIO IGNACIO	99,975.00	P	74,981.25	0.00	0.00	74,981.25	0.00	0.00	0.00	74,981.25
			E	99,975.00	0.00	0.00	99,975.00	0.00	0.00	0.00	99,975.00

		MAGAÑA, EL ROSARIO, LA PAZ		P	-24,993.75	0.00	0.00	-24,993.75	0.00	0.00	0.00	-24,993.75
				%	133.3 %	0.0 %	0.0 %	133.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	133.3 %
4683		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR DE QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD	99,698.35	P	99,698.35	0.00	0.00	99,698.35	0.00	0.00	0.00	99,698.35
				E	99,698.35	0.00	0.00	99,698.35	0.00	0.00	0.00	99,698.35
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4690		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR	94,314.04	P	65,076.69	0.00	0.00	65,076.69	0.00	0.00	0.00	65,076.69
				E	54,702.15	0.00	0.00	54,702.15	0.00	0.00	0.00	54,702.15
				D	10,374.54	0.00	0.00	10,374.54	0.00	0.00	0.00	10,374.54
				%	84.1 %	0.0 %	0.0 %	84.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	84.1 %
4673		REPARACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON CERRO ALTO, CALUCO, SONSONATE	86,511.83	P	86,511.83	0.00	0.00	86,511.83	0.00	0.00	0.00	86,511.83
				E	81,321.13	0.00	0.00	81,321.13	0.00	0.00	0.00	81,321.13
				D	5,190.70	0.00	0.00	5,190.70	0.00	0.00	0.00	5,190.70
				%	94.0 %	0.0 %	0.0 %	94.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	94.0 %
4802		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR JICALAPA, LA LIBERTAD	78,718.08	P	78,718.08	0.00	0.00	78,718.08	0.00	0.00	0.00	78,718.08
				E	78,718.08	0.00	0.00	78,718.08	0.00	0.00	0.00	78,718.08
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4678		REPARACION ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "DE CHALATENANGO", CHALATENANGO	73,897.96	P	73,897.96	0.00	0.00	73,897.96	0.00	0.00	0.00	73,897.96
				E	73,897.96	0.00	0.00	73,897.96	0.00	0.00	0.00	73,897.96
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4940		INSTITUTO NACIONAL DE SAN SIMON, MORAZAN	20,701.50	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				E	20,701.50	0.00	0.00	20,701.50	0.00	0.00	0.00	20,701.50
				D	-20,701.50	0.00	0.00	-20,701.50	0.00	0.00	0.00	-20,701.50
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
4714		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN VICENTE	64,948.86	P	64,948.86	0.00	0.00	64,948.86	0.00	0.00	0.00	64,948.86
				E	64,948.86	0.00	0.00	64,948.86	0.00	0.00	0.00	64,948.86
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4722		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE USulután	46,192.73	P	46,192.73	0.00	0.00	46,192.73	0.00	0.00	0.00	46,192.73
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	46,192.73	0.00	0.00	46,192.73	0.00	0.00	0.00	46,192.73
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
4669		REHABILITACION ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE METAPAN, SANTA ANA	20,244.62	P	20,244.62	0.00	0.00	20,244.62	0.00	0.00	0.00	20,244.62
				E	20,244.62	0.00	0.00	20,244.62	0.00	0.00	0.00	20,244.62
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4687		MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL BARRILLO, ZARAGOZA, LA LIBERTAD	18,621.84	P	18,621.84	0.00	0.00	18,621.84	0.00	0.00	0.00	18,621.84
				E	13,035.29	0.00	0.00	13,035.29	0.00	0.00	0.00	13,035.29
				D	5,586.55	0.00	0.00	5,586.55	0.00	0.00	0.00	5,586.55
				%	70.0 %	0.0 %	0.0 %	70.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	70.0 %
4699		REHABILITACION COMPLEJO EDUCATIVO RAFAEL CABRERA, M/SAN RAMON, D/CUSCATLAN	18,574.97	P	18,574.97	0.00	0.00	18,574.97	0.00	0.00	0.00	18,574.97
				E	18,574.97	0.00	0.00	18,574.97	0.00	0.00	0.00	18,574.97
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4686		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON SAN SEBASTIAN, ZARAGOZA, LA LIBERTAD	14,608.84	P	14,608.84	0.00	0.00	14,608.84	0.00	0.00	0.00	14,608.84
				E	14,608.84	0.00	0.00	14,608.84	0.00	0.00	0.00	14,608.84
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
		PROGRAMA DE										

	4158	INFRAESTRUCTURA DE CENTROS ESCOLARES EN DPTOS. DE AHUACHAPÁN, CHALATENANGO, SAN MIGUEL, Y MORAZÁN	5,200.00	P E D %	598.23 598.23 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	598.23 598.23 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,601.77 4,601.77 0.00 100.0 %	4,601.77 4,601.77 0.00 100.0 %	5,200.00 5,200.00 0.00 100.0 %
	4698	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN CERRO COLORADO, M/SAN RAFAEL CEDROS, D/CUSCATLÁN.	954.70	P E D %	954.70 954.70 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	954.70 954.70 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	954.70 954.70 0.00 100.0 %
	4604	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ZAPOTE, CANTON CASTILLO, SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD	749.87	P E D %	749.87 749.87 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	749.87 749.87 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	749.87 749.87 0.00 100.0 %
	4893	MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL GENERAL ADOLFO BLANDÓN, M/COJUTEPEQUE, D/CUSCATLÁN.	712.91	P E D %	712.91 712.91 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	712.91 712.91 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	712.91 712.91 0.00 100.0 %
	4672	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO VALLE NUEVO, CANTON METALIO, ACAJUTLA, SONSONATE	696.65	P E D %	696.65 696.65 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	696.65 696.65 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	696.65 696.65 0.00 100.0 %
FOVIAL			21,641,981.09	P E D %	18,158,980.39 15,379,252.04 2,779,728.35 84.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	18,158,980.39 15,379,252.04 2,779,728.35 84.7 %	3,012,809.49 2,348,489.98 664,319.53 78.0 %	151,982.32 119,582.46 32,409.86 78.7 %	3,104,801.81 2,408,072.42 696,729.39 78.0 %	21,323,782.20 17,847,324.40 3,476,457.74 83.7 %
	4783	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2011	12,933,982.28	P E D %	12,781,989.96 11,200,226.68 1,581,763.28 87.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,781,989.96 11,200,226.68 1,581,763.28 87.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	151,992.32 119,582.46 32,409.86 78.7 %	151,992.32 119,582.46 32,409.86 78.7 %	12,933,982.28 11,319,808.14 1,614,173.14 87.5 %
	4778	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2011	1,938,393.57	P E D %	1,938,393.57 1,926,580.17 11,813.40 99.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,938,393.57 1,926,580.17 11,813.40 99.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,938,393.57 1,926,580.17 11,813.40 99.4 %
	4773	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2011	1,303,858.58	P E D %	1,303,858.58 1,159,982.05 143,876.53 89.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,303,858.58 1,159,982.05 143,876.53 89.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,303,858.58 1,159,982.05 143,876.53 89.0 %
	5405	Reparación de Calle entre Urbanización Plan del Pino Municipio de Soyapango y Municipio de Ciudad Delgado, Depto de San Salvador.	1,139,782.24	P E D %	1,139,782.24 524,879.29 614,902.95 46.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,139,782.24 524,879.29 614,902.95 46.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,139,782.24 524,879.29 614,902.95 46.1 %
	4794	Mejoramiento Camino Rural UNI22N, Tramo Nueva Esparta - Polorós, La Unión	822,771.12	P E D %	94,655.10 0.00 94,655.10 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	94,655.10 0.00 94,655.10 0.0 %	728,116.02 0.00 728,116.02 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	728,116.02 0.00 728,116.02 0.0 %	822,771.12 0.00 822,771.12 0.0 %
	4771	Mejoramiento Camino Rural AHU24S/AHU26S, Entre: Km. 151 Carretera El Litoral (CA02W) - Garita Palmera, Ahuachapán.	795,817.24	P E D %	147,558.00 78,533.93 69,024.07 53.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	147,558.00 78,533.93 69,024.07 53.2 %	648,259.24 604,106.91 44,152.33 93.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	648,259.24 604,106.91 44,152.33 93.2 %	795,817.24 682,840.64 113,176.40 85.8 %

5521	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN LA ZONA DEL PUENTE SOBRE EL RIO EL DESAGUE, EST. 31+720 DE LA CARRETERA RN03E, CANDELARIA, CUSCATLAN	447,860.75	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	447,860.75 447,378.79 281.96 99.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	447,860.75 447,378.79 281.96 99.9 %	447,860.75 447,378.79 281.96 99.9 %
5621	CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCIÓN EN EST. 0+500 DE LA RUTA SAN19W-SAN21E-MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	447,588.58	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	302,121.11 364,132.59 -62,011.48 120.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	302,121.11 364,132.59 -62,011.48 120.5 %	302,121.11 364,132.59 -62,011.48 120.5 %
5403	Reparación de calle SAL22S, Tramo Puerta del Diablo(SAL07W)- Mil Cumbres, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador	388,419.36	P E D %	388,419.36 290,060.58 98,358.78 74.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	388,419.36 290,060.58 98,358.78 74.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	388,419.36 290,060.58 98,358.78 74.7 %	388,419.36 290,060.58 98,358.78 74.7 %
5408	Mejoramiento Camino Rural PAZ37E/PAZ10S, Tramo: Cantón el Nilo -Cantón El Garrapatero-Cantón San Francisco Los Reyes (PAZ10S)-CA:02E, Departamento de la Paz	380,449.59	P E D %	327,186.65 158,305.85 168,880.80 48.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	327,186.65 158,305.85 168,880.80 48.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	327,186.65 158,305.85 168,880.80 48.4 %	327,186.65 158,305.85 168,880.80 48.4 %
5822	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION EN EJE 73-B (BOULEVARD VENEZUELA), EST. 1+400, SAN SALVADOR	370,961.98	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	255,158.11 370,961.94 -115,803.83 145.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	255,158.11 370,961.94 -115,803.83 145.4 %	255,158.11 370,961.94 -115,803.83 145.4 %
5515	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS PAVIMENTADAS DEL DEPARTAMENTO DE USulután	101,486.58	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	191,486.58 154,358.92 37,129.64 80.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	191,486.58 154,358.92 37,129.64 80.6 %	191,486.58 154,358.92 37,129.64 80.6 %
5280	REPARACION DE OBRA DE PASO EN EST. 1+060 DE RUTA RN02E, SOYAPANGO, SAN SALVADOR	116,621.47	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	116,621.47 102,385.70 14,235.77 87.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	116,621.47 102,385.70 14,235.77 87.8 %	116,621.47 102,385.70 14,235.77 87.8 %
5370	REPARACIÓN DE CÁRCAVAS EN KM 17+400 Y KM 18+400 DE LA RUTA RN06S, SANTO TOMAS, SAN SALVADOR	109,653.69	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	109,653.69 109,653.67 0.02 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	109,653.69 109,653.67 0.02 100.0 %	109,653.69 109,653.67 0.02 100.0 %
4488	Administración del Programa (Unidad Ejecutora)	74,800.00	P E D %	31,263.01 34,929.68 -3,666.65 111.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	31,263.01 34,929.68 -3,666.65 111.7 %	39,730.34 39,730.33 0.01 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	39,730.34 39,730.33 0.01 100.0 %	70,993.35 74,859.99 -3,866.64 105.2 %
5516	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS NO PAVIMENTADAS DEL	52,289.40	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	52,289.40 39,355.49 12,913.91 75.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	52,289.40 39,355.49 12,913.91 75.3 %	52,289.40 39,355.49 12,913.91 75.3 %

		DEPARTAMENTO DE USulután										
	5508	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA, EN LA RUTA CA02E, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y LA PAZ	45,260.48	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	45,260.48 45,260.48 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	45,260.48 45,260.48 0.00 100.0 %	45,260.48 45,260.48 0.00 100.0 %
	4795	Mejoramiento Camino Rural UNIO2S, Triunfo: El Jagüey - El Tamarindo, Departamento de La Unión	24,406.30	P E D %	2,807.79 2,757.76 50.03 98.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,807.79 2,757.76 50.03 98.2 %	21,598.51 21,213.50 385.01 98.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	21,598.51 21,213.50 385.01 98.2 %	24,406.30 23,971.23 435.04 98.2 %
	5541	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL UNIO3S; CA02E - EMBARCADERO LOS CORRALES, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	19,513.39	P E D %	2,244.91 2,194.85 50.06 97.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,244.91 2,194.85 50.06 97.8 %	17,268.48 16,883.47 385.01 97.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	17,268.48 16,883.47 385.01 97.8 %	19,513.39 19,078.32 435.07 97.8 %
	5509	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN KM 124+000 DE LA CARRETERA CA08W, FRONTERA LAS CHINAMAS	19,015.36	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	19,015.36 19,015.36 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	19,015.36 19,015.36 0.00 100.0 %	19,015.36 19,015.36 0.00 100.0 %
	5282	REPARACION DE CARCAVA EN KM. 37+450 DE RUTA RN05S, SAN LUIS TALPA, LA PAZ	8,283.79	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,283.79 5,739.89 2,543.90 69.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,283.79 5,739.89 2,543.90 69.3 %	8,283.79 5,739.89 2,543.90 69.3 %
	4788	Mejoramiento del Camino Rural USU27E, entre Cantón La Canea (Et. USU06S) - Corral de Mulas, Usulután	7,138.03	P E D %	821.22 821.22 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	821.22 821.22 0.00 100.0 %	6,316.81 6,316.81 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,316.81 6,316.81 0.00 100.0 %	7,138.03 7,138.03 0.00 100.0 %
	5281	REPARACION DE OBRA DE PASO EN EJE 81 (ZOOLOGICO NACIONAL), SAN SALVADOR	3,989.37	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,989.37 1,998.11 1,991.26 50.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,989.37 1,998.11 1,991.26 50.1 %	3,989.37 1,998.11 1,991.26 50.1 %
ANDA			11,268,121.61	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,168,410.25 1,168,236.17 174.08 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,168,410.25 1,168,236.17 174.08 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	9,929,939.36 9,043,799.74 3,886,139.62 60.9 %	9,929,939.36 9,043,799.74 3,886,139.62 60.9 %	11,098,343.01 7,212,035.91 3,886,313.70 65.0 %
	5134	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.	10,999,711.36	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	9,929,939.36 9,043,799.74 3,886,139.62 60.9 %	9,929,939.36 9,043,799.74 3,886,139.62 60.9 %	9,929,939.36 9,043,799.74 3,886,139.62 60.9 %
	5499	INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A CANTÓN LOS MORANES, NEJAPA, SAN SALVADOR.	807,024.08	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	807,024.08 807,024.08 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	807,024.08 807,024.08 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	807,024.08 807,024.08 0.00 100.0 %
	5497	INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL CANTÓN LA LAGUNETA, SANTIAGO DE CHILE, SAN JUAN NONUALCO, LA PAZ.	361,386.17	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	361,386.17 361,212.09 174.08 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	361,386.17 361,212.09 174.08 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	361,386.17 361,212.09 174.08 100.0 %

FISDL			10,112,558.95	P E D %	4,444,945.10 3,905,891.06 539,054.04 87.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,444,945.10 3,905,891.06 539,054.04 87.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,667,613.85 4,577,220.25 1,090,393.60 80.6 %	5,667,613.85 4,577,220.25 1,090,393.60 80.6 %	10,112,558.95 8,483,111.31 1,629,447.64 83.8 %
	4097	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL	6,106,683.18	P E D %	4,330,360.10 3,807,531.27 522,828.83 87.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,330,360.10 3,807,531.27 522,828.83 87.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,775,323.08 1,224,863.59 551,459.49 69.0 %	1,775,323.08 1,224,863.59 551,459.49 69.0 %	6,100,083.18 5,032,394.86 1,074,288.32 82.4 %
	4995	PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FISDL V)	2,123,507.96	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,123,507.96 1,763,111.64 360,396.32 83.0 %	2,123,507.96 1,763,111.64 360,396.32 83.0 %	2,123,507.96 1,763,111.64 360,396.32 83.0 %
	4184	PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA DE EL SALVADOR (PAPE)	1,706,412.86	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,706,412.86 1,527,875.07 178,537.79 89.5 %	1,706,412.86 1,527,875.07 178,537.79 89.5 %	1,706,412.86 1,527,875.07 178,537.79 89.5 %
	5648	Rehabilitación de Infraestructura Básica en Municipios Afectados por la Depresión Tropical 12 E	114,585.00	P E D %	114,585.00 98,359.79 16,225.21 85.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	114,585.00 98,359.79 16,225.21 85.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	114,585.00 98,359.79 16,225.21 85.8 %
	5045	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES DE SALUD EN COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES	61,369.95	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	61,369.95 61,369.95 0.00 100.0 %	61,369.95 61,369.95 0.00 100.0 %	61,369.95 61,369.95 0.00 100.0 %
PNC - MJSP			7,748,583.33	P E D %	891,429.94 891,429.94 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	891,429.94 891,429.94 0.00 100.0 %	6,857,153.39 6,857,153.39 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,857,153.39 6,857,153.39 0.00 100.0 %	7,748,583.33 7,748,583.33 0.00 100.0 %
	5099	Suministro e Instalación del Sistema Integral para los Centros de Atención de Emergencias 911 y AVI/GPS de la Policía Nacional Civil de El Salvador.	7,748,583.33	P E D %	891,429.94 891,429.94 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	891,429.94 891,429.94 0.00 100.0 %	6,857,153.39 6,857,153.39 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,857,153.39 6,857,153.39 0.00 100.0 %	7,748,583.33 7,748,583.33 0.00 100.0 %
CI - MJSP			7,746,150.00	P E D %	784,212.00 308,388.31 475,823.69 39.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	784,212.00 308,388.31 475,823.69 39.3 %	6,032,400.00 2,372,217.81 3,660,182.19 39.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,032,400.00 2,372,217.81 3,660,182.19 39.3 %	6,816,612.00 2,680,606.12 4,136,005.88 39.3 %
	5137	Granja de Rehabilitación para Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil de Ilobasco, Departamento de Cabañas	7,746,150.00	P E D %	784,212.00 308,388.31 475,823.69 39.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	784,212.00 308,388.31 475,823.69 39.3 %	6,032,400.00 2,372,217.81 3,660,182.19 39.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,032,400.00 2,372,217.81 3,660,182.19 39.3 %	6,816,612.00 2,680,606.12 4,136,005.88 39.3 %
MARN			2,268,148.92	P E D %	149,492.08 141,394.33 8,097.75 94.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	149,492.08 141,394.33 8,097.75 94.6 %	2,116,654.84 2,054,364.17 62,290.67 97.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,116,654.84 2,054,364.17 62,290.67 97.1 %	2,268,148.92 2,195,758.50 70,388.42 95.9 %
	5102	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL	1,299,431.12	P E D %	149,492.08 141,394.33 8,097.75 94.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	149,492.08 141,394.33 8,097.75 94.6 %	1,149,939.04 1,087,648.37 62,290.67 94.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,149,939.04 1,087,648.37 62,290.67 94.6 %	1,299,431.12 1,229,042.70 70,388.42 94.6 %
	5229	PROGRAMA NACIONAL DE	710,880.37	P E	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	710,880.37 710,880.37	0.00 0.00	710,880.37 710,880.37	710,880.37 710,880.37

		REDUCCION DE RIESGO		P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %
	2881	PROGRAMA DE DESCONTAMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS	255,835.43	P	0.00	0.00	0.00	0.00	255,835.43	0.00	255,835.43	255,835.43
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	255,835.43	0.00	255,835.43	255,835.43
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %
MAG			2,254,885.30	P	1,783,457.12	0.00	0.00	1,763,457.12	491,428.18	0.00	491,428.18	2,254,885.30
				E	1,200,065.48	0.00	0.00	1,200,065.48	488,765.50	0.00	488,765.50	1,688,430.98
				D	562,791.64	0.00	0.00	562,791.64	2,602.68	0.00	2,602.68	565,454.32
				%	66.1 %	0.0 %	0.0 %	66.1 %	99.5 %	0.0 %	99.5 %	74.9 %
	4648	Construcción de Obras de Mitigación en Cordillera El Bálsamo, al Sur de Santa Tecla, 2da. Etapa	804,112.48	P	804,112.48	0.00	0.00	804,112.48	0.00	0.00	0.00	804,112.48
				E	423,958.03	0.00	0.00	423,958.03	0.00	0.00	0.00	423,958.03
				D	380,154.45	0.00	0.00	380,154.45	0.00	0.00	0.00	380,154.45
				%	52.7 %	0.0 %	0.0 %	52.7 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	52.7 %
	4646	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de Control de Inundaciones	333,609.66	P	333,609.66	0.00	0.00	333,609.66	0.00	0.00	0.00	333,609.66
				E	188,198.66	0.00	0.00	188,198.66	0.00	0.00	0.00	188,198.66
				D	145,411.00	0.00	0.00	145,411.00	0.00	0.00	0.00	145,411.00
				%	56.4 %	0.0 %	0.0 %	56.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	56.4 %
	3752	Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO)	308,923.03	P	0.00	0.00	0.00	0.00	308,923.03	0.00	308,923.03	308,923.03
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	308,923.03	0.00	308,923.03	308,923.03
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %
	4650	Construcción de Obras de Control de Inundaciones Ríos Tihuapa - Huiza, Depto. de La Libertad	218,078.73	P	218,078.73	0.00	0.00	218,078.73	0.00	0.00	0.00	218,078.73
				E	218,078.73	0.00	0.00	218,078.73	0.00	0.00	0.00	218,078.73
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	4643	Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutas en El Salvador	190,859.00	P	190,859.00	0.00	0.00	190,859.00	0.00	0.00	0.00	190,859.00
				E	189,245.36	0.00	0.00	189,245.36	0.00	0.00	0.00	189,245.36
				D	1,613.64	0.00	0.00	1,613.64	0.00	0.00	0.00	1,613.64
				%	99.2 %	0.0 %	0.0 %	99.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	99.2 %
	4651	Construcción de Muro de Retención en Quebrada La Oscurana, Municipio de Berlín	167,587.87	P	167,587.87	0.00	0.00	167,587.87	0.00	0.00	0.00	167,587.87
				E	131,975.32	0.00	0.00	131,975.32	0.00	0.00	0.00	131,975.32
				D	35,612.55	0.00	0.00	35,612.55	0.00	0.00	0.00	35,612.55
				%	78.7 %	0.0 %	0.0 %	78.7 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	78.7 %
	5300	REACTIVACION DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION ACUICOLA Y ENTREGA DE POST-LARVAS DE CAMARON MARINO, A COOPERATIVAS CAMARONERAS DEL BAJO LLEMPA AFECTADAS POR LA DEPRESION TROPICAL IDA	147,965.95	P	0.00	0.00	0.00	0.00	147,965.95	0.00	147,965.95	147,965.95
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	145,715.95	0.00	145,715.95	145,715.95
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	98.5 %	0.0 %	98.5 %	98.5 %
	4647	Obras de Control de Inundaciones en los Ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Goascorán (II Fase)	44,406.70	P	44,406.70	0.00	0.00	44,406.70	0.00	0.00	0.00	44,406.70
				E	44,406.70	0.00	0.00	44,406.70	0.00	0.00	0.00	44,406.70
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	5297	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN COOPERATIVAS DE LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	34,256.52	P	0.00	0.00	0.00	0.00	34,256.52	0.00	34,256.52	34,256.52
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	34,126.52	0.00	34,126.52	34,126.52
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	99.6 %	0.0 %	99.6 %	99.6 %

	4649	Reparación de Cárcava en Asentamiento Bello Horizonte, Comasagua, La Libertad	4,681.61	P E D %	4,681.61 4,681.61 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,681.61 4,681.61 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,681.61 4,681.61 0.00 100.0 %
	5284	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS RIOS LEMPA, GRANDE DE SAN MIGUEL, PAZ Y JIBOA	282.68	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	282.68 0.00 282.68 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	282.68 0.00 282.68 0.0 %	282.68 0.00 282.68 0.0 %
	4644	Fortalecimiento del Sector Pecuário y Avícola en El Salvador	121.07	P E D %	121.07 121.07 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	121.07 121.07 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	121.07 121.07 0.00 100.0 %
CEPA			1,591,043.23	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	177,004.07 126,208.72 50,795.35 71.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	177,004.07 126,208.72 50,795.35 71.3 %	1,414,039.16 1,226,835.71 187,203.45 85.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,414,039.16 1,226,835.71 187,203.45 85.6 %	1,591,043.23 1,353,044.43 237,998.80 85.0 %
	4603	Obras de Mitigación en el Aeropuerto Internacional Ilopango, FASE I.	1,414,039.16	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,414,039.16 1,226,835.71 187,203.45 85.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,414,039.16 1,226,835.71 187,203.45 85.6 %	1,414,039.16 1,226,835.71 187,203.45 85.6 %
	5610	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR	177,004.07	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	177,004.07 126,208.72 50,795.35 71.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	177,004.07 126,208.72 50,795.35 71.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	177,004.07 126,208.72 50,795.35 71.3 %
CNR			1,307,281.08	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	151,226.21 146,148.74 5,077.47 96.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	151,226.21 146,148.74 5,077.47 96.6 %	1,156,054.87 1,116,996.12 39,058.75 96.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,156,054.87 1,116,996.12 39,058.75 96.6 %	1,307,281.08 1,263,144.86 44,136.22 96.6 %
	3541	PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II	1,307,281.08	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	151,226.21 146,148.74 5,077.47 96.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	151,226.21 146,148.74 5,077.47 96.6 %	1,156,054.87 1,116,996.12 39,058.75 96.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,156,054.87 1,116,996.12 39,058.75 96.6 %	1,307,281.08 1,263,144.86 44,136.22 96.6 %
DGCP - MJSP			459,736.48	P E D %	459,736.48 459,736.48 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	459,736.48 459,736.48 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	459,736.48 459,736.48 0.00 100.0 %
	5520	Obras de Reforzamiento de Seguridad Pasiva y Control del Centro Penal de Zacatecoluca	187,782.01	P E D %	187,782.01 187,782.01 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	187,782.01 187,782.01 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	187,782.01 187,782.01 0.00 100.0 %
	5582	Construcción y readecuación de instalaciones del Centro de Formación de la Escuela Penitenciaria en la Penitenciaría Central La Esperanza, Dpto. San Salvador	113,552.81	P E D %	113,552.81 113,552.81 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	113,552.81 113,552.81 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	113,552.81 113,552.81 0.00 100.0 %
	5518	Readecuación del Área de Visitas de los Centros Penitenciarios de Quezaltepeque y Ciudad	84,530.26	P E D %	84,530.26 84,530.26 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	84,530.26 84,530.26 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	84,530.26 84,530.26 0.00 0.00

		Barrios		%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	5519	Reparación e impermeabilización de techos en el Centro Penitenciario de Zacatecoluca	73,871.40	P E D %	73,871.40 73,871.40 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	73,871.40 73,871.40 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	73,871.40 73,871.40 0.00 100.0 %
MIGOB			413,308.59	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 413,308.59 413,308.59 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 413,308.59 413,308.59 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	413,308.59 413,308.59 0.00 100.0 %
	5277	Mejoramiento de Infraestructura de 9 Gobernaciones Departamentales a nivel nacional	327,520.20	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 327,520.20 327,520.20 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 327,520.20 327,520.20 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	327,520.20 327,520.20 0.00 100.0 %
	5275	Adquisición de equipo por las Gobernaciones Departamentales, Dirección de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastros y Cuerpo de Bomberos del Ministerio de Gobernación	85,786.39	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 85,786.39 85,786.39 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 85,786.39 85,786.39 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	85,786.39 85,786.39 0.00 100.0 %
SE - MJSP			350,941.96	P E D %	40,373.86 33,754.64 6,619.22 83.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	40,373.86 33,754.64 6,619.22 83.6 %	310,568.10 259,651.08 50,917.02 83.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,568.10 259,651.08 50,917.02 83.6 %	350,941.96 293,405.72 57,536.24 83.6 %
	5136	Programa de Prevención de la Violencia y la Delincuencia	350,941.96	P E D %	40,373.86 33,754.64 6,619.22 83.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	40,373.86 33,754.64 6,619.22 83.6 %	310,568.10 259,651.08 50,917.02 83.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,568.10 259,651.08 50,917.02 83.6 %	350,941.96 293,405.72 57,536.24 83.6 %
ISNA			264,479.12	P E D %	264,479.12 264,474.00 5.12 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	264,479.12 264,474.00 5.12 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	264,479.12 264,474.00 5.12 100.0 %
	4830	REPARACION EDIFICIO LA ESTRELLA, DELEGACION CENTRAL ISNA (FASE II)	179,864.26	P E D %	179,864.26 179,864.26 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	179,864.26 179,864.26 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	179,864.26 179,864.26 0.00 100.0 %
	4511	REPARACIONES Y MEJORAS EN CENTRO DE REINSERCIÓN EL ESPINO, AHUACHAPAN (Primera Fase)	84,614.86	P E D %	84,614.86 84,609.74 5.12 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	84,614.86 84,609.74 5.12 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	84,614.86 84,609.74 5.12 100.0 %
AL			233,091.29	P E D %	233,091.29 227,626.45 5,464.84 97.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	233,091.29 227,626.45 5,464.84 97.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	233,091.29 227,626.45 5,464.84 97.7 %
	5222	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO II	233,091.29	P E D %	233,091.29 227,626.45 5,464.84 97.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	233,091.29 227,626.45 5,464.84 97.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	233,091.29 227,626.45 5,464.84 97.7 %
MH			200,641.40	P E D %	200,641.40 200,641.40 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,641.40 200,641.40 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,641.40 200,641.40 0.00 100.0 %
		REPARACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y										

	5522	CONSTRUCCION DE CERCA DE MALLA CICLÓN EN EL CENTRO RECREATIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, SAN BARTOLO, ILOPANGO.	87,284.77	P E D %	87,284.77 87,284.77 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	87,284.77 87,284.77 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	87,284.77 87,284.77 0.00 100.0 %
	5631	EQUIPAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS SEIS ADUANAS DE FRONTERA DE EL SALVADOR.	80,574.65	P E D %	80,574.65 80,574.65 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	80,574.65 80,574.65 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	80,574.65 80,574.65 0.00 100.0 %
	5513	Reparaciones en infraestructura de la Aduana en Frontera Las Chinamas, Departamento de Ahuachapán.	32,781.98	P E D %	32,781.98 32,781.98 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	32,781.98 32,781.98 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	32,781.98 32,781.98 0.00 100.0 %
BOMBER - MIGOB			194,525.95	P E D %	37,297.01 37,286.70 10.31 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	37,297.01 37,286.70 10.31 100.0 %	157,228.95 157,228.95 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	157,228.95 157,228.95 0.00 100.0 %	194,525.95 194,515.85 10.31 100.0 %
	5270	Adquisición de equipo para el Cuerpo de Bomberos de El Salvador a nivel nacional	157,228.95	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	157,228.95 157,228.95 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	157,228.95 157,228.95 0.00 100.0 %	157,228.95 157,228.95 0.00 100.0 %
	4999	Construcción y Equipamiento de dormitorios para el personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Estación Central.	37,297.01	P E D %	37,297.01 37,286.70 10.31 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	37,297.01 37,286.70 10.31 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	37,297.01 37,286.70 10.31 100.0 %
MTYPS			69,619.96	P E D %	69,619.96 68,578.36 3,041.60 95.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	69,619.96 68,578.36 3,041.60 95.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	69,619.96 68,578.36 3,041.60 95.6 %
	5191	Construcción, Reconstrucción, Modernización y Equipamiento en Centro de Recreación Obrera, Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Constitución 1950, Lago de Coatepeque Santa Ana	69,619.96	P E D %	69,619.96 68,578.36 3,041.60 95.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	69,619.96 68,578.36 3,041.60 95.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	69,619.96 68,578.36 3,041.60 95.6 %
CENTA			65,991.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	65,991.00 65,991.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	65,991.00 65,991.00 0.00 100.0 %	65,991.00 65,991.00 0.00 100.0 %
	5298	Rehabilitación de la Producción y Comercialización de Hortalizas en Zonas Afectadas por el Huracán Ida	65,991.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	65,991.00 65,991.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	65,991.00 65,991.00 0.00 100.0 %	65,991.00 65,991.00 0.00 100.0 %
CEL			45,015.17	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	45,015.17 0.00 45,015.17 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	45,015.17 0.00 45,015.17 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	45,015.17 0.00 45,015.17 0.0 %
	3684	Suministro e instalación de una micro unidad generadora en la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.	45,015.17	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	45,015.17 0.00 45,015.17 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	45,015.17 0.00 45,015.17 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	45,015.17 0.00 45,015.17 0.0 %
				P	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00

ILEA			38,900.00	P E D %	38,900.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	38,900.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	38,900.00 0.00 100.0 %
	4493	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, ILEA SAN SALVADOR"	38,900.00	P E D %	38,900.00 38,900.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	38,900.00 38,900.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	38,900.00 38,900.00 0.00 100.0 %
ISDEMU			38,348.08	P E D %	38,348.08 38,348.08 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	38,348.08 38,348.08 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	38,348.08 38,348.08 0.00 100.0 %
	5555	Readequación de Espacio y Acabados de Cocina y Oficinas de ISDEMU San Salvador	29,992.81	P E D %	29,992.81 29,992.81 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	29,992.81 29,992.81 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	29,992.81 29,992.81 0.00 100.0 %
	5556	MEJORA DE LA OFICINA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	8,355.25	P E D %	8,355.25 8,355.25 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,355.25 8,355.25 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,355.25 8,355.25 0.00 100.0 %
TOTAL PROVISIONES			169,972,192.74	P E D %	64,549,880.49 55,360,924.83 9,180,964.86 85.8 %	1,541,855.70 1,440,503.83 101,062.07 93.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	66,091,545.19 56,809,518.26 9,282,026.93 86.0 %	69,303,352.82 52,432,851.57 16,930,491.25 75.6 %	22,295,301.87 17,286,358.79 5,008,943.08 77.5 %	91,658,654.89 89,719,220.36 21,939,434.33 76.1 %	157,750,199.88 128,528,738.82 31,221,461.26 80.2 %
MINSAL			44,474,876.24	P E D %	28,358,360.50 3,499,844.27 24,858,516.23 12.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	28,358,360.50 3,499,844.27 24,858,516.23 12.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	28,358,360.50 3,499,844.27 24,858,516.23 12.3 %
	401	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION	13,691,149.77	P E D %	3,672,982.25 216,230.79 3,456,751.46 5.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,672,982.25 216,230.79 3,456,751.46 5.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,672,982.25 216,230.79 3,456,751.46 5.9 %
	4653	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños "Benjamin Bloom"	3,061,448.88	P E D %	1,503,351.14 50,511.00 1,452,840.14 3.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,503,351.14 50,511.00 1,452,840.14 3.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,503,351.14 50,511.00 1,452,840.14 3.4 %
	4656	Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"	3,053,272.32	P E D %	2,597,970.20 102,495.00 2,495,475.20 3.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,597,970.20 102,495.00 2,495,475.20 3.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,597,970.20 102,495.00 2,495,475.20 3.9 %
	4657	Programa de Extensión de Cobertura en la Zona Rural (período 2009-2011)	2,939,788.85	P E D %	2,533,153.32 2,269,436.55 263,716.77 89.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,533,153.32 2,269,436.55 263,716.77 89.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,533,153.32 2,269,436.55 263,716.77 89.6 %
	4655	Remodelación y Equipamiento de la Tercera Planta del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales	2,891,955.00	P E D %	1,618,775.00 75,145.00 1,543,630.00 4.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,618,775.00 75,145.00 1,543,630.00 4.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,618,775.00 75,145.00 1,543,630.00 4.6 %
		Apoyo al Primer Nivel de		P	1,570,169.95	0.00	0.00	1,570,169.95	0.00	0.00	0.00	1,570,169.95

4861	Atención y Hospitales del MSPAS.	1,808,874.28	E D %	110,786.52 1,459,383.43 7.1 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	110,786.52 1,459,383.43 7.1 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	110,786.52 1,459,383.43 7.1 %
4854	Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamin Bloom"	1,502,767.63	P E D %	1,150,440.24 110,686.00 1,039,754.24 9.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,150,440.24 110,686.00 1,039,754.24 9.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,150,440.24 110,686.00 1,039,754.24 9.6 %
4808	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás Pineda Martínez, Santa Ana	864,895.25	P E D %	884,855.20 2,316.50 882,538.70 0.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	884,855.20 2,316.50 882,538.70 0.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	884,855.20 2,316.50 882,538.70 0.3 %
4853	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martín, San Salvador	810,384.00	P E D %	710,345.78 26,916.60 683,429.16 3.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	710,345.78 26,916.60 683,429.16 3.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	710,345.78 26,916.60 683,429.16 3.8 %
4836	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de Ayutlaxtepeque, San Salvador	650,504.25	P E D %	421,960.00 0.00 421,960.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	421,960.00 0.00 421,960.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	421,960.00 0.00 421,960.00 0.0 %
4918	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Candelaria, Cuscatlán	505,522.25	P E D %	484,556.95 18,652.53 465,904.42 3.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	484,556.95 18,652.53 465,904.42 3.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	484,556.95 18,652.53 465,904.42 3.8 %
4887	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Ciudad Arca, La Libertad	497,960.25	P E D %	442,350.00 15,594.00 426,756.00 3.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	442,350.00 15,594.00 426,756.00 3.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	442,350.00 15,594.00 426,756.00 3.5 %
4907	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Bárbara, Santa Ana	445,000.00	P E D %	429,406.00 0.00 429,406.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	429,406.00 0.00 429,406.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	429,406.00 0.00 429,406.00 0.0 %
4924	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán	436,073.75	P E D %	209,085.00 0.00 209,085.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	209,085.00 0.00 209,085.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	209,085.00 0.00 209,085.00 0.0 %
4911	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Nahuizalco, Sonsonate	435,000.50	P E D %	431,610.50 9,814.27 421,796.23 2.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	431,610.50 9,814.27 421,796.23 2.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	431,610.50 9,814.27 421,796.23 2.3 %
4862	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Carlos, La Unión	435,000.25	P E D %	390,974.98 0.00 390,974.98 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	390,974.98 0.00 390,974.98 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	390,974.98 0.00 390,974.98 0.0 %
4865	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las Marías, Chinameca, San Miguel	435,000.25	P E D %	364,069.00 15,594.00 348,475.00 4.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	364,069.00 15,594.00 348,475.00 4.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	364,069.00 15,594.00 348,475.00 4.3 %
4910	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio, San Antonio del Monte, Sonsonate	435,000.25	P E D %	264,971.66 0.00 264,971.66 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	264,971.66 0.00 264,971.66 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	264,971.66 0.00 264,971.66 0.0 %
4913	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de	435,000.25	P E D %	363,780.05 54,267.61 309,512.44	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	363,780.05 54,267.61 309,512.44	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	363,780.05 54,267.61 309,512.44

	Ahuachapán, Ahuachapán		%	14.9 %	0.0 %	0.0 %	14.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	14.9 %
4827	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guacoteclí, Cabañas	435,000.25	P	288,605.07	0.00	0.00	288,605.07	0.00	0.00	0.00	288,605.07
			E	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00	0.00	0.00	0.00	15,594.00
			D	273,011.07	0.00	0.00	273,011.07	0.00	0.00	0.00	273,011.07
			%	5.4 %	0.0 %	0.0 %	5.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	5.4 %
4875	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Usulután, Usulután	455,000.00	P	291,594.10	0.00	0.00	291,594.10	0.00	0.00	0.00	291,594.10
			E	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00	0.00	0.00	0.00	15,594.00
			D	276,000.10	0.00	0.00	276,000.10	0.00	0.00	0.00	276,000.10
			%	5.3 %	0.0 %	0.0 %	5.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	5.3 %
3346	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA	434,726.25	P	397,042.48	0.00	0.00	397,042.48	0.00	0.00	0.00	397,042.48
			E	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00	0.00	0.00	0.00	15,594.00
			D	381,448.48	0.00	0.00	381,448.48	0.00	0.00	0.00	381,448.48
			%	3.9 %	0.0 %	0.0 %	3.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	3.9 %
4894	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana	419,810.95	P	370,323.76	0.00	0.00	370,323.76	0.00	0.00	0.00	370,323.76
			E	16,780.50	0.00	0.00	16,780.50	0.00	0.00	0.00	16,780.50
			D	353,543.26	0.00	0.00	353,543.26	0.00	0.00	0.00	353,543.26
			%	4.5 %	0.0 %	0.0 %	4.5 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	4.5 %
4874	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Rafael, San Miguel	403,382.93	P	383,352.44	0.00	0.00	383,352.44	0.00	0.00	0.00	383,352.44
			E	24,401.01	0.00	0.00	24,401.01	0.00	0.00	0.00	24,401.01
			D	358,951.43	0.00	0.00	358,951.43	0.00	0.00	0.00	358,951.43
			%	6.4 %	0.0 %	0.0 %	6.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	6.4 %
4884	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango	400,000.25	P	348,915.80	0.00	0.00	348,915.80	0.00	0.00	0.00	348,915.80
			E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			D	348,915.80	0.00	0.00	348,915.80	0.00	0.00	0.00	348,915.80
			%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
4850	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador	340,529.25	P	337,631.35	0.00	0.00	337,631.35	0.00	0.00	0.00	337,631.35
			E	28,143.05	0.00	0.00	28,143.05	0.00	0.00	0.00	28,143.05
			D	309,488.30	0.00	0.00	309,488.30	0.00	0.00	0.00	309,488.30
			%	8.3 %	0.0 %	0.0 %	8.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	8.3 %
4858	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilopango, San Salvador	314,140.25	P	311,200.25	0.00	0.00	311,200.25	0.00	0.00	0.00	311,200.25
			E	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00
			D	308,358.25	0.00	0.00	308,358.25	0.00	0.00	0.00	308,358.25
			%	0.9 %	0.0 %	0.0 %	0.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.9 %
4880	Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud El Espino, Jucuarán, Usulután	309,193.25	P	309,193.25	0.00	0.00	309,193.25	0.00	0.00	0.00	309,193.25
			E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			D	309,193.25	0.00	0.00	309,193.25	0.00	0.00	0.00	309,193.25
			%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
4912	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Salcoatitán, Sonsonate	302,938.01	P	244,864.40	0.00	0.00	244,864.40	0.00	0.00	0.00	244,864.40
			E	18,136.50	0.00	0.00	18,136.50	0.00	0.00	0.00	18,136.50
			D	226,727.90	0.00	0.00	226,727.90	0.00	0.00	0.00	226,727.90
			%	7.4 %	0.0 %	0.0 %	7.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	7.4 %
4885	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Arracaos, Nueva Concepción, Chalatenango	295,500.25	P	223,474.99	0.00	0.00	223,474.99	0.00	0.00	0.00	223,474.99
			E	2,034.00	0.00	0.00	2,034.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00
			D	221,440.99	0.00	0.00	221,440.99	0.00	0.00	0.00	221,440.99
			%	0.9 %	0.0 %	0.0 %	0.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.9 %
4839	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes, San Salvador	249,353.90	P	249,353.90	0.00	0.00	249,353.90	0.00	0.00	0.00	249,353.90
			E	2,881.50	0.00	0.00	2,881.50	0.00	0.00	0.00	2,881.50
			D	246,472.40	0.00	0.00	246,472.40	0.00	0.00	0.00	246,472.40
			%	1.2 %	0.0 %	0.0 %	1.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	1.2 %
4852	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador	240,500.25	P	237,788.25	0.00	0.00	237,788.25	0.00	0.00	0.00	237,788.25
			E	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00
			D	236,432.25	0.00	0.00	236,432.25	0.00	0.00	0.00	236,432.25
			%	0.6 %	0.0 %	0.0 %	0.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.6 %

4864	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Llano los Patos, Conchagua, La Unión	222,000.60	P E D %	210,525.16 3,277.00 207,248.16 1.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	210,525.16 3,277.00 207,248.16 1.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	210,525.16 3,277.00 207,248.16 1.6 %
4870	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud California, Usulután	222,000.25	P E D %	222,000.25 0.00 222,000.25 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	222,000.25 0.00 222,000.25 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	222,000.25 0.00 222,000.25 0.0 %
4932	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Mercedes La Ceiba, La Paz	167,000.75	P E D %	133,780.75 0.00 133,780.75 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	133,780.75 0.00 133,780.75 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	133,780.75 0.00 133,780.75 0.0 %
4919	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de El Carmen, Cuscatlán	167,000.25	P E D %	73,790.05 0.00 73,790.05 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	73,790.05 0.00 73,790.05 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	73,790.05 0.00 73,790.05 0.0 %
4935	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Juan Talpa, La Paz	145,065.93	P E D %	123,819.56 2,881.50 120,938.06 2.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	123,819.56 2,881.50 120,938.06 2.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	123,819.56 2,881.50 120,938.06 2.3 %
4928	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco del Monte, Ilobasco, Cabañas	141,406.25	P E D %	141,406.25 2,881.50 138,524.75 2.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	141,406.25 2,881.50 138,524.75 2.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	141,406.25 2,881.50 138,524.75 2.0 %
4881	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Cruz, Usulután	135,169.75	P E D %	106,745.80 0.00 106,745.80 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	106,745.80 0.00 106,745.80 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	106,745.80 0.00 106,745.80 0.0 %
3345	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CHALATENANGO	134,000.00	P E D %	93,085.16 16,040.53 77,044.63 17.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	93,085.16 16,040.53 77,044.63 17.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	93,085.16 16,040.53 77,044.63 17.2 %
4873	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Silva, San Miguel	126,824.25	P E D %	104,199.85 0.00 104,199.85 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	104,199.85 0.00 104,199.85 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	104,199.85 0.00 104,199.85 0.0 %
4872	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Milagro de la Paz, San Miguel	125,234.25	P E D %	83,826.85 0.00 83,826.85 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	83,826.85 0.00 83,826.85 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	83,826.85 0.00 83,826.85 0.0 %
4893	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Tamanique, La Libertad	113,830.30	P E D %	113,830.30 9,442.73 104,387.57 8.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	113,830.30 9,442.73 104,387.57 8.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	113,830.30 9,442.73 104,387.57 8.3 %
4938	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guadalupe, San Vicente	113,211.62	P E D %	113,211.62 11,865.00 101,346.62 10.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	113,211.62 11,865.00 101,346.62 10.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	113,211.62 11,865.00 101,346.62 10.5 %
4867	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Uruazapa, San Miguel	110,417.12	P E D %	110,417.12 6,780.00 103,637.12	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	110,417.12 6,780.00 103,637.12	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	110,417.12 6,780.00 103,637.12

				%	6.1 %	0.0 %	0.0 %	6.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	6.1 %
	4859	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Bobadilla, San Alejo, La Unión	106,519.11	P E D %	96,427.58 9,295.16 87,132.42 9.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	96,427.58 9,295.16 87,132.42 9.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	96,427.58 9,295.16 87,132.42 9.6 %
	4882	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Dorado, Chalatenango	105,395.00	P E D %	50,000.00 0.00 50,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	50,000.00 0.00 50,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	50,000.00 0.00 50,000.00 0.0 %
	4891	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Matías, La Libertad	100,368.14	P E D %	100,368.14 10,023.06 90,345.08 10.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	100,368.14 10,023.06 90,345.08 10.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	100,368.14 10,023.06 90,345.08 10.0 %
	4860	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Carmen, La Unión	100,000.00	P E D %	100,000.00 0.00 100,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	100,000.00 0.00 100,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	100,000.00 0.00 100,000.00 0.0 %
	4861	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Faro, Conchagua, La Unión	97,231.12	P E D %	97,231.12 9,483.16 87,747.96 9.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	97,231.12 9,483.16 87,747.96 9.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	97,231.12 9,483.16 87,747.96 9.8 %
	4930	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Jutiapa, Cabañas	80,731.87	P E D %	80,731.87 6,780.00 73,951.87 8.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	80,731.87 6,780.00 73,951.87 8.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	80,731.87 6,780.00 73,951.87 8.4 %
	4902	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San José Ingenio, Metapán, Santa Ana	75,000.25	P E D %	75,000.25 0.00 75,000.25 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	75,000.25 0.00 75,000.25 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	75,000.25 0.00 75,000.25 0.0 %
	4926	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Sensuntepeque, Cabañas	70,492.62	P E D %	70,492.62 6,780.00 63,712.62 9.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	70,492.62 6,780.00 63,712.62 9.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	70,492.62 6,780.00 63,712.62 9.6 %
	4920	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de Concepción, Cuscatlán	68,176.28	P E D %	68,176.28 8,475.00 59,701.28 12.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	68,176.28 8,475.00 59,701.28 12.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	68,176.28 8,475.00 59,701.28 12.4 %
	4868	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel	66,107.05	P E D %	66,107.05 8,475.00 57,632.05 12.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	66,107.05 8,475.00 57,632.05 12.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	66,107.05 8,475.00 57,632.05 12.8 %
	4922	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San José Guayabal, Cuscatlán	65,742.60	P E D %	65,742.60 0.00 65,742.60 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	65,742.60 0.00 65,742.60 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	65,742.60 0.00 65,742.60 0.0 %
	4059	Remodelación y equipamiento del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales	62,761.54	P E D %	62,761.54 0.00 62,761.54 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	62,761.54 0.00 62,761.54 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	62,761.54 0.00 62,761.54 0.0 %
		Ampliación, Equipamiento,										

4899	Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sillo El Niño, San Juan Opico, La Libertad	61,890.21	P L D %	61,890.21 6,739.09 55,151.12 10.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	61,890.21 6,739.09 55,151.12 10.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	61,890.21 6,739.09 55,151.12 10.9 %
4855	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Paisnal, San Salvador	60,500.25	P E D %	60,500.25 0.00 60,500.25 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	60,500.25 0.00 60,500.25 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	60,500.25 0.00 60,500.25 0.0 %
4863	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Playa, La Unión	60,076.49	P E D %	60,076.49 12,015.58 48,060.91 20.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	60,076.49 12,015.58 48,060.91 20.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	60,076.49 12,015.58 48,060.91 20.0 %
4929	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilobasco, Cabañas	58,986.04	P E D %	58,986.04 8,475.00 50,511.04 14.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	58,986.04 8,475.00 50,511.04 14.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	58,986.04 8,475.00 50,511.04 14.4 %
4892	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad	57,703.26	P E D %	57,703.26 7,545.48 50,157.78 13.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	57,703.26 7,545.48 50,157.78 13.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	57,703.26 7,545.48 50,157.78 13.1 %
4905	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana	57,249.53	P E D %	57,249.53 0.00 57,249.53 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	57,249.53 0.00 57,249.53 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	57,249.53 0.00 57,249.53 0.0 %
4897	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana	56,933.25	P E D %	56,933.25 8,475.00 48,458.25 14.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	56,933.25 8,475.00 48,458.25 14.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	56,933.25 8,475.00 48,458.25 14.9 %
4906	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Lucía, Santa Ana	56,404.34	P E D %	56,404.34 11,793.35 44,610.99 20.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	56,404.34 11,793.35 44,610.99 20.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	56,404.34 11,793.35 44,610.99 20.9 %
4917	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán	54,934.79	P E D %	54,934.79 15,186.44 39,736.35 27.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	54,934.79 15,186.44 39,736.35 27.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	54,934.79 15,186.44 39,736.35 27.7 %
4936	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Rafael Obrajuelo, La Paz	51,472.10	P E D %	51,472.10 7,436.13 44,035.97 14.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	51,472.10 7,436.13 44,035.97 14.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	51,472.10 7,436.13 44,035.97 14.4 %
4937	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitán, San Vicente	50,845.14	P E D %	50,845.14 0.00 50,845.14 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	50,845.14 0.00 50,845.14 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	50,845.14 0.00 50,845.14 0.0 %
4933	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía Orcoy, Olocuiltla, La Paz	50,000.50	P E D %	50,000.50 0.00 50,000.50 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	50,000.50 0.00 50,000.50 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	50,000.50 0.00 50,000.50 0.0 %
4921	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San	49,040.00	P E	49,040.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	49,040.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	49,040.00 0.00

		Pedro Perulapán, Cuscatlán		D	49,040.00	0.00	0.00	49,040.00	0.00	0.00	0.00	49,040.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4925	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Perulapia, Cuscatlán	48,390.75	P	48,390.75	0.00	0.00	48,390.75	0.00	0.00	0.00	48,390.75
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	48,390.75	0.00	0.00	48,390.75	0.00	0.00	0.00	48,390.75
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4903	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Juan las Minas, Metapán, Santa Ana	47,459.95	P	47,459.95	0.00	0.00	47,459.95	0.00	0.00	0.00	47,459.95
				E	10,615.94	0.00	0.00	10,615.94	0.00	0.00	0.00	10,615.94
				D	36,844.01	0.00	0.00	36,844.01	0.00	0.00	0.00	36,844.01
				%	22.4 %	0.0 %	0.0 %	22.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	22.4 %
	4905	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Piche, El Carmen, La Unión	46,231.05	P	46,231.05	0.00	0.00	46,231.05	0.00	0.00	0.00	46,231.05
				E	6,758.82	0.00	0.00	6,758.82	0.00	0.00	0.00	6,758.82
				D	39,474.43	0.00	0.00	39,474.43	0.00	0.00	0.00	39,474.43
				%	14.6 %	0.0 %	0.0 %	14.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	14.6 %
	4931	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyultlán, La Paz	45,047.41	P	45,047.41	0.00	0.00	45,047.41	0.00	0.00	0.00	45,047.41
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	45,047.41	0.00	0.00	45,047.41	0.00	0.00	0.00	45,047.41
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4858	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador	44,726.25	P	44,726.25	0.00	0.00	44,726.25	0.00	0.00	0.00	44,726.25
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	44,726.25	0.00	0.00	44,726.25	0.00	0.00	0.00	44,726.25
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4890	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La Libertad, La Libertad	44,623.58	P	44,623.58	0.00	0.00	44,623.58	0.00	0.00	0.00	44,623.58
				E	39,532.90	0.00	0.00	39,532.90	0.00	0.00	0.00	39,532.90
				D	5,090.66	0.00	0.00	5,090.66	0.00	0.00	0.00	5,090.66
				%	88.6 %	0.0 %	0.0 %	88.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	88.6 %
	4923	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Ramón, Cuscatlán	42,638.54	P	42,638.54	0.00	0.00	42,638.54	0.00	0.00	0.00	42,638.54
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	42,638.54	0.00	0.00	42,638.54	0.00	0.00	0.00	42,638.54
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4904	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Sebastián Salitrillo, Santa Ana	40,391.81	P	40,391.81	0.00	0.00	40,391.81	0.00	0.00	0.00	40,391.81
				E	8,475.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00
				D	31,916.81	0.00	0.00	31,916.81	0.00	0.00	0.00	31,916.81
				%	21.0 %	0.0 %	0.0 %	21.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	21.0 %
	4898	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa Ana	37,728.22	P	37,728.22	0.00	0.00	37,728.22	0.00	0.00	0.00	37,728.22
				E	5,085.00	0.00	0.00	5,085.00	0.00	0.00	0.00	5,085.00
				D	32,641.22	0.00	0.00	32,641.22	0.00	0.00	0.00	32,641.22
				%	13.5 %	0.0 %	0.0 %	13.5 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	13.5 %
	4951	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Tonacatepeque, San Salvador	37,149.99	P	37,149.99	0.00	0.00	37,149.99	0.00	0.00	0.00	37,149.99
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	37,149.99	0.00	0.00	37,149.99	0.00	0.00	0.00	37,149.99
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4971	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Guco, Chirilagua, San Miguel	35,508.00	P	35,508.00	0.00	0.00	35,508.00	0.00	0.00	0.00	35,508.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	35,508.00	0.00	0.00	35,508.00	0.00	0.00	0.00	35,508.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4847	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Ciudad Dignado, San Salvador	35,234.25	P	35,234.25	0.00	0.00	35,234.25	0.00	0.00	0.00	35,234.25
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	35,234.25	0.00	0.00	35,234.25	0.00	0.00	0.00	35,234.25
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
		Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de		P	35,000.25	0.00	0.00	35,000.25	0.00	0.00	0.00	35,000.25
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	4888	la Unidad de Salud Manuel Gallardo, Colón, La Libertad	35,000.25	D	35,000.25 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	35,000.25 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	35,000.25 0.0 %
	4846	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Villa Mariona, Cuscalancingo, San Salvador	27,770.27	P E D %	27,770.27 0.00 27,770.27 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	27,770.27 0.00 27,770.27 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	27,770.27 0.00 27,770.27 0.0 %
	4875	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután	26,864.25	P E D %	26,864.25 10,687.34 16,176.91 39.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	26,864.25 10,687.34 16,176.91 39.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	26,864.25 10,687.34 16,176.91 39.8 %
	4899	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Sabancas, Chalchuapa, Santa Ana	25,000.25	P E D %	25,000.25 0.00 25,000.25 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	25,000.25 0.00 25,000.25 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	25,000.25 0.00 25,000.25 0.0 %
	4840	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Marcos, San Salvador	24,324.56	P E D %	24,324.56 0.00 24,324.56 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	24,324.56 0.00 24,324.56 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	24,324.56 0.00 24,324.56 0.0 %
	4910	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Chinamas, Ahuachapán	22,730.56	P E D %	22,730.56 0.00 22,730.56 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	22,730.56 0.00 22,730.56 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	22,730.56 0.00 22,730.56 0.0 %
	4837	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador	19,585.79	P E D %	19,585.79 1.00 19,584.79 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	19,585.79 1.00 19,584.79 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	19,585.79 1.00 19,584.79 0.0 %
	4900	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Congo, Santa Ana	19,550.95	P E D %	19,550.95 0.00 19,550.95 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	19,550.95 0.00 19,550.95 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	19,550.95 0.00 19,550.95 0.0 %
	4909	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio Pajonal, Santa Ana	19,517.63	P E D %	19,517.63 0.00 19,517.63 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	19,517.63 0.00 19,517.63 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	19,517.63 0.00 19,517.63 0.0 %
	4854	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Guazapa, San Salvador	19,150.49	P E D %	19,158.49 0.00 19,158.49 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	19,158.49 0.00 19,158.49 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	19,158.49 0.00 19,158.49 0.0 %
	4845	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Popotlán, Apopa, San Salvador	18,881.23	P E D %	18,881.23 0.00 18,881.23 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	18,881.23 0.00 18,881.23 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	18,881.23 0.00 18,881.23 0.0 %
	4040	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador	18,695.06	P E D %	18,695.06 0.00 18,695.06 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	18,695.06 0.00 18,695.06 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	18,695.06 0.00 18,695.06 0.0 %
	4901	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Bolón Gualt, Metapán, Santa Ana	18,587.42	P E D %	18,587.42 0.00 18,587.42 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	18,587.42 0.00 18,587.42 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	18,587.42 0.00 18,587.42 0.0 %
	4914	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San	18,355.00	P E D	18,355.00 0.00 18,355.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18,355.00 0.00 18,355.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18,355.00 0.00 18,355.00

		Lorenzo, Ahuachapán		%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4915	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San José Naranjo, Jujutla, Ahuachapán	17,955.92	P	17,955.92	0.00	0.00	17,955.92	0.00	0.00	0.00	17,955.92
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	17,955.92	0.00	0.00	17,955.92	0.00	0.00	0.00	17,955.92
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4857	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador	16,479.29	P	16,479.29	0.00	0.00	16,479.29	0.00	0.00	0.00	16,479.29
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	16,479.29	0.00	0.00	16,479.29	0.00	0.00	0.00	16,479.29
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4893	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Palma, Chalatenango	16,035.95	P	16,035.95	0.00	0.00	16,035.95	0.00	0.00	0.00	16,035.95
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	16,035.95	0.00	0.00	16,035.95	0.00	0.00	0.00	16,035.95
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4869	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Comacaran, San Miguel	15,830.10	P	15,830.10	0.00	0.00	15,830.10	0.00	0.00	0.00	15,830.10
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	15,830.10	0.00	0.00	15,830.10	0.00	0.00	0.00	15,830.10
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4896	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Planos de la Laguna, Santa Ana	15,500.00	P	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4875	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Primavera, El Tránsito, San Miguel	14,628.45	P	14,628.45	0.00	0.00	14,628.45	0.00	0.00	0.00	14,628.45
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	14,628.45	0.00	0.00	14,628.45	0.00	0.00	0.00	14,628.45
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4655	Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Red de Establecimientos de Salud	12,139.58	P	12,139.58	0.00	0.00	12,139.58	0.00	0.00	0.00	12,139.58
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	12,139.58	0.00	0.00	12,139.58	0.00	0.00	0.00	12,139.58
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4041	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador	11,487.58	P	11,487.58	0.00	0.00	11,487.58	0.00	0.00	0.00	11,487.58
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	11,487.58	0.00	0.00	11,487.58	0.00	0.00	0.00	11,487.58
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4843	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilar, San Salvador	11,379.00	P	11,379.00	0.00	0.00	11,379.00	0.00	0.00	0.00	11,379.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	11,379.00	0.00	0.00	11,379.00	0.00	0.00	0.00	11,379.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4844	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador	11,346.32	P	11,346.32	0.00	0.00	11,346.32	0.00	0.00	0.00	11,346.32
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	11,346.32	0.00	0.00	11,346.32	0.00	0.00	0.00	11,346.32
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4886	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Azacualpa, Chalatenango	11,266.98	P	11,266.98	0.00	0.00	11,266.98	0.00	0.00	0.00	11,266.98
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	11,266.98	0.00	0.00	11,266.98	0.00	0.00	0.00	11,266.98
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4877	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Tránsito, Usulután	10,454.80	P	10,454.80	0.00	0.00	10,454.80	0.00	0.00	0.00	10,454.80
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	10,454.80	0.00	0.00	10,454.80	0.00	0.00	0.00	10,454.80
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4934	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz	10,282.45	P	10,282.45	0.00	0.00	10,282.45	0.00	0.00	0.00	10,282.45
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	10,282.45	0.00	0.00	10,282.45	0.00	0.00	0.00	10,282.45
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %

	4646	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador	9,721.29	P E D %	9,721.29 0.00 9,721.29 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	9,721.29 0.00 9,721.29 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	9,721.29 0.00 9,721.29 0.0 %
	4636	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Monserrat, San Salvador	9,113.54	P E D %	9,113.54 0.00 9,113.54 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	9,113.54 0.00 9,113.54 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	9,113.54 0.00 9,113.54 0.0 %
	4642	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Barrios, San Salvador	8,056.57	P E D %	8,056.57 0.00 8,056.57 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,056.57 0.00 8,056.57 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,056.57 0.00 8,056.57 0.0 %
	4660	Remodelación y equipamiento del Hospital Nacional de Chalchuapa	6,732.70	P E D %	6,732.70 6,729.83 2.87 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,732.70 6,729.83 2.87 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,732.70 6,729.83 2.87 100.0 %
	4670	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lolotique, San Miguel	2,939.58	P E D %	2,939.58 0.00 2,939.58 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,939.58 0.00 2,939.58 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,939.58 0.00 2,939.58 0.0 %
MOP			30,811,733.17	P E D %	17,293,320.08 10,684,448.06 6,608,872.02 61.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	17,293,320.08 10,684,448.06 6,608,872.02 61.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	17,293,320.08 10,684,448.06 6,608,872.02 61.8 %
	4529	Mejoramiento de Camino Rural LIB16S Tramo LIB22S - Tamaniique, La Libertad	8,176,351.50	P E D %	5,012,441.41 2,313,342.24 2,699,099.17 46.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,012,441.41 2,313,342.24 2,699,099.17 46.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,012,441.41 2,313,342.24 2,699,099.17 46.2 %
	4532	Mejoramiento de Camino Rural LIB16N: Tramo LIB22S - Chilitupan, La Libertad	8,262,138.81	P E D %	4,070,390.23 1,878,641.64 2,191,748.59 46.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,070,390.23 1,878,641.64 2,191,748.59 46.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,070,390.23 1,878,641.64 2,191,748.59 46.2 %
	4638	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AHU16S TRAMO: APANECA - QUEZALAPA - HACIA SAN PEDRO PUXTLA, APANECA, AHUACHAPAN	4,144,929.03	P E D %	0.00 1,243,478.71 -1,243,478.71 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 1,243,478.71 -1,243,478.71 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 1,243,478.71 -1,243,478.71 0.0 %
	4530	Mejoramiento de Camino Rural LIB16N Tramo LIB22S - Jayaque, La Libertad	3,874,889.87	P E D %	2,715,680.51 3,542,191.98 -826,511.45 130.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,715,680.51 3,542,191.98 -826,511.45 130.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,715,680.51 3,542,191.98 -826,511.45 130.4 %
	4531	Ampliación de un Tramo del Camino Terciano LIB05W: Tramo CA04S-LIB16S, (Desvío a Comasagua), La Libertad	2,403,282.56	P E D %	1,386,247.29 0.00 1,386,247.29 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,386,247.29 0.00 1,386,247.29 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,386,247.29 0.00 1,386,247.29 0.0 %
	3603	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAM28N, TRAMO: CHAPELTIQUE - SESORI, SAN MIGUEL	1,943,287.54	P E D %	1,943,287.54 981,509.50 961,778.04 50.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,943,287.54 981,509.50 961,778.04 50.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,943,287.54 981,509.50 961,778.04 50.5 %
	4640	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, TRAMO: COMASAGUA HACIA BELLO HORIZONTE, LA LIBERTAD	1,519,393.08	P E D %	0.00 455,817.92 -455,817.92 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 455,817.92 -455,817.92 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 455,817.92 -455,817.92 0.0 %
		CONSTRUCCIÓN DE MURO										

4624	DE RETENCIÓN EN COLONIA LAS MARGARITAS, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR	775,000.00	P E D %	581,250.00 0.00 581,250.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	581,250.00 0.00 581,250.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	581,250.00 0.00 581,250.00 0.0 %
4582	OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA COLONIA LLANO VERDE, (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO, SAN SALVADOR	422,027.91	P E D %	412,027.93 3,841.41 408,186.52 0.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	412,027.93 3,841.41 408,186.52 0.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	412,027.93 3,841.41 408,186.52 0.9 %
4559	PROYECTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A FAMILIAS EN ZONAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD NUEVO ISRAEL, SAN SALVADOR	305,839.09	P E D %	305,839.09 0.00 305,839.09 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	305,839.09 0.00 305,839.09 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	305,839.09 0.00 305,839.09 0.0 %
4841	OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE QUEBRADA LA LECHUZA, ALLEDAÑO AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SAN SALVADOR	285,936.10	P E D %	285,936.10 45,972.38 239,963.72 16.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	285,936.10 45,972.38 239,963.72 16.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	285,936.10 45,972.38 239,963.72 16.1 %
4585	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN 8a - 10a, Y CALLE PARAGUAY, SAN SALVADOR	243,055.31	P E D %	243,055.31 0.00 243,055.31 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	243,055.31 0.00 243,055.31 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	243,055.31 0.00 243,055.31 0.0 %
4535	Rehabilitación de la Carretera CHA07E-CHA09S, Tramo del Et. CHA08F-Arcatao, Chalatenango	219,652.30	P E D %	219,652.30 0.00 219,652.30 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	219,652.30 0.00 219,652.30 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	219,652.30 0.00 219,652.30 100.0 %
4583	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MITIGACIÓN CÁRCAVAS DE JARDINES DE SAN BARTOLO (1 PRINCIPAL Y 2 SECUNDARIAS) ILOPANGO, SAN SALVADOR.	63,856.81	P E D %	63,856.81 0.00 63,856.81 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	63,856.81 0.00 63,856.81 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	63,856.81 0.00 63,856.81 0.0 %
4568	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DEL CENTRO DE CONFERENCIAS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES (EX FERIA INTERNACIONAL)	48,843.02	P E D %	14,087.79 0.00 14,087.79 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	14,087.79 0.00 14,087.79 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	14,087.79 0.00 14,087.79 0.0 %
4564	CONSTRUCCIÓN DE MUROS GUARDANIVELES Y REPARACIÓN DE MURO GUARDANIVEL EN RÍO LAS CAÑAS ILOPANGO, SAN SALVADOR	48,300.02	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
4626	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DE CASA PRESIDENCIAL	34,514.65	P E D %	6,235.70 0.00 6,235.70 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,235.70 0.00 6,235.70 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,235.70 0.00 6,235.70 0.0 %
4630	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MURO DE RETENCIÓN EN URBANIZACIÓN ALTOS DEL BOULEVARD, SAN	33,332.07	P E D %	33,332.07 0.00 33,332.07 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	33,332.07 0.00 33,332.07 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	33,332.07 0.00 33,332.07 0.00 %

		SALVADOR		%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4639	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO SAV29S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE	100.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
	4642	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CON SU DESCARGA EN COLONIA EL MATAZANO, ILOPANGO, SAN SALVADOR	100.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
ANDA			18,889,446.21	P E D %	15,101,447.80 13,508,842.58 1,592,605.22 89.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	15,101,447.80 13,508,842.58 1,592,605.22 89.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	15,101,447.80 13,508,842.58 1,592,605.22 89.5 %
	4567	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN.	5,052,292.83	P E D %	3,244,377.70 3,244,377.70 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,244,377.70 3,244,377.70 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,244,377.70 3,244,377.70 0.00 100.0 %
	4620	MEJORAS EN LA LINEA DE IMPELENCIA Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.	1,899,242.35	P E D %	1,835,592.48 1,795,064.20 40,528.22 97.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,835,592.48 1,795,064.20 40,528.22 97.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,835,592.48 1,795,064.20 40,528.22 97.8 %
	4586	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	1,263,815.01	P E D %	1,049,089.58 764,221.95 284,867.63 72.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,049,089.58 764,221.95 284,867.63 72.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,049,089.58 764,221.95 284,867.63 72.8 %
	4573	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES EL PORVENIR, EL MILAGRO, VILANOVA, LAS TORRES Y LOMAS DE CANDELARIA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN.	787,524.04	P E D %	326,837.43 326,837.43 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	326,837.43 326,837.43 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	326,837.43 326,837.43 0.00 100.0 %
	4588	CAMBIO DE LINEA DE IMPELENCIA DE 6" PVC A 8" HoFo L=3,000 METROS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PAJONAL.	748,769.10	P E D %	274,940.75 274,940.75 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	274,940.75 274,940.75 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	274,940.75 274,940.75 0.00 100.0 %
	4595	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO A SISTEMA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS.	636,975.68	P E D %	386,308.76 386,308.76 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	386,308.76 386,308.76 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	386,308.76 386,308.76 0.00 100.0 %

		CUSCATLÁN										
	4597	PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN LOS AMATES DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, CHALATENANGO.	613,589.48	P E D %	613,589.48 613,589.48 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	613,589.48 613,589.48 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	613,589.48 613,589.48 0.00 100.0 %
	4594	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTON TUTULTEPEQUE EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA, SAN SALVADOR.	554,785.78	P E D %	554,785.78 554,785.78 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	554,785.78 554,785.78 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	554,785.78 554,785.78 0.00 100.0 %
	4595	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTON JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR.	521,359.71	P E D %	521,359.71 515,845.65 5,514.06 98.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	521,359.71 515,845.65 5,514.06 98.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	521,359.71 515,845.65 5,514.06 98.9 %
	4621	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután.	469,218.14	P E D %	469,218.14 458,471.20 10,746.94 97.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	469,218.14 458,471.20 10,746.94 97.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	469,218.14 458,471.20 10,746.94 97.7 %
	4611	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USulután.	434,056.75	P E D %	434,056.75 366,338.90 67,717.85 84.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	434,056.75 366,338.90 67,717.85 84.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	434,056.75 366,338.90 67,717.85 84.4 %
	4592	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUILARES.	398,720.63	P E D %	398,720.63 235,220.29 163,500.34 59.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	398,720.63 235,220.29 163,500.34 59.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	398,720.63 235,220.29 163,500.34 59.0 %
	4619	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE USulután.	357,026.38	P E D %	357,026.38 313,147.20 43,879.18 87.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	357,026.38 313,147.20 43,879.18 87.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	357,026.38 313,147.20 43,879.18 87.7 %
	4631	INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES EL SINGUIL, SANTA RITA Y EL CERRON, EL PORVENIR, SANTA ANA	350,000.00	P E D %	350,000.00 263,197.67 86,802.33 75.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	350,000.00 263,197.67 86,802.33 75.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	350,000.00 263,197.67 86,802.33 75.2 %
	4603	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN PABLO EN LA	348,592.11	P E D %	348,592.11 332,085.65 16,506.46	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	348,592.11 332,085.65 16,506.46	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	348,592.11 332,085.65 16,506.46

		CIUDAD DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL.		%	95.3 %	0.0 %	0.0 %	95.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	95.3 %
	4602	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, LA UNION.	341,846.08	P E D %	341,846.08 341,846.08 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	341,846.08 341,846.08 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	341,846.08 341,846.08 0.00 100.0 %
	4608	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, USULUTAN.	90,038.16	P E D %	90,038.16 90,038.16 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	90,038.16 90,038.16 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	90,038.16 90,038.16 0.00 100.0 %
	4574	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO GEMELO EN ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA-LA TOMA, MUNICIPIO DE QUILZALTEPEQUE.	300,000.00	P E D %	197,000.00 0.00 197,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	197,000.00 0.00 197,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	197,000.00 0.00 197,000.00 0.0 %
	4614	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE EL TRANSITO, SAN MIGUEL.	265,899.27	P E D %	265,899.27 265,899.27 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	265,899.27 265,899.27 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	265,899.27 265,899.27 0.00 100.0 %
	4601	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD HERMOSA PROVINCIA DEL MUNICIPIO DE JICALAPA, LA LIBERTAD.	292,343.59	P E D %	292,343.59 269,477.08 22,866.51 92.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	292,343.59 269,477.08 22,866.51 92.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	292,343.59 269,477.08 22,866.51 92.2 %
	4563	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M3 Y LA INSTALACION DE UN ANILLO DE DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE	286,827.56	P E D %	286,827.56 136,686.30 150,139.26 47.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	286,827.56 136,686.30 150,139.26 47.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	286,827.56 136,686.30 150,139.26 47.7 %
	4591	REHABILITACION DEL POZO NO.2 EN PLANTA DE BOMBEO EL TINTERAL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.	263,376.49	P E D %	263,376.49 263,207.27 169.22 99.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	263,376.49 263,207.27 169.22 99.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	263,376.49 263,207.27 169.22 99.9 %
	4612	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARAN, MUNICIPIO DE JUCUARAN DEPARTAMENTO DE USULUTAN.	240,165.12	P E D %	240,165.12 70,479.03 169,686.09 29.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	240,165.12 70,479.03 169,686.09 29.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	240,165.12 70,479.03 169,686.09 29.3 %
		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE		P E	240,027.88 178,804.30	0.00 0.00	0.00 0.00	240,027.88 178,804.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	240,027.88 178,804.30

4578	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE DE SANTA ANA.	240,027.88	D %	61,223.58 74.5 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	61,223.58 74.5 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	61,223.58 74.5 %
4618	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAROLINA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.	163,829.64	P E D %	163,829.64 107,827.64 56,102.00 65.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	163,829.64 107,827.64 56,102.00 65.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	163,829.64 107,827.64 56,102.00 65.8 %
4505	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS BRISAS DE CANTARRANA Y BARCELONA, UBICADAS EN CANTÓN CANTARRANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.	161,749.91	P E D %	161,320.61 161,320.61 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	161,320.61 161,320.61 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	161,320.61 161,320.61 0.00 100.0 %
4600	PERFORACION E INCORPORACION DE POZO EN LA ANTENA II DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS.	155,577.05	P E D %	123,577.05 123,577.05 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	123,577.05 123,577.05 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	123,577.05 123,577.05 0.00 100.0 %
4615	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NOR-ORIENTE DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL.	153,777.31	P E D %	153,777.31 67,757.29 86,020.02 44.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	153,777.31 67,757.29 86,020.02 44.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	153,777.31 67,757.29 86,020.02 44.1 %
4576	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA ø 10 HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCION DE SANTA ANA.	148,276.53	P E D %	44,132.50 0.00 44,132.50 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	44,132.50 0.00 44,132.50 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	44,132.50 0.00 44,132.50 0.0 %
4587	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE METAPAN.	148,076.50	P E D %	148,076.50 147,897.00 379.50 99.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	148,076.50 147,897.00 379.50 99.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	148,076.50 147,897.00 379.50 99.7 %
4596	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO EN PLANTA LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, LA PAZ.	141,883.12	P E D %	141,883.12 138,826.84 3,056.48 97.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	141,883.12 138,826.84 3,056.48 97.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	141,883.12 138,826.84 3,056.48 97.8 %
4590	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN CRISTOBAL DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.	138,643.75	P E D %	138,643.75 137,705.49 938.26 99.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	138,643.75 137,705.49 938.26 99.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	138,643.75 137,705.49 938.26 99.3 %

4016	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, ASI COMO CAMBIO DE LA LINEA DE IMPELENCIA EN EL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE, LA UNIÓN.	135,443.88	P E D %	135,443.88 94,877.19 40,566.69 70.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	135,443.88 94,877.19 40,566.69 70.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	135,443.88 94,877.19 40,566.69 70.0 %
4580	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO JARDINES DE SONSONATE.	133,403.58	P E D %	133,403.58 133,403.58 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	133,403.58 133,403.58 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	133,403.58 133,403.58 0.00 100.0 %
4575	REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIREADORES DE LA CAMARA HUMEDA DE LA ESTACION DE BOMBEO LA TOMA DE QUEZALTEPEQUE, DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE	78,518.95	P E D %	78,518.95 78,518.95 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	78,518.95 78,518.95 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	78,518.95 78,518.95 0.00 100.0 %
4583	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE.	62,456.50	P E D %	62,456.50 55,778.32 6,678.18 89.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	62,456.50 55,778.32 6,678.18 89.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	62,456.50 55,778.32 6,678.18 89.3 %
4584	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M ³ Y CERCADO PERIMETRAL EN PLANTA DE BOMBEO COLONIAS UNIDAS, MUNICIPIO DE SANTA ANA	42,366.21	P E D %	41,999.23 41,999.23 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	41,999.23 41,999.23 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	41,999.23 41,999.23 0.00 100.0 %
4604	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PASAQUINA Y FRONTERA LLAMATILLO, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.	41,489.07	P E D %	41,489.07 41,489.07 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	41,489.07 41,489.07 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	41,489.07 41,489.07 0.00 100.0 %
4581	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO BARRIO EL PILAR DE SONSONATE.	38,824.74	P E D %	38,824.74 38,824.74 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	38,824.74 38,824.74 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	38,824.74 38,824.74 0.00 100.0 %
4609	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA LLANO LOS PATOS. CAMBIO LINEA DE IMPELENCIA DE Ø 8" A Ø 10", MUNICIPIO DE CONCHAGUA, LA UNIÓN.	30,920.34	P E D %	30,920.34 30,920.34 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	30,920.34 30,920.34 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	30,920.34 30,920.34 0.00 100.0 %
4577	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE DIFERENTES DIAMETROS PARA AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCION EN EL CANTON PRIMavera E INCORPORACION DE	22,732.85	P E D %	22,732.85 22,732.33 0.52 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	22,732.85 22,732.33 0.52 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	22,732.85 22,732.33 0.52 100.0 %

		FUENTE CON EL FIN DE AUMENTAR LA COBERTURA EN LA ZONA.										
	4633	CAMBIO Y RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAÑERIAS DE AGUA POTABLE (700 MTS.) CANTON LAS MARIAS, CHINAMECA, SAN MIGUEL.	18,677.01	P E D %	18,677.00 18,677.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	18,677.00 18,677.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	18,677.00 18,677.00 0.00 100.0 %
	4605	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE USULUTÁN, MEDIANTE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN TANQUES EL NANZAL, MUNICIPIO DE USULUTÁN.	18,514.70	P E D %	18,514.70 0.00 18,514.70 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	18,514.70 0.00 18,514.70 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	18,514.70 0.00 18,514.70 0.0 %
	4607	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE OZATLÁN, USULUTÁN.	14,775.54	P E D %	14,775.54 0.00 14,775.54 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	14,775.54 0.00 14,775.54 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	14,775.54 0.00 14,775.54 0.0 %
	4579	CAMBIO Y PROFUNDIZACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CANTON EL TINTERAL, MUNICIPIO DE COATEPEQUE.	6,331.13	P E D %	6,331.13 6,037.97 293.16 95.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,331.13 6,037.97 293.16 95.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,331.13 6,037.97 293.16 95.4 %
	4606	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER, USULUTÁN.	305.37	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
	4570	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 DE CAPACIDAD, EN PLANTA EL MIRADOR, PLANES DE RENDEROS, SAN SALVADOR.	11.87	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
	4572	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE REBOMBEO, MUNICIPIO DE APOPA.	0.01	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
UES			14,579,238.55	P E D %	11,845,461.50 1,605,261.63 10,240,199.87 13.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	11,845,461.50 1,605,261.63 10,240,199.87 13.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	11,845,461.50 1,605,261.63 10,240,199.87 13.6 %
	3762	CONSTRUCCION DE BOVEDA	6,500,000.00	P E D %	4,875,000.00 0.00 4,875,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,875,000.00 0.00 4,875,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,875,000.00 0.00 4,875,000.00 0.0 %
	5025	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA JOVENES TALENTO DE LA UNIVERSIDAD DE EL	2,000,000.00	P E D %	1,550,000.00 0.00 1,550,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,550,000.00 0.00 1,550,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,550,000.00 0.00 1,550,000.00 0.0 %

		SALVADOR		%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5024	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES GENERANDO OPORTUNIDADES DE ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CON PERSPECTIVAS HACIA EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL	1,643,792.03	P E D %	1,315,014.98 482,380.49 832,634.49 38.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,315,014.98 482,380.49 832,634.49 38.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,315,014.98 482,380.49 832,634.49 38.7 %
	5013	Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias Económicas	755,571.47	P E D %	755,571.47 0.00 755,571.47 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	755,571.47 0.00 755,571.47 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	755,571.47 0.00 755,571.47 0.0 %
	5015	Construcción de Edificio para Instituto de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas	653,846.00	P E D %	488,846.00 0.00 488,846.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	488,846.00 0.00 488,846.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	488,846.00 0.00 488,846.00 0.0 %
	5016	Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias y Humanidades.	653,846.00	P E D %	488,846.00 0.00 488,846.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	488,846.00 0.00 488,846.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	488,846.00 0.00 488,846.00 0.0 %
	5012	Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente	457,702.67	P E D %	457,702.67 22,947.10 434,755.57 5.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	457,702.67 22,947.10 434,755.57 5.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	457,702.67 22,947.10 434,755.57 5.0 %
	5014	Construcción de Edificio de Usos Múltiples para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.	457,697.38	P E D %	457,697.38 0.00 457,697.38 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	457,697.38 0.00 457,697.38 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	457,697.38 0.00 457,697.38 0.0 %
	5023	Modernización de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.	269,042.23	P E D %	269,042.23 269,993.32 48.91 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	269,042.23 269,993.32 48.91 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	269,042.23 269,993.32 48.91 100.0 %
	5011	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL	251,433.78	P E D %	251,433.78 251,433.78 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	251,433.78 251,433.78 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	251,433.78 251,433.78 0.00 100.0 %
	5018	Construcción de Edificio de Posgrados en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.	238,416.01	P E D %	238,416.01 0.00 238,416.01 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	238,416.01 0.00 238,416.01 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	238,416.01 0.00 238,416.01 0.0 %
	5009	Fortalecimiento de los Laboratorios del área Básica de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	181,792.93	P E D %	181,792.93 179,106.11 2,686.82 98.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	181,792.93 179,106.11 2,686.82 98.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	181,792.93 179,106.11 2,686.82 98.5 %
	5028	Fortalecimiento de la Radio Universitaria	175,000.00	P E D %	175,000.00 174,966.00 34.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	175,000.00 174,966.00 34.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	175,000.00 174,966.00 34.00 100.0 %

5017	Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la Facultad de Medicina	117,894.22	P E D %	117,894.22 70,365.92 47,528.30 59.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	117,894.22 70,365.92 47,528.30 59.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	117,894.22 70,365.92 47,528.30 59.7 %
5019	Construcción de Muro Perimetral en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente	92,232.69	P E D %	92,232.69 48,048.59 44,184.10 52.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	92,232.69 48,048.59 44,184.10 52.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	92,232.69 48,048.59 44,184.10 52.1 %
5027	Modernización de la Administración Académica	66,737.04	P E D %	66,737.04 51,285.15 15,451.89 76.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	66,737.04 51,285.15 15,451.89 76.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	66,737.04 51,285.15 15,451.89 76.8 %
5020	Modernización de el Sistema de Energía Eléctrica en el Campus Central	44,409.40	P E D %	44,409.40 44,409.40 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	44,409.40 44,409.40 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	44,409.40 44,409.40 0.00 100.0 %
5022	Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia	20,062.62	P E D %	20,062.62 9,892.17 10,170.45 49.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	20,062.62 9,892.17 10,170.45 49.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	20,062.62 9,892.17 10,170.45 49.3 %
5021	Modernización de los Laboratorios del Departamento de Química de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente	1,724.35	P E D %	1,724.35 1,433.60 290.75 83.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,724.35 1,433.60 290.75 83.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,724.35 1,433.60 290.75 83.1 %
5010	Fortalecimiento de Infraestructura en la Facultad de Odontología	37.73	P E D %	37.73 0.00 37.73 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	37.73 0.00 37.73 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	37.73 0.00 37.73 0.0 %
MINED		5,266,020.08	P E D %	1,367,967.59 1,006,829.94 361,137.65 73.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,367,967.59 1,006,829.94 361,137.65 73.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,367,967.59 1,006,829.94 361,137.65 73.6 %
4690	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR	975,685.95	P E D %	304,000.12 0.00 304,000.12 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	304,000.12 0.00 304,000.12 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	304,000.12 0.00 304,000.12 0.0 %
4635	PROGRAMA DE REPARACIONES MENORES EN CENTROS ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	841,917.69	P E D %	841,917.69 851,917.69 -10,000.00 101.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	841,917.69 851,917.69 -10,000.00 101.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	841,917.69 851,917.69 -10,000.00 101.2 %
5755	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 18 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE	780,563.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
5759	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 10 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE USulután	527,500.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
5756	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 8 CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE	344,261.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %

		CHALATENANGO, LA LIBERTAD Y SAN SALVADOR		%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
5758		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 8 CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y SAN VICENTE	286,200.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
5761		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 5 CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE MORAZÁN Y LA UNIÓN	217,500.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
5754		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	193,200.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
5757		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCATLÁN Y CABAÑAS	179,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
5760		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL	173,900.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
5753		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN	167,800.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
4707		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO CERRO EL TORO, C/ LA TRINIDAD, SENSUNTEPQUE, CABAÑAS	160,500.00	P E D %	23,049.84 11,342.28 11,707.56 49.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	23,049.84 11,342.28 11,707.56 49.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	23,049.84 11,342.28 11,707.56 49.2 %
4725		MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR LA CARMENZA, SAN MIGUEL	146,804.00	P E D %	56,339.89 30,465.75 25,873.94 54.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	56,339.89 30,465.75 25,873.94 54.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	56,339.89 30,465.75 25,873.94 54.1 %
4938		PROGRAMA DE DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE CENTROS ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	67,740.61	P E D %	67,740.61 67,740.61 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	67,740.61 67,740.61 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	67,740.61 67,740.61 0.00 100.0 %
4721		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR EL MARQUEZADO, SANTIAGO DE MARIA, USULUTAN	30,900.00	P E D %	13,123.77 6,907.25 6,216.52 52.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	13,123.77 6,907.25 6,216.52 52.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	13,123.77 6,907.25 6,216.52 52.6 %
4723		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CHAPELTIQUE, SAN MIGUEL	29,162.39	P E D %	8,523.44 13,046.88 -5,523.44 200.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,523.44 13,046.88 -5,523.44 200.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,523.44 13,046.88 -5,523.44 200.0 %
		MEJORAMIENTO CENTRO		P	12,801.58	0.00	0.00	12,801.58	0.00	0.00	0.00	12,801.58

4716	ESCOLAR BRISAS DEL SOL, BERLIN, USulután	28,227.86	E D %	6,737.87 6,063.91 52.6 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	6,737.87 6,063.91 52.6 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	6,737.87 6,063.91 52.6 %
4701	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN CARLOS, J/ DOLORIS, D/ CABANAS	27,312.42	P E D %	20,382.72 0.00 20,382.72 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	20,382.72 0.00 20,382.72 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	20,382.72 0.00 20,382.72 0.0 %
4942	CENTRO ESCOLAR CANTON LOS CONEJOS, EL CARMEN, LA UNION	24,358.43	P E D %	5,945.75 5,945.75 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,945.75 5,945.75 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,945.75 5,945.75 0.00 100.0 %
4728	CENTRO ESCOLAR COLONIA CARRILLO, CANTON EL PAPALÓN, SAN MIGUEL	17,819.98	P E D %	4,235.90 4,235.90 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,235.90 4,235.90 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,235.90 4,235.90 0.00 100.0 %
4940	INSTITUTO NACIONAL DE SAN SIMON, MORAZAN	11,245.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
4943	CENTRO ESCOLAR BARRIO LA FATIMA, LA UNION	10,200.00	P E D %	2,548.03 2,548.03 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,548.03 2,548.03 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,548.03 2,548.03 0.00 100.0 %
4718	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL TABURETE, JIQUILISCO, USULUTAN	10,190.00	P E D %	2,542.13 2,542.13 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,542.13 2,542.13 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,542.13 2,542.13 0.00 100.0 %
4702	CENTRO ESCOLAR CASERIO CONCEPCION, CANTON LA QUESERA, ILOBASCO, CABANAS	7,013.56	P E D %	1,716.32 0.00 1,716.32 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,716.32 0.00 1,716.32 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,716.32 0.00 1,716.32 0.0 %
4666	REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON GUASCOTA, SAN LORENZO AHUACHAPAN	6,832.00	P E D %	5,100.00 3,400.00 1,700.00 66.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,100.00 3,400.00 1,700.00 66.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,100.00 3,400.00 1,700.00 66.7 %
4687	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL BARILLO, ZARAGOZA, LA LIBERTAD	0.18	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %
MAG		985,844.80	P E D %	831,798.96 374,157.24 457,841.72 45.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	831,798.96 374,157.24 457,841.72 45.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	831,798.96 374,157.24 457,841.72 45.0 %
4643	Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador	885,120.57	P E D %	751,074.73 371,147.28 379,927.47 49.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	751,074.73 371,147.28 379,927.47 49.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	751,074.73 371,147.28 379,927.47 49.4 %
4647	Obras de Control de Inundaciones en los Ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Goascorán (I fase)	70,720.38	P E D %	70,720.38 0.00 70,720.38 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	70,720.38 0.00 70,720.38 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	70,720.38 0.00 70,720.38 0.0 %
	Mantenimiento y Rehabilitación										

	4646	de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de Control de Inundaciones	10,003.87	P E D %	10,003.87 3,009.98 6,993.89 30.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	10,003.87 3,009.98 6,993.89 30.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	10,003.87 3,009.98 6,993.89 30.1 %
PEIS			114,959,959.03	P E D %	74,798,356.43 30,679,383.72 44,118,972.71 41.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	74,798,356.43 30,679,383.72 44,118,972.71 41.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	74,798,356.43 30,679,383.72 44,118,972.71 41.0 %
TOTAL GENERAL			1,246,994,261.01	P E D %	428,896,671.88 327,677,548.91 101,219,122.97 76.4 %	65,902,282.93 42,358,898.84 23,543,384.09 64.3 %	3,650,995.00 710,475.87 2,940,519.22 19.5 %	496,330,673.87 370,036,447.75 126,294,226.12 74.6 %	241,509,491.83 96,272,036.84 145,237,452.99 40.7 %	180,201,328.96 141,038,935.57 39,162,393.39 78.3 %	421,710,820.79 239,310,974.41 182,399,846.38 56.7 %	920,160,770.89 610,057,898.03 310,102,872.66 66.3 %

* Los datos relativos del mes que se informa se actualizan durante los primeros 5 días hábiles del mes posterior a este.

* P = Programado, E = Ejecutado, D = Diferencia de Ejecución

* Cifras base devengado
