


MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE INVERSION Y CREDITO PUBLICO

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011 AL MES DE DICIEMBRE

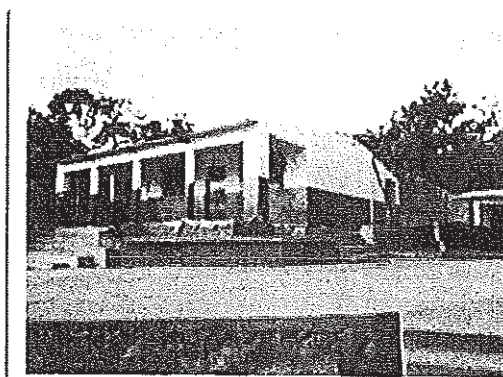

Febrero, 2012

I. RESUMEN PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

1

Para el presente ejercicio fiscal, el PAIP vigente al mes de diciembre asciende a \$1,154.9 millones, que equivale al 5.1% del PIB¹; reportando una disminución neta de \$43.7 millones, con respecto al vigente al mes de noviembre; debido a la modificación de los programas institucionales de MINSAL, MOP, ANDA, y MARN, que aumentaron y FOMILENIO, FOVIAL, CNR, VMVDU y FONAVIPO que registraron disminuciones. Dicho programa financia total o parcialmente la ejecución de 592 programas y/o proyectos.

Los \$1,154.9 millones incorporan \$598.1 millones de proyectos regulares, \$204.2 millones del FODES, \$231.9 millones de recursos del Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS), \$30.6 millones de recursos post Tormenta IDA, y \$90.1 millones de provisiones 2010 (\$57.7 millones de proyectos regulares, \$26.9 de IDA y \$5.5 del PEIS) como se muestra en el siguiente cuadro y en el que además se presenta el avance al mes de diciembre:

CUADRO No.1
PAIP 2011: CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA
(En millones de US dólares y porcentajes)

PROGRAMA / PRESUPUESTO	Programado vigente anual	Ejecutado a diciembre	% de Avance	COMPROMETIDO			% DE LO COMPROMETIDO RESPECTO A LO PROGRAMADO	NO COMPROMETIDO		
				TOTAL	EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE	PENDIENTE DE EJECUTAR		TOTAL	EN PROCESOS ADMINIST.	SIN INICIAR PROCESOS ADMINIST.
	1	2	3=(2/1)	4	5	6=4-5	7=4/1	8	9	10=8-9
PROYECTOS REGULARES	598.1	240.9	40.3%	466.2	240.9	225.3	77.9%	132.0	36.9	95.1
IDA	30.6	17.2	56.3%	24.6	17.2	7.5	80.5%	5.9	0.3	5.6
PROVISIONES	90.1	80.2	89.0%	90.1	80.2	9.8	100.0%	-	-	-
PEIS	231.9	76.4	32.9%	125.0	76.4	48.6	53.9%	106.9	6.2	100.7
Subtotal	950.7	414.7	43.6%	705.9	414.7	291.2	74.3%	244.8	43.4	201.4
FODES	204.2	204.2	100.0%	204.2	204.2	-	100.0%	-	-	-
TOTAL	1,154.9	619.0	53.6%	910.2	619.0	291.2	78.8%	244.8	43.4	201.4

PROVISIONES	Programado vigente anual	Ejecutado a diciembre	% de Avance
	1	2	3=(2/1)
PROYECTOS REGULARES	57.7	49.7	86.1%
IDA	26.9	25.6	86.1%
PEIS	5.5	5.0	86.1%
TOTAL	90.1	80.3	89.1%


A continuación se presenta un gráfico comparativo de la inversión programada/ejecutada durante el período enero – diciembre 2008 - 2011, en el cual se visualiza que el mayor monto de inversión ejecutada en dicho período es de \$619.0 millones, que corresponde al ejercicio 2011 y que es superior en \$69.7 millones al promedio de los años 2007-2011 de \$549.3 millones.

¹PIB: US\$22,442.4 millones.

2

Como se observa en el gráfico No.1, el 2011 es el año en que se ha programado el mayor monto de inversión, de los últimos 5 años.

Gráfico No.1
INVERSION PROGRAMA/EJECUTADA, PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2007 – 2011
(En millones de \$)

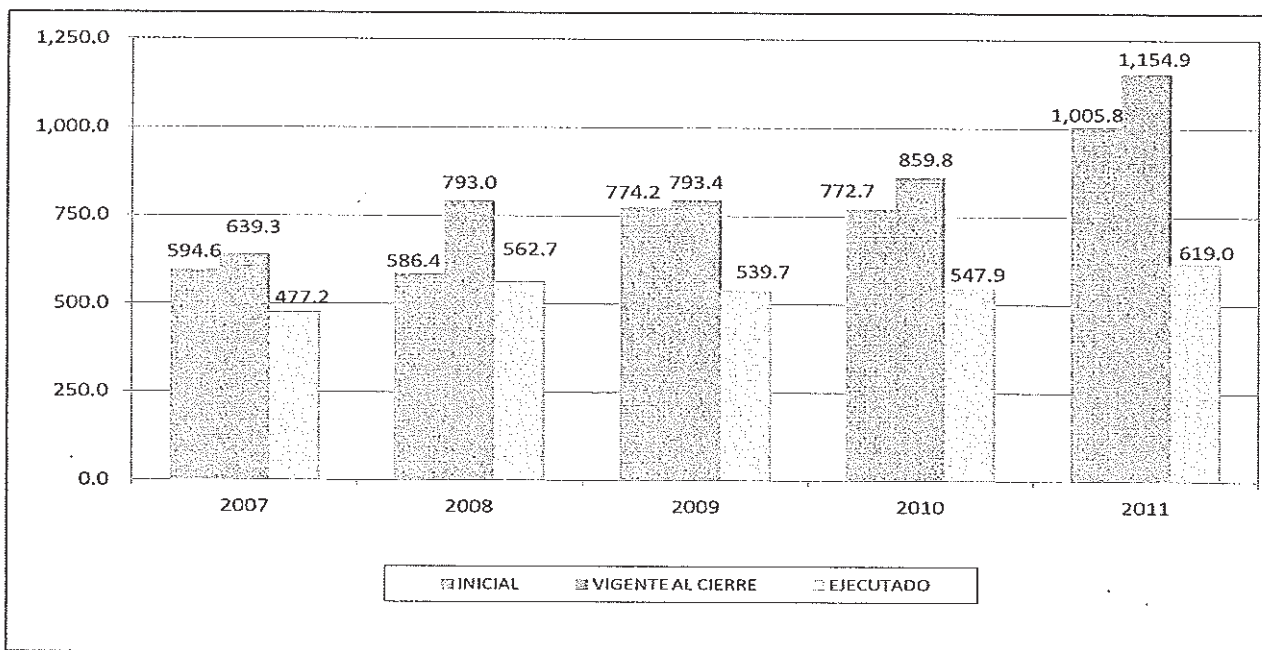

En los siguientes apartados se presenta la inversión programada/ejecutada, sin incluir la transferencia del FODES a las municipalidades, que a diciembre fue de \$204.2 millones.


II. COMPORTAMIENTO DEL PAIP 2011 SIN FODES:

Sin FODES, el PAIP vigente es de **\$950.7 millones**, que representa el 4.2% del PIB, de los cuales se ejecutaron **\$414.7 millones**, que representa el 43.6%. El monto programado al cierre y no ejecutado es de **\$536.0 millones**, de los cuales \$370.6 millones corresponden a asignaciones del Presupuesto/2011, \$9.8 millones a provisiones/2010 y \$155.5 millones a recursos del PEIS.

Del monto ejecutado de **\$414.7 millones**, \$258.1 millones (62.2%) corresponden a proyectos de la Ley de Presupuesto 2011, \$80.3 millones (19.4%) a provisiones 2010 y \$76.4 millones (18.4%) al PEIS, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico No.2
EJECUCION FINANCIERA DEL PAIP 2011 AL MES DE DICIEMBRE

3

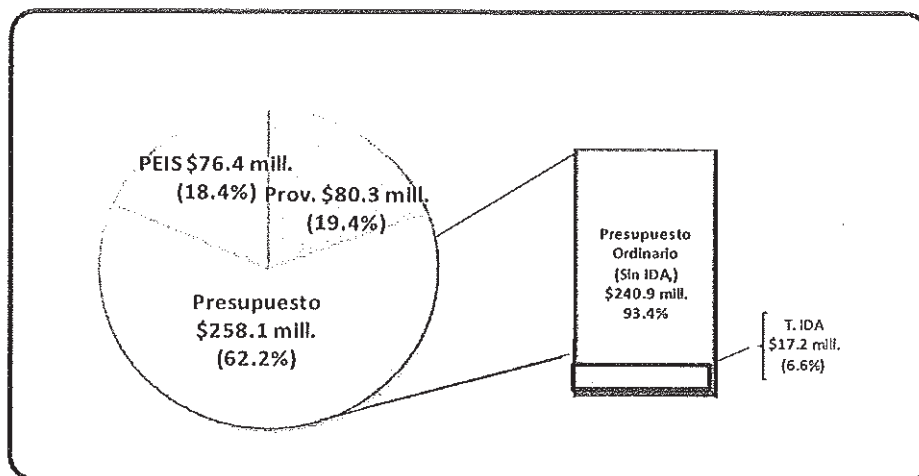


Es importante mencionar, que las provisiones ejecutadas por \$80.3 millones, incluyen \$49.7 millones de proyectos regulares, \$25.6 millones de recursos IDA y \$5.0 millones del PEIS.

El monto comprometido al mes de diciembre es de **\$705.9 millones**, que incluyen los **\$414.7 millones** ejecutados, lo que significa que existen recursos comprometidos y no ejecutados por el orden de **\$291.2 millones**.

De los recursos pendientes de comprometer al mes de diciembre por **\$244.8 millones**, de acuerdo a lo manifestado por las diferentes instituciones **\$43.4 millones** se encontraban en procesos administrativos y **\$201.4 millones** sin iniciar procesos, como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico No.3
EJECUCION FINANCIERA DEL PAIP POR PRESUPUESTO / PROGRAMA

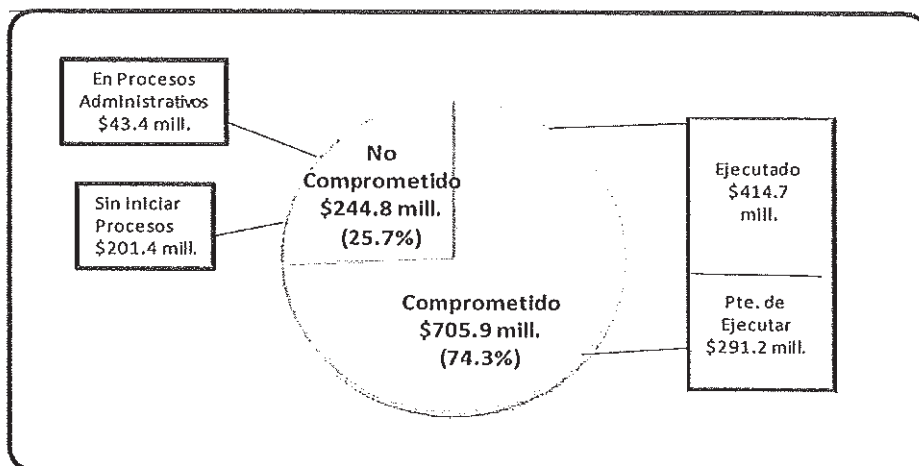

En el cuadro que a continuación se presenta, se detallan los 10 proyectos que reportan mayor monto de inversión ejecutada al mes de diciembre/11, y que concentran \$170.9 millones de

4

inversión, equivalente al 41.2% de la ejecución acumulada a dicho mes, de los cuales 3 son de FOMILENIO, 1 de MAG, 2 del FISDL, 1 de CEL, 2 de FOVIAL, y 1 de FONAVIPO.

Cuadro No.2

Proyectos con mayores montos de inversión ejecutada durante enero - diciembre 2011

INSTITUCIONES	PROYECTOS	MONTO EJECUTADO AL MES (EN MILL.\$)
FOMILENIO	Proyecto de Conectividad - Carretera Longitudinal del Norte - Sub-actividad de Construcción.	76.0
MAG	Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador.	16.8
FISDL	Programa Sistema de Protección Social Universal	14.9
FOMILENIO	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Contrapartida Conectividad.	10.7
FOMILENIO	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Agua y Saneamiento.	9.7
FISDL	Programa Promoción de la Prestación Descentralizada de Servicios.	9.5
FOVIAL	Programa de Mantenimiento Periódico, Año 2011.	9.0
CEL	Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.	8.8
FONAVIPO	Construcción de 1,068 apartamentos en proyecto habitacional Urbanización Santa Lucía, Municipio y Depto. de Santa Ana.	8.5
FOVIAL	Mejoramiento de Camino Rural USU 27E, entre Cantón La Canoa Corral de Mulas, Usulután.	7.0
TOTAL		170.9

III. AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION PUBLICA POR INSTITUCION.

Como se muestra en el siguiente cuadro, al mes de diciembre/11, las entidades que presentan mayores montos de inversión ejecutada son: FOMILENIO (\$130.4 millones), FOVIAL (\$35.7 millones), FISDL (\$35.0 millones), MAG (\$34.9 millones), MINSAL (\$31.3 millones), ANDA (\$31.1 millones), MOP (\$26.5 millones), FONAVIPO (\$25.2 millones), MINED (\$18.2 millones), MARN (\$12.5 millones) y CEL (\$10.1 millones), invirtiendo un total de \$390.9 millones, que equivale al 94.3% de los \$414.7 millones del PAIP ejecutado a diciembre 2011.

Por otra parte, las instituciones con mayor incidencia en el monto de \$536.0 millones de inversión programada al mes de diciembre y no ejecutada, son en su orden: MINSAL (\$103.1 millones), MOP (\$97.1 millones), CEL (\$91.4 millones), FISDL (\$45.6 millones), ANDA (\$33.8 millones), MINED (\$33.8 millones), FOVIAL (\$29.1 millones); UES (\$14.8 millones), CNR (\$15.5 millones), FONAVIPO (\$12.6 millones), CSJ (\$8.2 millones), y MAG (\$6.7 millones); que en su conjunto suman \$491.7 millones y comprenden el 91.7% del desfase financiero total respecto al monto programado al mes, incidiendo en términos generales en la menor ejecución de la inversión, principalmente, lo siguiente:

- Deficiente coordinación interna entre las áreas involucradas con el proceso de inversión dentro de cada institución.
- Deficiente planificación.
- Programas/proyectos incorporados al PAIP que no tienen lista la preinversión.
- Procesos de licitación declarados desierto.
- Retraso en inicio de obras por trámites de permisos de construcción, medio ambiente, entre otros.
- Las empresas no presentan cobro de estimaciones de obra o las presentan con deficiencias y tienen que ser devueltas.

A continuación se presenta por institución el avance financiero al mes de diciembre:


Cuadro No.3
EJECUCION FINANCIERA DEL PAIP 2011 AL MES DE DICIEMBRE POR INSTITUCION
(En Millones de US dólares y porcentajes)

5

INSTITUCIONES	No. PROYECTOS Y PROGRAMAS	PROGRAMADO VIGENTE ANUAL	EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE	% DE AVANCE	COMPROMISO			% DE LO COMPROMETIDO RESPECTO A LO PROGRAMADO	PENDIENTE DE COMPROMETER		
					TOTAL	EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE	PENDIENTE DE EJECUTAR		TOTAL	EN PROCESOS ADMISIVOS.	SIN INICIAR PROCESOS ADMISIVOS.
		1	3	4=3/2	5	6	7=5-6	8=5/1	9	10	11=9-10
GOBIERNO CENTRAL	358	418.00	134.69	32.2%	267.24	134.69	132.55	63.9%	150.76	35.32	115.44
MINSAL	138	134.40	31.25	23.3%	70.02	31.25	38.76	52.1%	64.38	10.88	53.50
MOP	63	123.56	26.53	21.5%	74.33	26.53	47.80	60.2%	49.24	19.60	29.64
MINED	83	52.02	18.20	35.0%	36.17	18.20	17.97	69.5%	15.84	3.94	11.91
MAG	20	41.58	34.89	83.9%	38.89	34.89	4.00	93.5%	2.69	0.07	2.62
MARN	4	17.44	12.55	71.9%	16.27	12.55	3.72	93.3%	1.18	-	1.18
CSJ	9	10.00	1.81	18.1%	4.33	1.81	2.52	43.3%	5.67	-	5.67
PNC - MJSP	1	7.91	0.16	2.0%	7.91	0.16	7.75	100.0%	-	-	-
CI - MJSP	2	7.82	0.00	0.0%	7.75	-	7.75	99.0%	0.08	-	0.08
VMVDU	2	4.08	0.02	0.4%	0.02	0.02	-	0.4%	4.06	-	4.06
MIGOB	6	2.47	1.85	75.0%	2.28	1.85	0.43	92.2%	0.19	-	0.19
ILEA	1	3.03	2.88	95.1%	2.96	2.88	0.07	97.5%	0.07	-	0.07
MIREX	3	1.98	1.98	100.0%	1.98	1.98	-	100.0%	-	-	-
SE - MJSP	2	1.91	0.78	40.9%	1.13	0.78	0.35	59.3%	0.78	0.75	0.03
MH	12	7.04	0.64	9.1%	0.84	0.64	0.20	11.9%	6.20	-	6.20
BOMBER - MIGOB	5	1.14	0.48	41.8%	0.95	0.48	0.47	83.1%	0.19	-	0.19
MTYPS	2	0.63	0.56	88.6%	0.63	0.56	0.07	99.6%	0.00	-	0.00
DGCP - MJSP	4	0.72	0.10	13.5%	0.56	0.10	0.46	77.0%	0.17	0.08	0.08
AL	1	0.25	0.00	0.0%	0.23	-	0.23	92.2%	0.02	-	0.02
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	108	189.38	80.63	42.6%	119.18	80.63	38.55	62.9%	70.21	7.22	62.99
FISDL	11	80.58	35.04	43.5%	47.76	35.04	12.72	59.3%	32.82	-	32.82
FOVIAL	46	64.81	35.66	55.0%	57.54	35.66	21.88	88.8%	7.26	-	7.26
UES	20	19.04	4.16	21.9%	7.54	4.16	3.38	39.6%	11.50	-	11.50
CNR	1	17.15	1.70	9.9%	3.21	1.70	1.51	18.7%	13.94	5.64	8.30
ISSS	9	4.19	1.37	32.7%	-	1.37	(1.37)	0.0%	4.19	1.41	2.77
CENTA	5	1.56	1.40	90.0%	1.47	1.40	0.07	94.3%	0.09	-	0.09
ISNA	4	0.44	0.02	5.0%	0.29	0.02	0.26	64.8%	0.16	-	0.16
ISRI	3	0.37	0.34	92.1%	0.37	0.34	0.03	100.0%	-	-	-
CORSATUR	4	0.31	0.31	100.0%	0.31	0.31	0.00	100.0%	-	-	-
Def. del Consum.	1	0.25	0.00	0.0%	-	-	-	0.0%	0.25	0.16	0.08
ISDEMU	3	0.15	0.08	50.9%	0.15	0.08	0.07	100.0%	0.00	-	0.00
ISTU	1	0.54	0.54	100.0%	0.54	0.54	-	100.0%	-	-	-
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	98	169.60	41.60	24.5%	151.64	41.60	110.05	89.4%	17.96	0.87	17.09
CEL	7	101.53	10.15	10.0%	94.24	10.15	84.09	92.8%	7.29	-	7.29
ANDA	84	64.86	31.05	47.9%	55.40	31.05	24.35	85.4%	9.46	-	9.46
CEPA	7	3.21	0.40	12.4%	2.00	0.40	1.61	62.4%	1.21	0.87	0.34
OTRAS	27	173.68	157.82	90.9%	167.79	157.82	9.97	96.6%	5.89	-	5.89
FOMILENIO	12	130.35	130.35	100.0%	130.35	130.35	-	100.0%	-	-	-
FONAVIPO	12	37.79	25.25	66.8%	35.17	25.25	9.93	93.1%	2.62	-	2.62
FSV	1	3.12	0.00	0.0%	-	-	-	0.0%	3.12	-	3.12
FONAES	2	2.42	2.22	91.6%	2.27	2.22	0.05	93.6%	0.16	-	0.16
TOTAL	591	950.66	414.74	43.6%	705.85	414.74	291.11	74.2%	244.81	43.41	201.41

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la inversión al mes de diciembre/2011, de las ejecutoras con montos programados en el año mayores a \$15.0 millones.

Gráfico No.4
INVERSION PROGRAMADA POR PRINCIPALES EJECUTORAS

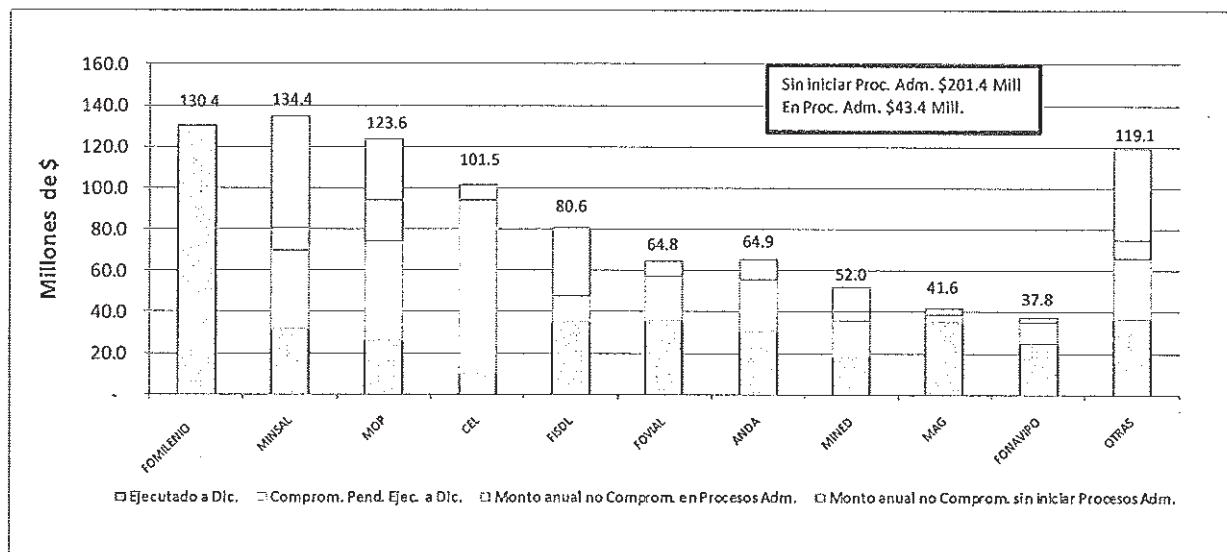

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION PUBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Clasificada por Fuentes de Financiamiento, la inversión ejecutada se ha financiado en un 36.3% con recursos de donaciones, que fundamentalmente son fondos del FOMILENIO, 25.9% de desembolsos de préstamos externos, 28.2% con recursos de fondo general y el 9.7% restante de recursos propios, como se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:


Cuadro No.4
SITUACION FINANCIERA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En millones de US dólares y porcentajes)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA VIGENTE A DICIEMBRE/11	EJECUTADO A DICIEMBRE/11	% EJECUCION A DICIEMBRE/11	% RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO	NO EJECUTADO DE LO PROGRAMADO A DICIEMBRE/11
Fondo General *	323.9	116.8	36.1	28.2	207.1
Recursos Propios	92.0	40.2	43.7	9.7	51.8
TOTAL INTERNO	415.9	157.0	37.7	37.9	258.9
Préstamos Externos**	353.4	107.3	30.4	25.9	246.1
Donaciones	181.4	150.4	82.9	36.3	31.0
TOTAL EXTERNO	534.8	257.7	48.2	62.1	277.1
TOTAL	950.7	414.7	43.6	100.0	536.0

*/ Incluye recursos del PEIS.

**/ Incluye recursos por Tormenta IDA.

Gráfico No.5
AVANCE DEL PAIP POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

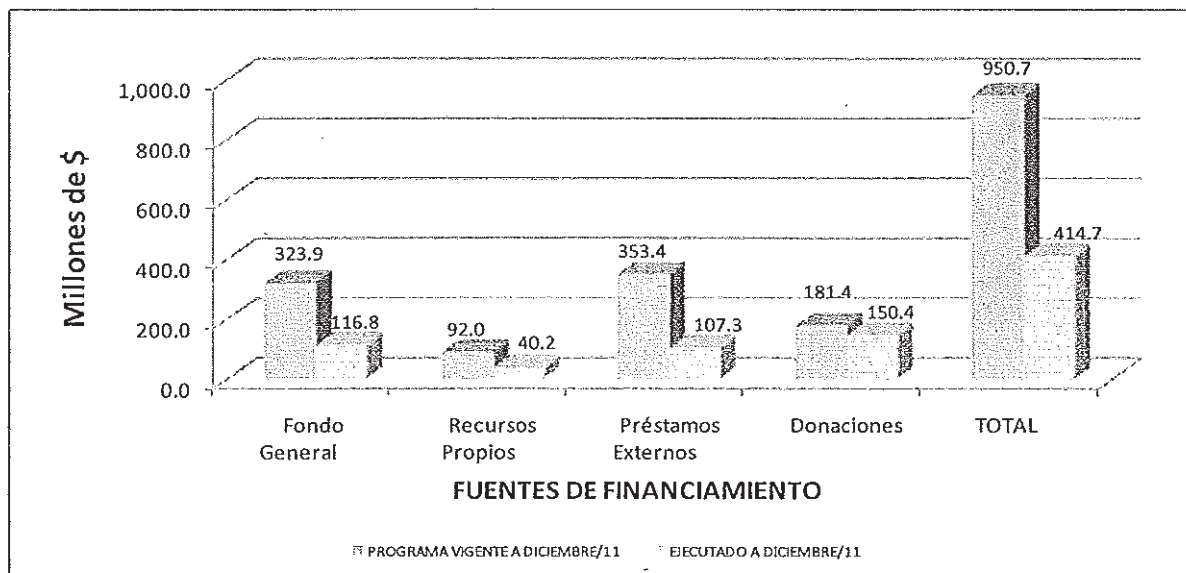


V. AVANCE DE LA INVERSION PUBLICA POR ESTRUCTURA DEL SPNF

De la inversión ejecutada al mes de diciembre, el 32.5% es inversión en proyectos ejecutados por las instituciones del Gobierno Central, 19.4% de proyectos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales, entre las cuales destaca FOVIAL y FISDL, 10.0% de inversión de las Empresas Públicas no Financieras, principalmente ANDA, y 38.1% de otras entidades, que básicamente corresponde a proyectos de FOMILENIO; siendo necesario que las diversas instituciones públicas realicen un mayor esfuerzo para elevar el nivel de ejecución de los fondos asignados y contribuir a dinamizar la economía; dado que en conjunto, el porcentaje de ejecución financiera de lo programado al mes de diciembre equivale al 43.6%.

Cuadro No.5
SITUACION FINANCIERA POR ESTRUCTURA DEL SECTOR PUBLICO
(En Millones de US dólares y porcentajes)

ESTRUCTURA	PROGRAMA VIGENTE A DICIEMBRE/11	EJECUTADO A DICIEMBRE/11	%EJECUCION A DICIEMBRE/11	% RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO	NO EJECUTADO DE LO PROGRAMADO A DICIEMBRE/11
GOBIERNO CENTRAL	418.0	134.7	32.2	32.5	283.3
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	189.4	80.6	42.6	19.4	108.8
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	169.6	41.6	24.5	10.0	128.0
OTROS	173.7	157.8	90.9	38.1	15.9
TOTAL	950.7	414.7	43.6	100.0	536.0

Gráfico No.6
AVANCE DEL PAIP POR ESTRUCTURA DEL SPNF

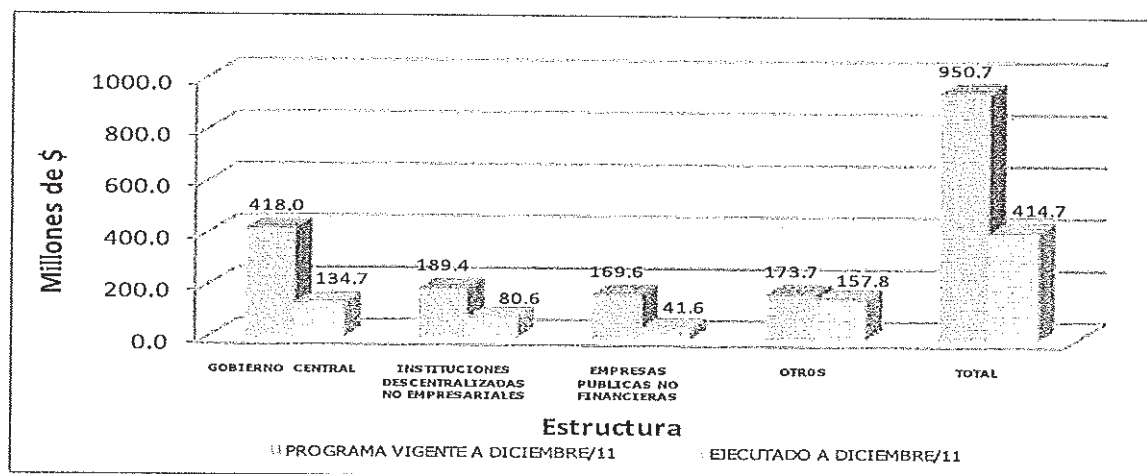


VI. AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION PUBLICA POR SECTOR DE ACTIVIDAD.

A continuación se presenta el comportamiento de la inversión ejecutada por sector de actividad, visualizándose que al sector social corresponden \$223.6 millones, seguido por el sector económico \$183.0 millones, y seguridad y justicia \$8.1 millones.

Cuadro No.6
SITUACION FINANCIERA DE LA INVERSION POR SECTOR DE ACTIVIDAD
(En millones de US dólares y porcentajes)

SECTORES	PROGRAMA VIGENTE A DICIEMBRE/11	EJECUTADO A DICIEMBRE/11	%EJECUCION A DICIEMBRE/11	%RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO	NO EJECUTADO DE LO PROGRAMADO A DICIEMBRE/11
SOCIAL	584.8	223.6	38.2	53.9	361.2
ECONOMICO	330.9	183.0	55.3	44.1	147.9
SEGURIDAD Y JUSTICIA	35.0	8.1	23.1	2.0	26.9
TOTAL	950.7	414.7	43.6	100.0	536.0


Gráfico No.7
AVANCE DEL PAIP POR SECTOR DE ACTIVIDAD

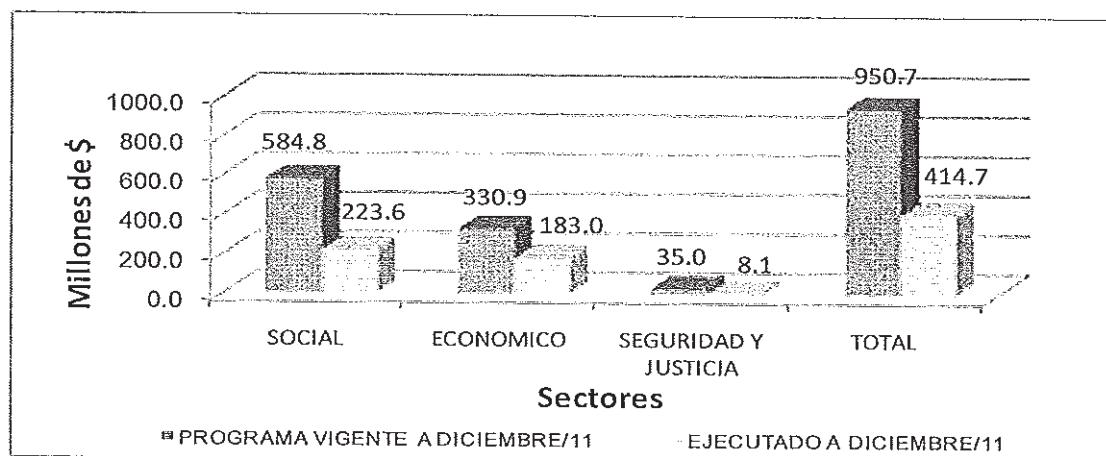

La inversión ejecutada en proyectos del sector social por valor de \$223.6 millones, se distribuyó en los siguientes subsectores: (i) Desarrollo Urbano y Comunal \$49.2 millones, (ii) Agua Potable y Alcantarillado \$40.7 millones; (iii) Multisectorial \$35.9 millones (iv) Salud \$32.9 millones; (v) Vivienda \$25.3 millones; (vi) Educación y Cultura \$24.1 millones; (vii) Medio Ambiente \$14.8 millones y (viii) Asistencia Social \$0.7 millones.


9

Gráfico No.8

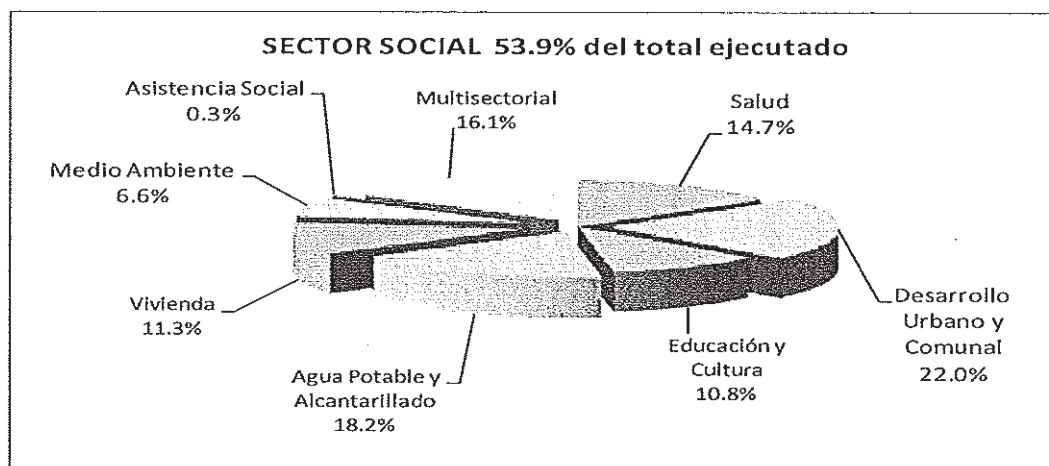


La inversión ejecutada en proyectos del sector económico por valor de \$183.0 millones, se distribuyó en los siguientes subsectores: (i) Transporte y Almacenaje \$135.1 millones, (73.8%); (ii) Silvoagropecuario \$36.5 millones, (19.9%); (iii) Energía \$10.7 millones, (5.9%); y (iv) Industria, Comercio y Turismo \$0.7 millones, (0.4%).

Gráfico No.9

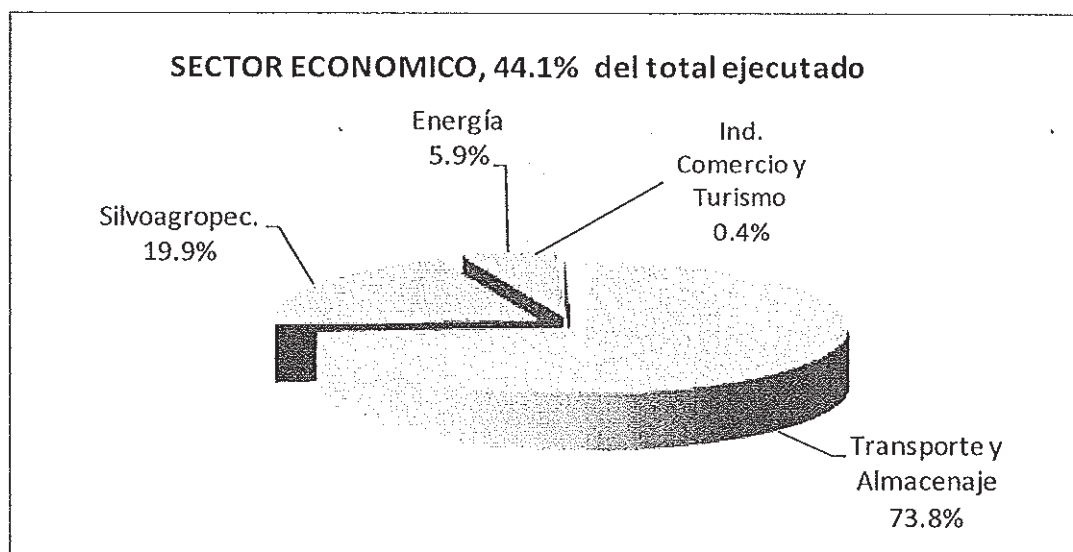

Para el Sector Seguridad Pública y Justicia la ejecución al mes de diciembre fue de \$8.1 millones, de los cuales \$6.2 millones corresponden a proyectos del área de seguridad y \$1.9 millón al área de justicia.

Gráfico No.10

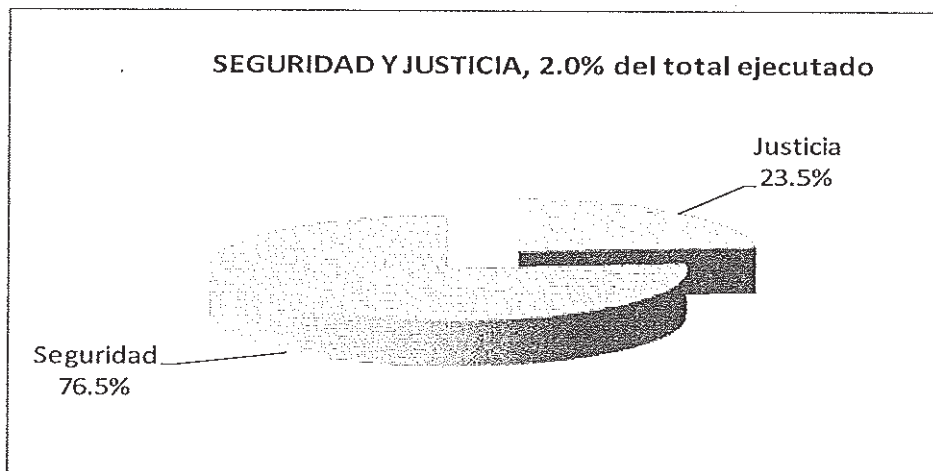

VII. AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION EJECUTADA CON RECURSOS PEIS

El PAIP 2011 vigente al mes de diciembre, contiene proyectos del MINSAL, MOP, MAG, ANDA, MINED y UES, que se financian con recursos del Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS), por un monto de \$237.4 millones, (incluyen \$5.5 millones de provisiones 2010), de los cuales se ejecutaron \$81.4 millones, representando el 34.3% de lo programado al mes.

Cuadro No.7
INVERSION FINANCIERA DE RECURSOS PEIS POR INSTITUCION
 (En millones de US dólares y porcentajes)

Instituciones	Programa vigente a diciembre/11	Ejecutado a diciembre/11	% de Ejecución a diciembre/11	No ejecutado del programado a diciembre/11
	1	2	3= (2/1)	4=(1-2)
MINSAL	82.4	13.0	15.8	69.4
MOP	51.9	14.2	27.4	37.7
MAG	29.2	29.7	101.7	-0.5
ANDA	29.9	11.1	37.1	18.8
MINED	25.0	9.2	36.8	15.8
UES	19.0	4.2	22.1	14.8
TOTAL	237.4	81.4	34.3	156.0

VIII. AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION EJECUTADA CON RECURSOS POST TORMENTA IDA

11

El PAIP 2011 vigente a diciembre, incorpora \$57.4 millones de recursos destinados a financiar proyectos por daños de la Tormenta IDA, (incluye \$26.9 millones de provisiones 2010), de los cuales se ejecutaron \$42.7 millones, equivalente al 74.4%, como se muestra a continuación:

Cuadro No.8
INVERSION FINANCIERA DE RECURSOS POST TORMENTA IDA POR INSTITUCION
(En millones de US dólares y porcentajes)



Instituciones	Programa vigente a diciembre/11	Ejecutado a diciembre/11	% de Ejecución a diciembre/11	No ejecutado del programado a diciembre/11
	1	2	3= (2/1)	4=(1-2)
MOP	9.1	6.3	69.2	2.8
MARN	8.1	7.4	91.4	0.7
FONAVIPO	5.8	3.3	56.9	2.5
FOVIAL	10.8	7.3	67.6	3.5
ANDA	5.9	5.7	96.6	0.2
MIGOB	2.5	1.9	76.0	0.6
MAG	4.6	4.4	95.7	0.2
MINSAL	5.8	3.7	63.8	2.1
VMVDU	0.02	0.02	100.0	0.00
CENTA	1.6	1.4	87.5	0.2
CEPA	1.5	0.1	6.7	1.4
MINED	1.3	1.0	76.9	0.3
BOMBER - MIGOB	0.4	0.2	50.0	0.2
TOTAL	57.4	42.7	74.4	14.7

IX. ALGUNOS PROYECTOS FINALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE/2011

A continuación se presentan algunos proyectos finalizados al mes de diciembre:

Cuadro No.9

INSTITUCION	NOMBRE DEL PROYECTO
FISDL	Programa Sistema de Protección Social Universal: 3 proyectos finalizados: "Remodelación del Centro Escolar Cantón El Zapote, San José La Unión"; "Remodelación del Centro Escolar Geremías Ventura, Yamabal, Morazán"; "Ampliación y Reparación de Unidad de Salud de San Miguel de Mercedes, Chalatenango".
FISDL	Fomento del Desarrollo Local y Gobernanza (FISDL/KFW IV): 1 proyecto finalizado: "Ampliación y Reparación Unidad de Salud Cantón Concepción, Municipio Monte San Juan, Cuscatlán".
FISDL	Programa Promoción de la Prestación Descentralizada de Servicios: 1 proyecto finalizado: "Adquisición de un Camión Compactador de 18 yardas cúbicas, para el servicio de recolección de desechos sólidos del Municipio de Usulután".
FISDL	Programa de Electrificación Rural de El Salvador; Fase IV: 2 proyectos finalizados: "Electrificación en Cantón Piedra Azul, san Rafael Oriente, San Miguel" y "Electrificación en Caserío La Presita, El Tránsito, San Miguel".

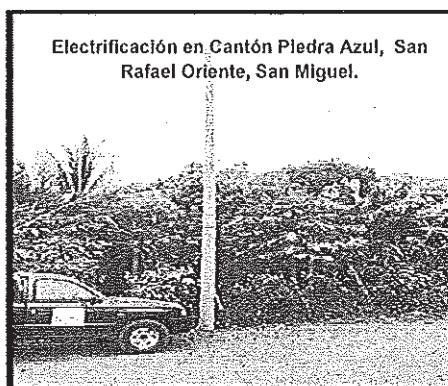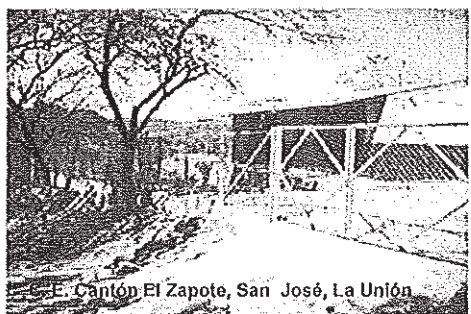

X. FACTORES QUE INCIDIERON EN EL AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION Y ALGUNOS PROYECTOS RELEVANTES POR INSTITUCION

4. MINSAL :

Factores: Procesos declarados desiertos y falta de estudios de preinversión.

Proyectos :

- **Hospital Nacional de Maternidad.** Se contrató las obras de terracería, supervisión y ejecución de Edificios de Consulta Externa, Morgue, Mantenimiento, Edificio de interconexión entre Consulta Externa y Edificio Administrativo. Y en evaluación de ofertas licitación p/construcción de Edificios de Hospitalización, Administrativo y Módulo separado de Hospitalización.
- **Programa Integrado de Salud**
 - 13 diseños de Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) finalizados
 - Contratación de la construcción de la UCSF Los Hernández, Municipio de Tejutla, Chalatenango
 - En fase final de contratación la construcción y supervisión de 7 UCSF
 - 17 obras de emergencia contratadas para la construcción y supervisión, por DT-12E
 - Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria fortalecida con 10 profesionales, para dar soporte técnico a los procesos de infraestructura del PRIDES



- Equipo, instrumental médico, mobiliario médico y de oficina, adquirido para fortalecer 42 Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF)
- Insumos y medicamentos de emergencia adquiridos para mitigar el desabastecimiento de provocado por la depresión tropical 12-E
- 310 plazas contratadas a partir de julio de 2011, para conformar a los ECOSF

13

➤ **Programa de Extensión de Cobertura en la Zona Rural (Período 2009-2011).**

- Instalación y funcionamiento de 380 Equipos Comunitarios de salud Familiar (Ecos Familiares) y 28 Ecos Especializados, para un total de 408 Ecos.
- Se cuenta con 326,921 familias adscritas a los Ecos Familiares
- Con el nuevo modelo de atención integral se han beneficiado a 1,351,796 personas en los 141 municipios intervenidos.
- Se contrataron 406 nuevos Recursos Humanos, lo que ha incrementado la fuerza laboral en salud, disminuyendo la brecha de RH en el primer nivel de atención.
- Dotación de 90 vehículos todo terreno para la movilidad de los Ecos Familiares y Especializados y 28 motocicletas.
- Se adquirió equipo médico y mobiliario para los Ecos familiares y Especializados instalados en el año 2011, 13 Ambulancias para apoyo a los Ecos Especializados en el traslado de pacientes, 15 Vehículos 4x4 para los Ecos familiares instalados en el 2011 y 8 camiones para apoyar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos de los Ecos familiares y Especializados.

➤ **Construcción y Equipamiento del Hospital Nacional de La Unión.**

Se elaboró el Diseño Final a través del FOSEP, el cual contempló la participación de especialistas en estructuras, arquitectura, electricidad, aire acondicionado, gases médicos, hidrosanitaria, señales débiles, desechos hospitalarios y energía renovable entre otros. El informe final del proyecto fue aprobado por el Comité Técnico de Seguimiento, el 23 de diciembre de 2011; el proceso de licitación está proyectado iniciar en el mes de enero de 2012.


± **MOP :**

Factores: Procesos declarados desiertos, falta de estudios de preinversión y tardía resolución de permisos ambientales. Incrementos al PAIP para tener cobertura presupuestaria para licitar

Proyectos:

- **Apertura Boulevard Diego de Holguín – Santa Tecla, Tramo II".** Se firmaron contratos de construcción el día martes 20 de diciembre. Para el Tramo II-A se contrató a la empresa DISA Constructora, S.A. de C.V. y para el tramo II-B a la empresa Inversiones OMNI, S.A. de C.V. La empresa Supervisora para ambos tramos será INSERIN S.A. de C.V. La Orden de Inicio se dio el miércoles 21 de diciembre/11.
- **Mejoramiento de Camino Rural LIB16S, Tramo LIB22S -Tamanique, La Libertad.** Se están superando observaciones en el diseño final. En trámite el análisis del Estudio de Impacto Ambiental.
- **Mejoramiento de Camino Rural, Tramo: Chapeltique - Sesori - San Miguel.** Se caducó contrato a empresa constructora. Se está revisando y liquidando para que empresa aseguradora retome el proyecto.

- **Rehabilitación de la Carretera, CHA07E- CHA09S, tramo del Et. CHA08E- Arcatao, Chalatenango.** Proyecto finalizado. En proceso de liquidación.
- **Mejoramiento de Camino Rural LIB18N: Tramo LIB22S - Chiltiupán, La Libertad.** Se están superando observaciones en el diseño final. En trámite el análisis del Estudio de Impacto Ambiental.
- **Construcción By Pass en la Ciudad de Usulután.** Se adjudicó a finales de diciembre a las empresas ECON, S.A. DE C.V. para la Construcción y a CONSULTA, S.A. DE C.V. para la Supervisión. Se contratará en enero de 2012 debido a tiempos exigidos por BCIE.
- **Programa Obras de Mitigación de Riesgo.** Se contrató a finales de diciembre el proyecto "Reparación de puentes Tule y Colima". Constructor: RODIOSWISSBORING Supervisión: INSERINS.A.de C.V.. El proyecto "Construcción de puente San Isidro", se declaró desierto.

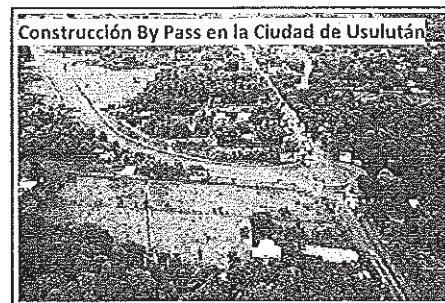


4 CEL

Factores Pago previsto para El Chaparral, no ejecutado por condiciones contractuales. Atraso en procesos de licitación.

Proyectos:

- **Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.** En el sitio de presa, continúan inactivos algunos frentes de obra, desde el 17 de junio/10, medida de seguridad adoptada por el contratista ante el incremento del caudal del río Torola. En diciembre de 2011, se continuó ejecutando trabajos en el Circuito de Generación de la margen izquierda del río. En las tuberías forzadas Nos.1 y 2, se finalizó el posicionado, alineado y soldadura en juntas de unión de las 10 virolas del tramo vertical y se realizó el posicionado y alineado de las 8 del codo superior. En el interior del pozo elíptico, finalizó construcción de losas de la estructura de casa de máquinas de la etapa I y se construyó la losa de transición de casa de máquinas con el túnel desfogue. En lo referente a la etapa II, se finalizó construcción de muros laterales de lados derecho e izquierdo hidráulico del núcleo central y muros del codo del tubo de aspiración. En el Túnel de Desfogue ha finalizando el proceso constructivo de la estructura de revestimiento del túnel. En la margen derecha, se continuaron mediciones en puntos de control topográfico y en las tuberías inclinométricas. La Supervisión del Proyecto, continuó realizando actividades de campo en frentes de obra en los que actualmente ejecuta actividades el Contratista, asimismo, continuó con revisión de documentos de diseños y procedimientos presentados por éste.

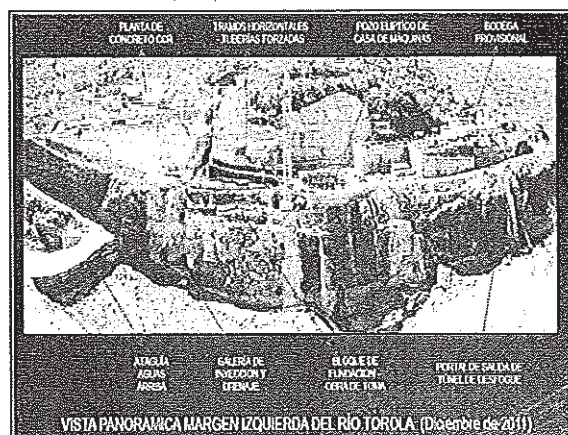

± FISDL

Factores: Procesos declarados desiertos, falta de estudios de preinversión y tardía. 15
resolución de permisos ambientales. Incrementos al PAIP para tener cobertura presupuestaria para licitar

Proyectos:

- **Programa Promoción de la Prestación Descentralizada de Servicios**". Se visaron 110 proyectos de los cuales, 8 firmaron contrato y 2 han solicitado el segundo desembolso. 83 proyectos deben iniciar o culminar el proceso de contratación del realizador, por medio de normativa Banco Mundial. Los 275 proyectos que no han sido visados, están en revisión de Carpetas Técnicas. La segunda transferencia será solicitada cuando inicie la ejecución de los proyectos, 201 municipios han presentado al menos una carpeta técnica para revisión, los municipios que aún no han presentado se encuentran en etapa de formulación. Respecto al componente 2 los segundos desembolsos se proyectan en 2012 dado que ISDEM está preparando la estrategia para ejecutar este componente. Sin embargo ya hay dos municipios que han presentado proyecto en gestión de riesgos y comenzarán con el proceso de adquisición por normativa Banco Mundial.
- **Fomento del Desarrollo Local y Gobernanza (FISDL/KFW IV)**. Se continúa gestionando la presentación de carpetas y/o perfiles con los Binomios, (Municipalidad/Comunidad), además, se encuentra en etapa de superación de observaciones a carpetas técnicas y a la formulación de las mismas.

± ANDA

Factores: Procesos de licitación declarados desiertos. Empresas no presentan estimaciones de obra

Proyecto:

- **Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, Municipio de San Martín**. El Subproyecto "Perforación de pozo profundo de producción en Oratorio de Concepción, Depto. de Cuscatlán (Etapa 1) se encuentra finalizado, la recepción final fue el 15 de julio de 2011. En el Subproyecto Perforación de Pozo Profundo Cantón Asino, Ilopango y el Subproyecto Perforación de Pozo Profundo Plantel El Coro se realizó la movilización, colocación de rótulo y perforación de pozo de producción. En el Subproyecto Construcción de Tanque, Línea de Impelencia y Línea de Distribución de Agua Potable, se realizó la instalación de 1300 mts. de tubería para los dos tramos y obras de muro de contención. El Subproyecto Mejoramiento de Estaciones de Bombeo Guluchapa, Santa Lucía y Selsut y Línea de Impelencia Guluchapa- Santa Lucía, Ilopango, se encuentra en evaluación de ofertas.

± FOVIAL

Factores: Incrementos al PAIP para tener cobertura presupuestaria para licitar.

Proyectos

- **Mejoramiento del Camino Rural USU27E, entre Cantón La Canoa – Corral de Mulas, Usulután**. Se encuentra finalizado y al mes de diciembre aún en proceso de liquidación.

✚ MINED

Factores: Procesos declarados desiertos, falta de estudios de preinversión y falta de legalización de terrenos y de solvencias municipales.

Proyectos:

➤ Programa de Fortalecimiento de la Cohesión Social en el Sector Educativo de El Salvador (PRO-EDUCA).

Avance al 31 de diciembre de 2011: 1- Consultoría para diseño de plan de estudio por competencias de carrera articulada entre el nivel educativo medio y el superior del sector agroindustria (100%). 2- Implementar clubes deportivos en centros escolares (9%). 3- Atención Psicodepagógica para estudiantes de centros escolares (30%). 4- Desarrollo de habilidades artísticas- culturales entre estudiantes de los centros escolares (30%). 5- Realizar capacitaciones y talleres que fomenten el desarrollo de habilidades para la vida entre estudiantes de centros escolares (14.5%). 6- Implementación de estaciones móviles de computadoras portátiles y conectividad en centros educativos de Educación Media (0.9%). 7- Adquisición de mobiliario, equipo y transporte vehicular para el desarrollo de actividades del programa de Pro-Educa componente 3 (67.0%). Los procesos pendientes se encuentran en contratación.



➤ Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para El Sistema Educativo en El Salvador. Los procesos de Levantamiento Topográfico y Mobiliario Escolar, se encuentran contratados. Se contrataron los procesos de Supervisión para 6 centros escolares, y la Construcción de 9 centros escolares. La ejecución física de todas las actividades se llevara cabo en el año 2012. Los 75 proyectos que serán ejecutados en 2012 continúan en diseño, con un avance del 82% aproximadamente.


✚ MAG

Factores: Atrasos en la presentación de estimaciones de obra por las empresas. Atraso en los procesos de adjudicación

Proyectos:

➤ Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador. Actividades realizadas a diciembre: Se entregaron 299,391 paquetes de insumos y fertilizantes para siembra de frijol; se construyeron 6 invernaderos para plantines y 8 bajo techo, se construyó infraestructura de apoyo a la producción: 7 macro túneles y 5 micro túneles. 355 Centros de desarrollo productivo establecidos en la cadena de granos básicos, hortalizas y frutas. 1000 Productores asistidos técnicamente para la producción de semilla y grano de maíz y frijol. 190 productores con asistencia técnica en materia de gestión y comercialización de productos agropecuarios y 857 actores de la cadena informados en el marco de plan de agricultura familiar.

➤ Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Central y Paracentral" (PRODEMOR-Central). Al mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades: 28 organizaciones de productores asistidos en aspectos

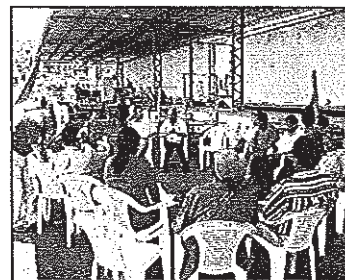

socio empresariales, producción sustentable y rehabilitación y manejo de recursos naturales. 7 proyectos productivos implementados con la participación de asociaciones de productores en el componente de desarrollo de negocios y microempresas rurales. Asistencia técnica a Organizaciones rurales para la gestión de financiamiento en el componente de servicios financieros rurales

- **Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO).** Al mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades: 585 productores capacitados en equidad de Género y autoestima. 297 productores asesorados en precios de productos agropecuarios, en principales plazas nacionales y regionales. Asistencia a 3,575 usuarios(as) provenientes de 67 organizaciones rurales en aspectos productivos y la implementación de proyectos de negocios rurales. Financiamiento para 35 proyectos de Negocios rurales y Alivio a la carga domestica de las mujeres en Organizaciones de productores. Asistencia para 599 usuarios(as) integrantes de 31 organizaciones rurales en la gestión de proyectos tendientes a la protección de los recursos naturales (suelo, agua bosque). 14 proyectos con financiamiento para Conservación de los recursos naturales y del medio ambiente a Organizaciones de productores.




✚ FONAVIPO

Factores: Descoordinación intra e interinstitucional. Falta de permisos de construcción y procesos de licitación declarados desierto.

Proyectos:

- **Construcción de 1,068 apartamentos en proyecto Habitacional Urbanización Santa Lucía, Municipio y Departamento de Santa Ana.** Las obras de urbanización están por finalizar con un avance mayor al 90.0%. De los 12 grupos en que se dividieron los 85 edificios, 2 grupos ya finalizaron (16 edificios), 5 se encuentran en ejecución con un aproximado del 60% de avance físico, 4 grupos en la etapa inicial y 1 último grupo que se ha declarado desierto en tercera ocasión.
- **Construcción de 1.373 Viviendas en Proyecto Residencial Los Almendros II Etapa, Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador.** El proyecto se divide en 4 polígonos (4, 5, 6 y 7). En los polígonos 4 y 5 se ejecutan las obras de terracería, y se espera resolver los trámites de permiso ambiental en el MARN. En los polígonos 6 y 7, las obras de urbanización están por finalizar al igual que la construcción de 491 viviendas con un avance físico aproximado del 98.0%, los restantes 5 grupos de viviendas han dado orden de inicio el presente mes y llevan un avance físico aproximado del 5.0%.
- **Construcción de 416 Apartamentos en proyecto Habitacional Urbanización Procavia, Municipio y Departamento de Santa Ana.** Las obras de urbanización presentan un avance físico del 89.3%, y adicionalmente están en ejecución obras de protección. De los 7 grupos en que se dividieron los 52 edificios, 3 ya finalizaron y los 4 restantes están

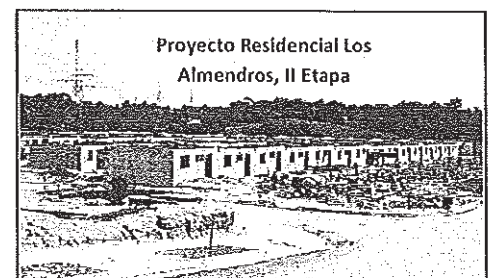

en su etapa final. Se prevé la finalización del proyecto en febrero 2012.

- **Construcción de 780 Viviendas en Proyecto Habitacional Reparto La Providencia, Municipio de Olocuilta y Cuyultitán, Departamento de La Paz.** El proyecto no tiene avance físico ya que no cuenta con el aval de parte de la Alcaldía de Cuyultitán, y por consecuencia no se pueden obtener los permisos de construcción.

✚ **MARN**

Factores: Procesos declarados desiertos por falta de oferentes debido a la especialización de los trabajos.

Proyecto:

- **Programa Nacional de Reducción de Riesgo.** Entre las actividades realizadas se encuentran: Servicio de Internet para el Centro de Monitoreo y enlace para 9 dispositivos USB inalámbricos y comunicación satelital para los Radares Meteorológicos y las Estaciones de Monitoreo de Fenómenos Naturales. Consultoría con la Universidad José Simeón Cañas (UCA) y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) ambas consultorías sobre Análisis de la Vulnerabilidad en Zonas Prioritarias en el país. Construcción de 12 Estaciones de Monitoreo Sísmicas. Adquisición de aires acondicionados para el Centro de Monitoreo de Fenómenos Naturales del MARN. Diagnóstico y Verificación de Campo de los Equipos de la Red de Estaciones de Monitoreo Hidrométricas, contratado con DESING ANALYSIS. Consultoría contratada con OSOP-Panamá sobre la Automatización de la Central Sísmica del MARN. Adquisición de 3 Radares Meteorológicos, adquiridos con la Empresa DHI, del Ducado de Dinamarca. Levantamiento de Secciones Transversales/Topográficas, con la empresa TOP COM. Servicios Profesionales contratados en las diferentes especialidades para el Programa.



✚ **PNC**

Factores: Procesos de licitación para supervisiones declarados desiertos en 2 oportunidades

Proyecto:

- **Suministro e Instalación del Sistema Integral para los Centros de Atención de Emergencias 911 y AVL/GPS de la Policía Nacional Civil de El Salvador.** En diciembre se iniciaron los trabajos en los sitios remotos ubicados en la Región Oriental: San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión, con desarrollo de las actividades siguientes: Construcción de divisiones y cielo falso, instalación de puertas y ventanas, adecuación de sanitarios, pintura general entre otras.

✚ **CENTROS INTERMEDIOS – CI-MJSP**

Factores: Proceso de licitación de supervisión declarado desierto para proyecto de la Granja

Proyectos:

- **Granja de Rehabilitación para Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil de Ilobasco, Departamento de Cabañas.** En el mes de diciembre se obtuvo la No Objeción del BCIE para publicar el proceso de licitación de la Supervisión del Proyecto y se espera apertura de ofertas para el mes de enero 2012.
- **Programa de Prevención de la Violencia y la Delincuencia".** Alcance: 8 proyectos:
Contratados: (Orden de Inicio en el mes de noviembre): "Mejoramiento de Casa Comunal y Áreas Deportivas Zacatecoluca, La Paz y "Mejoramiento de Casa Comunal y Áreas Deportivas Cuzcähapa, Chalchuapa, Sta. Ana.
Declarados Desiertos: "Mejoramiento de Casa Comunal, San Sebastián, San Vicente", "Mejoramiento de Cancha de Fútbol en Hacienda San Cayetano, Cutumay Camones, Departamento de Santa Ana".
En Contratación: "Mejoramiento de Casa Comunal, San Juan Opico, La Libertad",
En trámite de No Objeción de Carpeta Técnica: Mejoramiento de plaza de la cultura, municipio de Tonacatepeque, Depto. San Salvador, Componente proyecto "Construcción de Casa Comunal en Col. Vía Satélite, San Miguel y Construcción de Casa Comunal y Áreas Deportivas, Soyapango, San Salvador.

A continuación se presenta el detalle de los proyectos que conforman el PAIP 2011, agrupados por Institución Ejecutora.



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

20

COD.	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJECUCION FINANC.
MINSAL		138	134,397,712.58	31,252,325.14	23.3
5131	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR		21,711,238.00	417,297.62	1.9
4657	Programa de Extensión de Cobertura en la Zona Rural (período 2009-2011)		14,287,193.32	5,500,274.76	38.5
401	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION		13,788,728.10	97,578.33	0.7
4654	Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"		8,187,532.22	316,101.99	3.9
5128	Programa Integrado de Salud		8,111,365.00	1,379,139.67	17.0
4656	Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"		6,027,460.50	179,514.76	3.0
336	Rehabilitación y Equipamiento del Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca, La Paz		5,195,956.42	4,486,665.69	86.3
3235	Rehabilitación y Equipamiento Hospital Nacional San Pedro, Usulután		4,874,855.82	4,210,451.70	86.4
4653	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"		4,518,457.20	12,980.53	0.3
4661	Apoyo al Primer Nivel de Atención y Hospitales del MSPAS.		4,117,980.09	1,158,338.49	28.1
3237	Reparación Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, Departamento de San Miguel		3,438,656.16	1,330,905.16	38.7
4655	Remodelación y Equipamiento de la Tercera Planta del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales		2,901,560.00	9,605.00	0.3
4890	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La Libertad, La Libertad		1,450,179.63	353,021.15	24.3
3241	Construcción y Equipamiento Nuevo Hospital Santa Gertrudis, San Vicente		1,410,209.24	1,274,636.25	90.4
5322	Construcción de muros de contención en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos por daños ocasionados por la tormenta Tropical IDA, departamento de San Salvador		1,401,203.93	969,842.75	69.2
3276	PROGRAMA RECONSTRUCCION POR EMERGENCIA Y EXTENSION SERV. SALUD (BIRF-7084)		1,242,533.69	1,242,393.97	100.0
4658	Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Red de Establecimientos de Salud.		773,060.00	270,252.99	35.0
4836	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de Ayutuxtepeque, San Salvador		660,500.00	23,325.75	3.5
5129	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD VERAPAZ, SAN VICENTE		589,735.67	577,535.58	97.9
4853	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martín, San Salvador		568,751.45	110,231.10	19.4
4859	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Bobadilla, San Alejo, La Unión		435,000.00	11,799.75	2.7
4860	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Carmen, La Unión		435,000.00	-	-
4861	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Faro, Conchagua, La Unión		435,000.00	13,363.58	3.1
4862	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Carlos, La Unión		435,000.00	11,799.75	2.7
4866	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las Marías, Chinameca, San Miguel		435,000.00	10,104.75	2.3
4867	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Uluazapa, San Miguel		435,000.00	3,904.62	0.9
4876	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Usulután, Usulután		435,000.00	11,526.00	2.6
4891	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Matías, La Libertad		435,000.00	81,042.30	18.6
4893	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Tamanique, La Libertad		435,000.00	10,104.75	2.3
4899	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Sabanetas, Chalchuapa, Santa Ana		435,000.00	10,104.75	2.3
4902	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San José Ingenio, Metapán, Santa Ana		435,000.00	10,104.75	2.3
4909	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio Pajonal, Santa Ana		435,000.00	302,469.98	69.5



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

COD.	21 INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJCUCION FINANC.
4910	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio, San Antonio del Monte, Sonsonate		435,000.00	15,189.75	3.5
4911	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Nahuizalco, Sonsonate		435,000.00	10,867.50	2.5
4913	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Ahuachapán, Ahuachapán		435,000.00	8,070.75	1.9
4938	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guadalupe, San Vicente		435,000.00	6,452.30	1.5
4924	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán		435,000.00	15,217.50	3.5
4927	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guacotecti, Cabañas		435,000.00	10,104.75	2.3
3345	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CHALATENANGO		435,000.00	-	-
3346	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA		435,000.00	273.75	0.1
4878	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután		408,200.93	122,044.53	29.9
4915	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Jose Naranjo, Jujutla, Ahuachapán		359,730.12	264,003.02	73.4
4837	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador		353,247.93	273,738.89	77.5
4851	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Tonacatepeque, San Salvador		330,096.05	268,637.37	81.4
4660	Remodelación y equipamiento del Hospital Nacional de Chalchuapa		328,467.58	37,730.70	11.5
4857	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador		327,689.75	263,670.53	80.5
4845	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Popotlan, Apopa, San Salvador		316,815.77	279,038.93	88.1
4842	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Barrios, San Salvador		315,753.09	202,427.32	64.1
4912	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Salcoatitan, Sonsonate		310,000.01	7,062.00	2.3
4905	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana		310,000.00	106,215.11	34.3
4916	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Chinamas, Ahuachapán		310,000.00	197,367.20	63.7
4900	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Congo, Santa Ana		310,000.00	126,386.04	40.8
4901	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Belen Guijat, Metapán, Santa Ana		310,000.00	173,848.67	56.1
4895	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Palmar, Santa Ana		310,000.00	281,120.89	90.7
4897	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana		310,000.00	7,073.30	2.3
4841	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador		289,577.58	188,323.85	65.0
4838	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Monserrat, San Salvador		282,074.55	209,050.94	74.1
4922	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Jose Guayabal, Cuscatlán		275,000.00	150,577.20	54.8
4850	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador		273,073.81	30,015.36	11.0
4882	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Dorado, Chalatenango		265,500.00	7,797.00	2.9
4885	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Arracaos, Nueva Concepción, Chalatenango		265,500.00	9,765.75	3.7
4921	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Pedro Perulapán, Cuscatlán		265,500.00	5,310.00	2.0
4931	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyultitan, La Paz		265,000.00	67,664.71	25.5
5125	REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DEL HOSPITAL NACIONAL "ENF. ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO, SAN BARTOLO, ILOPANGO, SAN SALVADOR		264,107.50	198,585.99	75.2



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

22

COD.	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJECUCION FINANC.
4848	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador		258,050.20	238,800.51	92.5
4856	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador		251,769.44	48,346.84	19.2
4855	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Paisnal, San Salvador		250,500.00	21,291.75	8.5
4898	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa Ana		250,500.00	72,513.28	28.9
4896	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Planes de la Laguna, Santa Ana		250,500.00	-	-
4903	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Juan las Minas, Metapán, Santa Ana		250,500.00	63,890.39	25.5
4904	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Sebastián Salitrillo, Santa Ana		250,500.00	69,168.89	27.6
4904	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana		250,500.00	11,799.75	4.7
4888	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Manuel Gallardo, Colón, La Libertad		250,500.00	8,070.75	3.2
4889	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad		250,500.00	-	-
4917	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán		250,500.00	7,335.75	2.9
4906	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Lucía, Santa Ana		250,500.00	7,335.75	2.9
4907	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Bárbara, Santa Ana		250,500.00	-	-
4908	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás Pineda Martínez, Santa Ana		250,500.00	10,104.75	4.0
4925	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Perulapia, Cuscatlán		250,500.00	7,901.25	3.2
4847	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Ciudad Delgado, San Salvador		250,500.00	9,765.75	3.9
4840	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador		250,500.00	192,584.04	76.9
4884	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango		250,000.00	8,070.75	3.2
4938	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilopango, San Salvador		245,670.24	45,288.59	18.4
4923	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Ramón, Cuscatlán		240,000.00	128,052.12	53.4
4933	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía Orcoyo, Olaculitla, La Paz		240,000.00	7,627.50	3.2
5124	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD SAN LUIS TALPA, LA PAZ		236,659.50	158,408.45	66.9
4883	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Palma, Chalatenango		225,000.00	176,020.66	78.2
4887	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Ciudad Arce, La Libertad		225,000.00	23,268.75	10.3
4879	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud California, Usulután		222,000.00	8,070.75	3.6
4880	Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud El Espino, Jucuarán, Usulután		222,000.00	23,664.75	10.7
4868	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel		222,000.00	10,859.30	4.9
4863	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Playa, La Unión		222,000.00	-	-
4864	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Llano los Patos, Conchagua, La Unión		222,000.00	10,867.50	4.9
4877	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Triunfo, Usulután		221,842.01	55,749.02	25.1
4870	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lolotique, San Miguel		221,634.69	137,411.67	62.0



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

COD.	23 INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJCUCION FINANC.
4875	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Primavera, El Tránsito, San Miguel		221,618.32	146,509.85	66.1
4869	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Comacaran, San Miguel		221,593.94	149,053.66	67.3
4844	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador		205,167.34	110,057.40	53.6
4852	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador		198,312.57	52,927.42	26.7
4854	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Guazapa, San Salvador		196,415.26	152,861.87	77.8
4914	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Lorenzo, Ahuachapán		178,863.72	53,795.79	30.1
4839	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes, San Salvador		177,283.66	30,187.76	17.0
4919	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de El Carmen, Cuscatlán		167,000.00	7,335.75	4.4
4920	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de Concepción, Cuscatlán		167,000.00	1,093.55	0.7
4892	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad		167,000.00	5,769.39	3.5
4932	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Mercedes La Celba, La Paz		167,000.00	7,901.25	4.7
4936	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Rafael Obrajuelo, La Paz		167,000.00	2,542.50	1.5
4926	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Sensuntepeque, Cabañas		167,000.00	5,367.00	3.2
4929	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilobasco, Cabañas		167,000.00	1,093.55	0.7
4930	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Carrollna, Jutiapa, Cabañas		167,000.00	7,627.50	4.6
4849	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Marcos, San Salvador		165,109.39	112,096.87	67.9
5112	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD APOPA, SAN SALVADOR		162,975.63	69,960.88	42.9
4928	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco del Monte, Ilobasco, Cabañas		152,000.00	10,593.75	7.0
4886	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Azacualpa, Chalatenango		152,000.00	101,179.85	66.6
4843	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilares, San Salvador		150,500.00	76,186.83	50.6
4846	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Villa Mariona, Cuscatancingo, San Salvador		150,500.00	107,606.44	71.5
4659	Remodelación y equipamiento del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales		149,525.04	86,763.50	58.0
4937	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitán, San Vicente		140,000.00	8,583.79	6.1
4935	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Juan Talpa, La Paz		140,000.00	1,914.07	1.4
4881	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Cruz, Usulután		135,000.00	7,901.25	5.9
4871	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Cuco, Chirilagua, San Miguel		135,000.00	9,492.00	7.0
4872	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Milagro de la Paz, San Miguel		135,000.00	9,765.75	7.2
4873	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Silva, San Miguel		135,000.00	6,375.75	4.7
4874	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Rafael, San Miguel		135,000.00	7,620.07	5.6
4865	Ampliación , Equipamiento Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Piche, El Carmen, La Unión		135,000.00	273.75	0.2
4918	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Candelaria, Cuscatlán		112,000.00	7,335.75	6.5



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

24

COD.	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJECUCION FINANC.
4934	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz		112,000.00	35,000.18	31.3
5109	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD PANCHIMALCO, SAN SALVADOR		93,496.34	76,894.42	82.2
5106	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD CONCEPCIÓN, SAN SALVADOR		90,637.58	72,676.70	80.2
5334	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA CANOA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN		46,194.09	36,889.39	79.9
5135	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA CASA DE SALUD DE JOYA GRANDE, SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR		36,943.94	5,425.00	14.7
5335	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NUEVO AMANECER POR LA TORMENTA TROPICA IDA, USULUTÁN.		33,545.57	26,163.92	78.0
5333	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SISIGUAYO POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN		32,932.60	26,082.10	79.2
5119	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD SANTO TOMÁS, SAN SALVADOR		32,679.46	28,315.57	86.6
5331	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CORRAL DE MULAS POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN		28,311.44	26,174.19	92.5
5336	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE PUERTO PARADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN		28,149.14	28,149.14	100.0
5103	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA CASA DE SALUD BARRANCONES, PASAQUINA, LA UNIÓN		23,933.41	12,704.71	53.1
5332	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NUEVA GRANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USULUTÁN		23,406.95	17,756.20	75.9
FOMILENIO		12	130,350,193.42	130,350,193.42	100.0
40388	Proyecto de Conectividad - Carretera Longitudinal del Norte - Sub-actividad de Construcción		75,951,277.16	75,951,277.16	100.0
40394	Proyecto de Conectividad - Caminos Rurales - Sub-actividad de Contrapartida Conectividad		10,650,469.76	10,650,469.76	100.0
40372	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Agua y Saneamiento		9,646,460.67	9,646,460.67	100.0
373	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Infraestructura Comunitaria		6,319,987.13	6,319,987.13	100.0
40371	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Electrificación		6,272,891.59	6,272,891.59	100.0
40389	Proyecto de Conectividad - Carretera Longitudinal del Norte - Sub-actividad de Supervisión de Construcción		6,021,653.07	6,021,653.07	100.0
40386	Proyecto de Conectividad - Carretera Longitudinal del Norte - Sub-actividad de Adquisición de Derechos de Vía		4,873,799.23	4,873,799.23	100.0
40367	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Educación Formal		4,701,775.66	4,701,775.66	100.0
40374	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Contrapartida Desarrollo Comunitario		2,851,195.00	2,851,195.00	100.0
40368	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Educación Informal		1,257,104.06	1,257,104.06	100.0
40369	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Asistencia Técnica		1,117,938.04	1,117,938.04	100.0
40370	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Contrapartida Educacion y Capacitacion		685,642.05	685,642.05	100.0
MOP		63	123,563,125.66	26,529,116.09	21.5
3737	APERTURA BOULEVARD DIEGO DE HOLGUIN-SANTA TECLA TRAMO II		29,977,048.00	-	-
4529	Mejoramiento de Camino Rural LIB16S Tramo LIB22S - Tamanique. La Libertad		7,711,140.79	-	-
3603	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAM28N, TRAMO:CHAPELTIQUE - SESORI, SAN MIGUEL		7,547,122.72	5,475,279.41	72.5
4535	Rehabilitación de la Carretera CHA07E-CHA09S, Tramo del Et. CHA08E-Arcatao, Chalatenango		6,312,344.57	5,305,294.84	84.0
4532	Mejoramiento de Camino Rural LIB18N: Tramo LIB22S - Chiltiupan. La Libertad		6,262,138.81	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

COD.	25 INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJCUCION FINANC.
5004	CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RÍO LEMPA (KM. 75.5 LIB31N), LA LIBERTAD - CHALATENANGO		6,195,104.00	-	-
3091	CONSTRUCCION BY PASS EN LA CIUDAD DE USULUTAN		4,904,286.00	-	-
5098	PROGRAMA OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS		4,681,552.00	-	-
5652	RECONSTRUCCION DE PUENTE ATEOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN CAUCE DEL RIO TALNIQUE, RUTA CA:08W MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		4,148,987.00	-	-
4638	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AHU16S TRAMO: APANCA - QUEZALAPA - HACIA SAN PEDRO PUXTLA, APANCA, AHUACHAPAN		4,144,929.03	-	-
4530	Mejoramiento de Camlno Rural LIB19N Tramo LIB22S - Jayaque, La Libertad		3,542,191.96	-	-
3873	Mejoramiento Camino Rural CAB17N, Tramo: Entre Tejutepeque - Jutiapa. Cabañas		3,114,020.17	3,114,020.17	100.0
4179	Mejoramiento Camlno Rural PAZ10S, Tramo: CA02E - Hato de Los Reyes		2,722,372.19	2,722,372.19	100.0
5458	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO LIB22S: ET. LIB05W (DV. COMASAGUA) - DV. LIB18S (CHILTIUPAN), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		2,137,441.00	-	-
4531	Amplación de un Tramo del Camlno Terciario LIB05W: Tramo CA04S-LIB15S. (Desvío a Comasagua). La Libertad		2,132,688.14	-	-
5463	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO LIB31N, TRAMO: SAN PABLO TACACHICO - CANTON SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.		2,000,123.00	-	-
4629	CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN ARENAL MONSERRAT COLONIA MÁLAGA, 120.0 M. AGUAS ARRIBA DE LA 17a. AV. SUR. SAN SALVADOR		1,859,577.37	1,859,577.37	100.0
5008	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PUENTES TULE (KM 45.48) Y COLIMA (KM 47.45), CARRETERA TRONCAL DEL NORTE (CA:4N), MUNICIPIO DE EL PAISNAL. DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		1,768,678.00	-	-
5654	CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE EL RÍO COLON Y REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE DESDE LA INTERSEC. DE LA CARRETERA CA08W (KM. 29½) HACIA HDA. LAS SEISCIENTAS, CTÓN ENTRE RÍOS, MUNICIPIO DE COLON, DEPTO. DE LA LIBERTAD		1,738,936.00	-	-
4562	OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA COLONIA LLANO VERDE, (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO, SAN SALVADOR		1,599,729.78	955,020.92	59.7
4640	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO: COMASAGUA HACIA BELLO HORIZONTE, LA LIBERTAD		1,519,393.08	-	-
4630	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MURO DE RETENCIÓN EN URBANIZACIÓN ALTOS DEL BOULEVARD, SAN SALVADOR		1,484,444.09	1,255,297.29	84.6
4563	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MITIGACIÓN CÁRCAVAS DE JARDINES DE SAN BARTOLO (1 PRINCIPAL Y 2 SECUNDARIAS) ILOPANGO, SAN SALVADOR.		1,371,863.79	41,122.69	3.0
5378	Construcción de Bóveda y Muro de Contención del Parque Central de Soyapango, San Salvador.		1,276,100.00	322,644.38	25.3
4564	CONSTRUCCIÓN DE MUROS GUARDANIVELES Y REPARACIÓN DE MURO GUARDANIVEL EN RÍO LAS CAÑAS ILOPANGO, SAN SALVADOR		1,118,889.91	-	-
5321	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CON SU DESCARGA, OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES EN CALLE ROMÁN PEÑA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		1,098,196.33	1,026,709.50	93.5
4982	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN EN TALUD NOROESTE DEL REPARTO LAS CAÑAS, ILOPANGO, SAN SALVADOR.		828,334.68	828,334.30	100.0
4624	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN COLONIA LAS MARGARITAS, BARRIO SAN JACINTO. SAN SALVADOR		775,000.00	-	-
5511	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369		750,000.00	-	-
5400	OBRAS DE MITIGACION EN ZONA DE CARCAVA DE URBANIZACION LAS VICTORIAS, SOYAPANGO, SAN SALVADOR		742,217.00	191,450.10	25.8
4557	OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUD EN COMUNIDAD EL TRIUNFO CONCEPCIÓN DE ATACO, AHUACHAPÁN		720,672.70	-	-
5467	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE OBRAS PARA PUENTE TEMPORAL SOBRE RIO TITIHUAPA, RUTA "SAV25N, TRAMO: SAN IDELFONSO- L.D. CABAÑAS", MUNICIPIO DE SAN IDELFONSO, DPTOS DE SAN VICENTE/ CABAÑAS		700,000.00	697,757.86	99.7
5314	PROGRAMA DE REHABILITACION DE RIOS Y QUEBRADAS A NIVEL NACIONAL, AFECTADOS POR LA TORMENTA IDA.		668,469.09	668,469.08	100.0



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2011, EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DÓLARES)**

26

COD.	INSTITUCIÓN / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJECUCIÓN FINANC.
5411	Mejoramiento Camino Vecinal, Tramo: La Laguna-Canton Cuevitas ET-CHA13N (Dulce Nombre de María-San Fernando) Departamento de Chalatenango.		663,500.00	-	-
4558	MUROS DE CONTENCIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD EL TRIUNFO SAN JULIAN, SONSONATE		580,000.00	-	-
5404	Mejoramiento de Caminos Rurales en los Municipios de Santa Elena, Jucuaran, Concepción Batres y San Buenaventura, Departamento de Huehuetenango.		460,000.00	-	-
3918	DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES		323,768.23	323,768.23	100.0
5347	Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Cárcava de Reparto Las Jacarandas, Apopa, San Salvador.		321,075.00	321,075.00	100.0
5345	Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Reparto El Carmen, Soyapango, San Salvador		311,197.00	251,839.24	80.9
4559	PROYECTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A FAMILIAS EN ZONAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD NUEVO ISRAEL, SAN SALVADOR		305,839.09	-	-
5339	Construcción de Obras de Mitigación y Reconstrucción de Disipadores en Puente de la Avenida Chaparrastique, sobre Arenal, Seco, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador		285,192.59	285,192.59	100.0
5327	Construcción e Instalación de Obras para Puente Temporal sobre río Huiza en Cantón Melara, Municipio y departamento de La Libertad		261,757.46	260,284.32	99.4
5409	Pavimentación de Calles en el Municipio y Departamento de Santa Ana.		250,000.00	-	-
5410	Mejoramiento de Calles entre la 11 Calle Oriente y Calle a San Jorge, Municipio de San Rafael, Departamento de San Miguel		250,000.00	-	-
4565	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN 8a - 10a. Y CALLE PARAGUAY, SAN SALVADOR		243,055.31	-	-
5337	Construcción de Obras para Mitigación en Quebrada Arenal Tutunichapa, Colonia Santa Eugenia, Barrio La Esperanza, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador		200,000.00	60,000.00	30.0
5330	Construcción de Obras de Mitigación en Urbanización La Campiña 2000, Municipio de Cuscatancingo, San Salvador		187,378.00	56,213.40	30.0
4641	OBRAS DE MITIGACION EN ZONA DE QUEBRADA LA LECHUZA, ALEDAÑO AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SAN SALVADOR		175,936.10	-	-
4626	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DE CASA PRESIDENCIAL		167,903.65	120,920.51	72.0
5412	Mejoramiento del camino que conduce al Caserío Los Pérez del Ctn. Texlpulco, Camino Vecinal Caserío Los Martínez del mismo Ctn, y al Camino Vecinal La Joya del Ctn. La Concepción, todos Jurisdicción de San Pedro Puxtla del Dpto. de Ahuachapán		150,000.00	-	-
5226	REHABILITACION DEL CANAL DE DESAGÜE DEL LAGO DE ILOPANGO A CONSECUENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL IDA		145,222.51	94,510.43	65.1
5320	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN AGUAS ABAJO DEL PUENTE No. 2, ARENAL SECO, NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		137,915.00	41,374.50	30.0
5653	RECONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES S/ RIO COPAPAYO, RUTA CA:08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD - DVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.		132,577.00	-	-
4423	Ampliación de la carretera CA04S, Tramo I: entre Km. 12.66 (Las Piletas) - Km. 22.36 (Salida Sur de Zaragoza), Departamento de La Libertad.		108,647.90	108,647.90	100.0
5413	Mejoramiento Calles en la Colonia San Joaquín, Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador.		100,000.00	20,711.15	20.7
3973	Ampliación de Intercambiador en Autopista a Comalapa (RN05)- Carretera a Los Planes de Renderos (RN06), San Salvador.		59,183.60	59,183.60	100.0
5407	Reparación de Calles en el Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador		53,000.00	-	-
4566	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DEL CENTRO DE CONFERENCIAS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES (EX FERIA INTERNACIONAL)		48,843.02	-	-
4956	Construcción Sistema de Drenaje Aguas Lluvias y Colector de Descarga MEGATEC, La Unión.		45,074.00	43,876.67	97.3
3180	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 1556		21,869.00	18,168.45	83.1
5406	Mejoramiento de calles en Colonia Concepción, en el Municipio y Departamento de San Vicente.		20,000.00	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

COD.	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJCUCION FINANC.
27					
4642	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CON SU DESCARGA EN COLONIA EL MATAZANO, ILOPANGO, SAN SALVADOR		100.00	-	-
4639	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO SAV29S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE		100.00	-	-
CEL		7	101,526,330.00	10,147,349.71	10.0
3119	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL		98,102,480.00	8,755,584.87	8.9
622	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON		1,306,515.00	48,514.44	3.7
3684	Suministro e instalación de una micro unidad generadora en la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.		1,099,085.00	1,016,024.80	92.4
5504	Suministro e instalación de tres generadores fotovoltaicos con una capacidad total de aproximadamente 540 kw, con conexión a la red en las Centrales Hidroeléctricas Cerrón Grande y 15 de Septiembre.		548,995.00	-	-
4400	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.		370,370.00	318,750.60	86.1
373	3A. UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CERRON GRANDE (MUNICIPIO DE JUTIAPA)		90,410.00	-	-
3759	Diseño y Ejecución de Proyecto Solar		8,475.00	8,475.00	100.0
FISDL		11	80,581,201.22	35,035,927.10	43.5
5384	PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS		32,750,000.00	9,498,623.07	29.0
4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL		22,945,434.23	14,852,078.52	64.7
4460	FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNANZA (FISDL / KFW IV)		9,938,135.00	2,897,519.15	29.2
4996	PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FISDL V)		7,124,500.00	4,804,691.84	67.4
4184	PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA DE EL SALVADOR (PAPES)		3,880,255.00	773,633.58	19.9
4472	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV		1,616,720.00	569,757.76	35.2
5045	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES DE SALUD EN COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES		1,151,156.99	698,061.49	60.6
5648	Rehabilitación de Infraestructura Básica en Municipios Afectados por la Depresión Tropical 12 E		1,000,000.00	866,561.69	86.7
2660	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL.		100,000.00	-	-
5038	Construcción de Casa Comunal Colonia Buen Pastor del Cantó El Pedregal, Municipio de Chllanga, Departamento de Morazán		50,000.00	50,000.00	100.0
5035	Construcción de Cerca Perimetral y Engramado de Cancha de Fútbol, Cantón El Gavilán, Municipio El Carmen, Departamento de La Unión		25,000.00	25,000.00	100.0
ANDA		84	64,862,719.20	31,051,119.48	47.9
5134	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.		18,706,662.00	7,411,950.16	39.6
4567	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN.		5,311,628.95	2,067,251.25	38.9
4620	MEJORAS EN LA LINEA DE IMPELENCIA Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LA UNION.		2,000,000.00	-	-
4604	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PASAQUINA Y FRONTERA EL AMATILLO, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.		1,777,507.01	1,776,296.54	99.9
4578	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE DE SANTA ANA.		1,700,000.00	889,924.13	52.3
4602	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, LA UNION.		1,560,615.73	1,541,591.05	98.8
4568	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTE CAITES DEL DIABLO, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DELGADO.		1,400,000.00	99,840.00	7.1
5514	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PASO PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN LOS RIOS PASAQUINA, SANTA ROSA, SIRAMA Y AGUA SALADA, MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE LIMA Y PASAQUINA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.		1,356,101.00	188,380.65	13.9
4603	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN PABLO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL.		1,349,965.24	1,126,492.61	83.4



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

28

COD.	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJECUCION FINANC.
5497	INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL CANTÓN LA LAGUNETA, SANTIAGO DE CHILE, SAN JUAN NONUALCO, LA PAZ.		1,283,437.00	275,379.57	21.5
5380	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.		1,200,184.00	1,200,184.00	100.0
5388	INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL CANTÓN FLOR AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.		1,114,855.00	1,114,855.00	100.0
5259	RECONSTRUCCION DE PUENTES PARA TUBERIA DE HFD DE Ø16", 14" Y 10" QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE A URBANIZACION POPOTLAN, NUEVO APOPA Y VALLE DEL SOL, APOPA, SAN SALVADOR.		1,077,085.96	1,077,085.96	100.0
5257	REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO GULUCHAPA Y JOYA GRANDE, Y OBRAS DE PROTECCION EN BOCATOMA RIO CUAYA Y LINEA DE IMPELENCIA A PLANTA EL CAFETAL, ILOPANGO, SAN SALVADOR.		1,059,769.74	1,059,769.74	100.0
539	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTE LA CHACRA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO.		1,000,000.00	74,925.00	7.5
4595	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTON JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR.		985,990.15	342,309.86	34.7
5392	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN REPRESA CHILAMA DEL PUERTO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.		984,445.16	934,210.46	94.9
5499	INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A CANTÓN LOS MORANES, NEJAPA, SAN SALVADOR.		944,250.00	-	-
4576	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA Ø 10 HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCION DE SANTA ANA.		903,614.61	859,482.11	95.1
4586	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		800,000.00	135,361.22	16.9
4597	PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN LOS AMATES DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, CHALATENANGO.		741,000.00	-	-
4621	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután.		700,000.00	123,168.26	17.6
5249	RECONSTRUCCION Y HABILITACION DE PLANTA DE BOMBEO CACAHUATAL, SAN RAMON, CUSCATLAN.		699,656.00	683,802.94	97.7
4609	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA LLANO LOS PATOS, CAMBIO LINEA DE IMPELENCIA DE Ø 8" A Ø 10", MUNICIPIO DE CONCHAGUA, LA UNIÓN.		643,393.41	621,553.29	96.6
4585	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS BRISAS DE CANTARRANA Y BARCELONA, UBICADAS EN CANTÓN CANTARRANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.		600,000.00	595,454.96	99.2
5267	RECONSTRUCCION DE VIGA CANAL PARA TUBERIA DE 60" DE AGUAS NEGRAS Y TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 24", BARRIO LA VEGA, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.		582,751.95	582,751.95	100.0
5258	REUBICACION DE TUBERIA DE IMPELENCIA Y DISTRIBUCION EN RIO ACAHUAPA, SAN VICENTE, SAN VICENTE.		567,154.22	567,154.22	100.0
4592	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUILARES.		500,250.00	145,127.98	29.0
4594	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTON TUTULTEPEQUE EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA, SAN SALVADOR.		495,000.00	88,257.70	17.8
4593	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE.		443,097.00	412,901.18	93.2
5253	RECONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUA POTABLE CHALAPAN, SAN PEDRO PERULAPAN, CUSCATLAN.		418,528.00	404,835.38	96.7
4619	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE USulután.		400,000.00	-	-
4589	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO EN PLANTA EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA.		400,000.00	-	-
764	PROGR. DE REFORMA DEL SECTOR RECURSOS HIDRICOS Y SUBSECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FASE1 BID/1102		389,992.94	342,540.31	87.8
4577	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE DIFERENTES DIAMETROS PARA AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCION EN EL CANTON PRIMAVERA E INCORPORACION DE FUENTE CON EL FIN DE AUMENTAR LA COBERTURA EN LA ZONA.		385,442.44	366,241.57	95.0



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

COD.	29 INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJECUCION FINANC.
4598	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO A SISTEMA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS, CUSCATLÁN.		383,182.00	-	-
4573	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES EL PORVENIR, EL MILAGRO, VILANOVA, LAS TORRES Y LOMAS DE CANDELARIA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN.		380,000.00	87,091.80	22.9
4601	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD HERMOSA PROVINCIA DEL MUNICIPIO DE JICALAPA, LA LIBERTAD.		375,500.00	-	-
4613	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA ALTA Y MEDIA PONIENTE DE SAN MIGUEL		375,000.00	-	-
4632	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO A SISTEMA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VICTORIA, CANTON SANTA MARTA, CABAÑAS		365,000.00	-	-
4611	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USulután.		350,000.00	150,943.05	43.1
4583	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M3 Y LA INSTALACION DE UN ANILLO DE DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE		350,000.00	60,672.44	17.3
5381	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES LAS BRISAS I, II, III, Y COLONIA CARRILLO, CANTON LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.		336,469.00	336,469.00	100.0
4587	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE METAPAN.		325,000.00	86,614.84	26.7
5248	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN POZO DE RESIDENCIAL LIBERTAD, TONACATEPEQUE, SAN SALVADOR.		324,052.00	320,192.41	98.8
4581	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO BARRIO EL PILAR DE SONSONATE.		311,350.07	295,202.73	94.8
4588	CAMBIO DE LINEA DE IMPELENCIA DE ø6" PVC A ø8" HoFo L=3,000 METROS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PAJONAL.		300,000.00	89,924.63	30.0
4618	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAROLINA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.		300,000.00	-	-
4614	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE EL TRANSITO, SAN MIGUEL.		300,000.00	21,824.72	7.3
4596	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO EN PLANTA LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, LA PAZ.		281,367.71	161,526.12	57.4
4610	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JIQUILISCO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, USULUTÁN.		264,351.90	145,713.60	55.1
4607	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE OZATLÁN, USULUTÁN.		260,000.00	153,989.00	59.2
4584	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M³ Y CERCADO PERIMETRAL EN PLANTA DE BOMBEO COLONIAS UNIDAS, MUNICIPIO DE SANTA ANA		260,000.00	209,611.56	80.6
4574	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO GEMELO EN ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA-LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE.		260,000.00	-	-
4580	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO JARDINES DE SONSONATE.		257,593.04	155,560.59	60.4
4631	INTRODUCCIÓN Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES EL SINGUIL, SANTA RITA Y EL CERRON, EL PORVENIR, SANTA ANA		250,000.00	-	-
5643	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PARA URBANIZACIÓN LAS VICTORIAS Y COMUNIDAD CASTILLA DE LA MANCHA, JURISDICCIÓN DE APOPA, SAN SALVADOR.		250,000.00	-	-
5261	RECONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS CHILAMA, LA LIBERTAD, LA LIBERTAD.		235,600.14	235,600.14	100.0
5260	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN ACCESO A ESTACION DE BOMBEO R-1, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.		210,322.72	210,322.72	100.0
4605	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE USULUTÁN, MEDIANTE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN TANQUES EL NANZAL, MUNICIPIO DE USULUTAN.		200,000.00	166,410.62	83.2
4606	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER, USULUTÁN.		200,000.00	153,204.12	76.6



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)

30

COD.	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJECUCION FINANC.
4615	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NOR- ORIENTE DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL		200,000.00	-	-
4612	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARAN, MUNICIPIO DE JUCUARAN DEPARTAMENTO DE USulután.		200,000.00	-	-
4590	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN CRISTOBAL DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA. DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		200,000.00	36,528.67	18.3
4591	REHABILITACION DEL POZO NO.2 EN PLANTA DE BOMBEO EL TINTERAL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.		200,000.00	17,660.00	8.8
4571	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 22 DE ABRIL E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MUNICIPIO DE SOYAPANGO		200,000.00	-	-
4579	CAMBIO Y PROFUNDIZACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CANTON EL TINTERAL, MUNICIPIO DE COATEPEQUE.		200,000.00	119,017.76	59.5
50	RECONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUA POTABLE POZO APULO, ILOPANGO, SAN SALVADOR.		188,536.00	125,876.18	66.8
4600	PERFORACION E INCORPORACION DE POZO EN LA ANTENA II DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS.		175,000.00	45,793.62	26.2
5266	RECONSTRUCCION DE VIGA CANAL PARA TUBERIA DE 60" DE AGUAS NEGRAS, BARRIO LA VEGA, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.		172,514.00	149,138.37	86.5
4572	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE REBOMBEO, MUNICIPIO DE APOPA.		150,000.00	117,022.22	78.0
4570	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 DE CAPACIDAD, EN PLANTA EL MIRADOR, PLANES DE RENDEROS, SAN SALVADOR.		150,000.00	94,219.27	62.8
4616	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, ASI COMO CAMBIO DE LA LINEA DE IMPELENCIA EN EL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE, LA UNIÓN.		150,000.00	22,032.76	14.7
4575	REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIREADORES DE LA CAMARA HUMEDA DE LA ESTACION DE BOMBEO LA TOMA DE QUEZALTEPEQUE, DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE		100,000.00	22,538.98	22.5
4608	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, USULUTÁN.		97,682.45	7,644.29	7.8
4617	MEJORAMIENTO DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, LA UNIÓN.		75,000.00	-	-
5329	CAMBIO DE DIRECCIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS EN CALLE FRANCISCO MENENDEZ, BARRIO SANTA ANITA, SAN SALVADOR.		46,454.00	-	-
54	RECONSTRUCCION DE LINEA DE IMPELENCIA Y PLANTA DE AGUA POTABLE, EL POTRERITO, TEPETITAN, SAN VICENTE.		46,259.00	46,259.00	100.0
5251	RECONSTRUCCION DE LINEA DE IMPELENCIA Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PLANTA CHILAMA, LA LIBERTAD, LA LIBERTAD.		40,654.00	36,382.32	89.5
4633	CAMBIO Y RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAÑERIAS DE AGUA POTABLE (700 MTS.) CANTON LAS MARIAS, CHINAMECA, SAN MIGUEL		25,000.00	24,390.30	97.6
5252	RECONSTRUCCION DE LINEA DE IMPELENCIA DE AGUA POTABLE, SAN SEBASTIAN, SAN VICENTE.		24,195.00	19,584.92	80.9
5247	REUBICACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE PROTECCION , ILOPANGO, SAN SALVADOR.		20,020.00	2,839.02	14.2
5255	RECONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUA POTABLE LA ESPERANZA, OLOCUILTA, LA PAZ.		13,926.32	13,926.32	100.0
5264	RECONSTRUCCION DE POZO DE VISITA, TUBERIA DE 8" DE AGUAS NEGRAS Y MURO DE PROTECCION, EN URBANIZACION CASA CAMPO, CUSCATANCINGO, SAN SALVADOR.		312.34	312.34	100.0
FOVIAL		46	64,805,571.66	35,663,329.02	55.0
4783	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2011		22,472,315.91	9,028,819.97	40.2
4788	Mejoramiento del Camino Rural USU27E, entre Cantón La Canoa (Et. USU08S) - Corral de Mulas, Usulután		9,245,821.95	6,966,123.89	75.3
4782	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2010		6,570,267.21	5,379,670.55	81.9
4773	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2011		4,819,252.22	3,488,446.46	72.4
4778	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2011		2,723,025.00	260,997.58	9.6
4771	Mejoramiento Camino Rural AHU24S/AHU25S, Entre: Km. 151 Carretera El Litoral (CA02W) - Garita Palmera. Ahuachapán.		2,548,709.35	626,604.39	24.6

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

COD.	31 INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJCUCION FINANC.
4490	Mejoramiento del Camino Rural UNI16S: Tramo entre Bolivar-San Jose La Fuente, La Union		1,663,174.93	1,587,675.54	95.5
5235	REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO ACAHUAPA, AGUAS ARRIBA, EN LA RUTA RN04E, SAN VICENTE		1,648,360.59	1,524,733.52	92.5
5405	Reparación de Calle entre Urbanización Plan del Pino Municipio de Soyapango y Municipio de Ciudad Delgado, Depto de San Salvador.		1,000,000.00	-	-
4794	Mejoramiento Camino Rural UNI22N, Tramo Nueva Esparta - Polorós, La Unión		866,029.42	2,533.89	0.3
5521	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN LA ZONA DEL PUENTE SOBRE EL RIO EL DESAGUE, EST. 31+720 DE LA CARRETERA RN03E, CANDELARIA, CUSCATLAN		802,526.82	13,763.40	1.7
5509	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN KM 124+000 DE LA CARRETERA CA08W, FRONTERA LAS CHINAMAS		745,534.38	71,452.69	9.6
5621	CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCIÓN EN EST. 0+500 DE LA RUTA SAN19W:SAN21E-MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		691,662.34	-	-
4772	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2010		609,485.69	609,485.69	100.0
5289	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS PAVIMENTADAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, SAN VICENTE Y USULUTÁN		577,555.72	577,555.70	100.0
5291	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS PAVIMENTADAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD, SAN SALVADOR, CUSCATLAN Y CABAÑAS		560,636.28	560,636.28	100.0
5280	REPARACION DE OBRA DE PASO EN EST. 1+060 DE RUTA RN02E, SOYAPANGO, SAN SALVADOR		527,969.23	411,347.76	77.9
5292	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS NO PAVIMENTADAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD, SAN SALVADOR, CUSCATLAN Y CABAÑAS		478,061.36	478,061.36	100.0
5379	REPARACIÓN DE CÁRCAVAS EN KM 17+400 Y KM 18+400 DE LA RUTA RN05S, SANTO TOMAS, SAN SALVADOR		452,217.66	198,769.39	44.0
4488	Administración del Programa (Unidad Ejecutora)		410,966.90	220,056.72	53.5
5515	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS PAVIMENTADAS DEL DEPARTAMENTO DE USULUTÁN		408,612.80	217,126.24	53.1
5403	Reparación de calle SAL22S,Tramo Puerta del Diablo(SAL07W)- Mil Cumbres, Municipio de Panchimalco,Departamento de San Salvador		400,000.00	-	-
5408	Mejoramiento Camino Rural PAZ37E/PAZ10S, Tramo: Cantón el Nilo -Cantón El Garrapatero-Cantón San Francisco Los Reyes(PAZ10S)-CA:02E, Departamento de la Paz		400,000.00	-	-
5516	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS NO PAVIMENTADAS DEL DEPARTAMENTO DE USULUTÁN		388,570.67	336,301.27	86.5
5622	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION EN EJE 73-B (BOULEVARD VENEZUELA), EST. 1+400, SAN SALVADOR		376,864.31	-	-
5236	REPARACIÓN DE CÁRCAVA EN EST. 23+682 DE LA RUTA RN03E, SAN EMIGDIO, LA PAZ		325,939.35	304,579.73	93.4
5508	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN LA RUTA CA02E, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y LA PAZ		303,386.18	258,125.70	85.1
5328	REPARACIÓN DE CÁRCAVA EN EST. 28+205 DE LA RUTA RN03E, SANTA CRUZ ANALQUITO, CUSCATLÁN		301,662.15	254,013.37	84.2
5274	REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO JIBOA EN LA RUTA CA02E, SAN PEDRO MASAHUAT, LA PAZ		298,040.93	280,365.53	94.1
5281	REPARACION DE OBRA DE PASO EN EJE 81 (ZOOLOGICO NACIONAL), SAN SALVADOR		262,529.14	258,539.77	98.5
5282	REPARACION DE CARCAVA EN KM. 37+450 DE RUTA RN05S, SAN LUIS TALPA, LA PAZ		235,607.09	227,323.30	96.5
5243	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN EST. 19+621 DE LA RUTA RN03E, SAN MIGUEL TEPEZONTES, LA PAZ		216,284.55	212,086.57	98.1
5240	REPARACIÓN DE CÁRCAVA EN EST. 27+597 DE LA RUTA RN03E, SANTA CRUZ ANALQUITO, CUSCATLÁN		196,630.53	191,506.52	97.4
5272	REPARACIÓN DE CÁRCAVAS EN EST. 1+130 DE LA RUTA PAZ17E, PARAISO DE OSORIO, LA PAZ		181,355.67	177,157.73	97.7



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

32

COD.	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJECUCION FINANC.
5234	REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO JIBOA EN RUTA RN04, EL ROSARIO, LA PAZ		167,384.06	167,384.06	100.0
5232	REPARACION DE OBRA DE PASO EN EST. 18+200 EN RUTA PAZ07, SAN PEDRO NONUALCO, LA PAZ		134,985.03	134,985.00	100.0
5237	REPARACIÓN DE CÁRCAVA EN EST. 27+111 DE LA RUTA RN03E, SANTA CRUZ ANALQUITO, CUSCATLÁN		133,424.31	129,226.32	96.9
5383	CONSTRUCCION DE APOYOS PARA PUENTES PROVISIONALES DE EMERGENCIA, ETAPA 1		129,770.87	80,762.33	62.2
5273	REPARACIÓN DE CARCAVA EST. 19+900 EN LA RUTA CUS11N, TENANCINGO, CUSCATLAN		119,535.31	110,943.49	92.8
5541	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL UNI39S: CA02E - EMBARCADERO LOS CORRALES, DEPARTAMENTO DE LA UNION		111,504.42	60,780.06	54.5
4795	Mejoramiento Camino Rural UNI02S, Tramo: El Jagüey - El Tamarindo, Departamento de La Unión		111,504.42	81,359.33	73.0
5241	REPARACIÓN DE CÁRCAVA EN EST. 28+036 DE LA RUTA RN03E, SANTA CRUZ ANALQUITO, CUSCATLÁN		86,662.11	81,538.09	94.1
5239	REPARACIÓN DE CÁRCAVA EN EST. 27+350 DE LA RUTA RN03E, SANTA CRUZ ANALQUITO, CUSCATLÁN		51,490.02	47,292.04	91.8
5238	REPARACIÓN DE CÁRCAVA EN EST. 27+242 DE LA RUTA RN03E, SANTA CRUZ ANALQUITO, CUSCATLÁN		44,455.62	40,257.64	90.6
5233	REPARACIÓN DE PUENTE CHILAMA EN RUTA CA02, LA LIBERTAD		4,940.16	4,940.15	100.0
5288	REPARACIÓN DE CARCAVA EN EST. 0+800 DE LA RUTA SAV16E: SAV17E - SAN EMIGDIO, VERAPAZ, SAN VICENTE		859.00	-	-
MINED		83	52,015,645.52	18,204,852.99	35.0
5268	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO-EDUCA)		16,107,280.34	6,728,755.06	41.8
5096	Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador		7,458,000.00	-	-
4635	PROGRAMA DE REPARACIONES MENORES EN CENTROS ESCOLARES A NIVEL NACIONAL		2,402,162.90	1,550,245.21	64.5
4496	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2009		1,524,109.90	671,901.89	44.1
4636	PROGRAMA DE DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE CENTROS ESCOLARES A NIVEL NACIONAL		1,287,847.61	1,220,107.00	94.7
71	Reconstrucción y Rehabilitación de Centros Escolares Afectados por la Tormenta IDA		1,189,741.91	970,746.91	81.6
4690	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR		1,070,000.00	-	-
4708	REHABILITACION INSTITUTO NACIONAL CATOLICO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SENSUNTEPEQUE		877,568.58	219,392.14	25.0
4722	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE USulután		769,879.07	723,686.34	94.0
4186	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS ESCOLARES EN DPTOS. DE AHUACHAPAN, CHALATENANGO, SAN MIGUEL, Y MORAZAN		659,093.35	603,013.37	91.5
4687	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL BARILLO, ZARAGOZA, LA LIBERTAD		600,000.00	-	-
4688	MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE SAN MARCOS , SAN SALVADOR		589,280.66	-	-
4700	MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CINQUERA, CABAÑAS		560,503.95	420,377.96	75.0
4706	MEJORAMIENTO ESCUELA PARVULARIA MISAEL RAMOS, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS		554,634.47	138,658.62	25.0
4689	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SAN MARTIN DE PORRES, SAN MARTIN, SAN SALVADOR		535,000.00	-	-
4692	MEJORAMIENTO DE INSTITUTO NACIONAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS , SAN SALVADOR		467,792.45	-	-
4711	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR ANASTASIO AQUINO, SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ		464,765.61	232,382.82	50.0
4671	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCATIVO HACIENDA SAN CAYETANO, SANTA ANA		427,467.47	320,600.61	75.0
4691	REHABILITACION ESCUELA DE CIEGOS EUGENIA DE DUEÑAS, SAN SALVADOR		413,750.00	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

COD.	33 INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJECUCION FINANC.
4712	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR AGUSTIN SANCHEZ, APASTEPEQUE, SAN VICENTE		404,232.95	-	-
4703	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR "CANTON SAN JOSE LOMAS DE PEÑA", ILOBASCO, CABAÑAS		390,239.08	-	-
4670	MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "ELISA ALVAREZ DE DIAZ", SANTA ANA		382,063.80	382,063.80	100.0
4668	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR HACIENDA EL COCO, CHALCHUAPA, SANTA ANA		374,500.00	-	-
4694	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANDELARIO CUELLAR, M/COJUTEPEQUE, D/CUSCATLAN.		366,278.42	-	-
4713	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR DOMINGO SANTOS, SAN LORENZO, SAN VICENTE		355,599.94	355,599.94	100.0
4697	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL RODEO, M/SAN PEDRO PERULAPAN, D/CUSCATLAN.		350,700.00	350,700.00	100.0
4664	REPARACION Y MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCATIVO COL. NUEVA, CANTON GUYAPA ABAJO, JUJUTLA, AHUACHAPAN		341,394.00	-	-
4704	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR ISABEL LA CATÓLICA, CANTON LOS LLANITOS, ILOBASCO, CABAÑAS		337,598.06	168,799.04	50.0
4669	REHABILITACION ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE METAPAN, SANTA ANA		337,410.25	317,165.63	94.0
4721	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR EL MARQUEZADO, SANTIAGO DE MARIA, USULUTAN		321,000.00	7,000.00	2.2
4695	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR COLONIA FÁTIMA, M/COJUTEPEQUE, D/CUSCATLAN.		313,808.97	-	-
4705	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERÍO HUISCOYOL, CANTON TRINIDAD, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS		312,854.16	-	-
4699	REHABILITACION COMPLEJO EDUCATIVO RAFAEL CABRERA, M/SAN RAMON, D/CUSCATLAN.		309,582.98	291,008.01	94.0
4715	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE		307,020.26	-	-
4724	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR 15 DE SEPTIEMBRE, SAN MIGUEL		286,675.16	286,675.16	100.0
4677	REHABILITACION Y MEJORAS CENTRO ESCOLAR HEROES DEL 11 DE ENERO, CHALATENANGO		282,850.97	-	-
4681	MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL NOMBRE DE JESUS, CHALATENANGO		265,470.00	-	-
4710	MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE SAN JUAN TEPEZONTES, LA PAZ		255,286.10	11,251.18	4.4
4672	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO VALLE NUEVO, CANTON METALIO, ACAJUTLA, SONSONATE		251,337.98	250,641.33	99.7
4943	CENTRO ESCOLAR BARRIO LA FATIMA, LA UNION		245,036.00	-	-
4686	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON SAN SEBASTIAN, ZARAGOZA, LA LIBERTAD		243,480.69	228,871.85	94.0
4718	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL TABURETE, JIQUILISCO, USULUTAN		240,865.00	-	-
4676	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SISIMITEPEC, NAHUIZALCO, SONSONATE		235,069.65	117,534.84	50.0
4941	CENTRO ESCOLAR HACIENDA LA CAÑADA, CONCHAGUA, LA UNION		232,292.43	-	-
4719	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SAN JUAN CRUZADILLA, JIQUILISCO, USULUTAN		228,472.00	-	-
4675	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR JORGE LARDE, JUAYUA, SONSONATE		228,001.14	-	-
4674	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCATIVO PEDRO F. CANTOR, IZALCO, SONSONATE		226,257.81	226,257.81	100.0
4667	REPARACION Y MEJORAMIENTO ESC. EDUCACION ESPECIAL DE CHALCHUAPA, SANTA ANA		221,925.75	-	-
4942	CENTRO ESCOLAR CANTON LOS CONEJOS, EL CARMEN, LA UNION		217,320.00	-	-
4716	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR BRISAS DEL SOL, BERLIN, USULUTAN		214,000.00	7,000.00	3.3
4944	CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CUEVONA, LISLIQUE, LA UNION		212,485.33	-	-
4729	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EL DIVISADERO, MORAZAN		203,792.23	203,792.23	100.0
4679	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA EDUCACION PARVULARIA LUCILA TRUJILLO, CHALATENANGO		203,724.26	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

34

COD.	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJECUCION FINANC.
4701	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN CARLOS, J/ DOLORES, D/ CABAÑAS		201,160.00	-	-
4684	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ZAPOTE, CANTON CASTILLO, SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD		200,497.80	199,747.93	99.6
4685	REHABILITACION CENTRO ESCOLAR WALTER SOUNDY, SANTA TECLA, LA LIBERTAD		199,040.00	-	-
4727	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL "DE ULUAZAPA", SAN MIGUEL		196,594.75	43,450.66	22.1
4665	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO, JUJUTLA, AHUACHAPAN		189,787.84	47,446.97	25.0
4696	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JOSÉ, M/SAN CRISTOBAL, D/CUSCATLAN.		187,250.00	-	-
4723	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CHAPULTIQUE, SAN MIGUEL		187,250.00	-	-
4645	INSTITUTO NACIONAL DE NUEVA ESPARTA, LA UNION		183,349.13	183,349.13	100.0
4698	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN CERRO COLORADO, M/SAN RAFAEL CEDROS, D/CUSCATLAN.		182,351.68	181,396.98	99.5
4662	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO NUEVO NANCE AMARILLO, CANTON RIO FRIO, AHUACHAPAN		171,061.15	37,415.45	21.9
4693	MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL GENERAL ADOLFO BLANDÓN, M/COJUTEPEQUE, D/CUSCATLAN.		170,849.20	170,136.29	99.6
4726	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR PARAISO REAL, SAN MIGUEL		162,162.74	-	-
4707	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO CERRO EL TORO, C/ LA TRINIDAD, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS		160,500.00	-	-
4717	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INSTITUTO NACIONAL DE CONCEPCION BATRES, USULUTAN		157,290.00	-	-
4939	INSTITUTO NACIONAL DE OSICALA, MORAZAN		152,655.43	-	-
4728	CENTRO ESCOLAR COLONIA CARRILLO, CANTON EL PAPALÓN, SAN MIGUEL		149,800.00	7,000.00	4.7
4725	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR LA CARMENZA, SAN MIGUEL		146,804.00	-	-
4663	REPARACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL SALITRERO, ATQUIZAYA, AHUACHAPAN		141,156.34	35,289.09	25.0
4683	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR DE QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD		132,931.14	33,232.79	25.0
4714	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN VICENTE		129,897.74	64,948.88	50.0
4702	CENTRO ESCOLAR CASERIO CONCEPCION, CANTON LA QUESERA, ILOBASCO, CABAÑAS		119,840.00	-	-
4666	REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON GUASCOTA, SAN LORENZO AHUACHAPAN		112,350.00	-	-
4680	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON TALQUEZALAR, CITALA CHALATENANGO		109,157.40	109,157.40	100.0
4720	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE NUEVA GRANADA, USULUTAN		107,000.00	-	-
4709	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR FABIO IGNACIO MAGAÑA, EL ROSARIO, LA PAZ		99,975.00	-	-
4678	REPARACION ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "DE CHALATENANGO", CHALATENANGO		98,530.61	24,632.65	25.0
4673	REPARACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON CERRO ALTO, CALUCO, SONSONATE		86,511.83	-	-
4940	INSTITUTO NACIONAL DE SAN SIMON, MORAZAN		80,250.00	-	-
4682	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR JICALAPA, LA LIBERTAD		78,718.08	-	-
5188	Atención de Centros Escolares Afectados por Emergencia Tormenta IDA		63,420.02	63,420.02	100.0
MAG		20	41,578,784.79	34,893,816.43	83.9
4643	Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador		17,449,953.16	16,750,488.45	96.0
4644	Fortalecimiento del Sector Pecuario y Avícola en El Salvador		4,091,481.48	4,091,144.58	100.0



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

COD.	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJECUCION FINANC.
35					
4647	Obras de Control de Inundaciones en los Ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Goascorán (II Fase)		3,342,057.03	3,224,859.74	96.5
4377	PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LA REGION CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR-Central)		3,276,165.00	1,192,396.86	36.4
3752	Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO)		3,035,905.00	2,244,291.00	73.9
5284	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS RIOS LEMPA, GRANDE DE SAN MIGUEL, PAZ Y JIBOA		1,734,676.76	1,734,392.58	100.0
2963	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION RURAL (PREMODER)		1,416,715.00	1,108,275.21	78.2
4646	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de Control de Inundaciones		1,178,123.69	647,966.59	55.0
4648	Construcción de Obras de Mitigación en Cordillera El Bálsamo, al Sur de Santa Tecla, 2da. Etapa		1,150,000.00	-	-
4645	Seguridad Alimentaria con Productos Pesqueros y Acuícolas de Valor Agregado en El Salvador.		1,125,078.00	1,125,078.00	100.0
5283	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE EN DISTRITOS DE RIEGO		850,763.81	850,024.29	99.9
5306	REPOBLACION DE ZONAS CAFETALERAS EN LAS REGIONES PARACENTRAL Y ORIENTAL CON BAJA PRODUCTIVIDAD Y AFECTADAS POR EL FENOMENO CLIMATOLOGICO TORMENTA IDA		777,410.42	767,620.58	98.7
5285	RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS POR TORMENTA IDA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE PRACTICAS Y OBRAS DE CONSERVACION DE SUELOS		720,000.00	720,000.00	100.0
4651	Construcción de Muro de Retención en Quebrada La Oscurana, Municipio de Berlín		450,000.00	-	-
4650	Construcción de Obras de Control de Inundaciones Ríos Tihuapa - Huiza, Depto. de La Libertad		350,000.00	60,387.50	17.3
5300	REACTIVACION DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION ACUICOLA Y ENTREGA DE POST-LARVAS DE CAMARON MARINO, A COOPERATIVAS CAMARONERAS DEL BAJO LEMPA AFECTADAS POR LA DEPRESION TROPICAL IDA		310,021.04	115,067.29	37.1
5297	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN COOPERATIVAS DE LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE		155,859.44	113,015.82	72.5
5287	ESTABLECIMIENTO DE OPORTUNIDADES PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE ZONAS AFECTADAS POR EL HURACAN IDA		67,434.48	67,303.89	99.8
4649	Reparación de Cárcava en Asentamiento Bello Horizonte, Comasagua, La Libertad		50,000.00	34,363.57	68.7
4957	FOMENTO A LAS TECNOLOGIAS DE RIEGOS PARA PRODUCTORES HORTOFRUTICOLAS EN LA REGION ORIENTAL		47,140.48	47,140.48	100.0
FONAVIPO		12	37,790,971.51	25,247,996.64	66.8
5085	CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		13,310,764.95	8,497,675.96	63.8
5503	CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		8,772,818.33	6,155,382.75	70.2
5192	CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION PROCAVIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		8,314,388.49	5,777,797.33	69.5
5245	CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.		2,251,060.00	1,924,633.57	85.5
5371	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de San Vicente		1,595,675.00	433,835.76	27.2
5370	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Nuevo Verapaz, Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente		1,314,529.35	732,798.83	55.7
5028	CONSTRUCCIÓN DE 501 VIVIENDAS EN URBANIZACIÓN NUEVO BELEN, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL		1,096,484.88	972,999.68	88.7
5372	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Villas de San Pedro, Municipio de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz		607,905.65	246,010.00	40.5
5581	CONSTRUCCIÓN DE 64 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL CONDOMINIO ATLACATL, MUNICIPIO DE CIUDAD DELGADO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		332,566.03	322,089.95	96.8



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

36

COD.	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJECUCION FINANC.
5496	CONSTRUCCIÓN DE 780 VIVIENDAS EN PROYECTO HABITACIONAL REPARTO LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE OLOCUILTA Y CUYULTITAN, DEPARTAMENTO LA PAZ.		142,766.07	137,978.78	96.6
5396	CONSTRUCCIÓN DE 308 VIVIENDAS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LOS MANANTIALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE		46,937.76	41,719.03	88.9
5086	CONSTRUCCIÓN DE 1,056 APARTAMENTOS Y 834 VIVIENDAS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LA BRETAÑA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		5,075.00	5,075.00	100.0
UES		20	19,038,605.75	4,163,664.95	21.9
3762	CONSTRUCCION DE BOVEDA		6,500,000.00	-	-
5014	FORTEALECIMIENTO AL PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES GÉNERANDO OPORTUNIDADES DE ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CON PERSPECTIVAS HACIA EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL		2,842,021.55	1,289,000.93	45.4
5025	FORTEALECIMIENTO DEL PROGRAMA JÓVENES TALENTO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR		2,000,000.00	-	-
5013	Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias Economicas		819,298.81	63,727.34	7.8
5014	Construcción de Edificio de Usos Múltiples para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.		653,846.00	-	-
5015	Construcción de Edificio para Instituto de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas		653,846.00	-	-
5016	Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias y Humanidades.		653,846.00	-	-
5012	Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente		653,846.00	-	-
5023	Modernizacion de los Laboratorios de la Facultad de Ingenieria y Arquitectura.		650,716.32	432,952.12	66.5
5017	Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la Facultad de Medicina.		643,182.50	525,288.28	81.7
5009	Fortalecimiento de los Laboratorios del area Básica de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas		609,721.88	427,928.95	70.2
5010	Fortalecimiento de Infraestructura en la Facultad de Odontología.		457,703.52	457,665.79	100.0
5011	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL		457,291.42	213,478.37	46.7
5022	Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia.		410,593.75	390,531.13	95.1
5018	Construcción de Edificio de Posgrados en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.		353,846.00	-	-
5019	Construcción de Muro Perimetral en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente		260,000.00	232,512.08	89.4
5026	Fortalecimiento de la Radio Universitaria		175,000.00	-	-
5027	Modernizacion de la Administración Académica		125,000.00	58,262.96	46.6
5020	Modernización de el Sistema de Energía Eléctrica en el Campus Central		78,846.00	34,436.60	43.7
5021	Modernización de los Laboratorios del Departamento de Química de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.		40,000.00	37,880.40	94.7
MARN		4	17,443,314.02	12,546,039.74	71.9
5229	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE RIESGO		8,117,322.23	7,363,388.04	90.7
2881	PROGRAMA DE DESCONTAMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS		5,335,141.92	4,950,802.16	92.8
5102	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL		3,759,000.00	-	-
5348	Remodelación y Equipamiento de la Primera Planta Edificio Principal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales		231,849.87	231,849.54	100.0
CNR		1	17,153,523.55	1,703,035.70	9.9
3541	PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II		17,153,523.55	1,703,035.70	9.9
CSJ		9	10,000,400.00	1,814,004.87	18.1
4344	Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador		5,436,310.00	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

COD.	37 INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJCUCION FINANC.
4995	" Remodelación, Ampliación y Equipamiento de Sala de Autopsia, Morgue y Area de Oficinas Administrativas del Departamento de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de San Salvador".		1,350,195.00	530,900.86	39.3
5364	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SALAS DE AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA, CIVILES, DE SENTENCIA Y DE PAZ, A NIVEL NACIONAL.		902,200.00	491,229.91	54.4
5365	REMDELACIONES, AMPLIACIONES, READECUACIONES Y MEJORAS EN LOS TRIBUNALES A NIVEL NACIONAL.		808,450.00	362,452.58	44.8
5366	REPARACIONES MENORES A LA RED DE TRIBUNALES A NIVEL NACIONAL		500,000.00	357,667.95	71.5
4225	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR		350,000.00	-	-
3385	Construcción Centro Judicial Integrado de Apopa, San Salvador		350,000.00	-	-
3831	Construcción Centro Judicial Integrado de La Unión		289,360.00	57,871.18	20.0
4989	"Remodelaciones y Ampliaciones varias a la Red de Tribunales del Organo Judicial a Nivel Nacional"		13,885.00	13,882.39	100.0
PNC - MJSP		1	7,910,000.00	161,416.67	2.0
5099	Suministro e Instalación del Sistema Integral para los Centros de Atención de Emergencias 911 y AVL/GPS de la Policía Nacional Civil de El Salvador.		7,910,000.00	161,416.67	2.0
CI - MJSP		2	7,824,530.00	-	-
5137	Granja de Rehabilitación para Jovenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil de Ilobasco, Departamento de Cabañas		7,746,150.00	-	-
5561	READECUACIÓN DE CENTRO INTERMEDIO DE TONACATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.		78,380.00	-	-
MH		12	7,040,107.16	638,835.65	9.1
4958	Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV.		6,000,000.00	-	-
5494	Rehabilitación de las Condiciones Físicas en la Aduana de Frontera La Hachadura		161,999.96	161,999.96	100.0
5512	Reparaciones en Infraestructura de la Aduana en Frontera San Cristobal, Departamento de Santa Ana		150,952.00	101,964.47	67.5
5631	EQUIPAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS SEIS ADUANAS DE FRONTERA DE EL SALVADOR.		150,000.00	17,989.94	12.0
5522	REPARACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE CERCA DE MALLA CICLÓN EN EL CENTRO RECREATIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, SAN BARTOLO, ILOPANGO.		125,020.00	-	-
5506	Reparaciones en Infraestructura de la Aduana en Frontera Angulatú, Departamento de Santa Ana.		124,194.71	101,530.96	81.8
5493	Rehabilitación de las Condiciones Físicas en la Aduana de Frontera El Amatillo		115,753.24	115,753.24	100.0
5513	Reparaciones en Infraestructura de la Aduana en Frontera Las Chlnamas, Departamento de Ahuachapán.		102,490.00	32,777.83	32.0
5507	Reparaciones en Infraestructura de la Aduana en Frontera El Poy, Departamento de Chalatenango.		53,829.09	53,829.09	100.0
5340	CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA ADUANA TERRESTRE SAN CRISTOBAL		38,533.96	38,533.96	100.0
5367	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA SECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.		14,456.20	14,456.20	100.0
4204	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TRIBUTARIA		2,878.00	-	-
ISSS		9	4,186,580.00	1,370,242.59	32.7
2571	ADECUACION DEL HOSPITAL SONSONATE		1,270,985.00	583,540.53	45.9
5326	MEJORAMIENTO DE FARMACIAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL		649,570.00	-	-
5386	READECUACION DE LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL AMATEPEC, SAN SALVADOR.		600,855.00	-	-
5183	REMDELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DE SANTA ANA.		531,700.00	350,097.45	65.8
5313	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD MÉDICA DE SANTA TECLA		400,000.00	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

38

COD.	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJECUCION FINANC.
5344	ADQUISICIÓN Y READECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA CLÍNICA COMUNAL VIRGEN DEL TRANSITO, MEJICANOS, SAN SALVADOR		350,000.00	318,794.70	91.1
5187	READECUACIÓN DEL EDIFICIO VINSAR PARA ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA, SAN SALVADOR.		162,600.00	-	-
5308	SUSTITUCION DE LA CUBIERTA DE TECHO DE LA TORRE ONCOLOGICA DEL ISSS		115,000.00	31,135.60	27.1
871	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD MEDICA, SOYAPANGO.		105,870.00	86,674.31	81.9
VMVDU		2	4,079,999.03	16,144.03	0.4
5100	DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA		4,063,855.00	-	-
5224	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA SECTORES VULNERABLES EN 5 DEPARTAMENTOS AFECTADOS POR LA TORMENTA IDA		16,144.03	16,144.03	100.0
CEPA		7	3,211,075.68	399,073.42	12.4
4803	Obras de Mitigación en el Aeropuerto Internacional Ilopango, FASE I.		1,500,000.00	77,862.39	5.2
5583	Rehabilitación del pavimento asfáltico de calle perimetral entre SEI y acceso 6 del Aeropuerto Internacional El Salvador, Fase I		450,000.00	-	-
4477	Rehabilitación de las Losas de Concreto del Pavimento de Acceso a los Muelles del Puerto de Acajutla		336,075.68	321,211.03	95.6
4192	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO No. 3, DEL PUERTO DE ACAJUTLA		325,000.00	-	-
5632	Remodelación y Equipamiento de Servicios Sanitarios del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional El Salvador		319,200.00	-	-
5610	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR		180,800.00	-	-
5231	REHABILITACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE LOS MUELLES A, B Y C DEL PUERTO DE ACAJUTLA FASE II		100,000.00	-	-
FSV		1	3,119,165.00	-	-
4513	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RECURSOS LOGISTICOS, COMEDOR DEL PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV, SAN SALVADOR.		3,119,165.00	-	-
ILEA		1	3,030,961.22	2,883,228.89	95.1
4493	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, ILEA SAN SALVADOR"		3,030,961.22	2,883,228.89	95.1
MIGOB		6	2,470,520.35	1,851,902.67	75.0
5275	Adquisición de equipo par las Gobernaciones Departamentales, Dirección de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y Cuerpo de Bomberos del Ministerio de Gobernación		847,007.00	648,405.02	76.6
5278	Fortalecimiento de la Flotilla Vehicular en las Gobernaciones Departamentales, Comisiones Técnicas de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos a nivel nacional.		789,361.09	789,361.09	100.0
5277	Mejoramiento de Infraestructura de 9 Gobernaciones Departamentales a nivel nacional		389,949.69	47,876.34	12.3
5544	Adquisición y Adecuación de Inmuebles para las Gobernaciones Departamentales de Sonsonate y Ahuachapán		300,000.00	300,000.00	100.0
5295	Fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Ministerio de Gobernación		144,100.98	66,260.22	46.0
5279	Construcción de las Oficinas Centrales de la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en San Salvador		101.59	-	-
FONAES		2	2,424,079.72	2,220,882.04	91.6
5047	TECHO Y AGUA FASE 2011		1,600,000.00	1,396,802.32	87.3
5000	PROGRAMA TECHO Y AGUA, FASE 2010		824,079.72	824,079.72	100.0



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**


COD.	39	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJECUCION FINANC.
MIREX			3	1,978,307.21	1,978,307.21	100.0
5373		CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACION SUPERIOR PARA LA FORMACION DIPLOMATICA IIESFORD		1,745,000.00	1,745,000.00	100.0
4992		"PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS Y FRUTAS EN CUATRO CANTONES DEL MUNICIPIO DE CALUCO, SONSONATE"		158,356.00	158,356.00	100.0
3853		MICROPROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL 2005		74,951.21	74,951.21	100.0
SE - MJSP			2	1,912,000.00	782,000.00	40.9
5136		Programa de Prevencion de la Violencia y la Delincuencia		1,130,000.00	-	-
5517		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN LA ZONA ORIENTAL. DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.		782,000.00	782,000.00	100.0
CENTA			5	1,556,720.80	1,401,681.38	90.0
5298		Rehabilitación de la Producción y Comercialización de Hortalizas en Zonas Afectadas por el Huracán Ida		430,572.00	338,514.43	78.6
5299		Producción Artesanal de Semilla de Granos Básicos en Apoyo a los Productores y Productoras Afectados por el Huracán Ida		418,036.00	366,363.98	87.6
5294		Recuperación de la Producción Frutícola en Zonas Afectadas por el Huracán IDA		377,252.80	365,945.08	97.0
5293		Rehabilitación Productiva Mediante la Entrega de Paquetes de Aperos Agrícolas a Productores y Productoras Afectado(a)s por El Huracán IDA		310,800.00	310,800.00	100.0
5296		Recuperación de la Producción Apícola en Zonas Afectadas por el Huracán Ida		20,060.00	20,057.89	100.0
BOMBER - MIGOB			5	1,143,504.94	477,791.12	41.8
5270		Adquisición de equipo para el Cuerpo de Bomberos de El Salvador a nivel nacional		391,856.15	168,540.34	43.0
3944		CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE AHUACHAPAN		250,995.79	-	-
4999		Construcción y Equipamiento de dormitorios para el personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Estación Central.		233,325.00	171,350.78	73.4
4086		CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO DE MORAZAN		137,900.00	137,900.00	100.0
4998		Construcción de nave para albergar motobombas del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Estación Central		129,428.00	-	-
DGCP - MJSP			4	724,005.00	97,617.06	13.5
5520		Obras de Reforzamiento de Seguridad Pasiva y Control del Centro Penal de Zacatecoluca		285,885.00	97,617.06	34.1
5518		Readecuación del Área de Visitas de los Centros Penitenciarios de Quezaltepeque y Ciudad Barrios		186,995.00	-	-
5582		Construcción y readecuación de Instalaciones del Centro de Formación de la Escuela Penitenciaria en la Penitenciaría Central La Esperanza, Dpto. San Salvador		135,600.00	-	-
5519		Reparación e impermeabilización de techos en el Centro Penitenciaro de Zacatecoluca		115,525.00	-	-
MTYPS			2	634,436.94	562,102.41	88.6
5191		Construcción, Reconstrucción, Modernización y Equipamiento en Centro de Recreación Obrera, Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Constitución 1950, Lago de Coatepeque Santa Ana		500,000.00	427,665.47	85.5
5269		Reparaciones en Infraestructura y Equipamiento Básico Oficina Central (San Salvador) y Departamental (Sonsonate), Ministerio de Trabajo y Previsión Social.		134,436.94	134,436.94	100.0
ISTU			1	542,540.37	542,540.37	100.0
2241		REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL TURICENTRO ICHANMICHEN, ETAPA IV		542,540.37	542,540.37	100.0



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011, EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(MONTOS EN DOLARES)**

40

COD.	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. PROG. Y PROY.	PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO AL MES	% DE EJCUCION FINANC.
ISNA		4	441,855.00	21,903.86	5.0
4830	REPARACION EDIFICIO LA ESTRELLA, DELEGACION CENTRAL ISNA (FASE II)		226,673.00	-	-
4511	REPARACIONES Y MEJORAS EN CENTRO DE REINSECCION EL ESPINO, AHUACHAPAN (Primera Fase)		89,500.00	-	-
5571	Reparaciones y Mejoras para el Centro de Inserción Social Sendero de Libertad Ilobasco Departamento de Cabañas.		82,647.00	-	-
4512	REPARACION DE TECHOS Y MEJORAS, CENTRO DE REINSECCION SOCIAL DE TONACATEPEQUE.		43,035.00	21,903.86	50.9
ISRI		3	371,925.11	342,492.39	92.1
4821	Remodelación y Equipamiento del Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldivar, San Salvador		188,325.11	188,325.11	100.0
762	Fortalecimiento de los sistemas de Información del Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia, San Salvador		103,134.34	73,701.62	71.5
4101	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION DE INVÁLIDOS, SAN SALVADOR		80,465.66	80,465.66	100.0
CORSATUR		4	308,870.00	308,826.14	100.0
4517	Mejoramiento de calles de acceso a Playa El Tunco, Municipio de Tamanique, La Libertad.		109,540.00	109,540.00	100.0
5369	CONSTRUCCION DE 5 OBSERVATORIOS TURISTICOS, 2010		99,250.00	99,250.00	100.0
5376	MEJORAMIENTO DE RECORRIDOS TURISTICOS Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTERPRETACION EN PARQUE EL BOQUERON.		93,000.00	93,000.00	100.0
2436	REHABILITACION DEL COMPLEJO TURISTICO DEL PUERTO DE LA LIBERTAD		7,080.00	7,036.14	99.4
AL		1	250,000.00	-	-
5222	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO II		250,000.00	-	-
DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR		1	245,140.00	-	-
5133	FORTALECIENDO LA ATENCION A CONSUMIDORES: DESCENTRALIZANDO SERVICIOS Y MEJORANDO LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA		245,140.00	-	-
ISDEMU		3	150,445.29	76,519.05	50.9
5556	MEJORA DE LA OFICINA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		73,500.00	65,144.75	88.6
5095	Readecuación de espacio para Cocina-Bodega en la Oficina Central de ISDEMU.		46,945.29	11,374.30	24.2
5555	Readecuación de Espacio y Acabados de Cocina y Oficinas de ISDEMU San Salvador		30,000.00	-	-
SUB - TOTAL		591	950,664,867.70	414,736,278.23	43.6
FODES		1	204,233,140.00	204,233,140.00	100.0
5087	Inversión Municipal a través del FODES 2011		204,233,140.00	204,233,140.00	100.0
TOTAL GENERAL		592	1,154,898,007.70	618,969,418.23	53.6



Cifras preliminares conforme registro de las instituciones en SAFT y SIIP

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2011
(Montos en Dólares)

INSTITUCIÓN	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO PROG. ANUAL	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
FOMILENIO			130,350,193.42	P E D %	14,187,306.81 14,187,306.81 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	116,162,886.61 116,162,886.61 0.00 100.0 %	116,162,886.61 116,162,886.61 0.00 100.0 %	130,350,193.42 130,350,193.42 0.00 100.0 %
	40388	Proyecto de Conectividad - Carretera Longitudinal del Norte - Sub-actividad de Construcción	75,951,277.16	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	75,951,277.16 75,951,277.16 0.00 100.0 %	75,951,277.16 75,951,277.16 0.00 100.0 %	75,951,277.16 75,951,277.16 0.00 100.0 %
	40394	Proyecto de Conectividad - Caminos Rurales - Sub-actividad de Contrapartida Conectividad	10,650,469.76	P E D %	10,650,469.76 10,650,469.76 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	10,650,469.76 10,650,469.76 0.00 100.0 %
	40372	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Agua y Saneamiento	9,646,460.67	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	9,646,460.67 9,646,460.67 0.00 100.0 %	9,646,460.67 9,646,460.67 0.00 100.0 %
	40373	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Infraestructura Comunitaria	6,319,987.13	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,319,987.13 6,319,987.13 0.00 100.0 %	6,319,987.13 6,319,987.13 0.00 100.0 %
	40371	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Electrificación	6,272,891.59	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,272,891.59 6,272,891.59 0.00 100.0 %	6,272,891.59 6,272,891.59 0.00 100.0 %
	40389	Proyecto de Conectividad - Carretera Longitudinal del Norte - Sub-actividad de Supervisión de Construcción	6,021,653.07	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,021,653.07 6,021,653.07 0.00 100.0 %	6,021,653.07 6,021,653.07 0.00 100.0 %	6,021,653.07 6,021,653.07 0.00 100.0 %
	40386	Proyecto de Conectividad - Carretera Longitudinal del Norte - Sub-actividad de Adquisición de Derechos de Vía	4,873,799.23	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,873,799.23 4,873,799.23 0.00 100.0 %	4,873,799.23 4,873,799.23 0.00 100.0 %	4,873,799.23 4,873,799.23 0.00 100.0 %
	40367	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Educación Formal	4,701,775.66	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,701,775.66 4,701,775.66 0.00 100.0 %	4,701,775.66 4,701,775.66 0.00 100.0 %	4,701,775.66 4,701,775.66 0.00 100.0 %
	40374	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Contrapartida Desarrollo	2,851,195.00	P E D %	2,851,195.00 2,851,195.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,851,195.00 2,851,195.00 0.00 0.0 %

	Comunitario		%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	40368	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Educación Informal	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,257,104.06 1,257,104.06 1,257,104.06 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,257,104.06 1,257,104.06 1,257,104.06 100.0 %
	40369	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Asistencia Técnica	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,117,938.04 1,117,938.04 1,117,938.04 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,117,938.04 1,117,938.04 1,117,938.04 100.0 %
	40370	Proyecto de Desarrollo Humano - Sub-actividad de Contrapartida Educación y Capacitación	P E D %	685,642.05 685,642.05 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	685,642.05 685,642.05 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	685,642.05 685,642.05 0.00 100.0 %
CEL			P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	41,685,345.00 10,147,349.71 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	41,685,345.00 10,147,349.71 0.00 0.0 %	59,840,985.00 0.00 0.00 0.0 %	59,840,985.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	101,526,330.00 10,147,349.71 91,378,980.29 10.0 %
	3119	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	38,261,495.00 8,755,584.87 29,505,910.13 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	38,261,495.00 8,755,584.87 29,505,910.13 0.0 %	59,840,985.00 0.00 59,840,985.00 0.0 %	59,840,985.00 0.00 59,840,985.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	98,102,480.00 8,755,584.87 89,346,895.13 8.9 %
	622	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,306,515.00 48,514.44 1,258,000.56 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,306,515.00 48,514.44 1,258,000.56 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,306,515.00 48,514.44 1,258,000.56 3.7 %
	3684	Suministro e instalación de una micro unidad generadora en la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,099,085.00 1,016,024.80 83,060.20 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,099,085.00 1,016,024.80 83,060.20 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,099,085.00 1,016,024.80 83,060.20 92.4 %
	5504	Suministro e instalación de tres generadores fotovoltaicos con una capacidad total de aproximadamente 540 kw, con conexión a la red en las Centrales Hidroeléctricas Cerrón Grande y 15 de Septiembre.	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	548,995.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	548,995.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	548,995.00 0.00 0.00 0.0 %
	4400	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	370,370.00 318,750.60 51,619.40 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	370,370.00 318,750.60 51,619.40 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	370,370.00 318,750.60 51,619.40 86.1 %
	373	3A. UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CERRON GRANDE (MUNICIPIO DE JUTIAPA)	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	90,410.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	90,410.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	90,410.00 0.00 0.00 0.0 %
	3759	Diseño y Ejecución de Proyecto Solar	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,475.00 8,475.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,475.00 8,475.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,475.00 8,475.00 0.00 100.0 %
FISDL			P E D %	14,603,070.00 9,481,908.31 5,121,161.69 64.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	100,000.00 0.00 100,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	14,603,070.00 9,481,908.31 5,121,161.69 64.9 %	42,688,135.00 12,396,142.22 30,291,992.78 29.0 %	18,419,531.99 9,408,612.07 9,010,919.92 51.1 %	61,107,666.99 21,804,754.29 39,302,912.70 35.7 %	75,810,736.99 31,286,662.60 44,524,074.39 41.3 %
		PROGRAMA PROMOCIÓN	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750,000.00	0.00	32,750,000.00	32,750,000.00

	5384	DE LA PRESTACIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS	32,750,000.00	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,498,623.07	0.00	9,498,623.07	9,498,623.07
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,251,376.93	0.00	23,251,376.93	23,251,376.93
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	29.0 %	0.0 %	29.0 %	29.0 %
	4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL	18,666,690.00	P	13,603,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063,620.00	5,063,620.00	5,063,620.00	18,666,690.00
				E	8,615,346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818,058.17	2,818,058.17	2,818,058.17	11,433,404.79
				D	4,987,723.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,561.83	2,245,561.83	2,245,561.83	7,233,285.21
				%	63.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	55.7 %	55.7 %	55.7 %	61.3 %
	4460	FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNANZA (FISDL / KFW IV)	9,938,135.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,938,135.00	0.00	9,938,135.00	9,938,135.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897,519.15	0.00	2,897,519.15	2,897,519.15
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040,615.85	0.00	7,040,615.85	7,040,615.85
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	29.2 %	0.0 %	29.2 %	29.2 %
	4996	PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FISDL V)	7,124,500.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,124,500.00	7,124,500.00	7,124,500.00	7,124,500.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804,691.84	4,804,691.84	4,804,691.84	4,804,691.84
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,808.16	2,319,808.16	2,319,808.16	2,319,808.16
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	67.4 %	67.4 %	67.4 %	67.4 %
	4184	PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA DE EL SALVADOR (PAPE)	3,880,255.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880,255.00	3,880,255.00	3,880,255.00	3,880,255.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,633.58	773,633.58	773,633.58	773,633.58
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106,621.42	3,106,621.42	3,106,621.42	3,106,621.42
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	19.9 %	19.9 %	19.9 %	19.9 %
	4472	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV	1,200,000.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,166.99	314,166.99	314,166.99	314,166.99
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,833.01	885,833.01	885,833.01	885,833.01
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	26.2 %	26.2 %	26.2 %	26.2 %
	5045	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES DE SALUD EN COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES	1,151,156.99	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,156.99	1,151,156.99	1,151,156.99	1,151,156.99
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,061.49	698,061.49	698,061.49	698,061.49
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,095.50	453,095.50	453,095.50	453,095.50
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	60.6 %	60.6 %	60.6 %	60.6 %
	5648	Rehabilitación de Infraestructura Básica en Municipios Afectados por la Depresión Tropical 12 E	1,000,000.00	P	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
				E	866,561.69	0.00	0.00	0.00	0.00	866,561.69	0.00	866,561.69	866,561.69
				D	133,438.31	0.00	0.00	0.00	0.00	133,438.31	0.00	133,438.31	133,438.31
				%	86.7 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	86.7 %	0.0 %	86.7 %	86.7 %
	2660	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL	100,000.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
MOP			60,448,175.00	P	6,162,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,285,237.00	0.00	54,285,237.00	60,448,175.00
				E	66,678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,078.26	0.00	16,078.26	82,756.27
				D	6,096,259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	54,269,158.74	0.00	54,269,158.74	60,365,418.73
				%	1.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.1 %
	3737	APERTURA BOULEVARD DIEGO DE HOLGUIN-SANTA TECLA TRAMO II	29,977,048.00	P	2,261,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,715,612.00	0.00	27,715,612.00	29,977,048.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	2,261,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,715,612.00	0.00	27,715,612.00	29,977,048.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5004	CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RÍO LEMPA (KM. 75.5 LIB31N), LA LIBERTAD - CHALATENANGO	6,195,104.00	P	741,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453,668.00	0.00	5,453,668.00	6,195,104.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	741,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453,668.00	0.00	5,453,668.00	6,195,104.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	3091	CONSTRUCCION BY PASS EN LA CIUDAD DE USulután	4,904,286.00	P	846,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058,056.00	0.00	4,058,056.00	4,904,286.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	846,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058,056.00	0.00	4,058,056.00	4,904,286.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
				P	100,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,581,131.00	0.00	4,581,131.00	4,681,552.00

	5098	PROGRAMA OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS	E D %	100,421.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	100,421.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	4,581,131.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	4,581,131.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	4,581,131.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	4,681,552.00 0.0 %
	5652	RECONSTRUCCION DE PUENTE ATEOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN CAUCE DEL RIO TALNIQUE. RUTA CA-08W MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	P E D %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	4,148,987.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	4,148,987.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	4,148,987.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	4,148,987.00 0.00 0.0 %
	5458	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO LIB22S: ET. LIB05W (DV. COMASAGUA) - DV. LIB18S (CHILTIUPAN), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	P E D %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	2,137,441.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	2,137,441.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	2,137,441.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	2,137,441.00 0.00 0.0 %
	5463	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO LIB31N, TRAMO: SAN PABLO TACACHICO - CANTON SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	P E D %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	15,848.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	1,984,275.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	1,984,275.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	1,984,275.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	2,000,123.00 0.00 0.0 %
	5008	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PUENTES TULE (KM 45.48) Y COLIMA (KM 47.45), CARRETERA TRONCAL DEL NORTE (CA-4N), MUNICIPIO DE EL PAISNAL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	P E D %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	203,477.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	1,565,201.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	1,565,201.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	1,565,201.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	1,768,678.00 0.00 0.0 %
	5654	CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION SOBRE EL RIO COLON Y REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE DESDE LA INTERSEC. DE LA CARRETERA CA08W (KM. 29½) HACIA HDA. LAS SEISCIENTAS, CTÓN ENTRE RÍOS, MUNICIPIO DE COLON, DEPTO. DE LA LIBERTAD	P E D %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	1,738,936.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	1,738,936.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	1,738,936.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	1,738,936.00 0.00 0.0 %
	5511	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369	P E D %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	750,000.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	750,000.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	750,000.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	750,000.00 0.00 0.0 %
	5411	Mejoramiento Camino Vecinal, Tramo: La Laguna-Canton Cuevitas ET- CHA13N (Dulce Nombre de María-San Fernando) Departamento de Chalatenango.	P E D %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	663,500.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	663,500.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	663,500.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	663,500.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	663,500.00 0.00 0.0 %
		Mejoramiento de Caminos													

5404	Rurales en los Municipios de Santa Elena, Jucuaran, Concepción Baires y San Buenaventura, Departamento de Usulután.	460,000.00	P E D %	460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
5409	Pavimentación de Calles en el Municipio y Departamento de Santa Ana.	250,000.00	P E D %	250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
5410	Mejoramiento de Calles entre la 11 Calle Oriente y Calle a San Jorge, Municipio de San Rafael, Departamento de San Miguel	250,000.00	P E D %	250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
5412	Mejoramiento del camino que conduce al Caserio Los Pérez del Ctn. Texipulco, Camino Vecinal Caserio Los Martínez del mismo Ctn, y al Camino Vecinal La Joya del Ctn. La Concepción, todos Jurisdicción de San Pedro Puxtla del Dpto. de Ahuachapán	150,000.00	P E D %	150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
5653	RECONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES S/ RIO COPAPAYO, RUTA CA-08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD - D.VIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.	132,577.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	132,577.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	132,577.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
5413	Mejoramiento Calles en la Colonia San Joaquín, Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador.	100,000.00	P E D %	100,000.00 20,711.15 79,288.85 20.7 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	100,000.00 20,711.15 79,288.85 20.7 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	100,000.00 20,711.15 79,288.85 20.7 %
5407	Reparación de Calles en el Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador	53,000.00	P E D %	53,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	53,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	53,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
4956	Construcción Sistema de Drenaje Aguas Lluvias y Colector de Descarga MEGATEC, La Unión.	45,074.00	P E D %	45,074.00 43,876.67 1,197.33 97.3 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	45,074.00 43,876.67 1,197.33 97.3 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	45,074.00 43,876.67 1,197.33 97.3 %
3180	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 1556	21,869.00	P E D %	2,516.00 2,090.19 425.81 83.1 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	2,516.00 2,090.19 425.81 83.1 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	21,869.00 18,168.45 3,700.55 83.1 %
5406	Mejoramiento de calles en Colonia Concepción, en el Municipio y Departamento de San Vicente.	20,000.00	P E D %	20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
MINSAL		34,055,943.00	P E D %	5,107,829.00 1,346,425.62 3,761,403.38	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	5,107,829.00 1,346,425.62 3,761,403.38	0.00 0.00 0.00 0.00 %	34,055,943.00 2,725,565.29 31,330,377.71

<http://192.168.83.98/servlet/INTERReporConso>

	4344	Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador	5,436,310.00	P E D %	5,436,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5,436,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5,436,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5,436,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00
		"Remodelación, Ampliación y Equipamiento de Sala de Autopsia, Morgue y Area de Oficinas Administrativas del Departamento de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de San Salvador".	1,350,195.00	P E D %	1,350,195.00 530,900.86 819,294.14 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1,350,195.00 530,900.86 819,294.14 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1,350,195.00 530,900.86 819,294.14 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1,350,195.00 530,900.86 819,294.14 0.00
	5364	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SALAS DE AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA; CIVILES, DE SENTENCIA Y DE PAZ, A NIVEL NACIONAL.	902,200.00	P E D %	902,200.00 491,229.91 410,970.09 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	902,200.00 491,229.91 410,970.09 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	902,200.00 491,229.91 410,970.09 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	902,200.00 491,229.91 410,970.09 0.00
	5365	REMEDIACIONES, AMPLIACIONES, READECUACIONES Y MEJORAS EN LOS TRIBUNALES A NIVEL NACIONAL.	808,450.00	P E D %	808,450.00 362,452.58 445,997.42 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	808,450.00 362,452.58 445,997.42 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	808,450.00 362,452.58 445,997.42 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	808,450.00 362,452.58 445,997.42 0.00
	5366	REPARACIONES MENORES A LA RED DE TRIBUNALES A NIVEL NACIONAL	500,000.00	P E D %	500,000.00 357,667.95 142,332.05 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	500,000.00 357,667.95 142,332.05 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	500,000.00 357,667.95 142,332.05 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	500,000.00 357,667.95 142,332.05 0.00
	3385	Construcción Centro Judicial Integrado de Apopa, San Salvador	350,000.00	P E D %	350,000.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	350,000.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	350,000.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	350,000.00 0.00 0.00 0.00
	4225	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR	350,000.00	P E D %	350,000.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	350,000.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	350,000.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	350,000.00 0.00 0.00 0.00
	3831	Construcción Centro Judicial Integrado de La Unión	289,360.00	P E D %	289,360.00 57,871.18 231,488.82 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	289,360.00 57,871.18 231,488.82 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	289,360.00 57,871.18 231,488.82 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	289,360.00 57,871.18 231,488.82 0.00
	4989	"Remodelaciones y Ampliaciones varias a la Red de Tribunales del Organismo Judicial a Nivel Nacional"	13,885.00	P E D %	13,885.00 13,882.39 2.61 100.00	0.00 0.00 0.00 0.00	13,885.00 13,882.39 2.61 100.00	0.00 0.00 0.00 0.00	13,885.00 13,882.39 2.61 100.00	0.00 0.00 0.00 0.00	13,885.00 13,882.39 2.61 100.00
PNC - MJSP			7,910,000.00	P E D %	7,910,000.00 18,570.06 891,429.94 2.00	0.00 0.00 0.00 0.00	7,910,000.00 18,570.06 891,429.94 2.00	0.00 0.00 0.00 0.00	7,910,000.00 18,570.06 891,429.94 2.00	0.00 0.00 0.00 0.00	7,910,000.00 18,570.06 891,429.94 2.00
	5099	Suministro e Instalación del Sistema Integral para los Centros de Atención de Emergencias 911 y AVL/GPS de la Policía Nacional Civil de	7,910,000.00	P E D %	7,910,000.00 18,570.06 891,429.94 2.00	0.00 0.00 0.00 0.00	7,910,000.00 18,570.06 891,429.94 2.00	0.00 0.00 0.00 0.00	7,910,000.00 18,570.06 891,429.94 2.00	0.00 0.00 0.00 0.00	7,910,000.00 18,570.06 891,429.94 2.00

	5631	EQUIPAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS SEIS ADUANAS DE FRONTERA DE EL SALVADOR.	150,000.00	P E D %	150,000.00 17,989.94 132,010.06 12.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 17,989.94 132,010.06 12.0 %
	5522	REPARACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓN EN EL CENTRO RECREATIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, SAN BARTOLO, ILOPANGO.	125,020.00	P E D %	125,020.00 0.00 125,020.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	125,020.00 0.00 125,020.00 0.0 %
	5506	Reparaciones en infraestructura de la Aduana en Frontera Angaité, Departamento de Santa Ana.	124,194.71	P E D %	124,194.71 101,530.96 22,663.75 81.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	124,194.71 101,530.96 22,663.75 81.8 %
	5493	Rehabilitación de las Condiciones Físicas en la Aduana de Frontera El Amatillo	115,753.24	P E D %	115,753.24 115,753.24 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	115,753.24 115,753.24 0.00 100.0 %
	5513	Reparaciones en infraestructura de la Aduana en Frontera Las Chinamas, Departamento de Ahuachapán.	102,490.00	P E D %	102,490.00 32,777.83 69,712.17 32.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	102,490.00 32,777.83 69,712.17 32.0 %
	5507	Reparaciones en infraestructura de la Aduana en Frontera El Poy, Departamento de Chalatenango.	53,829.09	P E D %	53,829.09 53,829.09 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	53,829.09 53,829.09 0.00 100.0 %
	4204	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TRIBUTARIA	2,878.00	P E D %	2,878.00 0.00 2,878.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,878.00 0.00 2,878.00 0.0 %
MARN			4,410,034.00	P E D %	489,904.00 60,902.62 429,001.38 12.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,410,034.00 223,826.18 3,696,303.82 5.7 %
	5102	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL	3,759,000.00	P E D %	429,000.00 0.00 429,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,759,000.00 0.00 3,759,000.00 0.0 %
	2881	PROGRAMA DE DESCONTAMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS	612,443.00	P E D %	22,313.00 22,311.95 1.05 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	612,443.00 223,826.18 366,303.82 37.9 %
	5348	Remodelación y Equipamiento de la Primera Planta Edificio Principal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	38,591.00	P E D %	38,591.00 38,590.67 0.33 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	38,591.00 38,590.67 0.33 100.0 %
				P	4,186,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186,580.00

ISSS			4,186,580.00	E D	0.00 0.00 0.0 %	1,370,242.59 2,816,337.41 32.7 %	0.00 0.00 0.0 %	1,370,242.59 2,816,337.41 32.7 %	0.00 0.00 0.0 %	1,370,242.59 2,816,337.41 32.7 %
	2571	ADECUACION DEL HOSPITAL SONSONATE	1,270,985.00	P E D	0.00 0.00 0.0 %	1,270,985.00 583,540.53 687,444.47 45.9 %	0.00 0.00 0.0 %	1,270,985.00 583,540.53 687,444.47 45.9 %	0.00 0.00 0.0 %	1,270,985.00 583,540.53 687,444.47 45.9 %
	5326	MEJORAMIENTO DE FARMACIAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL	649,570.00	P E D	0.00 0.00 0.0 %	649,570.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	649,570.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	649,570.00 0.00 0.0 %
	5386	READECUACION DE LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL AMATEPEC, SAN SALVADOR.	600,855.00	P E D	0.00 0.00 0.0 %	600,855.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	600,855.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	600,855.00 0.00 0.0 %
	5183	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA DE SANTA ANA.	531,700.00	P E D	0.00 0.00 0.0 %	531,700.00 350,097.45 181,602.55 65.8 %	0.00 0.00 0.0 %	531,700.00 350,097.45 181,602.55 65.8 %	0.00 0.00 0.0 %	531,700.00 350,097.45 181,602.55 65.8 %
	5313	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD MEDICA DE SANTA TECLA	400,000.00	P E D	0.00 0.00 0.0 %	400,000.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	400,000.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	400,000.00 0.00 0.0 %
	5344	ADQUISICIÓN Y READECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA CLÍNICA COMUNAL VIRGEN DEL TRANSITO, MEJICANOS, SAN SALVADOR	350,000.00	P E D	0.00 0.00 0.0 %	350,000.00 318,794.70 31,205.30 91.1 %	0.00 0.00 0.0 %	350,000.00 318,794.70 31,205.30 91.1 %	0.00 0.00 0.0 %	350,000.00 318,794.70 31,205.30 91.1 %
	5187	READECUACIÓN DEL EDIFICIO VINSAR PARA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA, SAN SALVADOR.	162,600.00	P E D	0.00 0.00 0.0 %	162,600.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	162,600.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	162,600.00 0.00 0.0 %
	5308	SUSTITUCION DE LA CUBIERTA DE TECHO DE LA TORRE ONCOLOGICA DEL ISSS	115,000.00	P E D	0.00 0.00 0.0 %	115,000.00 31,135.60 83,864.40 27.1 %	0.00 0.00 0.0 %	115,000.00 31,135.60 83,864.40 27.1 %	0.00 0.00 0.0 %	115,000.00 31,135.60 83,864.40 27.1 %
	871	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD MEDICA, SOYAPANGO.	105,870.00	P E D	0.00 0.00 0.0 %	105,870.00 86,674.31 19,195.69 81.9 %	0.00 0.00 0.0 %	105,870.00 86,674.31 19,195.69 81.9 %	0.00 0.00 0.0 %	105,870.00 86,674.31 19,195.69 81.9 %
VMVDU			4,063,855.00	P E D	0.00 0.00 0.0 %	4,063,855.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	4,063,855.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	4,063,855.00 0.00 0.0 %
	5100	DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA	4,063,855.00	P E D	0.00 0.00 0.0 %	4,063,855.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	4,063,855.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	4,063,855.00 0.00 0.0 %
FSV			3,119,165.00	P E	0.00 0.00	3,119,165.00 0.00	0.00 0.00	3,119,165.00 0.00	0.00 0.00	3,119,165.00 0.00

				D %	0.09 0.0 %	3,119,165.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	3,119,165.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	3,119,165.00 0.0 %
	4513	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RECURSOS LOGISTICOS, COMEDOR DEL PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV, SAN SALVADOR.	3,119,165.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,119,165.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,119,165.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,119,165.00 0.00 0.00 0.0 %
ILEA			2,806,405.59	P E D %	150,000.00 36,710.33 113,289.67 24.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 36,710.33 113,289.67 24.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,806,405.59 2,658,673.26 147,732.33 94.7 %
	4493	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, ILEA SAN SALVADOR"	2,806,405.59	P E D %	150,000.00 36,710.33 113,289.67 24.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 36,710.33 113,289.67 24.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,806,405.59 2,658,673.26 147,732.33 94.7 %
FONAES			2,424,079.72	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,424,079.72 2,220,882.04 203,197.68 91.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,424,079.72 2,220,882.04 203,197.68 91.6 %
	5047	TECHO Y AGUA FASE 2011	1,600,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,600,000.00 1,396,802.32 203,197.68 87.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,600,000.00 1,396,802.32 203,197.68 87.3 %
	5000	PROGRAMA TECHO Y AGUA, FASE 2010	824,079.72	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	824,079.72 824,079.72 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	824,079.72 824,079.72 0.00 0.00
MIREX			1,978,307.21	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,978,307.21 1,978,307.21 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,978,307.21 1,978,307.21 0.00 0.00
	5373	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACION SUPERIOR PARA LA FORMACION DIPLOMATICA IEESFORD	1,745,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,745,000.00 1,745,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,745,000.00 1,745,000.00 0.00 0.00
	4992	"PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS Y FRUTAS EN CUATRO CANTONES DEL MUNICIPIO DE CALUCO, SONSONATE"	158,356.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	158,356.00 158,356.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	158,356.00 158,356.00 0.00 0.00
	3853	MICROPROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL 2005	74,951.21	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	74,951.21 74,951.21 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	74,951.21 74,951.21 0.00 0.00
SE - MJSP			1,912,000.00	P E D %	912,000.00 782,000.00 130,000.00 85.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	912,000.00 782,000.00 130,000.00 85.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,912,000.00 782,000.00 1,130,000.00 40.9 %

	5136	Programa de Prevención de la Violencia y la Delincuencia	1,130,000.00	P E D %	130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
	5517	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN LA ZONA ORIENTAL. DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.	782,000.00	P E D %	782,000.00 0.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	782,000.00 0.00 0.00 0.00 100.0 %
CEPA			1,375,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,375,000.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,375,000.00 0.00 0.00 0.00 %
	5583	Rehabilitación del pavimento asfáltico de calle perimetral entre SEI y acceso 6 del Aeropuerto Internacional El Salvador, Fase I	450,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	450,000.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	450,000.00 0.00 0.00 0.00 %
	4192	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO No. 3, DEL PUERTO DE ACAJUTLA	325,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	325,000.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	325,000.00 0.00 0.00 0.00 %
	5632	Remodelación y Equipamiento de Servicios Sanitarios del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional El Salvador	319,200.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	319,200.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	319,200.00 0.00 0.00 0.00 %
	5610	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR	180,800.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	180,800.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	180,800.00 0.00 0.00 0.00 %
	5231	REHABILITACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE LOS MUELLES A, B Y C DEL PUERTO DE ACAJUTLA FASE II	100,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	100,000.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	100,000.00 0.00 0.00 0.00 %
DGCP - MJSP			724,005.00	P E D %	724,005.00 97,617.06 626,387.94 13.5 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	724,005.00 97,617.06 626,387.94 13.5 %
	5520	Obras de Reforzamiento de Seguridad Pasiva y Control del Centro Penal de Zacatecoluca	285,885.00	P E D %	285,885.00 97,617.06 188,267.94 34.1 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	285,885.00 97,617.06 188,267.94 34.1 %
	5518	Readecuación del Área de Visitas de los Centros Penitenciarios de Quezaltepeque y Ciudad	186,995.00	P E D %	186,995.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	186,995.00 0.00 0.00 0.00 %

		Barrios		%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5582	Construcción y readecuación de instalaciones del Centro de Formación de la Escuela Penitenciaria en la Penitenciaría Central La Esperanza, Dpto. San Salvador	135,600.00	P E D %	135,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	135,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	5519	Reparación e impermeabilización de techos en el Centro Penitenciario de Zacatecoluca	115,525.00	P E D %	115,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	115,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MTYS			500,000.00	P E D %	500,000.00 427,665.47 72,334.53 85.5 %	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	500,000.00 427,665.47 72,334.53 85.5 %
	5191	Construcción, Reconstrucción, Modernización y Equipamiento en Centro de Recreación Obrera, Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Constitución 1950, Lago de Coatepeque Santa Ana	500,000.00	P E D %	500,000.00 427,665.47 72,334.53 85.5 %	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	500,000.00 427,665.47 72,334.53 85.5 %
ISNA			441,855.00	P E D %	441,855.00 21,903.86 419,951.14 5.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	441,855.00 21,903.86 419,951.14 5.0 %
	4830	REPARACION EDIFICIO LA ESTRELLA, DELEGACION CENTRAL ISNA (FASE II)	226,673.00	P E D %	226,673.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	226,673.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	4511	REPARACIONES Y MEJORAS EN CENTRO DE REINSENCION EL ESPINO, AHUACHAPAN (Primera Fase)	89,500.00	P E D %	89,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	89,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	5571	Reparaciones y Mejoras para el Centro de Inserción Social Sendero de Libertad Ilobasco Departamento de Cabañas.	82,647.00	P E D %	82,647.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	82,647.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	4512	REPARACION DE TECHOS Y MEJORAS, CENTRO DE REINSENCION SOCIAL DE TONACATEPEQUE.	43,035.00	P E D %	43,035.00 21,903.86 21,131.14 50.9 %	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	43,035.00 21,903.86 21,131.14 50.9 %
AL			250,000.00	P E D %	250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	5222	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO II	250,000.00	P E D %	250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Def. del			245,140.00	P E	245,140.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	245,140.00 0.00

Consum.			D	28,205.00	0.00	0.00	28,205.00	0.00	216,935.00	0.00	216,935.00	0.00	245,140.00	0.00
	5133	FORTALECIENDO LA ATENCION A CONSUMIDORES: DESCENTRALIZANDO SERVICIOS Y MEJORANDO LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA	P E D	28,205.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	28,205.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	216,935.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	216,935.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	245,140.00 0.00 0.00	0.00
BOMBER - MIOB			P E D	166,803.00 72.86 166,730.14	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	166,803.00 72.86 166,730.14	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	166,803.00 72.86 166,730.14	0.00
	4998	Construcción de nave para albergar motobombas del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Estación Central.	P E D	129,428.00 0.00 129,428.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	129,428.00 0.00 129,428.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	129,428.00 0.00 129,428.00	0.00
	4999	Construcción y Equipamiento de dormitorios para el personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Estación Central.	P E D	37,375.00 72.86 37,302.14	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	37,375.00 72.86 37,302.14	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	37,375.00 72.86 37,302.14	0.00
ISDEMU			P E D	103,500.00 65,144.75 38,355.25	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	103,500.00 65,144.75 38,355.25	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	103,500.00 65,144.75 38,355.25	0.00
	5556	MEJORA DE LA OFICINA DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	P E D	73,500.00 65,144.75 8,355.25	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	73,500.00 65,144.75 8,355.25	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	73,500.00 65,144.75 8,355.25	0.00
	5555	Readequación de Espacio y Acabados de Cocina y Oficinas de ISDEMU San Salvador	P E D	30,000.00 0.00 30,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	30,000.00 0.00 30,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	30,000.00 0.00 30,000.00	0.00
PROYECTOS REGULARES			P E D	598,143,136.37 89,948,659.00 42,109,934.11 47,838,724.89	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	598,143,136.37 89,948,659.00 42,109,934.11 47,838,724.89	0.00 0.00 0.00 0.00	422,107,883.86 248,321,465.26 20,844,903.79 227,476,561.47	0.00 0.00 0.00 0.00	422,107,883.86 248,321,465.26 20,844,903.79 227,476,561.47	0.00 0.00 0.00 0.00	598,143,136.37 240,933,815.14 357,209,321.23 40.3 %	0.00
FONAVIPO			P E D	5,769,170.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,769,170.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,769,170.00 3,337,278.16 2,431,891.84	0.00 0.00 0.00	5,769,170.00 3,337,278.16 2,431,891.84	0.00 0.00 0.00	5,769,170.00 3,337,278.16 2,431,891.84	0.00
	5245	CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	P E D	2,251,060.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,251,060.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,251,060.00 1,924,633.57 326,426.43	0.00 0.00 0.00	2,251,060.00 1,924,633.57 326,426.43	0.00 0.00 0.00	2,251,060.00 1,924,633.57 326,426.43	0.00
	5371	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de	P E D	1,595,675.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,595,675.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,595,675.00 433,835.76 1,161,839.24	0.00 0.00 0.00	1,595,675.00 433,835.76 1,161,839.24	0.00 0.00 0.00	1,595,675.00 433,835.76 1,161,839.24	0.00

		San Vicente		%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	27.2 %	0.0 %	27.2 %	27.2 %
	5370	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Nuevo Verapaz, Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente	1,314,529.35	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,314,529.35 732,798.83 581,730.52 55.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,314,529.35 732,798.83 581,730.52 55.7 %	1,314,529.35 732,798.83 581,730.52 55.7 %
	5372	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Villas de San Pedro, Municipio de San Pedro Masahual, Departamento de La Paz	607,905.65	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	607,905.65 246,010.00 361,895.65 40.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	607,905.65 246,010.00 361,895.65 40.5 %	607,905.65 246,010.00 361,895.65 40.5 %
FOVIAL			5,614,600.08	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,614,600.08 2,377,272.79 3,237,327.29 42.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,614,600.08 2,377,272.79 3,237,327.29 42.3 %	5,614,600.08 2,377,272.79 3,237,327.29 42.3 %
	5521	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN LA ZONA DEL PUENTE SOBRE EL RIO EL DESAGUE, EST. 31+720 DE LA CARRETERA RN03E, CANDELARIA, CUSCATLAN	802,526.82	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	802,526.82 13,763.40 788,763.42 1.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	802,526.82 13,763.40 788,763.42 1.7 %	802,526.82 13,763.40 788,763.42 1.7 %
	5509	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN KM 124+000 DE LA CARRETERA CA08W, FRONTERA LAS CHINAMAS	745,534.38	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	745,534.38 71,452.69 674,081.69 9.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	745,534.38 71,452.69 674,081.69 9.6 %	745,534.38 71,452.69 674,081.69 9.6 %
	5621	CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION EN EST. 0+500 DE LA RUTA SAN19W:SAN21E-MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	691,662.34	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	691,662.34 0.00 691,662.34 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	691,662.34 0.00 691,662.34 0.0 %	691,662.34 0.00 691,662.34 0.0 %
	5280	REPARACION DE OBRA DE PASO EN EST. 1+060 DE RUTA RN02E, SOYAPANGO, SAN SALVADOR	527,969.23	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	527,969.23 411,347.76 116,621.47 77.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	527,969.23 411,347.76 116,621.47 77.9 %	527,969.23 411,347.76 116,621.47 77.9 %
	5379	REPARACIÓN DE CÁRCAVAS EN KM 17+400 Y KM 18+400 DE LA RUTA RN05S, SANTO TOMAS, SAN SALVADOR	445,513.50	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	445,513.50 192,065.23 253,448.27 43.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	445,513.50 192,065.23 253,448.27 43.1 %	445,513.50 192,065.23 253,448.27 43.1 %
	5515	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS PAVIMENTADAS DEL DEPARTAMENTO DE USulután	408,612.80	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	408,612.80 217,126.24 191,486.56 53.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	408,612.80 217,126.24 191,486.56 53.1 %	408,612.80 217,126.24 191,486.56 53.1 %
	5516	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS NO PAVIMENTADAS DEL	388,570.67	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	388,570.67 336,301.27 52,269.40	0.00 0.00 0.00 0.0 %	388,570.67 336,301.27 52,269.40	388,570.67 336,301.27 52,269.40

		DEPARTAMENTO DE USulután		%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	86.5 %	0.0 %	86.5 %	86.5 %
	5622	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION EN EJE 73-B (BOULEVARD VENEZUELA), EST. 1+400, SAN SALVADOR	376,864.31	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	376,864.31 0.00 376,864.31 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	376,864.31 0.00 376,864.31 0.0 %	86.5 %
	5508	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN LA RUTA CA02E, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y LA PAZ	303,386.18	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	303,386.18 258,125.70 45,260.48 85.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	303,386.18 258,125.70 45,260.48 85.1 %	86.5 %
	5281	REPARACION DE OBRA DE PASO EN EJE 81 (ZOOLOGICO NACIONAL), SAN SALVADOR	262,529.14	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	262,529.14 258,539.77 3,989.37 98.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	262,529.14 258,539.77 3,989.37 98.5 %	86.5 %
	5282	REPARACION DE CARCAVA EN KM. 37+450 DE RUTA RN05E, SAN LUIS TALPA, LA PAZ	235,607.09	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	235,607.09 227,323.30 8,283.79 96.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	235,607.09 227,323.30 8,283.79 96.5 %	86.5 %
	5291	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS PAVIMENTADAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD, SAN SALVADOR, CUSCATLÁN Y CABAÑAS	186,882.24	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	186,882.24 186,882.24 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	186,882.24 186,882.24 0.00 100.0 %	86.5 %
	5328	REPARACIÓN DE CÁRCAVA EN EST. 28+205 DE LA RUTA RN03E, SANTA CRUZ ANALQUITO, CUSCATLÁN	59,010.40	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	59,010.40 34,034.73 24,975.67 57.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	59,010.40 34,034.73 24,975.67 57.7 %	86.5 %
	5237	REPARACIÓN DE CÁRCAVA EN EST. 27+111 DE LA RUTA RN03E, SANTA CRUZ ANALQUITO, CUSCATLÁN	46,790.23	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	46,790.23 46,790.22 0.01 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	46,790.23 46,790.22 0.01 100.0 %	86.5 %
	5232	REPARACION DE OBRA DE PASO EN EST. 18+200 EN RUTA PAZ07, SAN PEDRO NONUALCO, LA PAZ	46,122.30	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	46,122.30 46,122.27 0.03 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	46,122.30 46,122.27 0.03 100.0 %	86.5 %
	5234	REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO JIBOA EN RUTA RN04, EL ROSARIO, LA PAZ	42,811.13	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	42,811.13 42,811.13 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	42,811.13 42,811.13 0.00 100.0 %	86.5 %
	5272	REPARACIÓN DE CÁRCAVAS EN EST. 1+130 DE LA RUTA PAZ17E, PARAISO DE OSORIO, LA PAZ	22,436.85	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	22,436.85 22,436.85 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	22,436.85 22,436.85 0.00 100.0 %	86.5 %
	5235	REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO ACAHUAPA, AGUAS ARRIBA, EN LA RUTA RN04E, SAN VICENTE	12,520.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,520.00 3,758.53 8,761.47 30.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,520.00 3,758.53 8,761.47 30.0 %	86.5 %

<http://192.168.83.98/servlet/INTERReportConso>

	5345	Mitigación en Zona de Reparto El Carmen, Soyapango, San Salvador	311,197.00	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,839.24	0.00	251,839.24	251,839.24
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,357.76	0.00	59,357.76	59,357.76
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	80.9 %	0.0 %	80.9 %	80.9 %
	5337	Construcción de Obras para Mitigación en Quebrada Arenal Tutunichapa, Colonia Santa Eugenia, Barrio La Esperanza, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador	200,000.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	30.0 %	0.0 %	30.0 %	30.0 %
	5330	Mitigación de Obras de Campaña 2000, Municipio de Cuscatancingo, San Salvador	187,378.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,378.00	0.00	187,378.00	187,378.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,213.40	0.00	56,213.40	56,213.40
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.60	0.00	131,164.60	131,164.60
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	30.0 %	0.0 %	30.0 %	30.0 %
	5320	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN AGUAS ABAJO DEL PUENTE No. 2, ARENAL SECO, NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	137,915.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,915.00	0.00	137,915.00	137,915.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,374.50	0.00	41,374.50	41,374.50
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,540.50	0.00	96,540.50	96,540.50
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	30.0 %	0.0 %	30.0 %	30.0 %
	4982	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN EN TALUD NOROESTE DEL REPARTO LAS CAÑAS, ILOPANGO, SAN SALVADOR.	122,261.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,261.00	0.00	122,261.00	122,261.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,260.63	0.00	122,260.63	122,260.63
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.37	0.37
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %
MARN			5,214,906.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214,906.00	0.00	5,214,906.00	5,214,906.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,386.96	0.00	4,490,386.96	4,490,386.96
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,519.04	0.00	724,519.04	724,519.04
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	86.1 %	0.0 %	86.1 %	86.1 %
	5229	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE RIESGO	5,214,906.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214,906.00	0.00	5,214,906.00	5,214,906.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,386.96	0.00	4,490,386.96	4,490,386.96
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,519.04	0.00	724,519.04	724,519.04
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	86.1 %	0.0 %	86.1 %	86.1 %
ANDA			1,980,868.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,868.00	0.00	1,980,868.00	1,980,868.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,910.54	0.00	1,788,910.54	1,788,910.54
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,957.46	0.00	191,957.46	191,957.46
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	90.3 %	0.0 %	90.3 %	90.3 %
	5249	RECONSTRUCCION Y HABILITACION DE PLANTA DE BOMBEO CACAHUATAL, SAN RAMON, CUSCATLAN.	699,656.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,656.00	0.00	699,656.00	699,656.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,802.94	0.00	683,802.94	683,802.94
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,853.06	0.00	15,853.06	15,853.06
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	97.7 %	0.0 %	97.7 %	97.7 %
	5253	RECONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUA POTABLE CHALAPAN, SAN PEDRO PERULAPAN, CUSCATLAN.	418,528.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,528.00	0.00	418,528.00	418,528.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,835.38	0.00	404,835.38	404,835.38
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,692.62	0.00	13,692.62	13,692.62
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	96.7 %	0.0 %	96.7 %	96.7 %
	5248	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN POZO DE RESIDENCIAL LIBERTAD, TONACATEPEQUE, SAN SALVADOR.	324,052.00	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,052.00	0.00	324,052.00	324,052.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,192.41	0.00	320,192.41	320,192.41
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859.59	0.00	3,859.59	3,859.59
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	98.8 %	0.0 %	98.8 %	98.8 %
		RECONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUA POTABLE		P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,536.00	0.00	188,536.00	188,536.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,876.18	0.00	125,876.18	125,876.18

	5250	POZO APULO, ILOPANGO, SAN SALVADOR.	188,536.00	D %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	62,659.82 66.8 %	0.00 0.0 %	62,659.82 66.8 %	62,659.82 66.8 %
	5266	RECONSTRUCCION DE VIGA CANAL PARA TUBERIA DE 60" DE AGUAS NEGRAS, BARRIO LA VEGA, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.	172,514.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	172,514.00 149,138.37 23,375.63 86.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	172,514.00 149,138.37 23,375.63 86.5 %	172,514.00 149,138.37 23,375.63 86.5 %
	5329	CAMBIO DE DIRECCIÓN DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS EN CALLE FRANCISCO MENENDEZ, BARRIO SANTA ANITA, SAN SALVADOR.	46,454.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	46,454.00 0.00 46,454.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	46,454.00 0.00 46,454.00 0.0 %	46,454.00 0.00 46,454.00 0.0 %
	5254	RECONSTRUCCION DE LINEA DE IMPELENCIA Y PLANTA DE AGUA POTABLE, EL POTRERITO, TEPETITAN, SAN VICENTE.	46,259.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	46,259.00 46,259.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	46,259.00 46,259.00 0.00 100.0 %	46,259.00 46,259.00 0.00 100.0 %
	5251	RECONSTRUCCION DE LINEA DE IMPELENCIA Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PLANTA CHILAMA, LA LIBERTAD, LA LIBERTAD.	40,654.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	40,654.00 36,382.32 4,271.68 89.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	40,654.00 36,382.32 4,271.68 89.5 %	40,654.00 36,382.32 4,271.68 89.5 %
	5252	RECONSTRUCCION DE LINEA DE IMPELENCIA DE AGUA POTABLE, SAN SEBASTIAN, SAN VICENTE.	24,195.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	24,195.00 19,584.92 4,610.08 80.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	24,195.00 19,584.92 4,610.08 80.9 %	24,195.00 19,584.92 4,610.08 80.9 %
	5247	REUBICACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE PROTECCION, ILOPANGO, SAN SALVADOR.	20,020.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	20,020.00 2,839.02 17,180.98 14.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	20,020.00 2,839.02 17,180.98 14.2 %	20,020.00 2,839.02 17,180.98 14.2 %
CEPA			1,500,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,500,000.00 77,862.39 1,422,137.61 5.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,500,000.00 77,862.39 1,422,137.61 5.2 %	1,500,000.00 77,862.39 1,422,137.61 5.2 %
	4803	Obras de Mitigación en el Aeropuerto Internacional Ilopango, FASE I.	1,500,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,500,000.00 77,862.39 1,422,137.61 5.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,500,000.00 77,862.39 1,422,137.61 5.2 %	1,500,000.00 77,862.39 1,422,137.61 5.2 %
MINSAL			1,473,695.73	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,473,695.73 196,194.39 1,277,501.34 13.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,473,695.73 196,194.39 1,277,501.34 13.3 %	1,473,695.73 196,194.39 1,277,501.34 13.3 %
	4890	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La Libertad, La Libertad	1,056,559.95	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,056,559.95 32,848.43 1,023,711.52 3.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,056,559.95 32,848.43 1,023,711.52 3.1 %	1,056,559.95 32,848.43 1,023,711.52 3.1 %
	4878	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután	158,728.77	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	158,728.77 17,255.26 141,473.51 10.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	158,728.77 17,255.26 141,473.51 10.9 %	158,728.77 17,255.26 141,473.51 10.9 %
		REPARACIÓN DE LA											

5125	INFRAESTRUCTURA DANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DEL HOSPITAL NACIONAL "ENF. ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO, SAN BARTOLO, ILOPANGO, SAN SALVADOR	P E D %	47,199.29	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	47,199.29 47,199.29 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	47,199.29 47,199.29 0.00 100.0 %
5124	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD SAN LUIS TALPA, LA PAZ	P E D %	41,609.76	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	41,609.76 5,095.30 36,514.46 12.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	41,609.76 5,095.30 36,514.46 12.2 %
5129	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD VERAPAZ, SAN VICENTE	P E D %	25,491.67	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	25,491.67 13,929.17 11,562.50 54.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	25,491.67 13,929.17 11,562.50 54.6 %
5112	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD APOPA, SAN SALVADOR	P E D %	12,157.20	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,157.20 6,805.00 5,352.20 56.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,157.20 6,805.00 5,352.20 56.0 %
4853	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martin, San Salvador	P E D %	12,051.35	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,051.35 2,895.00 9,156.35 24.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,051.35 2,895.00 9,156.35 24.0 %
5334	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA CANOA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USulután	P E D %	10,975.30	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	10,975.30 1,719.00 9,256.30 15.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	10,975.30 1,719.00 9,256.30 15.7 %
4852	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador	P E D %	10,280.90	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	10,280.90 9,755.00 525.90 94.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	10,280.90 9,755.00 525.90 94.9 %
5322	Construcción de muros de contención en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos por daños ocasionados por la tormenta Tropical IDA, departamento de San Salvador	P E D %	10,200.00	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	10,200.00 10,200.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	10,200.00 10,200.00 0.00 100.0 %
5333	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SISIGUAYO POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USulután	P E D %	8,626.75	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,626.75 1,824.65 6,802.10 21.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,626.75 1,824.65 6,802.10 21.2 %
5335	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NUEVO AMANECER POR LA	P E D %	8,362.90	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,362.90 1,774.65 6,588.25	0.00 0.00 0.00 0.0 %	8,362.90 1,774.65 6,588.25

		TORMENTA TROPICAL IDA, USulután.		%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	21.2 %	0.0 %	21.2 %	21.2 %
	5106	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD CONCEPCIÓN, SAN SALVADOR	6,746.14	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,746.14 6,207.04 539.10 92.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,746.14 6,207.04 539.10 92.0 %	6,746.14 6,207.04 539.10 92.0 %
	5332	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NUEVA GRANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USulután	6,000.75	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,000.75 350.00 5,650.75 5.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,000.75 350.00 5,650.75 5.8 %	6,000.75 350.00 5,650.75 5.8 %
	5109	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD PANCHIMALCO, SAN SALVADOR	5,686.05	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,686.05 5,381.05 305.00 94.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,686.05 5,381.05 305.00 94.6 %	5,686.05 5,381.05 305.00 94.6 %
	4856	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador	5,666.35	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,666.35 2,705.00 2,961.35 47.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,666.35 2,705.00 2,961.35 47.7 %	5,666.35 2,705.00 2,961.35 47.7 %
	5119	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD SANTO TOMÁS, SAN SALVADOR	5,578.95	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,578.95 3,159.00 2,419.95 56.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,578.95 3,159.00 2,419.95 56.6 %	5,578.95 3,159.00 2,419.95 56.6 %
	4848	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador	5,085.55	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,085.55 4,533.55 552.00 89.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,085.55 4,533.55 552.00 89.1 %	5,085.55 4,533.55 552.00 89.1 %
	4845	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Popollan, Apopa, San Salvador	4,241.35	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,241.35 2,460.00 1,781.35 58.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,241.35 2,460.00 1,781.35 58.0 %	4,241.35 2,460.00 1,781.35 58.0 %
	5331	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CORRAL DE MULAS POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USulután	4,127.85	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,127.85 2,039.00 2,088.85 49.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,127.85 2,039.00 2,088.85 49.4 %	4,127.85 2,039.00 2,088.85 49.4 %
	5103	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA CASA DE SALUD BARRANCONES,	3,689.70	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,689.70 1,274.00 2,415.70 34.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,689.70 1,274.00 2,415.70 34.5 %	3,689.70 1,274.00 2,415.70 34.5 %

		la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador		D %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	133.00 74.3 %	0.00 0.0 %	133.00 74.3 %	133.00 74.3 %
CENTA			1,233,365.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,233,365.00 1,078,325.58 155,039.42 87.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,233,365.00 1,078,325.58 155,039.42 87.4 %	1,233,365.00 1,078,325.58 155,039.42 87.4 %
	5298	Rehabilitación de la Producción y Comercialización de Hortelizas en Zonas Afectadas por el Huracán Ida	430,572.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	430,572.00 338,514.43 92,057.57 78.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	430,572.00 338,514.43 92,057.57 78.6 %	430,572.00 338,514.43 92,057.57 78.6 %
	5299	Producción Artesanal de Semilla de Granos Básicos en Apoyo a los Productores y Productoras Afectados por el Huracán Ida	418,036.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	418,036.00 366,363.98 51,672.02 87.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	418,036.00 366,363.98 51,672.02 87.6 %	418,036.00 366,363.98 51,672.02 87.6 %
	5294	Recuperación de la Producción Frutícola en Zonas Afectadas por el Huracán Ida	364,697.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	364,697.00 353,389.28 11,307.72 96.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	364,697.00 353,389.28 11,307.72 96.9 %	364,697.00 353,389.28 11,307.72 96.9 %
	5296	Recuperación de la Producción Apícola en Zonas Afectadas por el Huracán Ida	20,060.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	20,060.00 20,057.89 2.11 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	20,060.00 20,057.89 2.11 100.0 %	20,060.00 20,057.89 2.11 100.0 %
MIGOB			1,077,865.10	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,077,865.10 471,864.22 606,000.88 43.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,077,865.10 471,864.22 606,000.88 43.8 %	1,077,865.10 471,864.22 606,000.88 43.8 %
	5277	Mejoramiento de Infraestructura de 9 Gobernaciones Departamentales a nivel nacional	389,949.69	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	389,949.69 47,876.34 342,073.35 12.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	389,949.69 47,876.34 342,073.35 12.3 %	389,949.69 47,876.34 342,073.35 12.3 %
	5544	Adquisición y Adecuación de Inmuebles para las Gobernaciones Departamentales de Sonsonate y Anhuachapán	300,000.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	300,000.00 300,000.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	300,000.00 300,000.00 0.00 100.0 %	300,000.00 300,000.00 0.00 100.0 %
	5275	Adquisición de equipo par las Gobernaciones Departamentales, Dirección de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y Cuerpo de Bomberos del Ministerio de Gobernación	225,959.59	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	225,959.59 39,974.41 185,985.18 17.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	225,959.59 39,974.41 185,985.18 17.7 %	225,959.59 39,974.41 185,985.18 17.7 %
	5295	Fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Ministerio de Gobernación	122,248.78	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	122,248.78 44,408.02 77,840.76 36.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	122,248.78 44,408.02 77,840.76 36.3 %	122,248.78 44,408.02 77,840.76 36.3 %
	5278	Fortalecimiento de la Flotilla Vehicular en las Gobernaciones Departamentales, Comisiones Técnicas de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos a nivel nacional.	39,605.45	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	39,605.45 39,605.45 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	39,605.45 39,605.45 0.00 100.0 %	39,605.45 39,605.45 0.00 100.0 %

		Construcción de las Oficinas Centrales de la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en San Salvador	101.59	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	101.59 0.00 101.59 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	101.59 0.00 101.59 0.0 %	101.59 0.00 101.59 0.0 %
MAG	5279		698,017.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	698,017.00 467,628.79 230,388.21 67.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	698,017.00 467,628.79 230,388.21 67.0 %	698,017.00 467,628.79 230,388.21 67.0 %
	5283	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE EN DISTRITOS DE RIEGO	298,337.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	298,337.00 297,597.48 739.52 99.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	298,337.00 297,597.48 739.52 99.8 %	298,337.00 297,597.48 739.52 99.8 %
	5300	REACTIVACION DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION ACUICOLA Y ENTREGA DE POST-LARVAS DE CAMARON MARINO, A COOPERATIVAS CAMARONERAS DEL BAJO LEMPA AFECTADAS POR LA DEPRESION TROPICAL IDA	228,026.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	228,026.00 33,072.25 194,953.75 14.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	228,026.00 33,072.25 194,953.75 14.5 %	228,026.00 33,072.25 194,953.75 14.5 %
	5284	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS RIOS LEMPA, GRANDE DE SAN MIGUEL, PAZ Y JIBOA	112,463.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	112,463.00 112,179.70 283.30 99.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	112,463.00 112,179.70 283.30 99.7 %	112,463.00 112,179.70 283.30 99.7 %
	5297	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN COOPERATIVAS DE LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	43,977.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	43,977.00 9,695.95 34,281.05 22.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	43,977.00 9,695.95 34,281.05 22.0 %	43,977.00 9,695.95 34,281.05 22.0 %
	5287	ESTABLECIMIENTO DE OPORTUNIDADES PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE ZONAS AFECTADAS POR EL HURACAN IDA	15,214.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	15,214.00 15,083.41 130.59 99.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	15,214.00 15,083.41 130.59 99.1 %	15,214.00 15,083.41 130.59 99.1 %
BOMBER - MIGOB			222,805.41	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	222,805.41 1,876.99 220,928.42 0.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	222,805.41 1,876.99 220,928.42 0.8 %	222,805.41 1,876.99 220,928.42 0.8 %
	5270	Adquisición de equipo para el Cuerpo de Bomberos de El Salvador a nivel nacional	222,805.41	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	222,805.41 1,876.99 220,928.42 0.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	222,805.41 1,876.99 220,928.42 0.8 %	222,805.41 1,876.99 220,928.42 0.8 %
MINED			218,995.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	218,995.00 0.00 218,995.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	218,995.00 0.00 218,995.00 0.0 %	218,995.00 0.00 218,995.00 0.0 %
		Reconstrucción y Rehabilitación de Centros		P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	218,995.00 0.00 218,995.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	218,995.00 0.00 218,995.00 0.0 %	218,995.00 0.00 218,995.00 0.0 %

	5271	Escolares Afectados por la Tornado IDA	218,995.00	D %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	218,995.00	0.00	0.00 %	218,995.00	0.00	0.00 %	218,995.00
VMVDU			12,668.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	12,668.00	0.00	0.00 %	12,668.00	0.00	0.00 %	12,668.00
		PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA SECTORES VULNERABLES EN 5 DEPARTAMENTOS AFECTADOS POR LA TORMENTA IDA	12,668.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	12,668.00	0.00	0.00 %	12,668.00	0.00	0.00 %	12,668.00
IDA			30,561,002.32	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	30,561,002.32	0.00	0.00 %	30,561,002.32	0.00	0.00 %	30,561,002.32
FODES	5087	Inversión Municipal a través del FODES 2011	204,233,140.00	P E D %	178,733,140.00 178,733,140.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	204,233,140.00	0.00	0.00 %	204,233,140.00	0.00	0.00 %	204,233,140.00
TOTAL PAIP SIN PROVISIONES			832,937,278.69	P E D %	268,681,799.00 220,843,074.11 47,838,724.89 82.2 %	85,986,593.51 34,369,754.73 51,616,838.78 40.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	832,937,278.69	0.00	0.00 %	832,937,278.69	0.00	0.00 %	832,937,278.69
FOVIAL			25,244,534.13	P E D %	8,598,705.61 6,987,069.59 1,611,636.02 81.3 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	25,244,534.13	0.00	0.00 %	25,244,534.13	0.00	0.00 %	25,244,534.13
	4788	Mejoramiento del Camino Rural USU27E, entre Cantón La Canoa (Et. USU08S) - Corral de Mulas, Usulután	9,245,821.95	P E D %	933,643.68 801,412.48 132,231.20 85.8 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	9,245,821.95	0.00	0.00 %	9,245,821.95	0.00	0.00 %	9,245,821.95
	4782	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2010	6,570,267.21	P E D %	6,570,267.21 5,379,670.55 1,190,596.66 81.9 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	6,570,267.21	0.00	0.00 %	6,570,267.21	0.00	0.00 %	6,570,267.21
	4490	Mejoramiento del Camino Rural UN16S: Tramo entre Bolívar-San Jose La Fuente, La Union	1,651,378.69	P E D %	233,067.63 182,652.93 50,414.70 78.4 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,651,378.69	0.00	0.00 %	1,651,378.69	0.00	0.00 %	1,651,378.69
	5235	REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO ACAHUAPA, AGUAS ARRIBA, EN LA RUTA RN04E, SAN VICENTE	1,635,840.59	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,635,840.59	0.00	0.00 %	1,635,840.59	0.00	0.00 %	1,635,840.59
	4771	Mejoramiento Camino Rural AHU24S/AHU25S, Entre: Km. 151 Carretera El Litoral (CA02W) - Ganita Palmera. Ahuachapán.	968,616.93	P E D %	105,755.80 2,821.46 102,934.34 2.7 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	968,616.93	0.00	0.00 %	968,616.93	0.00	0.00 %	968,616.93
	4794	Mejoramiento Camino Rural UNI22N, Tramo Nueva Esparta - Polorós, La Unión	866,029.42	P E D %	135,671.02 291.51 135,379.51 0.2 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	866,029.42	0.00	0.00 %	866,029.42	0.00	0.00 %	866,029.42

4772	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2010	609,485.69	P E D %	609,485.69 609,485.69 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	609,485.69 609,485.69 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	609,485.69 609,485.69 0.00 100.0 %
5289	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS PAVIMENTADAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, SAN VICENTE Y USulután	577,555.72	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	577,555.72 577,555.70 0.02 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	577,555.72 577,555.70 0.02 100.0 %	577,555.72 577,555.70 0.02 100.0 %
5292	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS NO PAVIMENTADAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD, SAN SALVADOR, CUSCATLÁN Y CABAÑAS	478,061.36	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	478,061.36 478,061.36 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	478,061.36 478,061.36 0.00 100.0 %	478,061.36 478,061.36 0.00 100.0 %
5291	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA IDA EN VÍAS PAVIMENTADAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD, SAN SALVADOR, CUSCATLÁN Y CABAÑAS	373,754.04	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	373,754.04 373,754.04 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	373,754.04 373,754.04 0.00 100.0 %	373,754.04 373,754.04 0.00 100.0 %
5236	REPARACIÓN DE CÁRCAVA EN EST. 23+682 DE LA RUTA RN03E, SAN EMIGDIO, LA PAZ	325,939.35	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	325,939.35 304,579.73 21,359.62 93.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	325,939.35 304,579.73 21,359.62 93.4 %	325,939.35 304,579.73 21,359.62 93.4 %
5274	REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO JIBOA EN LA RUTA CA02E, SAN PEDRO MASAHUAT, LA PAZ	298,040.93	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	298,040.93 280,365.53 17,675.40 94.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	298,040.93 280,365.53 17,675.40 94.1 %	298,040.93 280,365.53 17,675.40 94.1 %
5328	REPARACIÓN DE CÁRCAVA EN EST. 28+205 DE LA RUTA RN03E, SANTA CRUZ ANALQUITO, CUSCATLÁN	242,651.75	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	242,651.75 219,978.64 22,673.11 90.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	242,651.75 219,978.64 22,673.11 90.7 %	242,651.75 219,978.64 22,673.11 90.7 %
5243	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN EST. 19+621 DE LA RUTA RN03E, SAN MIGUEL TEPEZONTES, LA PAZ	216,284.55	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	216,284.55 212,086.57 4,197.98 98.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	216,284.55 212,086.57 4,197.98 98.1 %	216,284.55 212,086.57 4,197.98 98.1 %
5240	REPARACIÓN DE CÁRCAVA EN EST. 27+597 DE LA RUTA RN03E, SANTA CRUZ ANALQUITO, CUSCATLÁN	196,630.53	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	196,630.53 191,506.52 5,124.01 97.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	196,630.53 191,506.52 5,124.01 97.4 %	196,630.53 191,506.52 5,124.01 97.4 %
5272	REPARACIÓN DE CÁRCAVAS EN EST. 1+130 DE LA RUTA PAZ17E, PARAISO DE OSORIO, LA PAZ	158,918.82	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	158,918.82 154,720.88 4,197.94 97.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	158,918.82 154,720.88 4,197.94 97.4 %	158,918.82 154,720.88 4,197.94 97.4 %
	CONSTRUCCION DE APOYOS PARA PUENTES		P E	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	129,770.87 80,762.33	0.00 0.00	129,770.87 80,762.33	129,770.87 80,762.33

	5383	PROVISIONALES DE EMERGENCIA, ETAPA 1	129,770.87	D	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,008.54	62.2 %	49,008.54	62.2 %
	5234	REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO JIBOA EN RUTA RN04, EL ROSARIO, LA PAZ	124,572.93	P	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,572.93	100.0 %	124,572.93	100.0 %
	5273	REPARACIÓN DE CARCAVA EST. 19+900 EN LA RUTA CUS11N, TENANCINGO, CUSCATLÁN	119,535.31	P	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,535.31	100.0 %	119,535.31	100.0 %
	4488	Administración del Programa (Unidad Ejecutora)		P	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,943.49	92.8 %	110,943.49	92.8 %
	5232	REPARACION DE OBRA DE PASO EN EST. 18+200 EN RUTA PAZ07, SAN PEDRO NONUALCO, LA PAZ	94,020.08	P	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,205.50	88.62 %	83,205.50	88.62 %
	5241	REPARACIÓN DE CARCAVA EN EST. 28+036 DE LA RUTA RN03E, SANTA CRUZ ANALQUITO, CUSCATLÁN	86,662.11	P	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,662.11	100.0 %	86,662.11	100.0 %
	5237	REPARACIÓN DE CARCAVA EN EST. 27+111 DE LA RUTA RN03E, SANTA CRUZ ANALQUITO, CUSCATLÁN	86,634.08	P	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,634.08	100.0 %	86,634.08	100.0 %
	5239	REPARACIÓN DE CARCAVA EN EST. 27+350 DE LA RUTA RN03E, SANTA CRUZ ANALQUITO, CUSCATLÁN	49,181.07	P	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,181.07	100.0 %	49,181.07	100.0 %
	5238	REPARACIÓN DE CARCAVA EN EST. 27+242 DE LA RUTA RN03E, SANTA CRUZ ANALQUITO, CUSCATLÁN	43,313.26	P	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,313.26	100.0 %	43,313.26	100.0 %
	5379	REPARACIÓN DE CARCAVAS EN KM 17+400 Y KM 18+400 DE LA RUTA RN05S, SANTO TOMAS, SAN SALVADOR	6,704.16	P	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,704.16	100.0 %	6,704.16	100.0 %
MINSAL			16,446,378.73	P	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,446,378.73	100.0 %	16,446,378.73	100.0 %
	3236	Rehabilitación y Equipamiento del Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca, La Paz	4,587,854.42	P	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587,854.42	100.0 %	4,587,854.42	100.0 %
	3235	Rehabilitación y Equipamiento Hospital Nacional San Pedro, Usulután	4,286,496.82	P	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286,496.82	100.0 %	4,286,496.82	100.0 %
	3241	Construcción y Equipamiento Nuevo Hospital Santa	1,410,209.24	P	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,209.24	100.0 %	1,410,209.24	100.0 %

		Gertrudis, San Vicente		%	92.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	85.9 %	0.0 %	85.9 %	90.4 %
	5322	Construcción de muros de contención en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Invalídidos por daños ocasionados por la tormenta Tropical IDA, departamento de San Salvador	1,391,003.93	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,391,003.93 959,642.75 431,361.18 69.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,391,003.93 959,642.75 431,361.18 69.0 %	90.4 %
	3237	Reparación Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, Departamento de San Miguel	1,101,777.16	P E D %	10,306.79 10,306.79 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,091,470.37 1,091,470.37 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,101,777.16 1,101,777.16 0.00 100.0 %	
	5129	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD VERAPAZ, SAN VICENTE	564,244.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	564,244.00 563,606.41 637.59 99.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	564,244.00 563,606.41 637.59 99.9 %	
	3276	PROGRAMA RECONSTRUCCION POR EMERGENCIA Y EXTENSION SERV. SALUD (BIRF-7084)	542,533.69	P E D %	319,086.14 319,086.14 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	223,447.55 223,307.83 139.72 99.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	542,533.69 542,393.97 139.72 100.0 %	
	5125	REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DEL HOSPITAL NACIONAL "ENF. ANGELICA VIDAL DE NAJARRO, SAN BARTOLO, ILOPANGO, SAN SALVADOR	216,908.21	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	216,908.21 151,386.70 65,521.51 69.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	216,908.21 151,386.70 65,521.51 69.8 %	
	4654	Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamin Bloom"	199,148.86	P E D %	199,148.86 199,148.86 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	199,148.86 199,148.86 0.00 100.0 %	
	5124	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD SAN LUIS TALPA, LA PAZ	195,049.74	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	195,049.74 153,313.15 41,736.59 78.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	195,049.74 153,313.15 41,736.59 78.6 %	
	4841	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador	184,059.58	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	184,059.58 136,345.16 47,714.42 74.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	184,059.58 136,345.16 47,714.42 74.1 %	
	4890	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La Libertad, La Libertad	168,619.68	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	168,619.68 168,571.28 48.40 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	168,619.68 168,571.28 48.40 100.0 %	
	5112	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD	150,818.43	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,818.43 63,155.88 87,662.55 41.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,818.43 63,155.88 87,662.55 41.9 %	

[illegible]

4848	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador	48,673.18	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	48,673.18 42,527.17 6,146.01 87.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	48,673.18 42,527.17 6,146.01 87.4 %	48,673.18 42,527.17 6,146.01 87.4 %
4856	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayultuxtepeque, San Salvador	45,603.09	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	45,603.09 45,368.09 235.00 99.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	45,603.09 45,368.09 235.00 99.5 %	45,603.09 45,368.09 235.00 99.5 %
4852	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador	37,531.67	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	37,531.67 37,531.67 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	37,531.67 37,531.67 0.00 100.0 %	37,531.67 37,531.67 0.00 100.0 %
5135	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA CASA DE SALUD DE JOYA GRANDE, SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR	36,396.44	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	36,396.44 5,040.00 31,356.44 13.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	36,396.44 5,040.00 31,356.44 13.8 %	36,396.44 5,040.00 31,356.44 13.8 %
5334	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA CANOA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USulután	35,218.79	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	35,218.79 35,170.39 48.40 99.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	35,218.79 35,170.39 48.40 99.9 %	35,218.79 35,170.39 48.40 99.9 %
5336	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE PUERTO PARADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USulután	28,149.14	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	28,149.14 28,149.14 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	28,149.14 28,149.14 0.00 100.0 %	28,149.14 28,149.14 0.00 100.0 %
4858	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilopango, San Salvador	27,755.84	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	27,755.84 27,520.84 235.00 99.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	27,755.84 27,520.84 235.00 99.2 %	27,755.84 27,520.84 235.00 99.2 %
4878	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután	27,472.16	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	27,472.16 27,472.16 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	27,472.16 27,472.16 0.00 100.0 %	27,472.16 27,472.16 0.00 100.0 %
5119	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA UNIDAD DE SALUD SANTO TOMAS, SAN SALVADOR	27,100.51	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	27,100.51 25,156.57 1,943.94 92.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	27,100.51 25,156.57 1,943.94 92.8 %	27,100.51 25,156.57 1,943.94 92.8 %
5335	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NUEVO AMANECER POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USulután.	25,182.67	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	25,182.67 24,389.27 793.40 96.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	25,182.67 24,389.27 793.40 96.8 %	25,182.67 24,389.27 793.40 96.8 %
4839	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes,	24,782.66	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	24,782.66 24,782.66 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	24,782.66 24,782.66 0.00 100.0 %	24,782.66 24,782.66 0.00 100.0 %

	San Salvador		%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %
5333	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SISIGUAYO POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USulután	24,305.85	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	24,305.85 24,257.45 48.40 99.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	24,305.85 24,257.45 48.40 99.8 %	100.0 %
5331	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CORRAL DE MULAS POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USulután	24,183.59	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	24,183.59 24,135.19 48.40 99.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	24,183.59 24,135.19 48.40 99.8 %	100.0 %
4850	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador	20,954.61	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	20,954.61 20,954.61 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	20,954.61 20,954.61 0.00 100.0 %	100.0 %
5103	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA DE LA CASA DE SALUD BARRANCONES, PASAQUINA, LA UNIÓN	20,243.71	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	20,243.71 11,430.71 8,813.00 56.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	20,243.71 11,430.71 8,813.00 56.5 %	100.0 %
5332	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NUEVA GRANADA POR LA TORMENTA TROPICAL IDA, USulután	17,406.20	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	17,406.20 17,406.20 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	17,406.20 17,406.20 0.00 100.0 %	100.0 %
ANDA		10,835,277.11	P E D %	1,174,585.36 1,174,585.36 0.00 100.0 %	5,594,750.20 5,520,921.86 73,828.34 98.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,769,335.56 6,695,507.22 73,828.34 98.9 %	3,932,341.55 3,932,341.55 0.00 100.0 %	133,600.00 128,608.00 4,992.00 96.3 %	4,065,941.55 4,060,949.55 4,992.00 99.9 %	10,835,277.11 10,756,456.77 78,820.34 99.3 %
5380	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	1,200,184.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,200,184.00 1,200,184.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,200,184.00 1,200,184.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,200,184.00 1,200,184.00 0.00 100.0 %
5388	INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL CANTÓN FLOR AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	1,114,855.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,114,855.00 1,114,855.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,114,855.00 1,114,855.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,114,855.00 1,114,855.00 0.00 100.0 %
5259	RECONSTRUCCION DE PUENTES PARA TUBERIA DE HFD DE ø16", 14" Y 10" QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE A URBANIZACION POPOTLAN, NUEVO APOPA Y VALLE DEL SOL, APOPA, SAN SALVADOR.	1,077,085.96	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,077,085.96 1,077,085.96 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,077,085.96 1,077,085.96 0.00 100.0 %	1,077,085.96 1,077,085.96 0.00 100.0 %
	REHABILITACION DE											

[illegible]

4596	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO EN PLANTA LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, LA PAZ.	31,367.71	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	31,367.71 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	31,367.71 0.00 0.00 0.0 %	31,367.71 0.00 0.00 0.0 %
4605	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE USULUTÁN, MEDIANTE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN TANQUES EL NANZAL, MUNICIPIO DE USULUTÁN.	22,175.36	P E D %	22,175.36 0.00 100.0 %	22,175.36 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	22,175.36 0.00 0.00 0.0 %	22,175.36 0.00 0.00 100.0 %
4567	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN.	21,554.27	P E D %	21,554.27 0.00 100.0 %	21,554.27 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	21,554.27 0.00 0.00 0.0 %	21,554.27 0.00 0.00 100.0 %
4568	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTE CAITES DEL DIABLO, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL GADO.	19,968.00	P E D %	19,968.00 0.00 100.0 %	19,968.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	19,968.00 0.00 0.00 0.0 %	19,968.00 0.00 0.00 100.0 %
4570	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 DE CAPACIDAD, EN PLANTA EL MIRADOR, PLANES DE RENDEROS, SAN SALVADOR.	17,274.48	P E D %	17,274.48 0.00 100.0 %	17,274.48 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	17,274.48 0.00 0.00 0.0 %	17,274.48 0.00 0.00 100.0 %
4592	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUILARES.	17,175.77	P E D %	17,175.77 0.00 100.0 %	17,175.77 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	17,175.77 0.00 0.00 0.0 %	17,175.77 0.00 0.00 100.0 %
4569	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTE LA CHACRA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO.	14,985.00	P E D %	14,985.00 0.00 100.0 %	14,985.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	14,985.00 0.00 0.00 0.0 %	14,985.00 0.00 0.00 100.0 %
5255	RECONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUA POTABLE LA ESPERANZA, OLOCUILTA, LA PAZ.	13,926.32	P E D %	13,926.32 0.00 0.0 %	13,926.32 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	13,926.32 0.00 0.00 100.0 %	13,926.32 0.00 0.00 100.0 %
4608	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, USULUTÁN.	7,644.29	P E D %	7,644.29 0.00 100.0 %	7,644.29 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	7,644.29 0.00 0.00 100.0 %	7,644.29 0.00 0.00 100.0 %
5264	RECONSTRUCCION DE POZO DE VISITA, TUBERIA DE 8" DE AGUAS NEGRAS Y MURO DE PROTECCION, EN URBANIZACION CASA CAMPO, CUSCATANCINGO, SAN SALVADOR.	312.34	P E D %	312.34 0.00 0.0 %	312.34 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	312.34 0.00 0.00 100.0 %	312.34 0.00 0.00 100.0 %

MOP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	5327	Construcción e Instalación de Obras para Puente Temporal sobre río Huiza en Cantón Melara, Municipio y departamento de La Libertad	P E D %	261,757.46	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	261,757.46 260,284.32 1,473.14 99.4 %	0.00 0.00 0.00 0.00	261,757.46 260,284.32 1,473.14 99.4 %	261,757.46 260,284.32 1,473.14 99.4 %
	4562	OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA COLONIA LLANO VERDE, (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO, SAN SALVADOR	P E D %	199,363.22	199,363.22 199,363.22 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	199,363.22 199,363.22 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00	199,363.22 199,363.22 0.00 100.0 %	199,363.22 199,363.22 0.00 100.0 %
	5226	REHABILITACION DEL CANAL DE DESAGÜE DEL LAGO DE ILOPANGO A CONSECUENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL IDA	P E D %	145,222.51	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	145,222.51 94,510.43 50,712.08 65.1 %	0.00 0.00 0.00 0.00	145,222.51 94,510.43 50,712.08 65.1 %	145,222.51 94,510.43 50,712.08 65.1 %
	4423	Ampliación de la carretera CA04S, Tramo I: entre Km. 12.66 (Las Pilelas) - Km. 22.36 (Salida Sur de Zaragoza), Departamento de La Libertad.	P E D %	108,647.90	108,647.90 108,647.90 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	108,647.90 108,647.90 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00	108,647.90 108,647.90 0.00 100.0 %	108,647.90 108,647.90 0.00 100.0 %
	3973	Ampliación de Intercambiador en Autopista a Comalapa (RN05)- Carretera a Los Planes de Renderos (RN06), San Salvador.	P E D %	59,183.60	59,183.60 59,183.60 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	59,183.60 59,183.60 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00	59,183.60 59,183.60 0.00 100.0 %	59,183.60 59,183.60 0.00 100.0 %
MARN			P E D %	7,818,374.02	4,748,731.33 4,746,746.44 1,984.89 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	4,748,731.33 4,746,746.44 1,984.89 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00	3,069,642.69 3,024,177.54 45,465.15 98.5 %	7,818,374.02 7,770,923.98 47,450.04 99.4 %
	2881	PROGRAMA DE DESCONTAMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS	P E D %	4,722,698.92	4,555,472.46 4,553,487.57 1,984.89 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	4,555,472.46 4,553,487.57 1,984.89 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00	167,226.46 151,176.46 16,050.00 90.4 %	4,722,698.92 4,704,684.03 18,034.89 99.6 %
	5229	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE RIESGO	P E D %	2,902,416.23	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	2,902,416.23 2,873,001.08 29,415.15 99.0 %	2,902,416.23 2,873,001.08 29,415.15 99.0 %
	5348	Remodelación y Equipamiento de la Primera Planta Edificio Principal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	P E D %	193,258.87	193,258.87 193,258.87 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	193,258.87 193,258.87 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	193,258.87 193,258.87 0.00 100.0 %
MINED			P E D %	6,333,050.52	1,592,785.70 740,577.69 852,208.01 46.5 %	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1,592,785.70 740,577.69 852,208.01 46.5 %	0.00 0.00 0.00 0.00	4,740,264.82 4,740,264.82 0.00 100.0 %	6,333,050.52 5,480,842.51 852,208.01 86.5 %
	5268	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO-EDUCA)	P E D %	3,177,830.34	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	3,177,830.34 3,177,830.34 0.00 100.0 %	3,177,830.34 3,177,830.34 0.00 100.0 %
	4496	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	P E D %	1,524,109.90	1,524,109.90 671,901.89 852,208.01	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,524,109.90 671,901.89 852,208.01	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,524,109.90 671,901.89 852,208.01

		EDUCATIVA 2009		%	44.1 %	0.0 %	0.0 %	44.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	44.1 %
	5271	Reconstrucción y Rehabilitación de Centros Escolares Afectados por la Tormenta IDA	970,746.91	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	970,746.91 970,746.91 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	970,746.91 970,746.91 0.00 100.0 %	44.1 %
	4186	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS ESCOLARES EN DPTOS. DE AHUACHAPAN, CHALATENANGO, SAN MIGUEL, Y MORAZAN	596,943.35	P E D %	68,675.80 68,675.80 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	68,675.80 68,675.80 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	528,267.55 528,267.55 0.00 100.0 %	528,267.55 528,267.55 0.00 100.0 %	596,943.35 596,943.35 0.00 100.0 %	
	5188	Atención de Centros Escolares Afectados por Emergencia Tormenta IDA	63,420.02	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	63,420.02 63,420.02 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	63,420.02 63,420.02 0.00 100.0 %	
FISDL													
	4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL	4,770,464.23	P E D %	985,076.23 769,364.18 215,712.05 78.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	985,076.23 769,364.18 215,712.05 78.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,785,388.00 2,979,900.32 805,487.68 78.7 %	3,785,388.00 2,979,900.32 805,487.68 78.7 %	4,770,464.23 3,749,264.50 1,021,199.73 78.6 %	
	4472	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV	4,278,744.23	P E D %	910,076.23 694,364.18 215,712.05 76.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	910,076.23 694,364.18 215,712.05 76.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,368,668.00 2,724,309.55 644,358.45 80.9 %	3,368,668.00 2,724,309.55 644,358.45 80.9 %	4,278,744.23 3,418,673.73 860,070.50 79.9 %	
	5038	Construcción de Casa Comunal Colonia Buen Pastor del Cantón El Pedregal, Municipio de Chilanga, Departamento de Morazán	416,720.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	416,720.00 255,590.77 161,129.23 61.3 %	416,720.00 255,590.77 161,129.23 61.3 %	416,720.00 255,590.77 161,129.23 61.3 %	
	5035	Construcción de Cerca Perimetral y Engramado de Cancha de Fútbol, Cantón El Gavilán, Municipio El Carmen, Departamento de La Unión	25,000.00	P E D %	50,000.00 50,000.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	50,000.00 50,000.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	
MAG													
	5284	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS RIOS LEMPA, GRANDE DE SAN MIGUEL, PAZ Y JIBOA	3,918,148.95	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,918,148.95 3,899,795.66 18,353.29 99.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,918,148.95 3,899,795.66 18,353.29 99.5 %	
	5306	REPOBLACION DE ZONAS CAFETALERAS EN LAS REGIONES PARACENTRAL Y ORIENTAL CON BAJA PRODUCTIVIDAD Y AFECTADAS POR EL FENOMENO CLIMATOLOGICO	1,622,213.76	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,622,213.76 1,622,212.88 0.88 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,622,213.76 1,622,212.88 0.88 100.0 %	
	5306	REPOBLACION DE ZONAS CAFETALERAS EN LAS REGIONES PARACENTRAL Y ORIENTAL CON BAJA PRODUCTIVIDAD Y AFECTADAS POR EL FENOMENO CLIMATOLOGICO	777,410.42	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	777,410.42 767,620.58 9,789.84 98.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	777,410.42 767,620.58 9,789.84 98.7 %	

<http://192.168.83.98/servlet/INTERReporConso>

		4477	Concreto del Pavimento de Acceso a los Muelles del Puerto de Acajulla	336,075.68	E D %	321,211.03 14,864.65 95.6 %	0.00 0.00 0.0 %	321,211.03 14,864.65 95.6 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	321,211.03 14,864.65 95.6 %
CENTA				323,355.80	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	323,355.80 323,355.80 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	323,355.80 323,355.80 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	323,355.80 323,355.80 100.0 %
		5293	Rehabilitación Productiva Mediante la Entrega de Paquetes de Aperos Agrícolas a Productores y Productoras Afectado(a)s por El Huracán IDA	310,800.00	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,800.00 310,800.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,800.00 310,800.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,800.00 310,800.00 100.0 %
		5294	Recuperación de la Producción Frutícola en Zonas Afectadas por el Huracán IDA	12,555.80	P E D %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,555.80 12,555.80 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,555.80 12,555.80 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	12,555.80 12,555.80 100.0 %
CORSATUR				308,870.00	P E D %	308,870.00 308,826.14 43.86 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	308,870.00 308,826.14 43.86 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	308,870.00 308,826.14 43.86 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	308,870.00 308,826.14 43.86 100.0 %
		4517	Mejoramiento de calles de acceso a Playa El Tunco, Municipio de Tamanique, La Libertad.	109,540.00	P E D %	109,540.00 109,540.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	109,540.00 109,540.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	109,540.00 109,540.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	109,540.00 109,540.00 0.00 0.0 %
		5369	CONSTRUCCION DE 5 OBSERVATORIOS TURISTICOS, 2010	99,250.00	P E D %	99,250.00 99,250.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	99,250.00 99,250.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	99,250.00 99,250.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	99,250.00 99,250.00 0.00 0.0 %
		5376	MEJORAMIENTO DE RECORRIDOS TURISTICOS Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTERPRETACION EN PARQUE EL BOQUERON.	93,000.00	P E D %	93,000.00 93,000.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	93,000.00 93,000.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	93,000.00 93,000.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	93,000.00 93,000.00 0.00 0.0 %
		2436	REHABILITACION DEL COMPLEJO TURISTICO DEL PUERTO DE LA LIBERTAD	7,080.00	P E D %	7,080.00 7,036.14 43.86 99.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	7,080.00 7,036.14 43.86 99.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	7,080.00 7,036.14 43.86 99.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	7,080.00 7,036.14 43.86 99.4 %
ILEA				224,555.63	P E D %	224,555.63 224,555.63 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	224,555.63 224,555.63 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	224,555.63 224,555.63 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	224,555.63 224,555.63 0.00 0.0 %
		4493	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, ILEA SAN SALVADOR"	224,555.63	P E D %	224,555.63 224,555.63 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	224,555.63 224,555.63 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	224,555.63 224,555.63 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	224,555.63 224,555.63 0.00 0.0 %
CNR				163,783.55	P E D %	163,783.55 163,783.55 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	163,783.55 163,783.55 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	163,783.55 163,783.55 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	163,783.55 163,783.55 0.00 100.0 %
		3541	PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION DEL	163,783.55	P E D %	163,783.55 163,783.55 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	163,783.55 163,783.55 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	163,783.55 163,783.55 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	163,783.55 163,783.55 0.00 100.0 %

		REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II	D %	0.00 0.0 %	0.00 100.0 %	0.00 0.0 %	0.00 100.0 %	0.00 0.0 %	0.00 100.0 %	0.00 0.0 %	0.00 100.0 %	0.00 0.0 %	0.00 100.0 %
MTYPS			P E D %	134,436.94 134,436.94 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	134,436.94 134,436.94 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	134,436.94 134,436.94 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 100.0 %
	5269	Reparaciones en Infraestructura y Equipamiento Básico Oficina Central (San Salvador) y Departamental (Sonsonate), Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	P E D %	134,436.94 134,436.94 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	134,436.94 134,436.94 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	134,436.94 134,436.94 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 100.0 %
MH			P E D %	52,990.16 52,990.16 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	52,990.16 52,990.16 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	52,990.16 52,990.16 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 100.0 %
	5340	CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA ADUANA TERRESTRE SAN CRISTOBAL	P E D %	38,533.96 38,533.96 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	38,533.96 38,533.96 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	38,533.96 38,533.96 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 100.0 %
	5367	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA SECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	P E D %	14,456.20 14,456.20 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	14,456.20 14,456.20 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	14,456.20 14,456.20 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 100.0 %
ISDEMU			P E D %	46,945.29 46,945.29 11,374.30 35,570.99 24.2 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	46,945.29 46,945.29 11,374.30 35,570.99 24.2 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	46,945.29 46,945.29 11,374.30 35,570.99 24.2 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 100.0 %
	5095	Readecuación de espacio para Cocina-Bodega en la Oficina Central de ISDEMU.	P E D %	46,945.29 46,945.29 11,374.30 35,570.99 24.2 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	46,945.29 46,945.29 11,374.30 35,570.99 24.2 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	46,945.29 46,945.29 11,374.30 35,570.99 24.2 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 100.0 %
VMVDU			P E D %	3,476.03 3,476.03 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,476.03 3,476.03 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	3,476.03 3,476.03 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 100.0 %
	5224	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA SECTORES VULNERABLES EN 5 DEPARTAMENTOS AFECTADOS POR LA TORMENTA IDA	P E D %	90,048,672.08 90,048,672.08 56,649,437.93 62,814,606.21 69,386,759.25 76.7 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	90,048,672.08 90,048,672.08 56,649,437.93 62,814,606.21 69,386,759.25 76.7 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	90,048,672.08 90,048,672.08 56,649,437.93 62,814,606.21 69,386,759.25 76.7 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 100.0 %
TOTAL PROVISIONES			P E D %	5,953,779.38 5,953,779.38 5,865,086.39 88,692.99 98.5 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,953,779.38 5,953,779.38 5,865,086.39 88,692.99 98.5 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,953,779.38 5,953,779.38 5,865,086.39 88,692.99 98.5 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 100.0 %
MINSAL			P E D %	82,421,695.12 82,421,695.12 13,034,935.87 69,386,759.25 15.8 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	82,421,695.12 82,421,695.12 13,034,935.87 69,386,759.25 15.8 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	82,421,695.12 82,421,695.12 13,034,935.87 69,386,759.25 15.8 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 100.0 %
	4657	Programa de Extensión de Cobertura en la Zona Rural	P E D %	14,287,193.32 14,287,193.32 5,500,274.76 38.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	14,287,193.32 14,287,193.32 5,500,274.76 38.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	14,287,193.32 14,287,193.32 5,500,274.76 38.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 100.0 %

		(período 2009-2011)		D %	8,786,918.56 38.5 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	8,786,918.56 38.5 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	8,786,918.56 38.5 %
	401	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION	13,788,728.10	P E D %	13,788,728.10 97,578.33 13,691,149.77 0.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	13,788,728.10 97,578.33 13,691,149.77 0.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	13,788,728.10 97,578.33 13,691,149.77 0.7 %
	4654	Construcción y Equipamiento de La Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"	7,988,383.36	P E D %	7,988,383.36 116,953.13 7,871,430.23 1.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	7,988,383.36 116,953.13 7,871,430.23 1.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	7,988,383.36 116,953.13 7,871,430.23 1.5 %
	4656	Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"	6,027,460.50	P E D %	6,027,460.50 179,514.76 5,847,945.74 3.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,027,460.50 179,514.76 5,847,945.74 3.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	6,027,460.50 179,514.76 5,847,945.74 3.0 %
	4653	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"	4,518,457.20	P E D %	4,518,457.20 12,980.53 4,505,476.67 0.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,518,457.20 12,980.53 4,505,476.67 0.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,518,457.20 12,980.53 4,505,476.67 0.3 %
	4661	Apoyo al Primer Nivel de Atención y Hospitales del MSPAS.	4,117,980.09	P E D %	4,117,980.09 1,158,338.49 2,959,641.60 28.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,117,980.09 1,158,338.49 2,959,641.60 28.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	4,117,980.09 1,158,338.49 2,959,641.60 28.1 %
	4655	Remodelación y Equipamiento de la Tercera Planta del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales	2,901,560.00	P E D %	2,901,560.00 9,605.00 2,891,955.00 0.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,901,560.00 9,605.00 2,891,955.00 0.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,901,560.00 9,605.00 2,891,955.00 0.3 %
	4658	Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Red de Establecimientos de Salud.	773,060.00	P E D %	773,060.00 270,252.99 502,807.01 35.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	773,060.00 270,252.99 502,807.01 35.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	773,060.00 270,252.99 502,807.01 35.0 %
	4836	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de Ayutuxtepeque, San Salvador	660,500.00	P E D %	660,500.00 23,325.75 637,174.25 3.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	660,500.00 23,325.75 637,174.25 3.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	660,500.00 23,325.75 637,174.25 3.5 %
	4853	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martín, San Salvador	457,500.00	P E D %	457,500.00 8,136.00 449,364.00 1.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	457,500.00 8,136.00 449,364.00 1.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	457,500.00 8,136.00 449,364.00 1.8 %
	3345	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CHALATENANGO	435,000.00	P E D %	435,000.00 0.00 435,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	435,000.00 0.00 435,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	435,000.00 0.00 435,000.00 0.0 %
	3346	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA	435,000.00	P E D %	435,000.00 273.75 434,726.25 0.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	435,000.00 273.75 434,726.25 0.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	435,000.00 273.75 434,726.25 0.1 %
	4859	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Bobadilla, San Alejo, La Unión	435,000.00	P E D %	435,000.00 11,799.75 423,200.25 2.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	435,000.00 11,799.75 423,200.25 2.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	435,000.00 11,799.75 423,200.25 2.7 %

4913	la Unidad de Salud de Ahuachapán, Ahuachapán	435,000.00	D	426,929.25 1.9 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	426,929.25 1.9 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	426,929.25 1.9 %
4924	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán	435,000.00	P E D	435,000.00 15,217.50 419,782.50 3.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	435,000.00 15,217.50 419,782.50 3.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	435,000.00 15,217.50 419,782.50 3.5 %
4927	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guacotectli, Cabañas	435,000.00	P E D	435,000.00 10,104.75 424,895.25 2.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	435,000.00 10,104.75 424,895.25 2.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	435,000.00 10,104.75 424,895.25 2.3 %
4938	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guadalupe, San Vicente	435,000.00	P E D	435,000.00 6,452.30 428,547.70 1.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	435,000.00 6,452.30 428,547.70 1.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	435,000.00 6,452.30 428,547.70 1.5 %
4915	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Jose Naranjo, Jujutla, Ahuachapán	359,730.12	P E D	359,730.12 264,003.02 95,727.10 73.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	359,730.12 264,003.02 95,727.10 73.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	359,730.12 264,003.02 95,727.10 73.4 %
4660	Remodelación y equipamiento del Hospital Nacional de Chalchuapa	328,467.58	P E D	328,467.58 37,730.70 290,736.88 11.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	328,467.58 37,730.70 290,736.88 11.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	328,467.58 37,730.70 290,736.88 11.5 %
4912	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Salcoatlán, Sonsonate	310,000.01	P E D	310,000.01 7,062.00 302,938.01 2.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,000.01 7,062.00 302,938.01 2.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,000.01 7,062.00 302,938.01 2.3 %
4895	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Palmar, Santa Ana	310,000.00	P E D	310,000.00 281,120.89 28,879.11 90.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,000.00 281,120.89 28,879.11 90.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,000.00 281,120.89 28,879.11 90.7 %
4897	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana	310,000.00	P E D	310,000.00 7,073.30 302,926.70 2.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,000.00 7,073.30 302,926.70 2.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,000.00 7,073.30 302,926.70 2.3 %
4900	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Congo, Santa Ana	310,000.00	P E D	310,000.00 126,386.04 183,613.96 40.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,000.00 126,386.04 183,613.96 40.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,000.00 126,386.04 183,613.96 40.8 %
4901	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Belén Gujlat, Metapán, Santa Ana	310,000.00	P E D	310,000.00 173,848.67 136,151.33 56.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,000.00 173,848.67 136,151.33 56.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,000.00 173,848.67 136,151.33 56.1 %
4905	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana	310,000.00	P E D	310,000.00 106,215.11 203,784.89 34.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,000.00 106,215.11 203,784.89 34.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,000.00 106,215.11 203,784.89 34.3 %
4916	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Chinamas, Ahuachapán	310,000.00	P E D	310,000.00 197,367.20 112,632.80 63.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,000.00 197,367.20 112,632.80 63.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	310,000.00 197,367.20 112,632.80 63.7 %
4922	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de	275,000.00	P E	275,000.00 150,577.20	0.00 0.00	0.00 0.00	275,000.00 150,577.20	0.00 0.00	0.00 0.00	275,000.00 150,577.20

	Salud de San Jose Guayabal, Cuscatlán		D %	124,422.80 54.8 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	124,422.80 54.8 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	124,422.80 54.8 %
4882	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Dorado, Chaltenango	265,500.00	P E D %	265,500.00 7,797.00 257,703.00 2.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	265,500.00 7,797.00 257,703.00 2.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	265,500.00 7,797.00 257,703.00 2.9 %
4885	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Arracaos, Nueva Concepción, Chaltenango	265,500.00	P E D %	265,500.00 9,765.75 255,734.25 3.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	265,500.00 9,765.75 255,734.25 3.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	265,500.00 9,765.75 255,734.25 3.7 %
4921	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Pedro Perulapán, Cuscatlán	265,500.00	P E D %	265,500.00 5,310.00 260,190.00 2.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	265,500.00 5,310.00 260,190.00 2.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	265,500.00 5,310.00 260,190.00 2.0 %
4931	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyulitán, La Paz	265,000.00	P E D %	265,000.00 67,664.71 197,335.29 25.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	265,000.00 67,664.71 197,335.29 25.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	265,000.00 67,664.71 197,335.29 25.5 %
4857	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador	251,180.17	P E D %	251,180.17 203,190.71 47,989.46 80.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	251,180.17 203,190.71 47,989.46 80.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	251,180.17 203,190.71 47,989.46 80.9 %
4837	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador	250,500.00	P E D %	250,500.00 171,581.96 78,918.04 68.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 171,581.96 78,918.04 68.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 171,581.96 78,918.04 68.5 %
4840	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador	250,500.00	P E D %	250,500.00 192,584.04 57,915.96 76.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 192,584.04 57,915.96 76.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 192,584.04 57,915.96 76.9 %
4847	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Ciudad Delgado, San Salvador	250,500.00	P E D %	250,500.00 9,765.75 240,734.25 3.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 9,765.75 240,734.25 3.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 9,765.75 240,734.25 3.9 %
4850	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador	250,500.00	P E D %	250,500.00 8,070.75 242,429.25 3.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 8,070.75 242,429.25 3.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 8,070.75 242,429.25 3.2 %
4855	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Paisnal, San Salvador	250,500.00	P E D %	250,500.00 21,291.75 229,208.25 8.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 21,291.75 229,208.25 8.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 21,291.75 229,208.25 8.5 %
4888	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Manuel Gallardo, Colón, La Libertad	250,500.00	P E D %	250,500.00 8,070.75 242,429.25 3.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 8,070.75 242,429.25 3.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 8,070.75 242,429.25 3.2 %
4889	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad	250,500.00	P E D %	250,500.00 0.00 250,500.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 0.00 250,500.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 0.00 250,500.00 0.0 %
			P	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	250,500.00

4894	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana	E	11,799.75 238,700.25 4.7 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	11,799.75 238,700.25 4.7 %
4896	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Planes de la Laguna, Santa Ana	P E D	250,500.00 250,500.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 250,500.00 0.0 %
4898	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa Ana	P E D	250,500.00 72,513.28 177,986.72 28.9 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 72,513.28 177,986.72 28.9 %
4903	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Juan las Minas, Metapán, Santa Ana	P E D	250,500.00 63,890.39 186,609.61 25.5 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 63,890.39 186,609.61 25.5 %
4904	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Sebastian Saltillo, Santa Ana	P E D	250,500.00 69,168.89 181,331.11 27.6 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 69,168.89 181,331.11 27.6 %
4906	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Lucia, Santa Ana	P E D	250,500.00 7,335.75 243,164.25 2.9 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 7,335.75 243,164.25 2.9 %
4907	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Barbara, Santa Ana	P E D	250,500.00 0.00 250,500.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 0.00 250,500.00 0.0 %
4908	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás Pineda Martínez, Santa Ana	P E D	250,500.00 10,104.75 240,395.25 4.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 10,104.75 240,395.25 4.0 %
4917	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán	P E D	250,500.00 7,335.75 243,164.25 2.9 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 7,335.75 243,164.25 2.9 %
4925	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Perulapita, Cuscatlán	P E D	250,500.00 7,901.25 242,598.75 3.2 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	250,500.00 7,901.25 242,598.75 3.2 %
4884	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chaltenango	P E D	250,000.00 8,070.75 241,929.25 3.2 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	250,000.00 8,070.75 241,929.25 3.2 %
4846	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Popolitan, Apopa, San Salvador	P E D	246,193.55 216,102.40 30,091.15 87.8 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	246,193.55 216,102.40 30,091.15 87.8 %
4923	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Ramon,	P E D	240,000.00 128,052.12 111,947.88 53.4 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	240,000.00 128,052.12 111,947.88 53.4 %

4929	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilobasco, Cabañas	167,000.00	P E D %	167,000.00 1,093.55 165,906.45 0.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	167,000.00 1,093.55 165,906.45 0.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	167,000.00 1,093.55 165,906.45 0.7 %
4930	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Jutiapa, Cabañas	167,000.00	P E D %	167,000.00 7,627.50 159,372.50 4.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	167,000.00 7,627.50 159,372.50 4.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	167,000.00 7,627.50 159,372.50 4.6 %
4932	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Mercedes La Ceiba, La Paz	167,000.00	P E D %	167,000.00 7,901.25 159,098.75 4.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	167,000.00 7,901.25 159,098.75 4.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	167,000.00 7,901.25 159,098.75 4.7 %
4936	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Rafael Obrajuelo, La Paz	167,000.00	P E D %	167,000.00 2,542.50 164,457.50 1.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	167,000.00 2,542.50 164,457.50 1.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	167,000.00 2,542.50 164,457.50 1.5 %
4886	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Azacualpa, Chaltenango	152,000.00	P E D %	152,000.00 101,179.85 50,820.15 66.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	152,000.00 101,179.85 50,820.15 66.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	152,000.00 101,179.85 50,820.15 66.6 %
4928	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco del Monte, Ilobasco, Cabañas	152,000.00	P E D %	152,000.00 10,593.75 141,406.25 7.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	152,000.00 10,593.75 141,406.25 7.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	152,000.00 10,593.75 141,406.25 7.0 %
4838	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Monserrat, San Salvador	150,500.00	P E D %	150,500.00 97,784.16 52,715.84 65.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,500.00 97,784.16 52,715.84 65.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,500.00 97,784.16 52,715.84 65.0 %
4839	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes, San Salvador	150,500.00	P E D %	150,500.00 3,995.10 146,504.90 2.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,500.00 3,995.10 146,504.90 2.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,500.00 3,995.10 146,504.90 2.7 %
4843	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilares, San Salvador	150,500.00	P E D %	150,500.00 76,186.83 74,313.17 50.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,500.00 76,186.83 74,313.17 50.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,500.00 76,186.83 74,313.17 50.6 %
4846	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Villa Mariona, Cuscatancingo, San Salvador	150,500.00	P E D %	150,500.00 107,606.44 42,893.56 71.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,500.00 107,606.44 42,893.56 71.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,500.00 107,606.44 42,893.56 71.5 %
4852	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador	150,500.00	P E D %	150,500.00 5,640.75 144,859.25 3.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,500.00 5,640.75 144,859.25 3.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,500.00 5,640.75 144,859.25 3.7 %
4659	Remodelación y equipamiento del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales	149,525.04	P E D %	149,525.04 86,763.50 62,761.54 58.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	149,525.04 86,763.50 62,761.54 58.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	149,525.04 86,763.50 62,761.54 58.0 %

4935	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Juan Talpa, La Paz	140,000.00	P	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	1.4 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	1.4 %
			E	1,914.07	0.00	0.00	0.00	1,914.07	0.00	0.00	1,914.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.07	
			D	138,085.93	0.00	0.00	0.00	138,085.93	0.00	0.00	138,085.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,085.93	
			%	1.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	1.4 %	0.0 %	0.0 %	1.4 %		0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	1.4 %	
4937	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitlan, San Vicente	140,000.00	P	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	6.1 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	6.1 %
			E	8,583.79	0.00	0.00	0.00	8,583.79	0.00	0.00	8,583.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583.79	
			D	131,416.21	0.00	0.00	0.00	131,416.21	0.00	0.00	131,416.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,416.21	
			%	6.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	6.1 %	0.0 %	0.0 %	6.1 %		0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	6.1 %	
4854	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Guazapa, San Salvador	136,087.30	P	136,087.30	0.00	0.00	0.00	136,087.30	0.00	0.00	136,087.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,087.30	
			E	98,761.31	0.00	0.00	0.00	98,761.31	0.00	0.00	98,761.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,761.31	
			D	37,325.99	0.00	0.00	0.00	37,325.99	0.00	0.00	37,325.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,325.99	
			%	72.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	72.6 %	0.0 %	0.0 %	72.6 %		0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	72.6 %	
4865	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Piche, El Carmen, La Unión	135,000.00	P	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
			E	273.75	0.00	0.00	0.00	273.75	0.00	0.00	273.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.75	
			D	134,726.25	0.00	0.00	0.00	134,726.25	0.00	0.00	134,726.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,726.25	
			%	0.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.2 %	0.0 %	0.0 %	0.2 %		0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.2 %	
4871	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Cuco, Chiriquia, San Miguel	135,000.00	P	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
			E	9,492.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	0.00	0.00	9,492.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	
			D	125,508.00	0.00	0.00	0.00	125,508.00	0.00	0.00	125,508.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,508.00	
			%	7.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	7.0 %	0.0 %	0.0 %	7.0 %		0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	7.0 %	
4872	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Milagro de la Paz, San Miguel	135,000.00	P	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
			E	9,765.75	0.00	0.00	0.00	9,765.75	0.00	0.00	9,765.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,765.75	
			D	125,234.25	0.00	0.00	0.00	125,234.25	0.00	0.00	125,234.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,234.25	
			%	7.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	7.2 %	0.0 %	0.0 %	7.2 %		0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	7.2 %	
4873	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Silva, San Miguel	135,000.00	P	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
			E	6,375.75	0.00	0.00	0.00	6,375.75	0.00	0.00	6,375.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.75	
			D	128,624.25	0.00	0.00	0.00	128,624.25	0.00	0.00	128,624.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,624.25	
			%	4.7 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	4.7 %	0.0 %	0.0 %	4.7 %		0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	4.7 %	
4874	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Rafael, San Miguel	135,000.00	P	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
			E	7,620.07	0.00	0.00	0.00	7,620.07	0.00	0.00	7,620.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.07	
			D	127,379.93	0.00	0.00	0.00	127,379.93	0.00	0.00	127,379.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,379.93	
			%	5.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	5.6 %	0.0 %	0.0 %	5.6 %		0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	5.6 %	
4881	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Cruz, Usulután	135,000.00	P	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
			E	7,901.25	0.00	0.00	0.00	7,901.25	0.00	0.00	7,901.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,901.25	
			D	127,098.75	0.00	0.00	0.00	127,098.75	0.00	0.00	127,098.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,098.75	
			%	5.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	5.9 %	0.0 %	0.0 %	5.9 %		0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	5.9 %	
4918	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Candelaria, Cuscatlán	112,000.00	P	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	
			E	7,335.75	0.00	0.00	0.00	7,335.75	0.00	0.00	7,335.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.75	
			D	104,664.25	0.00	0.00	0.00	104,664.25	0.00	0.00	104,664.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,664.25	
			%	6.5 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	6.5 %	0.0 %	0.0 %	6.5 %		0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	6.5 %	
4934	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz	112,000.00	P	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	
			E	35,000.18	0.00	0.00	0.00	35,000.18	0.00	0.00	35,000.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.18	
			D	76,999.82	0.00	0.00	0.00	76,999.82	0.00	0.00	76,999.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,999.82	
			%	31.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	31.3 %	0.0 %	0.0 %	31.3 %		0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	31.3 %	
4841	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador	105,000.00	P	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	
			E	51,593.69	0.00	0.00	0.00	51,593.69	0.00	0.00	51,593.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,593.69	
			D	53,406.31	0.00	0.00	0.00	53,406.31	0.00	0.00	53,406.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,406.31	
			%	49.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	49.1 %	0.0 %	0.0 %	49.1 %		0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	49.1 %	
4849	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San	95,038.35	P	95,038.35	0.00	0.00	0.00	95,038.35	0.00	0.00	95,038.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,038.35	
			E	52,726.82	0.00	0.00	0.00	52,726.82	0.00	0.00	52,726.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,726.82	
			D	42,311.53	0.00	0.00	0.00	42,311.53	0.00	0.00	42,311.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,311.53	

		Marcos, San Salvador	%	55.5 %	0.0 %	0.0 %	55.5 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	55.5 %
MOP			P	47,543,965.61	0.00	0.00	47,543,965.61	0.00	0.00	0.00	0.00	47,543,965.61
			E	14,221,056.33	0.00	0.00	14,221,056.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14,221,056.33
			D	33,322,909.28	0.00	0.00	33,322,909.28	0.00	0.00	0.00	0.00	33,322,909.28
			%	29.9 %	0.0 %	0.0 %	29.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	29.9 %
4529		Mejoramiento de Camino Rural LIB16S Tramo LIB22S - Tamanique, La Libertad	P	7,711,140.79	0.00	0.00	7,711,140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711,140.79
			E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			D	7,711,140.79	0.00	0.00	7,711,140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711,140.79
			%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
4532		Mejoramiento de Camino Rural LIB18N: Tramo LIB22S - Chilitupan, La Libertad	P	6,262,138.81	0.00	0.00	6,262,138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,262,138.81
			E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			D	6,262,138.81	0.00	0.00	6,262,138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,262,138.81
			%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
3603		MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAM28N, TRAMO CHAPELTIQUE - SESORI, SAN MIGUEL	P	5,322,358.73	0.00	0.00	5,322,358.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322,358.73
			E	3,536,618.13	0.00	0.00	3,536,618.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536,618.13
			D	1,785,740.60	0.00	0.00	1,785,740.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,740.60
			%	66.4 %	0.0 %	0.0 %	66.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	66.4 %
4535		Rehabilitación de la Carretera CHA07E-CHA09S, Tramo del EL CHA08E-Arcatao, Chalatenango	P	4,520,740.08	0.00	0.00	4,520,740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520,740.08
			E	3,755,852.56	0.00	0.00	3,755,852.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755,852.56
			D	764,887.52	0.00	0.00	764,887.52	0.00	0.00	0.00	0.00	764,887.52
			%	83.1 %	0.0 %	0.0 %	83.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	83.1 %
4638		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AHU16S TRAMO: APANECA - QUEZALAPA - HACIA SAN PEDRO PUXTLA, APANECA, AHUACHAPAN	P	4,144,929.03	0.00	0.00	4,144,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144,929.03
			E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			D	4,144,929.03	0.00	0.00	4,144,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144,929.03
			%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
4530		Mejoramiento de Camino Rural LIB19N Tramo LIB22S - Jayaque, La Libertad	P	3,542,191.96	0.00	0.00	3,542,191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542,191.96
			E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			D	3,542,191.96	0.00	0.00	3,542,191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542,191.96
			%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
3873		Mejoramiento Camino Rural CAB17N, Tramo: Entre Tejutepique - Juliapa, Cabañas	P	2,465,420.17	0.00	0.00	2,465,420.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,420.17
			E	2,465,420.17	0.00	0.00	2,465,420.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,420.17
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4179		Mejoramiento Camino Rural PAZ10S, Tramo: CA02E - Hato de Los Reyes	P	2,166,205.19	0.00	0.00	2,166,205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,205.19
			E	2,166,205.19	0.00	0.00	2,166,205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,205.19
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4531		Ampliación de un Tramo del Camino Terciario LIB05W: Tramo CA04S-LIB15S. (Desvío a Comasagua). La Libertad	P	2,132,688.14	0.00	0.00	2,132,688.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,688.14
			E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			D	2,132,688.14	0.00	0.00	2,132,688.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,688.14
			%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
4640		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO: COMASAGUA HACIA BELLO HORIZONTE, LA LIBERTAD	P	1,519,393.08	0.00	0.00	1,519,393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,393.08
			E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			D	1,519,393.08	0.00	0.00	1,519,393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,393.08
			%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
4562		OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA COLONIA LLANO VERDE, (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO, SAN SALVADOR	P	1,400,366.56	0.00	0.00	1,400,366.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,366.56
			E	755,657.70	0.00	0.00	755,657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	755,657.70
			D	644,708.86	0.00	0.00	644,708.86	0.00	0.00	0.00	0.00	644,708.86
			%	54.0 %	0.0 %	0.0 %	54.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	54.0 %
		CONSTRUCCIÓN DE MUROS										

4564	GUARDANIVELES Y REPARACIÓN DE MURO GUARDANIVEL EN RÍO LAS CAÑAS ILOPANGO, SAN SALVADOR	1,118,889.91	P E D %	1,118,889.91 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,118,889.91 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,118,889.91 0.00 0.00 0.00 %
4629	CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN ARENAL MONSERRAT COLONIA MÁLAGA, 120.0 M. AGUAS ARRIBA DE LA 17a. AV. SUR. SAN SALVADOR	1,102,241.37	P E D %	1,102,241.37 0.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,102,241.37 0.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,102,241.37 0.00 0.00 100.0 %
4624	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN COLONIA LAS MARGARITAS, BARRIO SAN JACINTO. SAN SALVADOR	775,000.00	P E D %	775,000.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	775,000.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	775,000.00 0.00 0.00 0.00 %
4557	OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUD EN COMUNIDAD EL TRIUNFO CONCEPCIÓN DE ATACO, AHUACHAPÁN	720,672.70	P E D %	720,672.70 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	720,672.70 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	720,672.70 0.00 0.00 0.00 %
4563	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MITIGACIÓN CÁRCAVAS DE JARDINES DE SAN BARTOLO (1 PRINCIPAL Y 2 SECUNDARIAS) ILOPANGO, SAN SALVADOR.	583,295.79	P E D %	583,295.79 12,771.36 570,524.43 2.2 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	583,295.79 12,771.36 570,524.43 2.2 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	583,295.79 12,771.36 570,524.43 2.2 %
4558	MUROS DE CONTENCIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD EL TRIUNFO SAN JULIAN, SONSONATE	580,000.00	P E D %	580,000.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	580,000.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	580,000.00 0.00 0.00 0.00 %
4630	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MURO DE RETENCIÓN EN URBANIZACIÓN ALTOS DEL BOULEVARD, SAN SALVADOR	534,516.13	P E D %	534,516.13 305,369.34 229,146.79 57.1 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	534,516.13 305,369.34 229,146.79 57.1 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	534,516.13 305,369.34 229,146.79 57.1 %
4559	PROYECTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A FAMILIAS EN ZONAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD NUEVO ISRAEL, SAN SALVADOR	305,839.09	P E D %	305,839.09 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	305,839.09 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	305,839.09 0.00 0.00 0.00 %
4565	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN 8a - 10a. Y CALLE PARAGUAY, SAN SALVADOR	243,055.31	P E D %	243,055.31 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	243,055.31 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	243,055.31 0.00 0.00 0.00 %
4641	OBRAS DE MITIGACION EN ZONA DE QUEBRADA LA LECHUZA, ALEDAÑO AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SAN SALVADOR	175,936.10	P E D %	175,936.10 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	175,936.10 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	175,936.10 0.00 0.00 0.00 %
4626	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DE CASA PRESIDENCIAL	167,903.65	P E D %	167,903.65 120,920.51 46,983.14 72.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	167,903.65 120,920.51 46,983.14 72.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 %	167,903.65 120,920.51 46,983.14 72.0 %

		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DEL CENTRO DE CONFERENCIAS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES (EX FERIA INTERNACIONAL)	P E D %	48,843.02 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	48,843.02 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	48,843.02 0.00 0.00 0.00 0.00 %
4566										
		MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO SAV29S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE	P E D %	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
4639										
		CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS Lluvias con su DESCARGA EN COLONIA EL MATAZANO, ILOPANGO, SAN SALVADOR	P E D %	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
4642										
	MAG		P E D %	29,186,693.36	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	29,186,693.36 25,934,288.43 3,252,404.93 0.00 88.9 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	29,186,693.36 25,934,288.43 3,252,404.93 0.00 88.9 %
4643		Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador	P E D %	17,449,953.16	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	17,449,953.16 16,750,488.45 699,464.71 0.00 96.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	17,449,953.16 16,750,488.45 699,464.71 0.00 96.0 %
4644		Fortalecimiento del Sector Pecuario y Avícola en El Salvador	P E D %	4,091,481.48	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	4,091,481.48 4,091,144.58 336.90 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	4,091,481.48 4,091,144.58 336.90 100.0 %
4647		Obras de Control de Inundaciones en los Ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Goascorán (II Fase)	P E D %	3,342,057.03	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	3,342,057.03 3,224,859.74 117,197.29 96.5 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	3,342,057.03 3,224,859.74 117,197.29 96.5 %
4646		Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de Control de Inundaciones	P E D %	1,178,123.69	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,178,123.69 647,966.59 530,157.10 55.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,178,123.69 647,966.59 530,157.10 55.0 %
4648		Construcción de Obras de Mitigación en Cordillera El Bálsamo, al Sur de Santa Tecla, 2da. Etapa	P E D %	1,150,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
4645		Seguridad Alimentaria con Productos Pesqueros y Acuicultura de Valor Agregado en El Salvador.	P E D %	1,125,078.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,125,078.00 1,125,078.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	1,125,078.00 1,125,078.00 0.00 100.0 %
4651		Construcción de Muro de Retención en Quebrada La Oscurana, Municipio de Berlín	P E D %	450,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %	450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %

	4650	Construcción de Obras de Control de Inundaciones Ríos Tihuapa - Huiza, Depto. de La Libertad	350,000.00	P E D %	350,000.00 60,387.50 289,612.50 17.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	350,000.00 60,387.50 289,612.50 17.3 %
	4649	Reparación de Cárcava en Asentamiento Bello Horizonte, Comasagua, La Libertad	50,000.00	P E D %	50,000.00 34,363.57 15,636.43 68.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	50,000.00 34,363.57 15,636.43 68.7 %
ANDA			28,707,097.09	P E D %	28,707,097.09 9,881,249.49 18,825,847.60 34.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	28,707,097.09 9,881,249.49 18,825,847.60 34.4 %
	4567	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN.	5,290,074.68	P E D %	5,290,074.68 2,045,696.98 3,244,377.70 38.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	5,290,074.68 2,045,696.98 3,244,377.70 38.7 %
	4620	MEJORAS EN LA LINEA DE IMPELENCIA Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LA UNION.	2,000,000.00	P E D %	2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.0 %
	4578	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE DE SANTA ANA.	1,700,000.00	P E D %	1,700,000.00 889,924.13 810,075.87 52.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,700,000.00 889,924.13 810,075.87 52.3 %
	4568	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTE CAITES DEL DIABLO, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DELGADO.	1,380,032.00	P E D %	1,380,032.00 79,872.00 1,300,160.00 5.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	1,380,032.00 79,872.00 1,300,160.00 5.8 %
	4595	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTON JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR.	985,990.15	P E D %	985,990.15 342,309.86 643,680.29 34.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	985,990.15 342,309.86 643,680.29 34.7 %
	4569	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTE LA CHACRA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO.	985,015.00	P E D %	985,015.00 59,940.00 925,075.00 6.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	985,015.00 59,940.00 925,075.00 6.1 %
	4604	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PASAQUINA Y FRONTERA EL AMATILLO, DEPARTAMENTO DE LA UNION.	866,747.90	P E D %	866,747.90 865,537.43 1,210.47 99.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	866,747.90 865,537.43 1,210.47 99.9 %
	4586	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE	800,000.00	P E D %	800,000.00 135,361.22 664,638.78	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	800,000.00 135,361.22 664,638.78

		METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		%	16.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	16.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	16.9 %
	4597	PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN LOS AMATES DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, CHALATENANGO.	741,000.00	P E D %	741,000.00 0.00 741,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	741,000.00 0.00 741,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	741,000.00 0.00 741,000.00 0.0 %
	4602	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, LA UNION.	711,015.28	P E D %	711,015.28 691,990.60 19,024.68 97.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	711,015.28 691,990.60 19,024.68 97.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	711,015.28 691,990.60 19,024.68 97.3 %
	4621	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.	700,000.00	P E D %	700,000.00 123,168.26 576,831.74 17.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	700,000.00 123,168.26 576,831.74 17.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	700,000.00 123,168.26 576,831.74 17.6 %
	4585	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS BRISAS DE CANTARRANA Y BARCELONA, UBICADAS EN CANTÓN CANTARRANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.	600,000.00	P E D %	600,000.00 595,454.96 4,545.04 99.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	600,000.00 595,454.96 4,545.04 99.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	600,000.00 595,454.96 4,545.04 99.2 %
	4603	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN PABLO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL.	550,000.00	P E D %	550,000.00 326,527.37 223,472.63 59.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	550,000.00 326,527.37 223,472.63 59.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	550,000.00 326,527.37 223,472.63 59.4 %
	4594	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTON TUTULTEPEQUE EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA, SAN SALVADOR.	495,000.00	P E D %	495,000.00 88,257.70 406,742.30 17.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	495,000.00 88,257.70 406,742.30 17.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	495,000.00 88,257.70 406,742.30 17.8 %
	4592	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUILARES.	483,074.23	P E D %	483,074.23 127,952.21 355,122.02 26.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	483,074.23 127,952.21 355,122.02 26.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	483,074.23 127,952.21 355,122.02 26.5 %
	4576	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA ø 10 HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCION DE	450,000.00	P E D %	450,000.00 405,867.50 44,132.50 90.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	450,000.00 405,867.50 44,132.50 90.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	450,000.00 405,867.50 44,132.50 90.2 %

4583	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M3 Y LA INSTALACION DE UN ANILLO DE DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE	350,000.00	E D %	60,672.44 289,327.56 17.3 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	60,672.44 289,327.56 17.3 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	60,672.44 289,327.56 17.3 %
4611	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USulután.	350,000.00	P E D %	350,000.00 150,943.05 199,056.95 43.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	350,000.00 150,943.05 199,056.95 43.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	350,000.00 150,943.05 199,056.95 43.1 %
4587	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE METAPÁN.	325,000.00	P E D %	325,000.00 86,614.84 238,385.16 26.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	325,000.00 86,614.84 238,385.16 26.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	325,000.00 86,614.84 238,385.16 26.7 %
4588	CAMBIO DE LINEA DE IMPELENCIA DE Ø6" PVC A Ø8" HoFo L=3.000 METROS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PAJONAL.	300,000.00	P E D %	300,000.00 89,924.63 210,075.37 30.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	300,000.00 89,924.63 210,075.37 30.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	300,000.00 89,924.63 210,075.37 30.0 %
4609	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA LLANO LOS PATOS, CAMBIO LINEA DE IMPELENCIA DE Ø 8" A Ø 10", MUNICIPIO DE CONCHAGUA, LA UNIÓN.	300,000.00	P E D %	300,000.00 278,159.88 21,840.12 92.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	300,000.00 278,159.88 21,840.12 92.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	300,000.00 278,159.88 21,840.12 92.7 %
4614	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE EL TRANSITO, SAN MIGUEL.	300,000.00	P E D %	300,000.00 21,824.72 278,175.28 7.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	300,000.00 21,824.72 278,175.28 7.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	300,000.00 21,824.72 278,175.28 7.3 %
4618	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAROLINA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.	300,000.00	P E D %	300,000.00 0.00 300,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	300,000.00 0.00 300,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	300,000.00 0.00 300,000.00 0.0 %
4610	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JIQUILISCO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, USULUTÁN.	264,351.90	P E D %	264,351.90 145,713.60 118,638.30 55.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	264,351.90 145,713.60 118,638.30 55.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	264,351.90 145,713.60 118,638.30 55.1 %
4574	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO GEMELO EN ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA-LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZAL TEPEQUE.	260,000.00	P E D %	260,000.00 0.00 260,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	260,000.00 0.00 260,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	260,000.00 0.00 260,000.00 0.0 %
4607	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE OZATLÁN,	260,000.00	P E D %	260,000.00 153,989.00 106,011.00 59.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	260,000.00 153,989.00 106,011.00 59.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	260,000.00 153,989.00 106,011.00 59.2 %

4590	POTABLE DE SAN CRISTOBAL DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA. DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	200,000.00	P E D %	200,000.00 36,528.67 163,471.33 18.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,000.00 36,528.67 163,471.33 18.3 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,000.00 36,528.67 163,471.33 18.3 %
4591	REHABILITACION DEL POZO NO.2 EN PLANTA DE BOMBEO EL TINTERAL MUNICIPIO DE COATEPEQUE. DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.	200,000.00	P E D %	200,000.00 17,660.00 182,340.00 8.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,000.00 17,660.00 182,340.00 8.8 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,000.00 17,660.00 182,340.00 8.8 %
4606	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER, USulután.	200,000.00	P E D %	200,000.00 153,204.12 46,795.88 76.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,000.00 153,204.12 46,795.88 76.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,000.00 153,204.12 46,795.88 76.6 %
4612	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARAN, MUNICIPIO DE JUCUARAN DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.	200,000.00	P E D %	200,000.00 0.00 200,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,000.00 0.00 200,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,000.00 0.00 200,000.00 0.0 %
4615	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NOR-ORIENTE DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL	200,000.00	P E D %	200,000.00 0.00 200,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,000.00 0.00 200,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	200,000.00 0.00 200,000.00 0.0 %
4605	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE USULUTÁN, MEDIANTE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN TANQUES EL NANZAL, MUNICIPIO DE USULUTÁN.	177,824.64	P E D %	177,824.64 144,235.26 33,589.38 81.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	177,824.64 144,235.26 33,589.38 81.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	177,824.64 144,235.26 33,589.38 81.1 %
4600	PERFORACION E INCORPORACION DE POZO EN LA ANTENA II DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, CABANAS.	175,000.00	P E D %	175,000.00 45,793.62 129,206.38 26.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	175,000.00 45,793.62 129,206.38 26.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	175,000.00 45,793.62 129,206.38 26.2 %
4572	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE REBOMBEO, MUNICIPIO DE APOPA.	150,000.00	P E D %	150,000.00 117,022.22 32,977.78 78.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 117,022.22 32,977.78 78.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 117,022.22 32,977.78 78.0 %
4616	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, ASI COMO CAMBIO DE LA LINEA DE IMPELENCIA EN EL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE, LA UNIÓN.	150,000.00	P E D %	150,000.00 22,032.76 127,967.24 14.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 22,032.76 127,967.24 14.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	150,000.00 22,032.76 127,967.24 14.7 %

	4570	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 DE CAPACIDAD, EN PLANTA EL MIRADOR, PLANES DE RENDEROS, SAN SALVADOR.	132,725.52	P	132,725.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,725.52
			76,944.79	E	76,944.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,944.79
			55,780.73	D	55,780.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,780.73
			58.0 %	%	58.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	58.0 %
	4575	REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIREADORES DE LA CAMARA HUMEDA DE LA ESTACION DE BOMBEO LA TOMA DE QUEZALTEPEQUE, DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE	100,000.00	P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			22,538.98	E	22,538.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538.98
			77,461.02	D	77,461.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,461.02
			22.5 %	%	22.5 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	22.5 %
	4608	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, USULUTAN.	90,038.16	P	90,038.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,038.16
			0.00	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			90,038.16	D	90,038.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,038.16
			0.0 %	%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4617	MEJORAMIENTO DE LAS TORRES DE ENFRIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, LA UNION.	75,000.00	P	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
			0.00	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			75,000.00	D	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
			0.0 %	%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4633	CAMBIO Y RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE CANERIAS DE AGUA POTABLE (700 MTS.) CANTON LAS MARIAS, CHINAMECA, SAN MIGUEL	25,000.00	P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
			24,390.30	E	24,390.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.30
			609.70	D	609.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.70
			97.6 %	%	97.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	97.6 %
MINED			25,014,000.00	P	25,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,014,000.00
			9,167,015.74	E	9,167,015.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,167,015.74
			15,846,984.26	D	15,846,984.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,846,984.26
			36.6 %	%	36.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	36.6 %
	4635	PROGRAMA DE REPARACIONES MENORES EN CENTROS ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	2,402,162.90	P	2,402,162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402,162.90
			1,550,245.21	E	1,550,245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,245.21
			851,917.69	D	851,917.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,917.69
			64.5 %	%	64.5 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	64.5 %
	4636	PROGRAMA DE DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE CENTROS ESCOLARES A NIVEL NACIONAL	1,287,847.61	P	1,287,847.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,847.61
			1,220,107.00	E	1,220,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,107.00
			67,740.61	D	67,740.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,740.61
			94.7 %	%	94.7 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	94.7 %
	4690	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR	1,070,000.00	P	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00
			0.00	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,070,000.00	D	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00
			0.0 %	%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	4708	REHABILITACION INSTITUTO NACIONAL CATOLICO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SENSUNTEPEQUE	877,568.58	P	877,568.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,568.58
			219,392.14	E	219,392.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,392.14
			658,176.44	D	658,176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,176.44
			25.0 %	%	25.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	25.0 %

		SANTA ANA		%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
	4668	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR HACIENDA EL COCO, CHALCHUAPA, SANTA ANA	374,500.00	P E D %	374,500.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	374,500.00 0.00 374,500.00 0.00 0.0 %
	4694	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANDELARIO CUELLAR,MICOJUTEPEQUE, D/CUSCATLAN.	366,278.42	P E D %	366,278.42 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 %	366,278.42 0.00 366,278.42 0.00 0.0 %
	4713	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR DOMINGO SANTOS, SAN LORENZO, SAN VICENTE	355,599.94	P E D %	355,599.94 355,599.94 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	355,599.94 355,599.94 0.00 100.0 %
	4697	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL RODEO, M/SAN PEDRO PERULAPAN, D/CUSCATLAN.	350,700.00	P E D %	350,700.00 350,700.00 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	350,700.00 350,700.00 0.00 100.0 %
	4664	REPARACION Y MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCATIVO COL. NUEVA, CANTON GUYAPA ABAJO, JUJUTLA, AHUACHAPAN	341,394.00	P E D %	341,394.00 341,394.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	341,394.00 341,394.00 0.00 0.0 %
	4704	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR ISABEL LA CATOLICA, CANTON LOS LLANITOS, ILOBASCO, CABANAS	337,598.06	P E D %	337,598.06 168,799.04 168,799.02 50.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	337,598.06 168,799.04 168,799.02 50.0 %
	4669	REHABILITACION ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE METAPAN, SANTA ANA	337,410.25	P E D %	337,410.25 317,165.63 20,244.62 94.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	337,410.25 317,165.63 20,244.62 94.0 %
	4721	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR EL MARQUEZADO, SANTIAGO DE MARIA, USULUTAN	321,000.00	P E D %	321,000.00 7,000.00 314,000.00 2.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	321,000.00 7,000.00 314,000.00 2.2 %
	4695	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR COLONIA FATIMA, MICOJUTEPEQUE, D/CUSCATLAN.	313,808.97	P E D %	313,808.97 0.00 313,808.97 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	313,808.97 0.00 313,808.97 0.0 %
	4705	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO HUISCOYOL, CANTON TRINIDAD, SENSUNTEPEQUE, CABANAS	312,854.16	P E D %	312,854.16 0.00 312,854.16 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	312,854.16 0.00 312,854.16 0.0 %
		REHABILITACION		P	309,582.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,582.98

4699	COMPLEJO EDUCATIVO RAFAEL CABRERA, MISAN RAMON, DICUSCATLAN.	309,582.98	E	291,008.01 18,574.97 94.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	291,008.01 18,574.97 94.0 %	0.00 0.00 0.0 %	291,008.01 18,574.97 94.0 %
4716	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE	307,020.26	P	307,020.26 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	307,020.26 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	307,020.26 0.00 0.0 %
4724	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR 15 DE SEPTIEMBRE, SAN MIGUEL	286,675.16	P	286,675.16 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	286,675.16 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	286,675.16 0.00 0.0 %
4677	REHABILITACION Y MEJORAS CENTRO ESCOLAR HEROES DEL 11 DE ENERO, CHALATENANGO	282,850.97	P	282,850.97 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	282,850.97 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	282,850.97 0.00 0.0 %
4681	MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL NOMBRE DE JESUS, CHALATENANGO	265,470.00	P	265,470.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	265,470.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	265,470.00 0.00 0.0 %
4710	MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE SAN JUAN TEPEZONTES, LA PAZ	255,286.10	P	255,286.10 11,251.18 4.4 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	255,286.10 11,251.18 4.4 %	0.00 0.00 0.0 %	255,286.10 11,251.18 4.4 %
4672	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO VALLE NUEVO, CANTON METALIO, ACAJUTLA, SONSONATE	251,337.98	P	251,337.98 250,641.33 99.7 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	251,337.98 250,641.33 99.7 %	0.00 0.00 0.0 %	251,337.98 250,641.33 99.7 %
4943	CENTRO ESCOLAR BARRIO LA FATIMA, LA UNION	245,036.00	P	245,036.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	245,036.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	245,036.00 0.00 0.0 %
4686	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON SAN SEBASTIAN, ZARAGOZA, LA LIBERTAD	243,480.69	P	243,480.69 228,871.85 94.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	243,480.69 228,871.85 94.0 %	0.00 0.00 0.0 %	243,480.69 228,871.85 94.0 %
4718	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL TABURETE, JIQUILISCO, USulután	240,865.00	P	240,865.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	240,865.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	240,865.00 0.00 0.0 %
4676	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SISIMITEPEC, NAHUZALCO, SONSONATE	235,069.65	P	235,069.65 117,534.84 50.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	235,069.65 117,534.84 50.0 %	0.00 0.00 0.0 %	235,069.65 117,534.84 50.0 %
4941	CENTRO ESCOLAR HACIENDA LA CAÑADA, CONCHAGUA, LA UNION	232,292.43	P	232,292.43 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	232,292.43 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	232,292.43 0.00 0.0 %
4719	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SAN JUAN	228,472.00	P	228,472.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	228,472.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.0 %	228,472.00 0.00 0.0 %

4665	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO, JUJUTLA, AHUACHAPAN	P E D %	189,787.84 47,446.97 142,340.87 25.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	189,787.84 47,446.97 142,340.87 25.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	189,787.84 47,446.97 142,340.87 25.0 %
4696	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JOSÉ, MISAN CRISTOBAL, D/CUSCATLAN.	P E D %	187,250.00 0.00 187,250.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	187,250.00 0.00 187,250.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	187,250.00 0.00 187,250.00 0.0 %
4723	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CHAPELTIQUE, SAN MIGUEL	P E D %	187,250.00 0.00 187,250.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	187,250.00 0.00 187,250.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	187,250.00 0.00 187,250.00 0.0 %
4945	INSTITUTO NACIONAL DE NUEVA ESPARTA, LA UNION	P E D %	183,349.13 183,349.13 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	183,349.13 183,349.13 0.00 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	183,349.13 183,349.13 0.00 100.0 %
4698	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON CERRO COLORADO, MISAN RAFAEL CEDROS, D/CUSCATLAN.	P E D %	182,351.68 181,396.98 954.70 99.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	182,351.68 181,396.98 954.70 99.5 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	182,351.68 181,396.98 954.70 99.5 %
4662	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO NUEVO NANCE AMARILLO, CANTON RIO FRIO, AHUACHAPAN	P E D %	171,061.15 37,415.45 133,645.70 21.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	171,061.15 37,415.45 133,645.70 21.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	171,061.15 37,415.45 133,645.70 21.9 %
4693	MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL GENERAL ADOLFO BLANDÓN, M/COJUTEPEQUE, D/CUSCATLAN.	P E D %	170,849.20 170,136.29 712.91 99.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	170,849.20 170,136.29 712.91 99.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	170,849.20 170,136.29 712.91 99.6 %
4726	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR PARAISO REAL, SAN MIGUEL	P E D %	162,162.74 0.00 162,162.74 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	162,162.74 0.00 162,162.74 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	162,162.74 0.00 162,162.74 0.0 %
4707	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO CERRO EL TORO, C/ LA TRINIDAD, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS	P E D %	160,500.00 0.00 160,500.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	160,500.00 0.00 160,500.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	160,500.00 0.00 160,500.00 0.0 %
4717	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INSTITUTO NACIONAL DE CONCEPCION BATRES, USULUTAN	P E D %	157,290.00 0.00 157,290.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	157,290.00 0.00 157,290.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	157,290.00 0.00 157,290.00 0.0 %
4939	INSTITUTO NACIONAL DE OSICALA, MORAZAN	P E D %	152,655.43 0.00 152,655.43 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	152,655.43 0.00 152,655.43 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	152,655.43 0.00 152,655.43 0.0 %
4728	CENTRO ESCOLAR COLONIA CARRILLO, CANTON EL PAPALÓN, SAN MIGUEL	P E D %	149,800.00 7,000.00 142,800.00 4.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	149,800.00 7,000.00 142,800.00 4.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	149,800.00 7,000.00 142,800.00 4.7 %

4725	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR LA CARMENZA, SAN MIGUEL	146,804.00	P	146,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,804.00	0.00	0.00	0.00	146,804.00	0.00
			E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4663	REPARACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL SALITRERO, ATQUIZAYA, AHUACHAPAN	141,156.34	P	141,156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,156.34	0.00	0.00	0.00	141,156.34	0.00
			E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4683	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CEN TO ESCOLAR DE QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD	132,931.14	P	132,931.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,931.14	0.00	0.00	0.00	132,931.14	0.00
			E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4714	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN VICENTE	129,897.74	P	129,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,897.74	0.00	0.00	0.00	129,897.74	0.00
			E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4702	CENTRO ESCOLAR CASERIO CONCEPCION, CANTON LA QUESERA, ILOBASCO, CABAÑAS	119,840.00	P	119,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,840.00	0.00	0.00	0.00	119,840.00	0.00
			E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4666	REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON GUASCOTA, SAN LORENZO AHUACHAPAN	112,350.00	P	112,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,350.00	0.00	0.00	0.00	112,350.00	0.00
			E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4680	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON TALQUEZALAR, CITALA CHALATENANGO	109,157.40	P	109,157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,157.40	0.00	0.00	0.00	109,157.40	0.00
			E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4720	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE NUEVA GRANADA, USULUTAN	107,000.00	P	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00
			E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4709	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR FABIO IGNACIO MAGAÑA, EL ROSARIO, LA PAZ	99,975.00	P	99,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,975.00	0.00	0.00	0.00	99,975.00	0.00
			E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4678	REPARACION ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "DE CHALATENANGO", CHALATENANGO	98,530.61	P	98,530.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,530.61	0.00	0.00	0.00	98,530.61	0.00
			E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4673	REPARACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON CERRO ALTO, CALUCO, SONSONATE	86,511.83	P	86,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,511.83	0.00	0.00	0.00	86,511.83	0.00
			E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4940	INSTITUTO NACIONAL DE SAN SIMON, MORAZAN	80,250.00	P	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00	0.00	80,250.00	0.00
			E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4682	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO	78,718.08	P	78,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,718.08	0.00	0.00	0.00	78,718.08	0.00
			E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00

		ESCOLAR JICALAPA, LA LIBERTAD		D %	78,718.08 0.0 %	0.00 0.0 %	78,718.08 0.0 %	0.00 0.0 %	0.00 0.0 %	78,718.08 0.0 %
UES				P	19,038,605.75	0.00	19,038,605.75	0.00	0.00	19,038,605.75
				E	4,163,664.95	0.00	4,163,664.95	0.00	0.00	4,163,664.95
				D	14,874,940.80	0.00	14,874,940.80	0.00	0.00	14,874,940.80
				%	21.9 %	0.0 %	21.9 %	0.0 %	0.0 %	21.9 %
	3762	CONSTRUCCION DE BOVEDA		P	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5024	FORTELECIMIENTO AL PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES GENERANDO OPORTUNIDADES DE ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CON PERSPECTIVAS HACIA EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL		P	2,842,021.55	0.00	2,842,021.55	0.00	0.00	2,842,021.55
				E	1,289,000.93	0.00	1,289,000.93	0.00	0.00	1,289,000.93
				D	1,553,020.62	0.00	1,553,020.62	0.00	0.00	1,553,020.62
				%	45.4 %	0.0 %	45.4 %	0.0 %	0.0 %	45.4 %
	5025	FORTELECIMIENTO DEL PROGRAMA JÓVENES TALENTO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR		P	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5013	Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias Económicas		P	819,298.81	0.00	819,298.81	0.00	0.00	819,298.81
				E	63,727.34	0.00	63,727.34	0.00	0.00	63,727.34
				D	755,571.47	0.00	755,571.47	0.00	0.00	755,571.47
				%	7.8 %	0.0 %	7.8 %	0.0 %	0.0 %	7.8 %
	5012	Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente		P	653,846.00	0.00	653,846.00	0.00	0.00	653,846.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	653,846.00	0.00	653,846.00	0.00	0.00	653,846.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5014	Construcción de Edificio de Usos Múltiples para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.		P	653,846.00	0.00	653,846.00	0.00	0.00	653,846.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	653,846.00	0.00	653,846.00	0.00	0.00	653,846.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5015	Construcción de Edificio para Instituto de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas		P	653,846.00	0.00	653,846.00	0.00	0.00	653,846.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	653,846.00	0.00	653,846.00	0.00	0.00	653,846.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5016	Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias y Humanidades.		P	653,846.00	0.00	653,846.00	0.00	0.00	653,846.00
				E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	653,846.00	0.00	653,846.00	0.00	0.00	653,846.00
				%	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	5023	Modernización de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.		P	650,716.32	0.00	650,716.32	0.00	0.00	650,716.32
				E	432,952.12	0.00	432,952.12	0.00	0.00	432,952.12
				D	217,764.20	0.00	217,764.20	0.00	0.00	217,764.20
				%	66.5 %	0.0 %	66.5 %	0.0 %	0.0 %	66.5 %
	5017	Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la Facultad de Medicina.		P	643,182.50	0.00	643,182.50	0.00	0.00	643,182.50
				E	525,288.28	0.00	525,288.28	0.00	0.00	525,288.28
				D	117,894.22	0.00	117,894.22	0.00	0.00	117,894.22
				%	81.7 %	0.0 %	81.7 %	0.0 %	0.0 %	81.7 %

		Fortalecimiento de los Laboratorios del área Básica de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	P 609,721.88 E 427,928.95 D 181,792.93 %	609,721.88 427,928.95 181,792.93 70.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	609,721.88 427,928.95 181,792.93 70.2 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	609,721.88 427,928.95 181,792.93 70.2 %
	5009													
	5010	Fortalecimiento de Infraestructura en la Facultad de Odontología.	P 457,703.52 E 457,665.79 D 37.73 %	457,703.52 457,665.79 37.73 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	457,703.52 457,665.79 37.73 100.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	457,703.52 457,665.79 37.73 100.0 %
	5011	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL	P 457,291.42 E 213,478.37 D 243,813.05 %	457,291.42 213,478.37 243,813.05 46.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	457,291.42 213,478.37 243,813.05 46.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	457,291.42 213,478.37 243,813.05 46.7 %
	5022	Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia.	P 410,593.75 E 390,531.13 D 20,062.62 %	410,593.75 390,531.13 20,062.62 95.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	410,593.75 390,531.13 20,062.62 95.1 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	410,593.75 390,531.13 20,062.62 95.1 %
	5018	Construcción de Edificio de Posgrados en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.	P 353,846.00 E 0.00 D 353,846.00 %	353,846.00 0.00 353,846.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	353,846.00 0.00 353,846.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	353,846.00 0.00 353,846.00 0.0 %
	5019	Construcción de Muro Perimetral en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente	P 260,000.00 E 232,512.08 D 27,487.92 %	260,000.00 232,512.08 27,487.92 89.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	260,000.00 232,512.08 27,487.92 89.4 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	260,000.00 232,512.08 27,487.92 89.4 %
	5026	Fortalecimiento de la Radio Universitaria	P 175,000.00 E 0.00 D 175,000.00 %	175,000.00 0.00 175,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	175,000.00 0.00 175,000.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	175,000.00 0.00 175,000.00 0.0 %
	5027	Modernización de la Administración Académica	P 125,000.00 E 58,262.96 D 66,737.04 %	125,000.00 58,262.96 66,737.04 46.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	125,000.00 58,262.96 66,737.04 46.6 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	125,000.00 58,262.96 66,737.04 46.6 %
	5020	Modernización de el Sistema de Energía Eléctrica en el Campus Central	P 78,846.00 E 34,436.60 D 44,409.40 %	78,846.00 34,436.60 44,409.40 43.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	78,846.00 34,436.60 44,409.40 43.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	78,846.00 34,436.60 44,409.40 43.7 %
	5021	Modernización de los Laboratorios del Departamento de Química de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.	P 40,000.00 E 37,880.40 D 2,119.60 %	40,000.00 37,880.40 2,119.60 94.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	40,000.00 37,880.40 2,119.60 94.7 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	40,000.00 37,880.40 2,119.60 94.7 %
PEIS			P 231,912,056.93 E 76,402,210.81 D 155,509,846.12 %	231,912,056.93 76,402,210.81 155,509,846.12 32.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	231,912,056.93 76,402,210.81 155,509,846.12 32.9 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	0.00 0.00 0.00 0.0 %	231,912,056.93 76,402,210.81 155,509,846.12 32.9 %
TOTAL GENERAL			P 1,154,898,007.70 E 321,029,682.67 D 207,009,628.03 %	1,154,898,007.70 321,029,682.67 207,009,628.03 60.8 %	91,940,372.89 40,234,841.12 51,705,531.77 43.8 %	100,000.00 0.00 100,000.00 0.0 %	353,406,819.62 107,281,065.72 246,125,753.90 30.4 %	181,411,504.49 150,423,828.72 30,987,675.77 82.9 %	534,818,324.11 257,704,894.44 277,113,429.67 48.2 %	1,154,898,007.70 321,029,682.67 207,009,628.03 60.8 %	91,940,372.89 40,234,841.12 51,705,531.77 43.8 %	100,000.00 0.00 100,000.00 0.0 %	353,406,819.62 107,281,065.72 246,125,753.90 30.4 %	1,154,898,007.70 321,029,682.67 207,009,628.03 60.8 %

* Los datos relativos del mes que se informa se actualizan durante los primeros 5 días hábiles del mes posterior a este.

* P = Programado, E = Ejecutado, D = Diferencia de Ejecución

* Cifras base devengado

