

PAIP 2014

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA (PAIP) AL MES DE JUNIO



DIRECCION GENERAL DE INVERSION Y
CREDITO PÚBLICO


I. Información General

1.1 Composición del Programa

El PAIP 2014 vigente al mes de junio por valor de \$1,088.9 millones equivalente al 4.3% del PIB¹, reporta un incremento de \$14.5 millones con respecto al PAIP vigente al mes de mayo, debido a modificación de los programas Institucionales de MINSAL, MARN, PNC-MJSP y DGCP-MJSP que incrementaron, y FOVIAL que disminuyó.

En el Gráfico 1 se presenta la composición por tipo de presupuesto y/o programas especiales.


Gráfico No.1
Composición del PAIP 2014

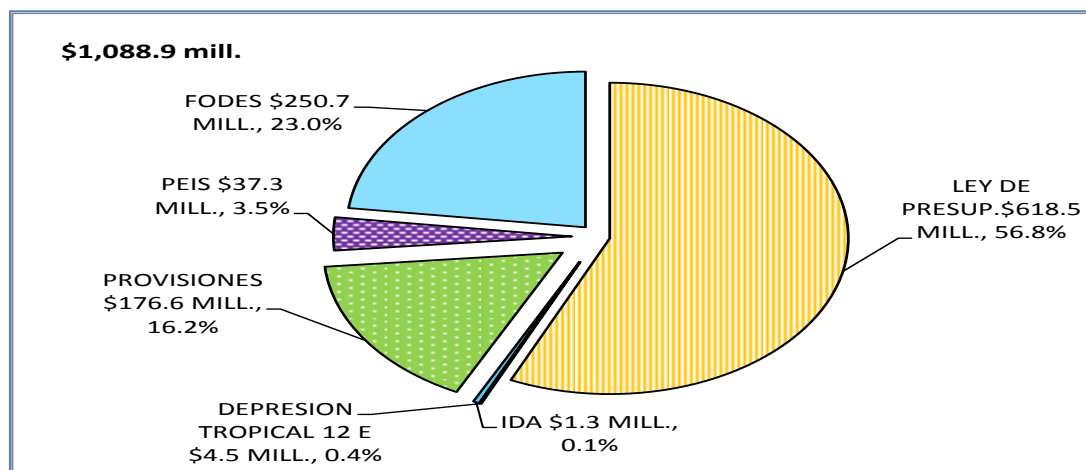

1.2 Distribución del PAIP 2014, por Sector de Actividad.

El PAIP vigente al mes de junio/14 contempla \$533.7 millones (49.0%) para proyectos del sector social, \$475.1 millones (43.6%) para proyectos del sector económico y \$80.1 millones (7.4%) para proyectos del sector justicia y seguridad pública.


Gráfico No.2
PAIP 2014 por Sector de Actividad, al mes de Junio

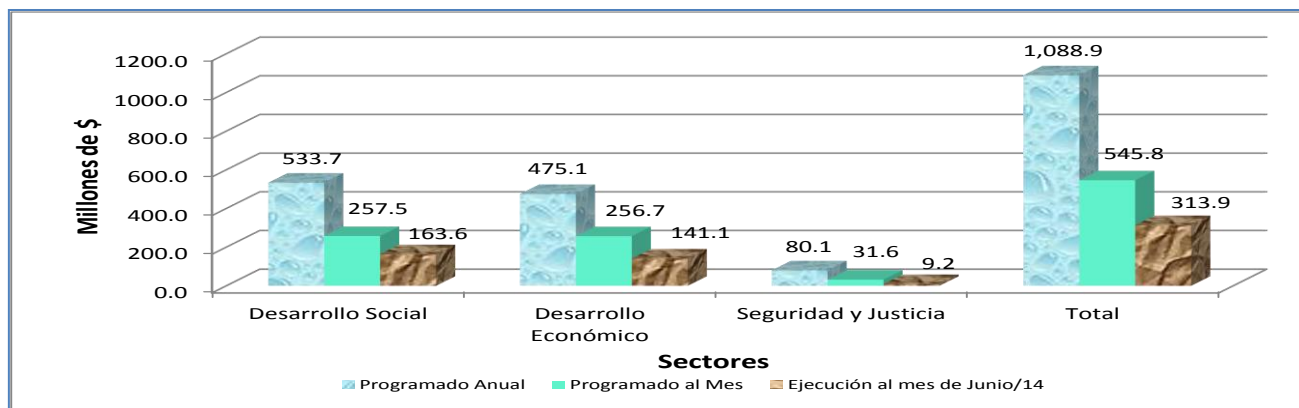

¹ PIB: US\$25,337.9 millones.


1.3 Composición del PAIP 2014, por Fuente de Financiamiento.

Gráfico No.3
Avance PAIP 2014 a junio, por Fuente de Financiamiento
(Montos en millones US\$)

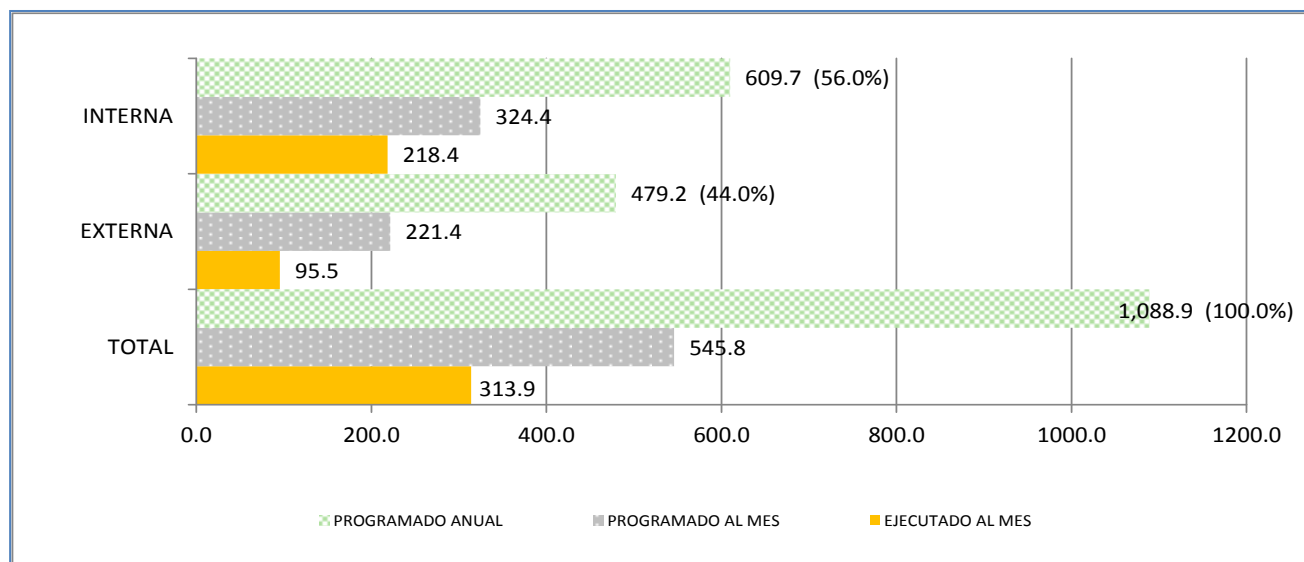

1.4 Composición del PAIP 2014, por Estructura del Sector Público no Financiero


Gráfico No.4
Avance PAIP 2014 a junio, por Estructura del Sector Público
(Montos en millones US\$)

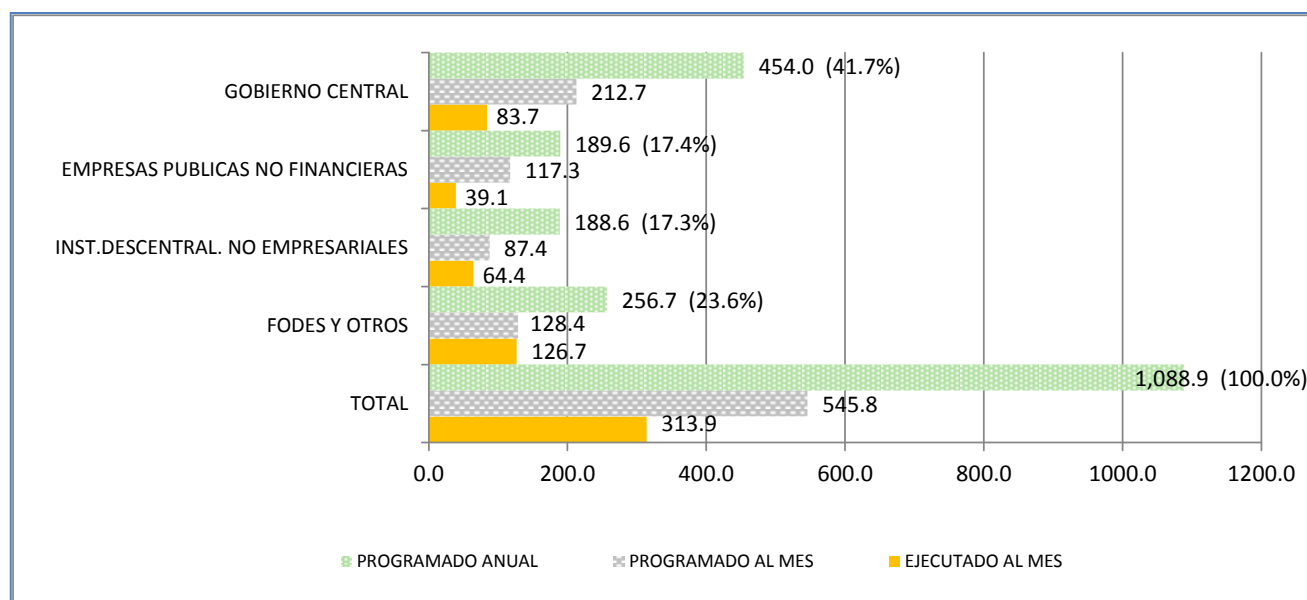

II. Comportamiento del PAIP

2.1 Avance en uso de los Recursos del PAIP


Gráfico No.5
Avance en el Uso de los Recursos del PAIP 2014 al mes de Junio

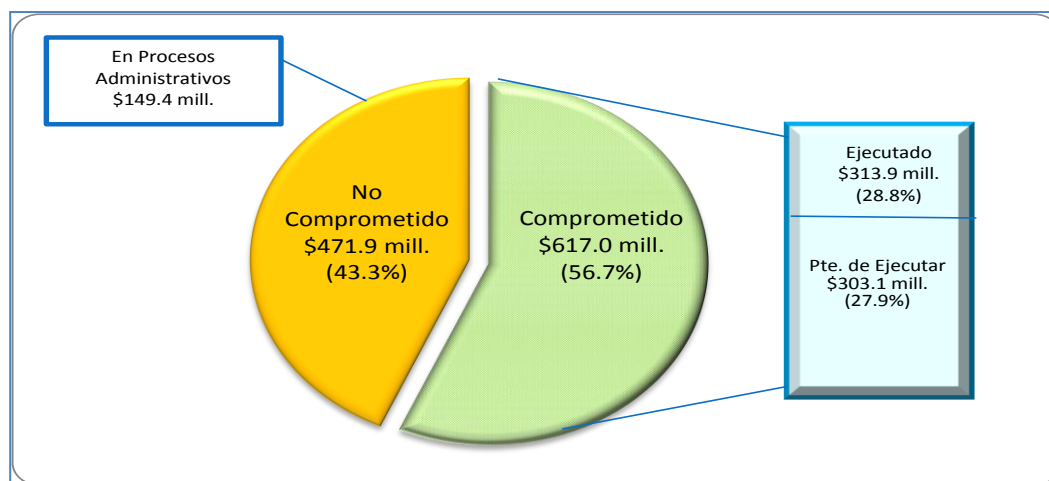

2.2 Comparativo de la Inversión Programada / Ejecutada

En el siguiente gráfico se reportan los montos de inversión programada/ejecutada al mes de junio, durante los últimos 6 años (2009 – 2014).

Gráfico No.6
Inversión Programada/Ejecutada, al mes de junio 2009 - 2014
(En millones US\$)

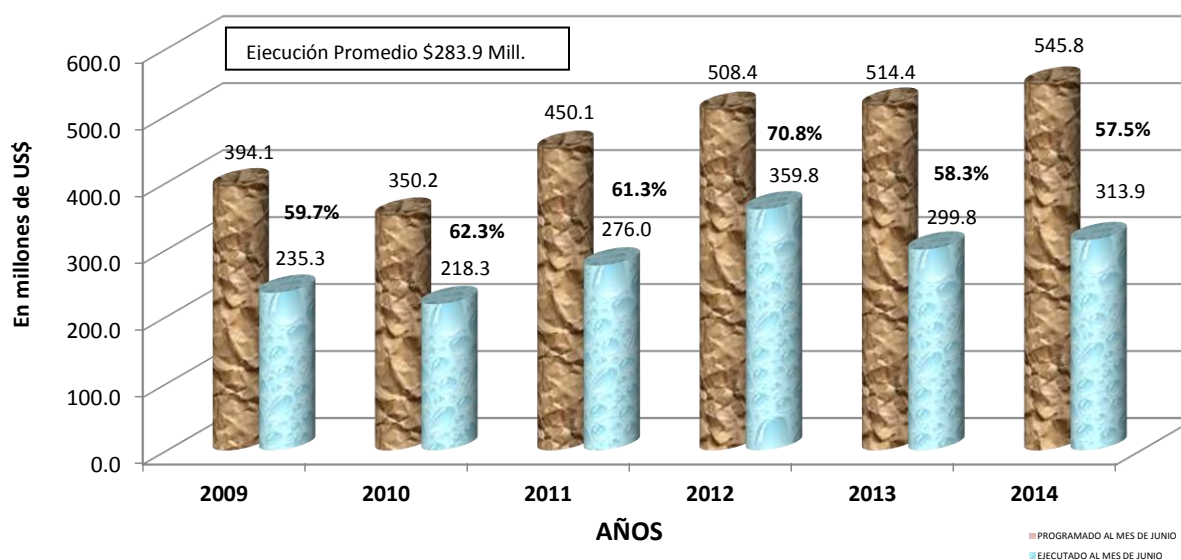


2.3 Inversión Programada / Ejecutada por Institución Ejecutora

Cuadro No.1
EJECUCION FINANCIERA DEL PAIP 2014, AL MES DE JUNIO, POR INSTITUCION
(En millones de dólares)

| INSTITUCIONES | No. de Programas /Proyectos | PROGRAMA VIGENTE ANUAL | PROGRAMADO AL MES DE JUNIO | COMPROMETIDO AL MES DE JUNIO | | MONTO NO COMPROMETIDO AL MES DE JUNIO | |
|--|-----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | TOTAL | TOTAL EJECUTADO | TOTAL | SUB TOTAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS |
| GOBIERNO CENTRAL | 268 | 454.05 | 212.77 | 205.01 | 83.73 | 249.04 | 114.73 |
| MINSAL | 124 | 97.28 | 62.62 | 54.24 | 22.79 | 43.04 | 42.48 |
| MOP | 60 | 81.36 | 36.39 | 39.58 | 11.08 | 41.79 | 26.98 |
| VMVDU | 6 | 52.58 | 17.20 | 14.61 | 6.94 | 37.97 | 21.30 |
| MINED | 14 | 43.09 | 15.94 | 26.02 | 12.77 | 17.07 | 8.40 |
| MAG | 11 | 36.92 | 15.43 | 13.90 | 8.84 | 23.02 | 13.45 |
| CSJ | 11 | 35.55 | 19.74 | 13.18 | 5.52 | 22.37 | 0.02 |
| DGCP -MJSP | 9 | 23.26 | 4.22 | 2.10 | 0.92 | 21.15 | - |
| MARN | 7 | 18.89 | 5.25 | 6.20 | 1.16 | 12.68 | - |
| VMT | 1 | 17.46 | 16.61 | 13.35 | 6.99 | 4.10 | - |
| PNC - MJSP | 5 | 14.21 | 4.74 | 7.18 | - | 7.04 | - |
| MINEC | 1 | 6.34 | 2.58 | 1.38 | 0.47 | 4.96 | 0.71 |
| SE-MJSP | 1 | 5.83 | 2.33 | 5.83 | 2.33 | - | - |
| MH | 5 | 5.28 | 2.50 | 1.15 | 0.66 | 4.13 | 1.40 |
| SIS CAPRES | 3 | 4.97 | 1.88 | 0.44 | 1.05 | 4.53 | - |
| AL | 4 | 3.92 | 3.42 | 2.97 | 1.26 | 0.95 | - |
| MTYPS | 1 | 3.37 | 0.83 | 1.37 | 0.28 | 2.00 | - |
| CONAMYPE | 2 | 1.20 | 0.57 | 0.31 | 0.25 | 0.89 | - |
| FGR | 1 | 1.00 | 0.30 | 0.98 | 0.29 | 0.02 | - |
| INJUVE | 1 | 1.30 | - | - | - | 1.30 | - |
| CI -MJSP | 1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | - | - |
| INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 54 | 188.57 | 87.35 | 75.02 | 64.41 | 113.55 | 16.44 |
| FISDL | 12 | 82.73 | 38.56 | 22.78 | 24.79 | 59.95 | 3.30 |
| FOVIAL | 10 | 64.19 | 31.78 | 42.99 | 29.45 | 21.20 | 5.97 |
| CNR | 1 | 14.35 | 6.24 | 7.63 | 4.82 | 6.72 | 0.59 |
| UES | 13 | 9.75 | 4.60 | - | 0.84 | 9.75 | - |
| ISSS | 6 | 7.30 | 0.64 | - | 0.52 | 7.30 | 6.26 |
| CENTA | 2 | 4.69 | 3.55 | - | 2.70 | 4.69 | 0.32 |
| ISTU | 3 | 3.95 | 1.89 | 1.47 | 1.24 | 2.48 | - |
| ISDEMU | 4 | 0.88 | 0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.73 | - |
| ISRI | 3 | 0.73 | - | - | - | 0.73 | - |
| EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS | 24 | 189.64 | 117.32 | 84.10 | 39.09 | 105.54 | 18.09 |
| CEL | 8 | 156.15 | 93.05 | 71.41 | 30.91 | 84.74 | - |
| CEPA | 2 | 22.97 | 19.00 | 7.95 | 4.36 | 15.03 | 14.75 |
| ANDA | 14 | 10.52 | 5.27 | 4.75 | 3.82 | 5.77 | 3.33 |
| OTRAS | 11 | 5.88 | 3.00 | 2.07 | 1.30 | 3.81 | 0.18 |
| FONAVIPO | 7 | 2.26 | 0.45 | 0.36 | 0.27 | 1.91 | 0.01 |
| FSV | 2 | 2.09 | 1.77 | 1.27 | 0.59 | 0.83 | 0.18 |
| FONAES | 2 | 1.52 | 0.78 | 0.45 | 0.45 | 1.07 | - |
| SUB-TOTAL | 357 | 838.14 | 420.44 | 366.21 | 188.53 | 471.93 | 149.44 |
| FODES | | 250.75 | 125.38 | 250.75 | 125.38 | - | - |
| TOTAL | | 1,088.89 | 545.81 | 616.96 | 313.91 | 471.93 | 149.44 |

2.4 Inversión Programada / Ejecutada por Principales Instituciones.

Gráfico No.7
Instituciones con mayor Inversión Ejecutada en Enero – Junio 2014
(Montos en millones de US\$)

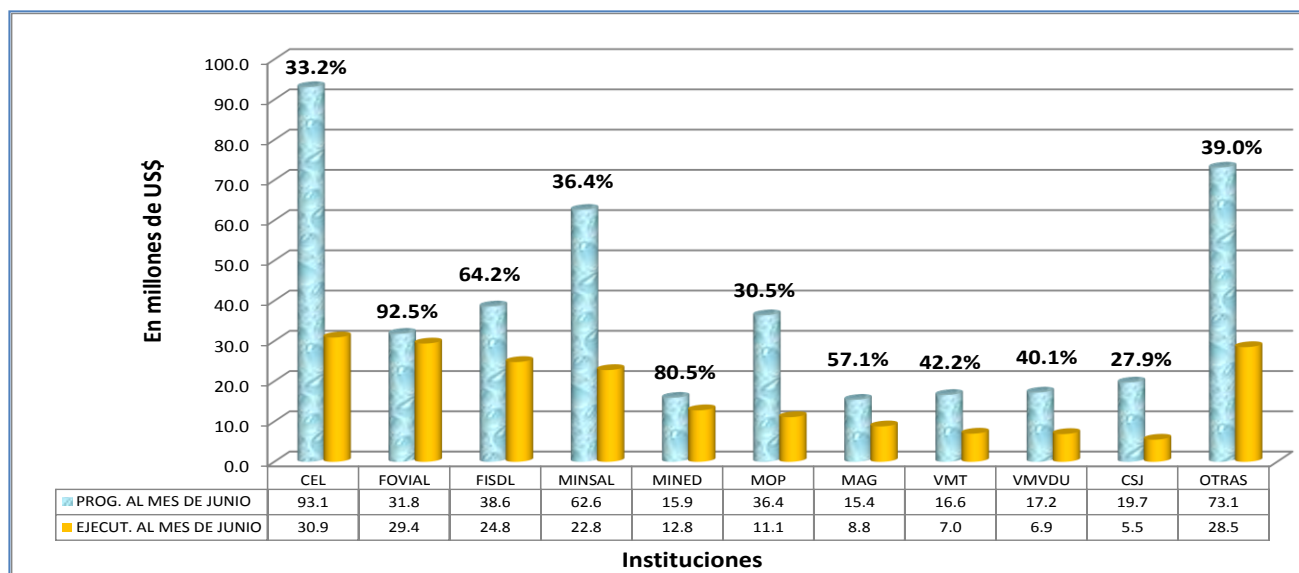

(No incluye FODES)

2.5 Inversión Programada / Ejecutada con Recursos PEIS.

Cuadro No.2
Inversión 2014 con recursos PEIS
(Montos en millones de US\$)

| Instituciones | Programa vigente al mes de junio/14 | Programado al mes de junio/14 | Ejecutado al mes de junio/14 | % de Ejecución al mes de junio/14 | No ejecutado del programado al mes de junio/14 |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4= (3/2) | 5=(2-3) |
| MINSAL | 17.9 | 17.1 | 4.4 | 25.7 | 12.7 |
| UES | 9.7 | 4.6 | 0.8 | 17.4 | 3.8 |
| MOP | 8.3 | 8.3 | 2.8 | 33.7 | 5.5 |
| ANDA | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 88.9 | 0.1 |
| MAG | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 25.0 | 0.3 |
| MINED | 0.4 | 0.04 | 0.02 | 50.0 | 0.02 |
| TOTAL | 37.7 | 31.3 | 8.9 | 28.4 | 22.4 |

(Incluye provisiones PEIS).

2.6 Algunos proyectos reportados por las Ejecutoras como finalizados en junio/2014.

Cuadro No.3
Proyectos finalizados en el mes de Junio

| INSTITUCION | NOMBRE DEL PROYECTO |
|--------------|--|
| FISDL | Programa Promoción de la Prestación Descentralizada de Servicios : 4 proyectos finalizados: "Adoquinado Completo de 3ra. Calle Poniente, Barrio El Calvario, Intipucá, La Unión"; "Rehabilitación del Centro Escolar Cantón La Joya, San José, La Unión"; "Construcción de Unidad de Salud Básica Familiar, Cantón El Despoblado, Santa Rosa Guachipilín, Santa Ana" e "Introducción de Energía Eléctrica en Caserío Santa Agueda, Cantón Punta Remedios, Acajutla, Sonsonate". |
| ISTU | "Cancha de Football de Playa en Centro Recreativo Apulo" y "Cancha de Football de Playa en Centro Recreativo Costa del Sol". (Fase I). |

A continuación se detallan los proyectos que conforman el PAIP 2014 vigentes al mes de junio/2014, agrupados por institución ejecutora, según reporte generado el 11 de julio de 2014, con información registrada por las entidades ejecutoras en los Sistemas SAFI y SIIP.



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE JUNIO a/
(MONTOS EN DOLARES)

| CODIGO | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO | No. Prog. y Proyec. | PROGRAMADO TOTAL | PROGRAMADO AL MES | EJECUTADO AL MES | % EJEC. FINANC. |
|-------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| GOBIERNO CENTRAL | | | | | | |
| MINSAL | | 124 | 97,283,905.91 | 62,618,424.94 | 22,787,496.80 | 36.39 |
| 5209 | Fortalecimiento del Sistema Público de Salud | | 27,530,507.74 | 7,494,423.15 | 159,145.20 | 2.12 |
| 5128 | Programa Integrado de Salud | | 25,319,842.04 | 15,434,736.78 | 9,140,958.42 | 59.22 |
| 5131 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR | | 22,040,495.38 | 20,092,365.30 | 8,086,522.03 | 40.25 |
| 401 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION | | 10,286,386.51 | 10,304,989.79 | 1,244,889.00 | 12.08 |
| 6015 | PROGRAMA SALUD MESOAMÉRICA 2015 - EL SALVADOR | | 2,400,000.00 | 825,522.31 | 988,832.37 | 119.78 |
| 4656 | Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña" | | 1,254,454.33 | 567,996.52 | 777,621.98 | 136.91 |
| 4654 | Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom" | | 1,173,336.93 | 1,168,306.61 | 339,952.92 | 29.10 |
| 4655 | Remodelación y Equipamiento de la Tercera Planta del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales | | 884,899.31 | 884,899.31 | 606,858.89 | 68.58 |
| 4890 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La Libertad, La Libertad | | 731,295.75 | 495,348.73 | - | - |
| 5766 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JIQUILISCO, USULUTÁN. | | 431,709.10 | 359,757.60 | - | - |
| 4894 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana | | 401,319.11 | 393,773.63 | 6,045.53 | 1.54 |
| 4927 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guacotecti, Cabañas | | 361,865.20 | 341,525.20 | 256,053.99 | 74.97 |
| 5782 | Equipamiento de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar -ECOS- de la Bahía de Jiquilisco, Usulután | | 270,097.07 | 225,080.90 | - | - |
| 4911 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Nahuizalco, Sonsonate | | 263,438.75 | 263,438.75 | 89,649.10 | 34.03 |
| 4860 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Carmen, La Unión | | 261,906.38 | 261,906.38 | 17,761.91 | 6.78 |
| 4876 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Usulután, Usulután | | 232,322.50 | 232,256.89 | 166,030.01 | 71.49 |
| 4653 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom" | | 166,662.51 | 159,882.51 | 32,006.56 | 20.02 |
| 4853 | Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martín, San Salvador | | 165,943.26 | 155,773.26 | 62,703.73 | 40.25 |
| 5962 | CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE | | 161,239.00 | 159,139.00 | 52,414.47 | 32.94 |
| 4887 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Ciudad Arce, La Libertad | | 160,125.06 | 160,125.06 | 34,860.79 | 21.77 |
| 5773 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CASERIO LA PIRRAYA, ISLA SAN SEBASTIAN, USULUTAN | | 133,034.73 | 88,689.84 | - | - |
| 5832 | Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica Canton San Marcos Lempa, Jiquilisco, Usulután | | 132,271.84 | 110,226.55 | - | - |
| 4908 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás Pineda Martínez, Santa Ana | | 125,639.63 | 122,454.97 | 26,778.97 | 21.87 |
| 5958 | CONSTRUCCION UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CANTON EL PASTOR, MUNICIPIO DE YAYANTIQUE, LA UNIÓN | | 112,414.64 | 93,678.90 | - | - |
| 5831 | Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica Cantón La Laguna, Caserío La Ermita, Corinto, Morazán | | 104,296.64 | 86,913.90 | - | - |
| 4836 | Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de Ayutuxtepeque, San Salvador | | 96,746.64 | 76,406.64 | 28,517.27 | 37.32 |
| 4910 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio, San Antonio del Monte, Sonsonate | | 86,712.08 | 86,712.08 | 38,742.68 | 44.68 |
| 4866 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las Marías, Chinameca, San Miguel | | 77,726.52 | 77,726.52 | 36,403.33 | 46.84 |
| 4880 | Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud El Espino, Jucuarán, Usulután | | 65,482.44 | 65,482.44 | 50,478.00 | 77.09 |
| 4884 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango | | 64,834.75 | 64,834.75 | 40,153.87 | 61.93 |
| 3345 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CHALATENANGO | | 58,342.44 | 58,342.44 | 15,054.67 | 25.80 |
| 4864 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Llano los Patos, Conchagua, La Unión | | 57,553.27 | 57,553.27 | 14,207.17 | 24.69 |
| 4924 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán | | 56,047.65 | 56,047.65 | 26,877.72 | 47.96 |
| 4881 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Cruz, Usulután | | 54,467.19 | 54,467.19 | 15,924.86 | 29.24 |
| 4882 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Dorado, Chalatenango | | 50,526.43 | 50,526.43 | 33,993.50 | 67.28 |
| 4929 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilobasco, Cabañas | | 49,852.51 | 49,852.51 | 3,052.91 | 6.12 |
| 4862 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Carlos, La Unión | | 48,434.98 | 48,434.98 | 5,254.37 | 10.85 |
| 4913 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Ahuachapán, Ahuachapán | | 47,191.82 | 47,191.82 | 22,404.44 | 47.48 |
| 4930 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Jutiapa, Cabañas | | 45,374.49 | 43,255.74 | 12,800.46 | 29.59 |
| 4661 | Apoyo al Primer Nivel de Atención y Hospitales del MSPAS. | | 43,971.68 | 41,894.00 | 21,059.92 | 50.27 |
| 4859 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Bobadilla, San Alejo, La Unión | | 43,126.36 | 43,126.36 | 8,913.40 | 20.67 |
| 5829 | ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR - PROYECTO SALUD MESOAMERICA 2015 | | 41,146.23 | 34,288.55 | - | - |



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE JUNIO a/
(MONTOS EN DOLARES)

| CODIGO | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO | No. Prog. y Proyec. | PROGRAMADO TOTAL | PROGRAMADO AL MES | EJECUTADO AL MES | % EJC. FINANC. |
|--------|--|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 4867 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Uluazapa, San Miguel | | 40,665.92 | 40,665.92 | 9,734.01 | 23.94 |
| 4912 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Salcoatitan, Sonsonate | | 39,640.18 | 39,640.18 | 12,859.28 | 32.44 |
| 4893 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Tamanique, La Libertad | | 39,598.18 | 39,598.18 | 9,613.66 | 24.28 |
| 3346 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA | | 38,948.22 | 38,948.22 | 20,463.57 | 52.54 |
| 4852 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador | | 38,442.77 | 38,442.77 | 15,552.41 | 40.46 |
| 4861 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Faro, Conchagua, La Unión | | 38,176.82 | 38,176.82 | 3,156.40 | 8.27 |
| 4858 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucia, Ilopango, San Salvador | | 35,608.54 | 35,608.54 | 8,600.43 | 24.15 |
| 4874 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Rafael, San Miguel | | 35,216.19 | 25,046.19 | 11,869.97 | 47.39 |
| 4839 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes, San Salvador | | 35,047.51 | 35,047.51 | 9,287.00 | 26.50 |
| 4850 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador | | 32,704.82 | 32,704.82 | 11,544.76 | 35.30 |
| 4891 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Matías, La Libertad | | 31,263.76 | 31,263.76 | 2,556.51 | 8.18 |
| 4938 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guadalupe, San Vicente | | 30,626.14 | 30,626.14 | 5,386.65 | 17.59 |
| 4902 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Jose Ingenio, Metapán, Santa Ana | | 28,359.54 | 28,359.54 | 7,038.46 | 24.82 |
| 4889 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad | | 27,656.76 | 27,656.76 | 10,248.61 | 37.06 |
| 4918 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Candelaria, Cuscatlán | | 25,539.65 | 25,539.65 | 12,108.89 | 47.41 |
| 4851 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Tonacatepeque, San Salvador | | 25,043.31 | 25,043.31 | 10,385.08 | 41.47 |
| 4926 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Sensuntepeque, Cabañas | | 24,452.76 | 24,452.76 | 9,293.78 | 38.01 |
| 4906 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Lucia, Santa Ana | | 23,362.53 | 23,290.88 | 9,277.55 | 39.83 |
| 4905 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana | | 22,908.64 | 22,908.64 | 2,722.17 | 11.88 |
| 4907 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Barbara, Santa Ana | | 22,605.17 | 22,605.17 | 5,228.45 | 23.13 |
| 4897 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana | | 19,829.24 | 19,829.24 | 2,585.00 | 13.04 |
| 4868 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel | | 19,811.53 | 19,811.53 | 4,789.44 | 24.18 |
| 4925 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Perulapia, Cuscatlán | | 19,574.60 | 19,574.60 | 5,681.89 | 29.03 |
| 4920 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de Concepción, Cuscatlán | | 18,802.33 | 18,802.33 | 2,552.89 | 13.58 |
| 4837 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador | | 17,408.33 | 17,408.33 | 1,695.00 | 9.74 |
| 4847 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Ciudad Delgado, San Salvador | | 17,016.25 | 17,016.25 | 5,649.52 | 33.20 |
| 4919 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de El Carmen, Cuscatlán | | 16,521.06 | 16,521.06 | 4,641.86 | 28.10 |
| 4933 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucia Orcoyo, Olocuitla, La Paz | | 16,482.90 | 16,482.90 | 597.00 | 3.62 |
| 4865 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Piche, El Carmen, La Unión | | 16,438.57 | 16,438.57 | 2,404.21 | 14.63 |
| 4923 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Ramon, Cuscatlán | | 15,909.10 | 15,909.10 | 5,236.98 | 32.92 |
| 4855 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Paisnal, San Salvador | | 15,498.86 | 15,498.86 | 1,129.79 | 7.29 |
| 4873 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Silva, San Miguel | | 15,024.41 | 15,024.41 | 9,682.45 | 64.44 |
| 4917 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán | | 14,676.75 | 14,676.72 | 1,024.57 | 6.98 |
| 4932 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Mercedes La Ceiba, La Paz | | 14,477.99 | 14,477.99 | 7,884.98 | 54.46 |
| 4935 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Juan Talpa, La Paz | | 14,249.38 | 14,249.38 | 10,708.37 | 75.15 |
| 4898 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa Ana | | 13,816.25 | 13,477.25 | 1,105.00 | 8.20 |
| 4888 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Manuel Gallardo, Colón, La Libertad | | 13,764.24 | 13,764.24 | 3,289.79 | 23.90 |
| 4657 | Programa de Extensión de Cobertura en la Zona Rural (período 2009-2011) | | 13,324.66 | 12,110.05 | 702.00 | 5.80 |
| 4854 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Guazapa, San Salvador | | 13,294.41 | 13,294.41 | 514.25 | 3.87 |
| 4659 | Remodelación y equipamiento del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales | | 13,017.44 | 13,017.44 | 12,436.02 | 95.53 |
| 4937 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitán, San Vicente | | 12,652.12 | 12,652.12 | 2,222.32 | 17.56 |
| 4872 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Milagro de la Paz, San Miguel | | 12,369.55 | 12,369.55 | 8,269.50 | 66.85 |



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE JUNIO a/
(MONTOS EN DOLARES)

| CODIGO | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO | No. Prog. y Proyec. | PROGRAMADO TOTAL | PROGRAMADO AL MES | EJECUTADO AL MES | % EJE. FINANC. |
|--------|---|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 4849 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Marcos, San Salvador | | 12,312.57 | 12,312.57 | 1,455.45 | 11.82 |
| 4903 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Juan las Minas, Metapán, Santa Ana | | 11,566.76 | 11,566.76 | 617.00 | 5.33 |
| 4922 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Jose Guayabal, Cuscatlán | | 11,361.75 | 11,361.75 | 2,596.96 | 22.86 |
| 4846 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Villa Mariona, Cuscatancingo, San Salvador | | 10,979.44 | 10,979.44 | 518.5 | 4.72 |
| 4885 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Arracaos, Nueva Concepción, Chalatenango | | 10,780.14 | 10,780.14 | 5,574.97 | 51.72 |
| 4845 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Popotlan, Apopa, San Salvador | | 10,453.81 | 10,453.81 | 1,311.20 | 12.54 |
| 4875 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Primavera, El Tránsito, San Miguel | | 10,190.34 | 10,190.34 | - | - |
| 4841 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador | | 9,541.88 | 9,541.88 | 601.25 | 6.30 |
| 4869 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Comacaran, San Miguel | | 9,470.05 | 9,470.05 | 601.25 | 6.35 |
| 4878 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután | | 7,976.77 | 7,976.77 | 4,935.87 | 61.88 |
| 4931 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyultitan, La Paz | | 7,974.48 | 7,974.48 | 2,701.83 | 33.88 |
| 4901 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Belen Guijat, Metapán, Santa Ana | | 7,756.12 | 7,756.12 | 5,306.91 | 68.42 |
| 4848 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador | | 7,138.66 | 7,138.66 | - | - |
| 4904 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Sebastian Salitrillo, Santa Ana | | 6,472.41 | 6,472.41 | 514.25 | 7.95 |
| 4900 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Congo, Santa Ana | | 5,334.63 | 5,334.63 | 2,326.84 | 43.62 |
| 4863 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Playa, La Unión | | 4,846.10 | 4,846.10 | 56.70 | 1.17 |
| 4916 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Chinamas, Ahuachapán | | 4,807.43 | 4,807.43 | 2,672.42 | 55.59 |
| 4871 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Cuco, Chirilagua, San Miguel | | 4,783.21 | 4,783.21 | - | - |
| 4936 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Rafael Obrajuelo, La Paz | | 4,663.73 | 4,663.73 | 753.96 | 16.17 |
| 4838 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Monserrat, San Salvador | | 4,518.00 | 4,518.00 | 1,393.00 | 30.83 |
| 4892 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad | | 4,443.03 | 4,443.03 | 296.78 | 6.68 |
| 4934 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz | | 4,279.96 | 4,279.96 | 1,964.57 | 45.90 |
| 4921 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Pedro Perulapán, Cuscatlán | | 4,138.20 | 4,138.20 | - | - |
| 4840 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador | | 3,795.06 | 3,795.06 | 404.96 | 10.67 |
| 4857 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador | | 3,436.76 | 3,436.76 | 1,318.16 | 38.35 |
| 4914 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Lorenzo, Ahuachapán | | 3,345.02 | 3,345.02 | 510 | 15.25 |
| 4909 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio Pajonal, Santa Ana | | 3,247.54 | 3,247.54 | 946.85 | 29.16 |
| 4915 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Jose Naranjo, Jujutla, Ahuachapán | | 2,955.30 | 2,955.30 | 573.96 | 19.42 |
| 4899 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Sabanetas, Chalchuapa, Santa Ana | | 2,946.14 | 2,946.14 | - | - |
| 4842 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Barrios, San Salvador | | 2,702.87 | 2,702.87 | - | - |
| 4843 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilares, San Salvador | | 2,476.65 | 2,476.65 | 1,316.15 | 53.14 |
| 4856 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador | | 2,064.78 | 2,064.78 | 1,318.16 | 63.84 |
| 4877 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Triunfo, Usulután | | 2,019.15 | 2,019.15 | 4.25 | 0.21 |
| 4896 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Planes de la Laguna, Santa Ana | | 1,891.92 | 1,891.92 | 13.92 | 0.74 |
| 4883 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Palma, Chalatenango | | 1,872.13 | 1,872.13 | 223.86 | 11.96 |
| 4870 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lolotique, San Miguel | | 1,426.15 | 1,426.15 | 0.70 | 0.05 |
| 4844 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador | | 565.78 | 565.78 | 4.25 | 0.75 |
| 4658 | Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Red de Establecimientos de Salud. | | 266.09 | 266.09 | - | - |
| 4886 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Azacualpa, Chalatenango | | 233.96 | 233.96 | 6.96 | 2.97 |
| 4660 | Remodelación y equipamiento del Hospital Nacional de Chalchuapa | | 2.87 | 2.87 | - | - |



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE JUNIO a/
(MONTOS EN DOLARES)

| CODIGO | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO | No. Prog. y Proyec. | PROGRAMADO TOTAL | PROGRAMADO AL MES | EJECUTADO AL MES | % EJEC. FINANC. |
|------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| MOP | | 60 | 81,364,160.63 | 36,390,085.75 | 11,080,516.36 | 30.45 |
| 5492 | PROGRAMA DE CONECTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO | | 17,139,712.00 | 789,018.00 | - | - |
| 5564 | MANTENIMIENTO PERIODICO Y RECONSTRUCCION DE LA RUTA CA04N TRAMO: QUITASOL (KM 48) – INTERSECCIÓN DV. AMAYO (CA03W-CA03E), MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPTO. DE CHALATENANGO | | 9,279,811.40 | 5,651,361.06 | 2,415,604.96 | 42.74 |
| 5098 | PROGRAMA OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS | | 9,133,044.00 | 3,667,419.00 | - | - |
| 5004 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RÍO LEMPA (KM. 75.5 LIB31N), LA LIBERTAD - CHALATENANGO | | 8,737,842.47 | 1,678,181.19 | 222,729.96 | 13.27 |
| 5806 | Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca (USU07S) – Cantón California – San Hilario – Sitio El Corral - Salinas El Zompopero, Municipio de Jiquilisco; Departamento de Usulután. | | 6,571,763.00 | 153,728.00 | 27,500.00 | 17.89 |
| 5468 | Programa de Conectividad Rural en Zonas Norte y Oriente | | 6,456,130.00 | 5,822,635.00 | - | - |
| 4639 | MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO SAV29S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE | | 4,531,614.45 | 3,312,530.55 | 1,027,361.40 | 31.01 |
| 3742 | MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO CAB18E, ENTRE CINQUERA - TEJUTEPEQUE, CABAÑAS | | 3,168,456.07 | 2,478,516.21 | 1,988,696.40 | 80.24 |
| 4638 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AHU16S TRAMO: APANECA - QUEZALAPA - HACIA SAN PEDRO PUXTLA, APANECA, AHUACHAPAN | | 2,028,526.82 | 2,028,526.82 | - | - |
| 3443 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUS18E-CAB18E, TRAMO: SUCHITOTO-CINQUERA | | 1,612,629.61 | 1,612,629.61 | 1,088,674.80 | 67.51 |
| 4531 | Ampliación de un Tramo del Camino Terciario LIB05W: Tramo CA04S-LIB15S. (Desvío a Comasagua). La Libertad | | 1,145,988.18 | 1,145,988.18 | - | - |
| 5511 | FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369 | | 1,105,618.19 | 232,925.09 | 205,683.60 | 88.30 |
| 4629 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN ARENAL MONSERRAT COLONIA MÁLAGA, 120.0 M. AGUAS ARRIBA DE LA 17a. AV. SUR. SAN SALVADOR | | 1,079,525.88 | 1,079,525.88 | 1,079,525.88 | 100.00 |
| 4640 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO: COMASAGUA HACIA BELLO HORIZONTE, LA LIBERTAD | | 1,063,575.16 | 1,063,575.16 | - | - |
| 5043 | Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo | | 1,025,027.00 | 0.9 | - | - |
| 5926 | FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2581 | | 597,987.59 | 66,387.59 | 66,887.59 | 100.75 |
| 3603 | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAM28N, TRAMO:CHAPELTIQUE - SESORI, SAN MIGUEL | | 572,006.59 | 572,006.59 | 484,936.06 | 84.78 |
| 6036 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE DERECHOS DE VÍA, COMPLEMENTARIO AL BOULEVARD MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO, ANTIGUO CUSCATLÁN TRAMO II-A | | 519,729.71 | 519,729.71 | 230,648.11 | 44.38 |
| 4530 | Mejoramiento de Camino Rural LIB19N Tramo LIB22S - Jayaque. La Libertad | | 435,510.92 | 435,510.92 | 411,110.92 | 94.40 |
| 4179 | Mejoramiento Camino Rural PAZ10S, Tramo: CA02E - Hato de Los Reyes | | 373,408.57 | 373,408.57 | 373,408.57 | 100.00 |
| 4642 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CON SU DESCARGA EN COLONIA EL MATAZANO, ILOPANGO, SAN SALVADOR | | 332,744.90 | 332,744.90 | - | - |
| 4559 | PROYECTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A FAMILIAS EN ZONAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD NUEVO ISRAEL, SAN SALVADOR | | 271,636.26 | 271,636.26 | - | - |
| 5623 | FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2067 | | 264,541.29 | 132,269.99 | 86,946.64 | 65.73 |
| 4529 | Mejoramiento de Camino Rural LIB16S Tramo LIB22S - Tamanique. La Libertad | | 220,713.51 | 220,713.51 | 137,899.62 | 62.48 |
| 6051 | Recarpeteo de Calle perimetral del Mercado de la Ciudad de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana | | 200,000.00 | 50,000.00 | - | - |
| 4565 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN 8a - 10a. Y CALLE PARAGUAY, SAN SALVADOR | | 194,444.25 | 194,444.25 | - | - |
| 5852 | Construcción de Concreteo de calles hacia Cantones Carbonal y Cordoncillo y Adoquinado y Obra de Paso en calle, Caserío Los Zetinos, Cantón Cedros, Municipio de Anamorós, Departamento de la Unión. | | 190,796.00 | 190,796.00 | 89,686.02 | 47.01 |
| 3873 | Mejoramiento Camino Rural CAB17N, Tramo: Entre Tejutepeque - Jutiapa. Cabañas | | 188,214.28 | 188,214.28 | 188,214.28 | 100.00 |
| 4624 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN COLONIA LAS MARGARITAS, BARRIO SAN JACINTO. SAN SALVADOR | | 176,958.00 | 176,958.00 | - | - |
| 4986 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN TALUD NORTE DE LA COLONIA BELLO SAN JUAN, PLANES DE RENDEROS. SAN SALVADOR | | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 100.00 |
| 5856 | Construcción de Pavimento en calle al Cantón El Carrizal, Municipio de Rosario de Mora, Departamento de San Salvador | | 159,671.31 | 159,671.31 | 138,390.24 | 86.67 |
| 6046 | Construcción de Obras de Mitigación de Cárcava en Colonia Alcaine, Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador | | 150,000.00 | 37,500.00 | - | - |
| 5855 | Construcción de Concreteo de calle Avenida El Paisnal, Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador | | 144,254.22 | 144,254.22 | 136,078.65 | 94.33 |
| 4562 | OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA COLONIA LLANO VERDE, (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO, SAN SALVADOR | | 134,369.52 | 134,369.52 | 52,944.92 | 39.40 |
| 5860 | Mejoramiento de calle principal del Municipio Cuscatancingo, Departamento de San Salvador | | 124,816.98 | 124,816.98 | - | - |
| 5857 | Construcción de Pavimento en calle al Cantón Cerco de Piedra, Municipio de Rosario de Mora, Departamento de San Salvador | | 119,878.88 | 119,878.88 | 35,963.66 | 30.00 |
| 5838 | CONSTRUCCIÓN DE CARRIL AUXILIAR PARA LA SEGURIDAD VIAL DE CICLISTAS Y PEATONES, COMPLEMENTARIO AL BOULEVARD DIEGO DE HOLGUÍN, ANTIGUO CUSCATLÁN, TRAMO II-A, ETAPA II. | | 115,074.66 | 115,074.66 | 106,854.31 | 92.86 |
| 6052 | Mejoramiento de Tramo de Calle al Cantón Tilapa Abajo, Municipio de El Rosario, Departamento de La Paz | | 100,000.00 | 25,000.00 | - | - |
| 6053 | Pavimentación de Calle Antigua a San Pablo Tacachico, Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador | | 100,000.00 | 25,000.00 | - | - |
| 6054 | Reparación de Tramo de Calle, Cantón Arenales, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador | | 100,000.00 | 25,000.00 | - | - |



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE JUNIO a/
(MONTOS EN DOLARES)

| CODIGO | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO | No. Prog. y Proyec. | PROGRAMADO TOTAL | PROGRAMADO AL MES | EJECUTADO AL MES | % EJEC. FINANC. |
|--------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 6055 | Construcción de Carpeta Asfáltica y Obras de Drenaje en Calle de Comunidad Chandanta, Municipio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador | | 100,000.00 | 25,000.00 | - | - |
| 6056 | Pavimentación de Tramo de Calle en Colonia Florencia, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador | | 100,000.00 | 25,000.00 | - | - |
| 6057 | Pavimentación de Tramo de Camino Vecinal en Comunidades El Barrio y El Cereto, Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán | | 100,000.00 | 25,000.00 | - | - |
| 6048 | Construcción de Obra de Paso en el Municipio de San Jorge, Departamento de San Miguel | | 100,000.00 | 25,000.00 | - | - |
| 6049 | Reparación de Calle en el Municipio de San Agustín, Departamento de Usulután | | 100,000.00 | 25,000.00 | - | - |
| 6050 | Construcción de Obra de Paso sobre Quebrada Chocolate, Cantón Tizate, Municipio de Anamorós, Departamento de la Unión | | 100,000.00 | 25,000.00 | - | - |
| 5861 | Construcción de Pavimento de calle entre los Municipios de Santa Cruz Michapa y Tenancingo, Departamento de Cuscatlán | | 99,595.38 | 99,595.38 | - | - |
| 5865 | Construcción de Pavimento en calle al Volcán, Final 75 Avenida Norte, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador | | 95,840.33 | 95,840.33 | - | - |
| 5737 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO COPAPAYO 1, RUTA CA: 08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD ? DVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | | 90,310.00 | 90,310.00 | 90,309.19 | 100.00 |
| 5858 | Construcción de Pavimento en calle al Cantón Plan del Mango, Municipio de Rosario de Mora, Departamento de San Salvador | | 89,671.50 | 89,671.50 | 26,901.45 | 30.00 |
| 5854 | Construcción de Empedrado y Fraguado de 500 metros de calle, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán | | 81,941.59 | 81,941.59 | 58,175.65 | 71.00 |
| 4557 | OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUD EN COMUNIDAD EL TRIUNFO CONCEPCIÓN DE ATACO, AHUACHAPÁN | | 70,976.42 | 70,976.42 | 70,976.42 | 100.00 |
| 5859 | Construcción de Concreteado de calle principal de la Colonia San Fernando y Colonia Saprise, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador | | 69,822.00 | 69,822.00 | 20,946.60 | 30.00 |
| 5863 | Construcción de Empedrado seco y Drenaje menor en calle a Colonia Santa Elena, Cantón El Cortes, San Pedro Puxtla | | 49,700.23 | 49,700.23 | - | - |
| 5864 | Construcción de Empedrado seco y Drenaje menor en calle a Caserio Los Pérez; Cantón Pululapa, San Pedro Puxtla, Departamento de Ahuachapán | | 46,760.46 | 46,760.46 | 46,760.46 | 100.00 |
| 6047 | Reparación de Calle Santa Gabriela, Colonias Santa Ana y Santa Rosa, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador | | 20,000.00 | 10,000.00 | - | - |
| 5368 | Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Cárcava en Urbanización Los Naranjos, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador | | 5,971.00 | 5,971.00 | - | - |
| 4532 | Mejoramiento de Camino Rural LIB18N: Tramo LIB22S - Chiltiupan. La Libertad | | 3,701.45 | 3,701.45 | - | - |
| 3918 | DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES | | 3,148.60 | 3,148.60 | - | - |
| 5653 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES S/ RIO COPAPAYO, RUTA CA:08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD - DVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 100.00 |
| VMVDU | | 6 | 52,583,810.44 | 17,195,226.91 | 6,936,379.86 | 40.34 |
| 5132 | PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS | | 29,318,744.94 | 8,331,101.41 | 6,114,787.61 | 73.40 |
| 5939 | PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMMS | | 15,000,000.00 | 4,577,740.00 | 54,827.25 | 1.20 |
| 5398 | "PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS URBANOS-KFW (MIAPU-KFW) Canje de Deuda entre la República de Alemania y la República de El Salvador" | | 3,930,000.00 | 1,824,595.00 | 2,100.00 | 0.12 |
| 5100 | DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA | | 2,841,927.59 | 1,098,552.59 | - | - |
| 5781 | Programa de fortalecimiento de las capacidades asociativas para la generación de empleo intensivo en Comunidades Solidarias Urbanas, a nivel Nacional. | | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 100.00 |
| 5769 | Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios- PACSES, a nivel Nacional. | | 743,137.91 | 613,237.91 | 14,665.00 | 2.39 |
| MINED | | 14 | 43,090,486.08 | 15,938,366.89 | 12,771,575.63 | 80.13 |
| 5096 | Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador | | 19,681,615.73 | 6,436,310.82 | 6,468,351.11 | 100.50 |
| 5813 | Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación. | | 19,031,596.19 | 7,441,400.54 | 4,194,487.22 | 56.37 |
| 5768 | Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES) - Componente Educación. | | 3,122,351.97 | 1,681,715.40 | 1,441,267.84 | 85.70 |
| 5268 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO-EDUCA) | | 544,245.45 | 197,075.55 | 540,408.48 | 274.21 |
| 6017 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2014 | | 236,400.00 | 108,050.00 | 68,297.89 | 63.21 |
| 4675 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR JORGE LARDE, JUAYUA, SONSONATE | | 119,700.60 | - | - | - |
| 4711 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR ANASTASIO AQUINO, SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ | | 116,191.39 | - | - | - |
| 4715 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE | | 69,842.26 | - | - | - |
| 4722 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE USULUTAN | | 46,192.73 | - | - | - |
| 4701 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN CARLOS , J/ DOLORES, D/ CABAÑAS | | 37,217.54 | 35,315.16 | 20,264.24 | 57.38 |
| 5843 | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR EL PEÑÓN DEL MUNICIPIO DE COMASAGUA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | | 33,530.00 | 13,530.00 | 13,530.00 | 100.00 |
| 4690 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR | | 28,388.25 | 2,580.75 | 2,580.75 | 100.00 |
| 5844 | Cerrando la Brecha del Conocimiento, segunda fase, San Miguel/Ahuachapán | | 22,388.67 | 22,388.67 | 22,388.10 | 100.00 |



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE JUNIO a/
(MONTOS EN DOLARES)

| CODIGO | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO | No. Prog. y Proyec. | PROGRAMADO TOTAL | PROGRAMADO AL MES | EJECUTADO AL MES | % EJEC. FINANC. |
|--------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 4677 | REHABILITACION Y MEJORAS CENTRO ESCOLAR HEROES DEL 11 DE ENERO, CHALATENANGO | | 825.30 | - | - | - |
| MAG | | 11 | 36,920,493.89 | 15,431,428.09 | 8,840,225.66 | 57.29 |
| 5562 | Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF) | | 20,720,985.00 | 6,346,345.96 | 4,493,693.93 | 70.81 |
| 5385 | PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL RURAL (AMANECER RURAL) | | 4,935,530.00 | 1,805,035.00 | 106,200.00 | 5.88 |
| 4377 | PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LA REGION CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR-Central) | | 4,457,980.00 | 1,655,496.18 | 1,598,424.46 | 96.55 |
| 3752 | Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO) | | 3,918,935.00 | 2,752,139.00 | 1,935,665.58 | 70.33 |
| 5725 | CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA REGIÓN ORIENTAL CEDAF MORAZAN | | 1,296,466.88 | 1,296,466.88 | 291.96 | 0.02 |
| 5783 | Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de Riego del Bajo Lempa, en los Departamentos de San Vicente, La Paz y Usulután | | 925,373.41 | 925,373.41 | 405,306.82 | 43.80 |
| 4643 | Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador | | 379,654.83 | 371,996.78 | 114,823.03 | 30.87 |
| 5729 | Construcción y Equipamiento de Infraestructura para la Producción de Camarón Marino y Cultivo de Tilapia, como Apoyo a Organizaciones Acuícolas en el Departamento de Usulután. | | 143,323.07 | 143,323.07 | 93,885.50 | 65.51 |
| 5764 | Fortalecimiento Institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológicas en Sanidad Animal, Análisis de Riesgo de Plagas y Sistema de Inteligencia de Mercados Agropecuarios en El Salvador | | 79,980.24 | 79,980.24 | 38,424.38 | 48.04 |
| 5763 | Remodelación y Equipamiento del Laboratorio de Microbiología de Alimentos sede El Matazano para la Inspección Sanitaria de la Carne | | 55,271.57 | 55,271.57 | 53,510.00 | 96.81 |
| 4646 | Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de Control de Inundaciones | | 6,993.89 | - | - | - |
| CSJ | | 11 | 35,550,068.23 | 19,742,380.57 | 5,518,318.15 | 27.95 |
| 4344 | Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador | | 11,834,537.51 | 5,490,322.27 | 1,603,730.41 | 29.21 |
| 3243 | Construcción Centro Judicial Integrado de Santa Tecla | | 6,328,818.70 | 4,705,941.86 | 3,505,831.54 | 74.50 |
| 3831 | Construcción Centro Judicial Integrado de La Unión | | 6,000,000.00 | 2,322,057.00 | - | - |
| 4225 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR | | 5,000,000.00 | 3,263,466.00 | - | - |
| 3385 | Construcción Centro Judicial Integrado de Apopa, San Salvador | | 4,000,000.00 | 2,511,093.32 | - | - |
| 6019 | REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, AÑO 2014. | | 1,245,585.00 | 828,053.00 | 253,579.40 | 30.62 |
| 3466 | Construcción Centro Judicial Integrado de Ahuachapán | | 232,000.00 | 102,080.00 | - | - |
| 3830 | Construcción del Centro Judicial Integrado de Usulután | | 232,000.00 | 102,080.00 | - | - |
| 3245 | Construcción Centro Judicial Integrado de Chalatenango | | 232,000.00 | 102,080.10 | - | - |
| 5157 | Construcción y Equipamiento del Centro Judicial Integrado en Materia Penal de Santa Ana. | | 232,000.00 | 102,080.00 | - | - |
| 5828 | Remodelaciones, Ampliaciones y Mejoras de la Infraestructura Institucional del Órgano Judicial a Nivel Nacional, Año 2013. | | 213,127.02 | 213,127.02 | 155,176.80 | 72.81 |
| DGCP - MJSP | | 9 | 23,258,091.12 | 4,224,906.83 | 916,216.74 | 21.69 |
| 5748 | Obras Complementarias para finalización del Complejo Penitenciario de Seguridad Izalco FASE III | | 6,960,810.00 | 1,022,070.00 | - | - |
| 5897 | Ampliación de Centro Penal de Izalco | | 4,582,678.00 | 346,165.00 | - | - |
| 5899 | Readecuación de Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, Departamento de La Paz | | 3,479,785.00 | 423,790.00 | - | - |
| 5896 | Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos | | 2,522,340.00 | - | - | - |
| 5903 | Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco, Departamento de Sonsonate | | 2,197,607.00 | 287,610.00 | - | - |
| 5904 | Readecuación de Granja Penitenciaria en el Departamento de Santa Ana | | 1,302,090.00 | 287,610.00 | - | - |
| 4445 | AMPLIACION DEL CENTRO PENITENCIARIO DE QUEZALTEPEQUE | | 1,240,881.12 | 1,240,881.12 | 656,879.76 | 52.94 |
| 4444 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO MODULAR EN EL CENTRO DE MUJERES, ILOPANGO | | 863,493.00 | 616,780.71 | 259,336.98 | 42.05 |
| 6162 | Fortalecimiento Institucional Préstamo BCIE 2102 | | 108,407.00 | - | - | - |
| MARN | | 7 | 18,885,682.68 | 5,246,378.52 | 1,158,884.85 | 22.09 |
| 5391 | Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Solidos en El Salvador | | 12,357,593.03 | 617,922.37 | 44,480.45 | 7.20 |
| 5102 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL | | 3,338,607.45 | 3,338,607.45 | 386,607.45 | 11.58 |
| 5563 | Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias - Programa de Agua y Saneamiento Rural | | 1,488,207.43 | 686,073.93 | 660,085.90 | 96.21 |
| 6024 | Evaluación y Remediación de Sitios Contaminados por Desechos Peligrosos Conteniendo Plaguicidas y Metales Pesados a Nivel Nacional. | | 750,000.00 | - | - | - |
| 6023 | Fortalecimiento de Capacidades del MARN y Municipalidades Vulnerables para la Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático a Nivel Nacional. | | 500,000.00 | 228,500.00 | - | - |
| 6087 | Construcción y equipamiento del Salón de Usos Múltiples del MARN | | 380,000.00 | 304,000.00 | - | - |
| 5978 | Proyecto Fortalecimiento de la Red de Monitoreo Sísmico a nivel nacional | | 71,274.77 | 71,274.77 | 67,711.05 | 95.00 |
| VMT | | 1 | 17,455,343.79 | 16,610,071.09 | 6,989,800.14 | 42.08 |
| 5478 | Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador | | 17,455,343.79 | 16,610,071.09 | 6,989,800.14 | 42.08 |



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE JUNIO a/
(MONTOS EN DOLARES)**

| CODIGO | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO | No. Prog. y Proyec. | PROGRAMADO TOTAL | PROGRAMADO AL MES | EJECUTADO AL MES | % EJE. FINANC. |
|--|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| PNC - MJSP | | 5 | 14,214,036.03 | 4,741,509.97 | - | - |
| 4766 | Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil | | 5,510,781.03 | 3,753,189.97 | - | - |
| 4747 | Construcción y Equipamiento Básico Delegación Centro PNC | | 4,317,680.00 | 988,320.00 | - | - |
| 5673 | Reemplazo de la Flota Vehicular de la Policía Nacional Civil | | 3,177,450.00 | - | - | - |
| 5938 | Fortalecimiento de las Capacidades de la Subdirección de Administración y Finanzas de la Policía Nacional Civil de El Salvador. | | 1,130,000.00 | - | - | - |
| 5099 | Suministro e Instalación del Sistema Integral para los Centros de Atención de Emergencias 911 y AVL/GPS de la Policía Nacional Civil de El Salvador. | | 78,125.00 | - | - | - |
| MINEC | | 1 | 6,342,473.86 | 2,577,840.53 | 467,407.56 | 18.13 |
| 6025 | PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- COMPONENTES I, III, y V (BID 2583/OC-ESL1057) | | 6,342,473.86 | 2,577,840.53 | 467,407.56 | 18.13 |
| SE - MJSP | | 1 | 5,826,138.20 | 2,330,455.28 | 2,330,455.28 | 100.00 |
| 6028 | Suministro e Instalación de un Sistema de Vigilancia Electrónica para el Área Metropolitana de San Salvador. | | 5,826,138.20 | 2,330,455.28 | 2,330,455.28 | 100.00 |
| MH | | 5 | 5,279,818.86 | 2,497,159.30 | 656,359.71 | 26.28 |
| 4958 | Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV. | | 4,279,818.86 | 2,457,029.30 | 656,359.71 | 26.71 |
| 4204 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TRIBUTARIA | | 676,761.00 | - | - | - |
| 6174 | REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EDIFICIO DEL ALMACÉN DE SUMINISTROS Y ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL MINISTERIO DE HACIENDA | | 226,444.00 | - | - | - |
| 6172 | REPARACIONES EN LOSA DE CONCRETO DEL PARQUEO SUPERIOR DE LAS TRES TORRES Y EDIFICIO EX CAM MOTOR DEL MINISTERIO DE HACIENDA | | 56,665.00 | - | - | - |
| 6026 | REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA | | 40,130.00 | 40,130.00 | - | - |
| SIS - CAPRES | | 3 | 4,969,020.37 | 1,876,572.69 | 1,049,442.31 | 55.92 |
| 5644 | PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL, PROMOCION COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CIUDAD MUJER | | 2,027,171.75 | 434,724.07 | 385,315.43 | 88.63 |
| 5785 | Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer Usulután, Santa Ana y San Martín | | 1,500,000.00 | - | - | - |
| 5824 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO A AGUA SEGURA, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO BASICO EN CENTROS ESCOLARES DEL SECTOR PUBLICO DE LAS REGIONES CENTRAL Y OCCIDENTAL, CON UN ENFOQUE INTEGRAL E INTERSECTORIAL. | | 1,441,848.62 | 1,441,848.62 | 664,126.88 | 46.06 |
| AL | | 4 | 3,923,234.25 | 3,419,705.43 | 1,263,881.03 | 36.96 |
| 5222 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO II | | 2,334,054.60 | 1,830,525.78 | 587,278.05 | 32.08 |
| 6038 | RESTAURACIÓN DE INMUEBLE PATRIMONIAL CONOCIDO COMO VILLA DUEÑAS, UBICADO EN ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR | | 1,399,508.36 | 1,399,508.36 | 561,511.12 | 40.12 |
| 6095 | REMEDIACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL EDIFICIO DE COMISIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, SAN SALVADOR | | 137,060.15 | 137,060.15 | 62,480.72 | 45.59 |
| 6094 | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO EN PLAZA CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, SAN SALVADOR | | 52,611.14 | 52,611.14 | 52,611.14 | 100.00 |
| MTYPS | | 1 | 3,372,695.00 | 829,321.57 | 278,116.60 | 33.54 |
| 6032 | Protección de Ingresos y Empleabilidad, Parte B Fortalecimiento de los Sistemas de Intermediación, Información y Formación Profesional. | | 3,372,695.00 | 829,321.57 | 278,116.60 | 33.54 |
| CONAMYPE | | 2 | 1,200,200.00 | 565,331.00 | 251,348.29 | 44.46 |
| 5834 | Fortalecimiento y Promoción del Emprendedurismo Social en Municipios de Pobreza Extrema a nivel nacional | | 700,000.00 | 227,447.00 | 161,274.97 | 70.91 |
| 5780 | Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa productores de Calzado, Uniformes y Útiles Escolares a Nivel Nacional. | | 500,200.00 | 337,884.00 | 90,073.32 | 26.66 |
| FGR | | 1 | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 294,618.60 | 98.21 |
| 6166 | Modernización del Sistema de Información y Gestión Automatizado del Proceso Fiscal (SIGAP), de la FGR. | | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 294,618.60 | 98.21 |
| INJUVE | | 1 | 1,300,000.00 | - | - | - |
| 5770 | Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias - FOCAP | | 1,300,000.00 | - | - | - |
| CI - MJSP | | 1 | 230,261.45 | 230,261.45 | 143,731.70 | 62.42 |
| 5137 | Granja de Rehabilitación para Jovenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil de Ilobasco, Departamento de Cabañas | | 230,261.45 | 230,261.45 | 143,731.70 | 62.42 |
| INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | | |
| FISDL | | 12 | 82,734,415.17 | 38,558,418.29 | 24,787,153.86 | 64.28 |
| 4997 | PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL | | 39,530,476.83 | 14,955,210.62 | 9,838,062.53 | 65.78 |



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE JUNIO a/
(MONTOS EN DOLARES)

| CODIGO | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO | No. Prog. y Proyec. | PROGRAMADO TOTAL | PROGRAMADO AL MES | EJECUTADO AL MES | % EJEC. FINANC. |
|---------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 5627 | PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR, COMPONENTE I | | 10,737,380.06 | 6,071,948.00 | 2,196,959.04 | 36.18 |
| 5384 | PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS | | 10,000,000.00 | 4,225,000.00 | 2,617,949.22 | 61.96 |
| 5629 | PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y EMPLEABILIDAD | | 9,324,535.88 | 6,630,251.38 | 4,310,968.03 | 65.02 |
| 2660 | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL. | | 3,597,400.00 | 1,628,195.00 | 1,330,672.41 | 81.73 |
| 5630 | COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN EDUCACIÓN | | 3,466,254.76 | 1,002,817.00 | 517,425.18 | 51.60 |
| 5628 | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER | | 2,835,737.33 | 2,579,772.29 | 2,558,795.61 | 99.19 |
| 4472 | PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV | | 1,459,555.23 | 277,914.00 | 171,433.28 | 61.69 |
| 4460 | FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNANZA (FISDL / KFW IV) | | 1,431,037.68 | 1,073,280.00 | 1,160,377.68 | 108.12 |
| 4996 | PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FISDL V) | | 152,037.40 | 114,030.00 | 84,510.88 | 74.11 |
| 6059 | Concreteo de calle en el sector sur del Cantón Primavera, Municipio El Tránsito, Departamento de San Miguel | | 100,000.00 | - | - | - |
| 6060 | Adoquinado de la Calle Principal de Colonia Santa Rosa, Barrio El Calvario, Municipio de Lolotique, Departamento de San Miguel | | 100,000.00 | - | - | - |
| FOVIAL | | 10 | 64,194,841.13 | 31,783,662.28 | 29,448,161.60 | 92.65 |
| 4785 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2013 | | 32,967,929.56 | 21,756,924.03 | 23,339,897.48 | 107.28 |
| 5960 | MEJORAMIENTO DE VIAS E INTERSECCIONES A NIVEL NACIONAL | | 19,825,944.84 | 6,914,197.25 | 4,935,081.86 | 71.38 |
| 4786 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2014 | | 6,260,000.00 | 536,116.46 | 34,431.10 | 6.42 |
| 4781 | PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2014 | | 1,961,300.00 | 1,204,985.00 | 435,792.44 | 36.17 |
| 4776 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2014 | | 1,600,000.00 | 585,882.81 | 50,749.28 | 8.66 |
| 5845 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN16N: TRAMO RN13W-CANTON LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | | 739,360.00 | - | - | - |
| 4775 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2013 | | 602,183.53 | 602,183.53 | 488,773.30 | 81.17 |
| 4488 | Administración del Programa (Unidad Ejecutora) | | 122,765.62 | 68,015.62 | 48,078.59 | 70.69 |
| 4780 | PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2013 | | 69,002.34 | 69,002.34 | 69,002.33 | 100.00 |
| 4795 | Mejoramiento Camino Rural UNI02S, Tramo: El Jaguey - El Tamarindo, Departamento de La Unión | | 46,355.24 | 46,355.24 | 46,355.22 | 100.00 |
| CNR | | 1 | 14,346,419.45 | 6,241,080.70 | 4,823,839.92 | 77.29 |
| 3541 | PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II | | 14,346,419.45 | 6,241,080.70 | 4,823,839.92 | 77.29 |
| UES | | 13 | 9,750,686.80 | 4,604,469.29 | 844,583.46 | 18.34 |
| 3762 | CONSTRUCCION DE BOVEDA | | 6,500,000.00 | 2,600,000.00 | - | - |
| 5025 | FORTEALECIMIENTO DEL PROGRAMA JÓVENES TALENTO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR | | 1,183,393.80 | 513,284.78 | 227,889.06 | 44.40 |
| 5015 | Construcción de Edificio para instituto de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas | | 653,846.00 | 461,153.80 | 239,014.12 | 51.83 |
| 5012 | Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente | | 434,755.57 | 70,000.00 | - | - |
| 5013 | Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias Economicas | | 377,919.07 | 377,919.07 | 195,126.50 | 51.63 |
| 5016 | Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias y Humanidades. | | 272,587.99 | 272,587.99 | 16,609.31 | 6.09 |
| 5014 | Construcción de Edificio de Usos Múltiples para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. | | 178,985.10 | 178,985.10 | 80,624.90 | 45.05 |
| 5018 | Construcción de Edificio de Posgrados en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. | | 85,734.00 | 85,734.00 | 84,600.60 | 98.68 |
| 5019 | Construcción de Muro Perimetral en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente | | 44,184.10 | 44,184.10 | - | - |
| 5017 | Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la Facultad de Medicina. | | 14,960.80 | - | 100.00 | - |
| 5024 | FORTEALECIMIENTO AL PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES GENERANDO OPORTUNIDADES DE ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CON PERSPECTIVAS HACIA EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL | | 2,888.10 | - | - | - |
| 5009 | Fortalecimiento de los Laboratorios del area Básica de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas | | 811.82 | - | - | - |
| 5022 | Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia. | | 620.45 | 620.45 | 618.97 | 99.76 |
| ISSS | | 6 | 7,300,000.00 | 644,284.00 | 521,970.82 | 81.02 |
| 3585 | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE APOPA | | 5,500,000.00 | - | - | - |
| 5739 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ISSS, PARA ATENCIÓN DE ESPECIALIDADES, SAN SALVADOR. | | 755,835.00 | - | - | - |
| 5326 | MEJORAMIENTO DE FARMACIAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL | | 491,405.00 | 491,405.00 | 402,511.60 | 81.91 |
| 862 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ZACAMIL | | 341,410.00 | 105,410.00 | 85,859.94 | 81.45 |
| 5820 | MEJORAMIENTO DE SALAS DE EMERGENCIAS DE UNIDADES MÉDICAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR. | | 150,000.00 | - | - | - |
| 5325 | REMODELACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA ATLACATL, SAN SALVADOR. | | 61,350.00 | 47,469.00 | 33,599.28 | 70.78 |
| CENTA | | 2 | 4,688,939.14 | 3,545,018.21 | 2,695,174.24 | 76.03 |
| 5868 | Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologías Sostenibles Ante el Cambio Climático en El Salvador | | 2,387,574.93 | 1,243,654.00 | 556,129.67 | 44.72 |
| 5979 | APOYO INTEGRAL PARA LA REACTIVACION DEL SUB SECTOR CAFE DE EL SALVADOR | | 2,301,364.21 | 2,301,364.21 | 2,139,044.57 | 92.95 |



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE JUNIO a/
(MONTOS EN DOLARES)

| CODIGO | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO | No. Prog. y Proyec. | PROGRAMADO TOTAL | PROGRAMADO AL MES | EJECUTADO AL MES | % EJE. FINANC. |
|---|--|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ISTU | | 3 | 3,950,000.00 | 1,886,513.00 | 1,241,835.42 | 65.83 |
| 5676 | Construccion de Cancha de Football Playa en Centro Recreativo Apulo, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador | | 1,500,000.00 | 663,609.00 | 633,760.10 | 95.50 |
| 5677 | Construccion de Cancha de Football Playa en Centro Recreativo Costa del Sol, Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de la Paz. | | 1,500,000.00 | 890,904.00 | 608,075.32 | 68.25 |
| 3565 | REPARACION TURICENTRO ATECOZOL ETAPA III | | 950,000.00 | 332,000.00 | - | - |
| ISDEMU | | 4 | 877,895.00 | 81,936.48 | 48,572.28 | 59.28 |
| 5619 | Equipamiento de Seis Centros de Atención del ISDEMU para la Efectiva Territorialización de la Política Nacional de la Mujer | | 375,380.00 | - | - | - |
| 5765 | Adecuación de Centros de Atención para la Gestión Territorial para la Igualdad y la Prevención social de la violencia de Genero en 11 Municipios de Comunidades Solidarias Urbanas | | 300,000.00 | 81,936.48 | 43,307.88 | 52.86 |
| 5893 | Construcción de obras de mejoramiento de la infraestructura de la oficina de ISDEMU Santa Ana. | | 145,000.00 | - | - | - |
| 5617 | Adecuación de la Escuela de formación para la Igualdad sustantiva del ISDEMU, San Salvador | | 57,515.00 | - | 5,264.40 | - |
| ISRI | | 3 | 725,860.00 | - | - | - |
| 5945 | Instalación de Sistemas de Energía Solar en el Centro del Aparato Locomotor de S.S. y Centros de Rehabilitación Integral de Oriente y Occidente del ISRI. | | 340,860.00 | - | - | - |
| 4764 | Instalación de un sistema fotovoltaico para la generación de electricidad en el Centro de Atención para Ancianos Sara Zaldívar, San Salvador | | 200,000.00 | - | - | - |
| 4102 | DIAGNOSTICO Y SUSTITUCION DE LINEAS HIDROSANITARIAS EN EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION DE INVALIDOS, ETAPA I, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | | 185,000.00 | - | - | - |
| EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS | | | | | | |
| CEL | | 8 | 156,148,605.00 | 93,054,485.00 | 30,905,510.17 | 33.21 |
| 4400 | Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre. | | 62,463,340.00 | 22,189,420.00 | 24,085,817.80 | 108.55 |
| 3119 | PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL | | 47,999,595.00 | 39,142,775.00 | 4,088,311.59 | 10.44 |
| 5821 | Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre | | 36,482,175.00 | 25,331,435.00 | 98,336.33 | 0.39 |
| 5818 | Reparación y Mantenimiento de Bordas en el Bajo Lempa-CEL | | 4,462,145.00 | 4,144,325.00 | 2,538,378.18 | 61.25 |
| 5570 | Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana. | | 3,480,140.00 | 1,407,920.00 | - | - |
| 622 | PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON | | 558,815.00 | 477,385.00 | 48,526.82 | 10.17 |
| 373 | 3A. UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CERRON GRANDE (MUNICIPIO DE JUTIAPA) | | 406,795.00 | 188,030.00 | - | - |
| 5801 | Programa de eficiencia energética en instalaciones de CEL | | 295,600.00 | 173,195.00 | 46,139.45 | 26.64 |
| CEPA | | 2 | 22,972,675.00 | 19,000,000.00 | 4,359,064.73 | 22.94 |
| 5790 | Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional El Salvador | | 21,972,675.00 | 18,000,000.00 | 4,250,000.00 | 23.61 |
| 4193 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL PUERTO DE ACAJUTLA | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 109,064.73 | 10.91 |
| ANDA | | 14 | 10,519,362.80 | 5,268,210.77 | 3,820,821.50 | 72.53 |
| 5034 | PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR. | | 3,641,783.79 | 721,763.88 | 149,601.74 | 20.73 |
| 5134 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR. | | 2,543,118.78 | 1,738,235.40 | 1,199,291.00 | 68.99 |
| 5584 | Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente. | | 1,918,960.97 | 647,379.92 | 693,472.70 | 107.12 |
| 5982 | RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 10 º CALLE PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE AGUILARES, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | | 1,280,115.10 | 1,280,115.10 | 1,174,337.99 | 91.74 |
| 5651 | INTRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SONSONATE Y SESORI EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. | | 262,820.95 | 262,820.95 | 180,219.45 | 68.57 |
| 4586 | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | | 230,547.62 | 230,547.62 | 193,786.78 | 84.05 |
| 4612 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARAN, MUNICIPIO DE JUCUARAN DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. | | 169,686.09 | 169,347.47 | 169,347.47 | 100.00 |
| 5643 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PARA URBANIZACIÓN LAS VICTORIAS Y COMUNIDAD CASTILLA DE LA MANCHA. JURISDICCION DE APOPA, SAN SALVADOR. | | 128,226.90 | 128,226.90 | 39,798.18 | 31.04 |
| 6045 | Modificación y Ampliación del Sistema de distribución de Agua Potable, Fase I, Municipio de Sonzacate, Departamento de Sonsonate | | 119,065.00 | - | - | - |
| 4576 | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA ø 10 HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCION DE SANTA ANA. | | 68,807.34 | 68,807.34 | - | - |
| 4611 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN. | | 67,717.85 | - | - | - |
| 6044 | Ampliación de Tanque de Agua Potable, Barrio El Calvario, Municipio de Jutiapa, Departamento de Cabañas | | 40,000.00 | - | - | - |
| 4574 | PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO GEMELO EN ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA-LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE. | | 27,546.22 | - | - | - |



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE JUNIO a/
(MONTOS EN DOLARES)**

| CODIGO | INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO | No. Prog. y Proyec. | PROGRAMADO TOTAL | PROGRAMADO AL MES | EJECUTADO AL MES | % EJE. FINANC. |
|----------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 5963 | Perforación de pozo de producción en cantón La Isleta, municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz | | 20,966.19 | 20,966.19 | 20,966.19 | 100.00 |
| OTRAS | | | | | | |
| FONAVIPO | | 7 | 2,264,733.11 | 454,979.99 | 268,389.31 | 58.99 |
| 5371 | Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de San Vicente | | 1,186,872.78 | 36,688.09 | - | - |
| 5085 | CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | | 353,210.85 | 151,602.33 | 89,216.98 | 58.85 |
| 5503 | CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | | 294,518.21 | 127,673.20 | 108,209.71 | 84.76 |
| 5192 | CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION PROCAVIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | | 194,179.75 | 72,839.62 | 45,650.80 | 62.67 |
| 5245 | CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | | 124,290.02 | 24,198.34 | 129.26 | 0.53 |
| 5396 | CONSTRUCCIÓN DE 308 VIVIENDAS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LOS MANANTIALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | | 96,961.50 | 27,278.41 | 10,914.85 | 40.01 |
| 5370 | Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Nuevo Verapaz, Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente | | 14,700.00 | 14,700.00 | 14,267.71 | 97.06 |
| FSV | | 2 | 2,090,638.92 | 1,765,638.92 | 586,745.28 | 33.23 |
| 4513 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RECURSOS LOGISTICOS, COMEDOR DEL PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV, SAN SALVADOR. | | 1,715,638.92 | 1,715,638.92 | 586,745.28 | 34.20 |
| 5881 | Programa de Fortalecimiento Institucional y Financiero del FSV, Fase II | | 375,000.00 | 50,000.00 | - | - |
| FONAES | | 2 | 1,522,298.24 | 783,383.24 | 447,071.99 | 57.07 |
| 5050 | PROGRAMA TECHO Y AGUA 2014 | | 1,000,000.00 | 261,085.00 | - | - |
| 5777 | Programa Techo y Agua 2012-2013 | | 522,298.24 | 522,298.24 | 447,071.99 | 85.60 |
| SUB-TOTAL | | 357 | 838,137,290.55 | 420,437,506.98 | 188,533,669.85 | 44.84 |
| FODES | | | 250,751,096.25 | 125,375,548.68 | 125,375,548.68 | 100.00 |
| 5090 | Inversión Municipal a través del FODES 2014 | | 250,751,096.25 | 125,375,548.68 | 125,375,548.68 | 100.00 |
| TOTAL GENERAL | | | 1,088,888,386.80 | 545,813,055.66 | 313,909,218.53 | 57.51 |

a/ Información registrada por las Ejecutoras en los Sistemas SAFI y SIIP, reporte generado el 10 de julio de 2014.
