

PAIP 2014

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA (PAIP) AL MES DE MAYO



DIRECCION GENERAL DE INVERSION

CREDITO PÚBLICO


I. Información General

1.1 Composición del Programa

El PAIP 2014 vigente al mes de mayo por valor de \$1,074.4 millones equivalente al 4.2% del PIB¹, reporta un incremento de \$3.8 millones con respecto al PAIP vigente al mes de abril, debido a modificación de los programas Institucionales de MAG y ANDA que incrementaron, FONAVIPO que disminuyó y a la incorporación de 1 proyecto de la FGR.

En el Gráfico 1 se presenta la composición por tipo de presupuesto y/o programas especiales.


Gráfico No.1
Composición del PAIP 2014

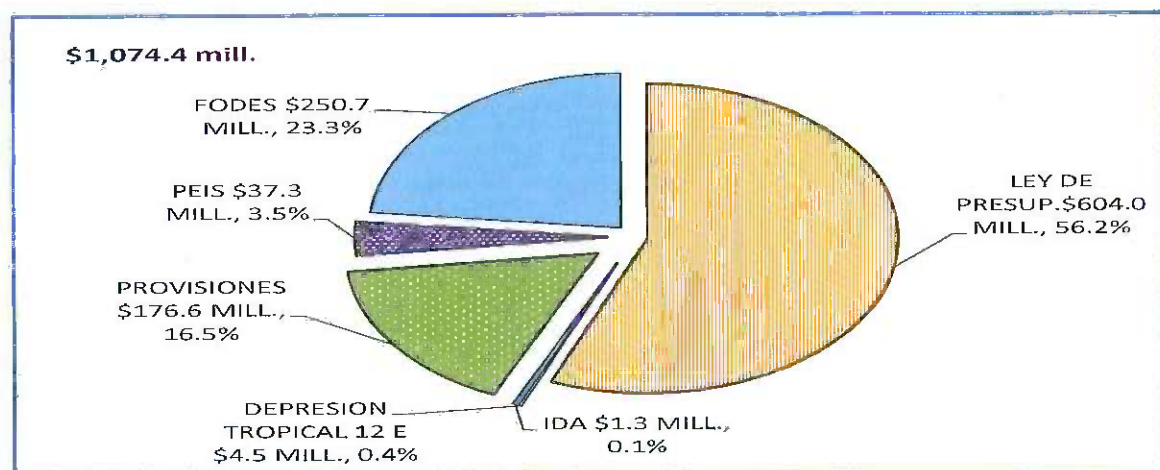

1.2 Distribución del PAIP 2014, por Sector de Actividad.

El PAIP vigente al mes de mayo/14 contempla \$532.6 millones (49.6%) para proyectos del sector social, \$480.9 millones (44.7%) para proyectos del sector económico y \$60.9 millones (5.7%) para proyectos del sector justicia y seguridad pública.


Gráfico No.2
PAIP 2014 por Sector de Actividad, al mes de Mayo.

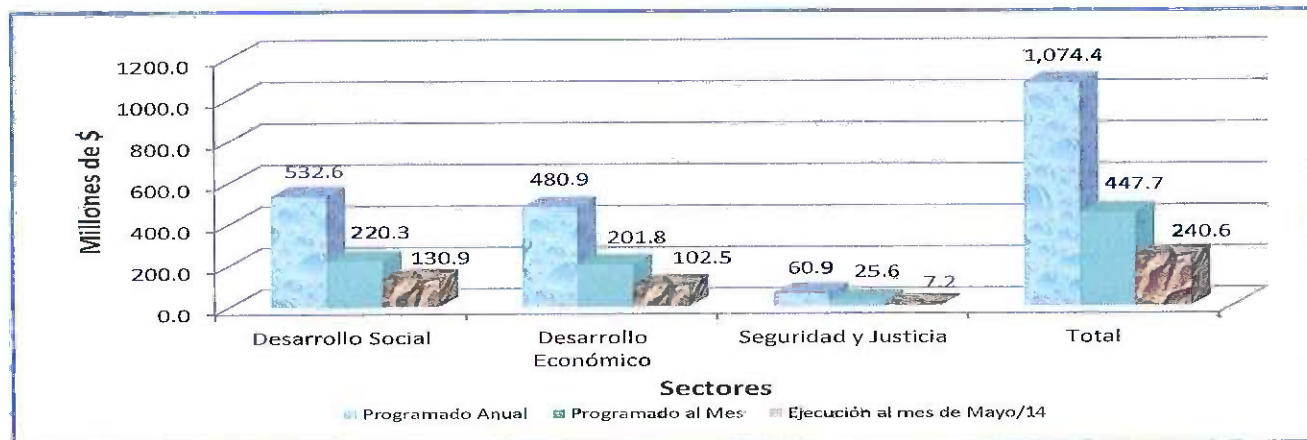

¹ PIB: US\$25,337.9 millones.


1.3 Composición del PAIP 2014, por Fuente de Financiamiento.

Gráfico No.3
Avance PAIP 2014 por Fuente de Financiamiento
(Montos en millones US\$)

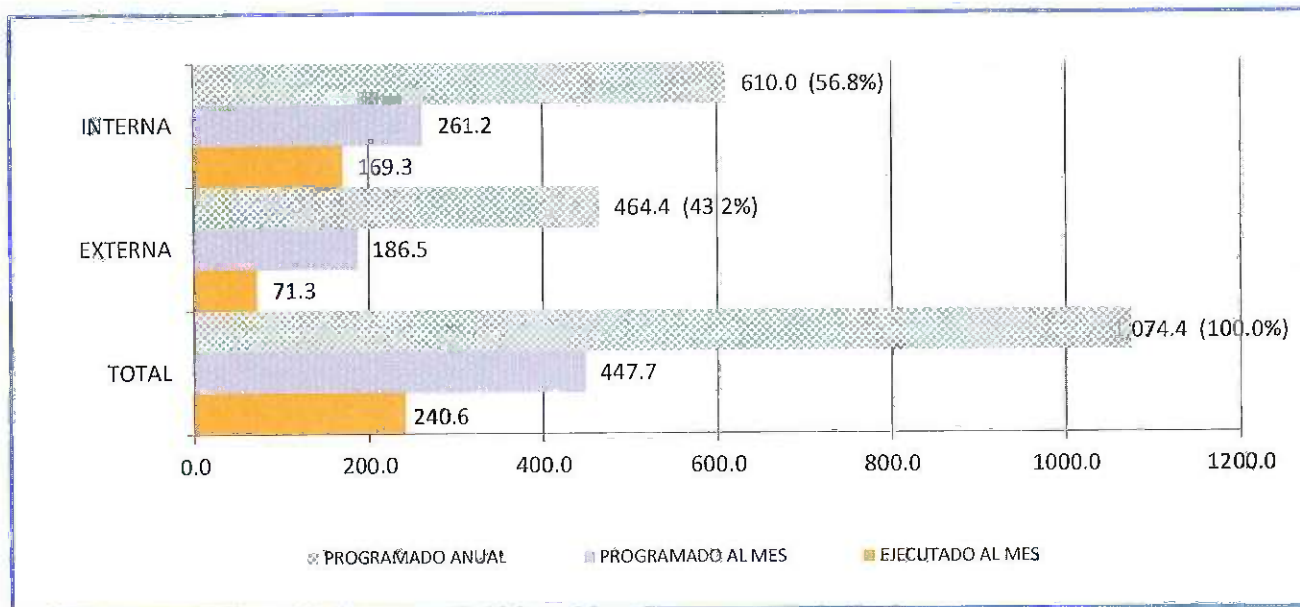

1.4 Composición del PAIP 2014, por Estructura del Sector Público no Financiero


Gráfico No.4
Avance PAIP 2014 por Estructura del Sector Público
(Montos en millones US\$)

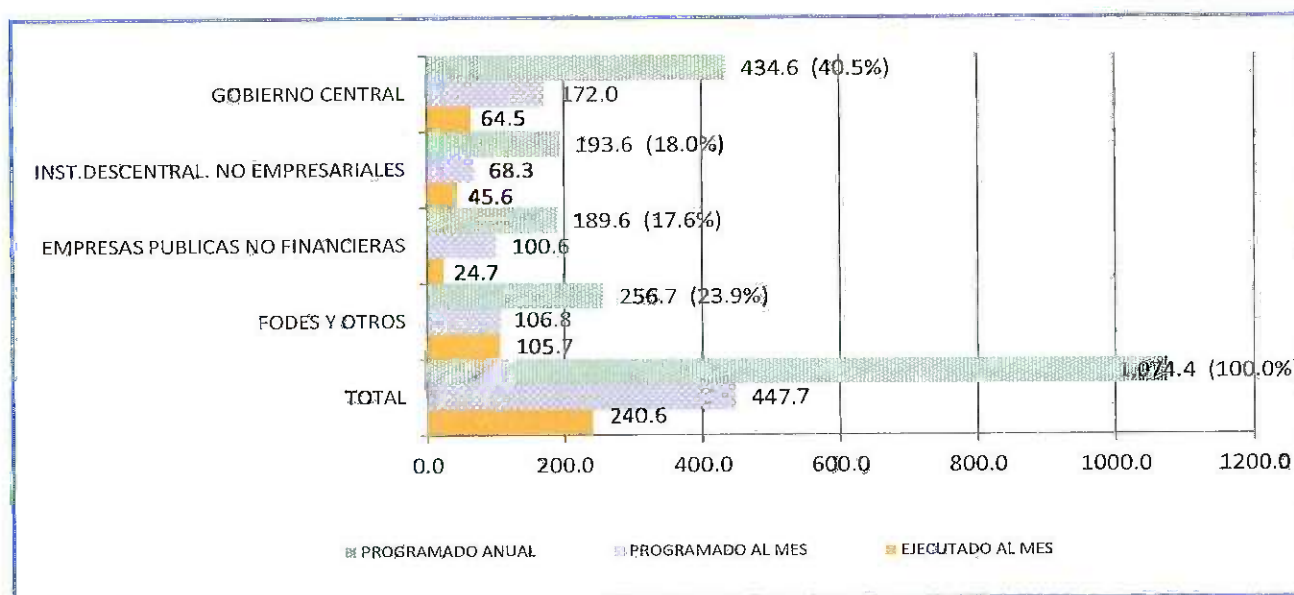

II. Comportamiento del PAIP

2.1 Avance en uso de los Recursos del PAIP


Gráfico No.5
Avance en el Uso de los Recursos del PAIP 2014 al mes de Mayo

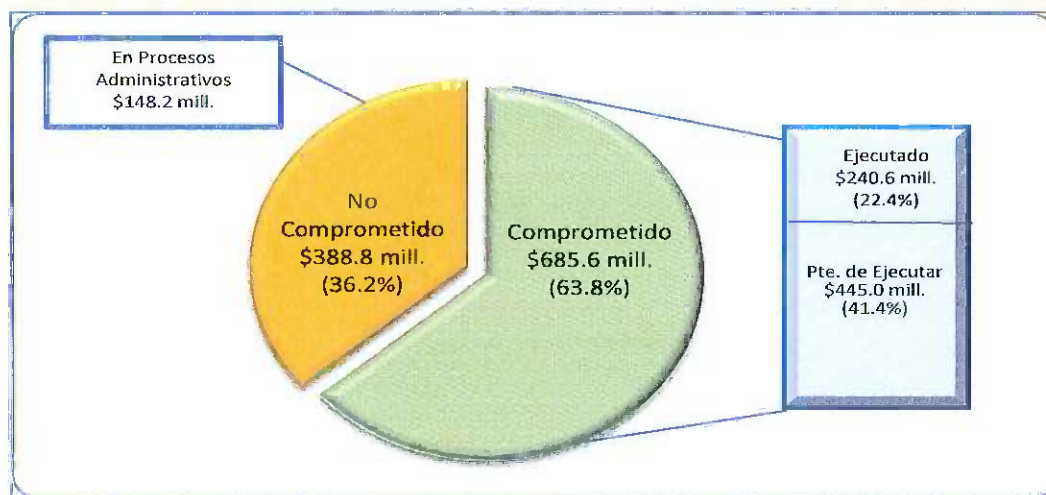

2.2 Comparativo de la Inversión Programada / Ejecutada

En el siguiente gráfico se reportan los montos de inversión programada/ejecutada al mes de mayo, durante los últimos 6 años (2009 – 2014).

Gráfico No.6
Inversión Programada/Ejecutada, al mes de mayo 2009 - 2014
(En millones US\$)

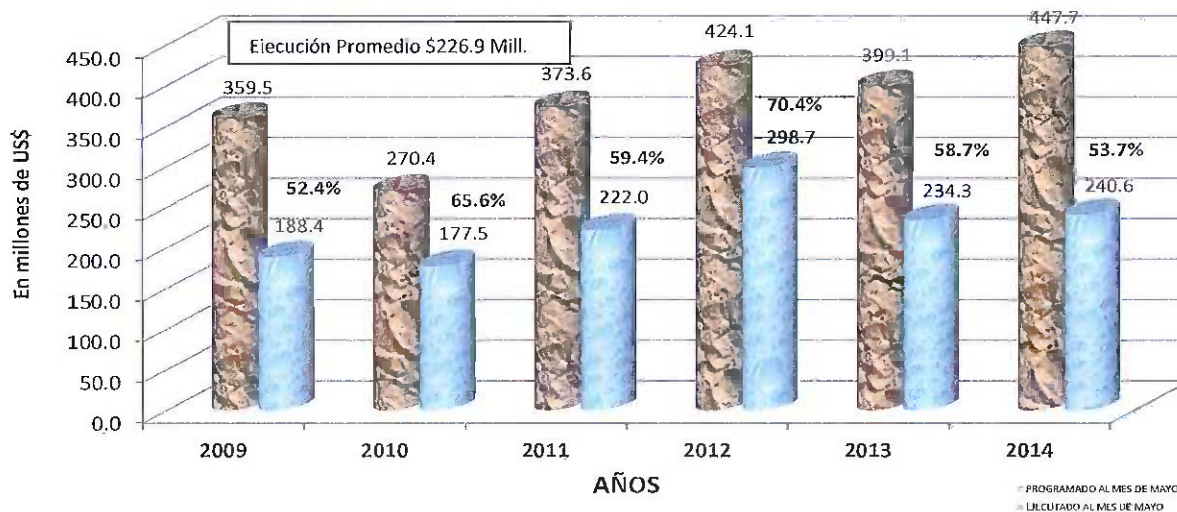


2.3 Inversión Programada / Ejecutada por Institución Ejecutora

Cuadro No.1
EJECUCION FINANCIERA DEL PAIP 2014, AL MES DE MAYO, POR INSTITUCION
(En millones de dólares)

INSTITUCIONES	No. de Programas / Proyectos	PROGRAMA VIGENTE ANUAL	PROGRAMADO AL MES DE MAYO	COMPROMETIDO AL MES DE MAYO		MONTO NO COMPROMETIDO AL MES DE MAYO	
				TOTAL	TOTAL EJECUTADO	TOTAL	SUB TOTAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
GOBIERNO CENTRAL	262	434.58	172.03	194.26	64.51	240.32	114.98
MINSAL	123	97.12	49.29	52.45	18.37	44.67	38.74
MOP	60	81.36	21.69	38.78	8.37	42.58	27.13
VMVDU	6	52.58	16.06	14.53	5.98	38.05	15.59
MINED	14	43.09	13.48	25.95	9.23	17.14	8.84
MAG	11	36.92	12.72	10.06	4.89	26.86	13.62
CSJ	11	35.55	17.35	13.16	3.87	22.39	-
MARN	7	18.78	7.47	6.21	1.14	12.57	-
VMT	1	17.46	14.07	13.16	5.85	4.29	-
PNC - MJSP	3	13.01	3.12	4.15	-	8.86	8.67
MINEC	1	6.34	2.01	1.30	0.38	5.05	0.75
SE-MJSP	1	5.83	2.33	5.83	2.33	-	-
MH	3	5.28	1.47	1.15	0.62	4.13	1.12
DGCP -MJSP	8	5.27	2.28	2.10	0.53	3.16	-
SIS CAPRES	3	4.97	1.83	0.40	1.00	4.57	-
AL	4	3.92	3.73	2.86	1.18	1.06	0.54
MTYPS	1	3.37	2.02	0.70	0.21	2.67	-
CONAMYPE	2	1.20	0.57	0.26	0.16	0.94	-
FGR	1	1.00	0.29	0.98	0.29	0.02	-
INJUVE	1	1.30	-	-	-	1.30	-
CI-MJSP	1	0.23	0.23	0.23	0.11	-	-
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	54	193.59	68.34	69.79	45.60	123.81	15.52
FISDL	12	82.73	33.37	20.64	15.89	62.10	1.89
FOVIAL	10	69.22	20.42	40.28	20.51	28.94	7.21
CNR	1	14.35	5.64	7.62	4.65	6.73	0.59
UES	13	9.75	3.71	-	0.52	9.75	-
ISSS	6	7.30	0.46	-	0.49	7.30	5.50
CENTA	2	4.69	3.21	-	2.47	4.69	0.32
ISTU	3	3.95	1.50	1.17	1.06	2.78	-
ISDEMU	4	0.88	0.03	0.09	0.01	0.79	-
ISRI	3	0.72	-	-	-	0.73	-
EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	24	189.64	100.55	168.81	24.74	20.83	17.49
CEL	8	156.15	82.17	156.15	16.87	-	-
CEPA	2	22.97	12.75	7.95	4.36	15.02	14.76
ANDA	14	10.52	5.63	4.71	3.51	5.81	2.73
OTRAS	11	5.88	2.32	2.00	1.25	3.88	0.20
FSV	2	2.09	1.10	1.27	0.59	0.83	0.18
FONAES	2	1.52	0.78	0.45	0.45	1.07	-
FONAVIPO	7	2.26	0.45	0.28	0.21	1.98	0.03
SUB-TOTAL	351	823.69	343.24	434.85	136.09	388.84	148.19
FODES		250.75	104.48	250.75	104.48	-	-
TOTAL		1,074.44	447.72	685.60	240.57	388.84	148.19

2.4 Inversión Programada / Ejecutada por Principales Instituciones.

Gráfico No.7
Instituciones con mayor Inversión Ejecutada en Enero – Mayo 2014
(Montos en millones de US\$)

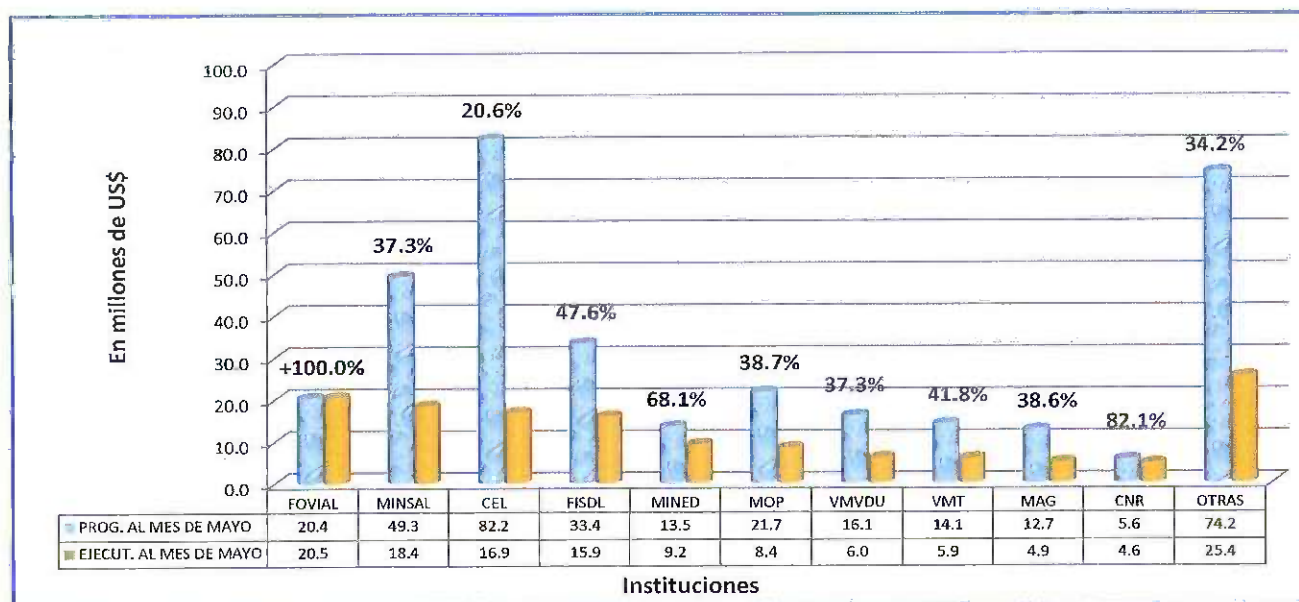

2.5 Inversión Programada / Ejecutada con Recursos PEIS.

Cuadro No.2
Inversión 2014 con recursos PEIS
(Montos en millones de US\$)

Instituciones	Programa vigente al mes de mayo/14	Programado al mes de mayo/14	Ejecutado al mes de mayo/14	% de Ejecución al mes de mayo /14	No ejecutado del programado al mes de mayo/14
	1	2	3	4= (3/2)	5=(2-3)
MINSAL	17.9	15.4	3.2	20.8	12.2
UES	9.7	3.7	0.5	13.5	3.2
MOP	8.3	5.8	2.2	37.9	3.6
ANDA	1.0	0.9	0.8	88.9	0.1
MAG	0.4	0.2	0.1	50.0	0.1
MINED	0.4	0.03	0.02	66.7	0.01
TOTAL	37.7	26.0	6.8	26.2	19.2

2.6 Algunos proyectos reportados por las Ejecutoras como finalizados en mayo/2014.

Cuadro No.3
Proyectos finalizados en el mes de Mayo

INSTITUCION	NOMBRE DEL PROYECTO
FISDL	Programa Promoción de la Prestación Descentralizada de Servicios : 2 proyectos finalizados: "Concreteado calle que conduce a Cantón Candelaria Abajo, San Cayetano Istepeque, San Vicente" e "Introducción de energía eléctrica en Caserío Los Maríes - Agua Zarca, Cantón Metalío, Sonsonate".
FISDL	Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana (FISDL V) : 1 proyecto finalizado: "Rehabilitación del Centro Escolar Caserío Las Lajitas, Cantón El Condadillo, Estanzuelas".

A continuación se detallan los proyectos que conforman el PAIP 2014 vigentes al mes de mayo/2014, agrupados por institución ejecutora, según reporte generado el 11 de junio de 2014, con información registrada por las entidades ejecutoras en los Sistemas SAFI y SIIP.



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO TOTAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
GOBIERNO CENTRAL						
MINSAL		123	97,122,666.91	49,283,910.99	18,366,714.96	37.26
5209	Fortalecimiento del Sistema Público de Salud		27,530,507.74	4,975,455.52	115,343.86	2.32
5128	Programa Integrado de Salud		25,319,842.04	12,603,935.63	7,497,458.59	59.49
5131	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR		22,040,495.38	14,323,626.55	6,665,569.22	48.68
401	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION		10,286,386.51	9,528,554.12	1,139,751.81	11.96
6015	PROGRAMA SALUD MESOAMERICA 2015 - EL SALVADOR		2,400,000.00	761,830.00	870,682.84	114.32
4656	Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"		1,254,454.33	331,170.12	277,016.38	83.65
4654	Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"		1,173,336.93	820,678.01	211,127.39	25.73
4655	Remodelación y Equipamiento de la Tercera Planta del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales		884,899.31	679,170.31	493,662.92	72.69
4890	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La Libertad, La Libertad		731,295.75	495,348.73	-	-
5766	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JIQUILISCO, USulután		431,709.10	287,806.08	-	-
4894	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana		401,319.11	334,965.80	5,027.38	1.50
4927	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guacotecli, Cabañas		361,865.20	338,135.20	163,790.16	48.44
5782	Equipamiento de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar-ECOS- de la Bahía de Jiquilisco, Usulután		270,097.07	180,084.72	-	-
4911	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Nahuizalco, Sonsonate		263,438.75	263,438.75	89,649.10	34.03
4860	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Carmen, La Unión		261,906.38	261,906.38	12,321.91	4.70
4876	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Usulután, Usulután		232,322.50	232,256.69	155,150.01	66.80
4653	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"		166,662.51	159,882.51	32,006.56	20.02
4853	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Martín, San Salvador		165,943.26	152,607.00	57,596.43	37.74
4887	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Ciudad Arce, La Libertad		160,125.06	160,125.06	31,590.79	19.73
5773	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CASERIO LA PIRRAYA, ISLA SAN SEBASTIAN, USULUTAN		133,034.73	66,517.38	-	-
5832	Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica Canton San Marcos Lempa, Jiquilisco, Usulután		132,271.84	88,181.24	-	-
4908	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás Pineda Martínez, Santa Ana		125,639.63	78,755.72	16,842.07	21.39
5958	CONSTRUCCION UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CANTON EL PASTOR, MUNICIPIO DE YAYANTIQUÉ, LA UNIÓN		112,414.64	74,943.12	-	-
5831	Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica Canton La Laguna, Caserio La Ermita, Corinto, Morazán		104,296.64	69,531.12	-	-
4836	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Ayutuxtepeque, San Salvador		96,746.64	64,846.96	23,637.27	36.45
4910	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio, San Antonio del Monte, Sonsonate		86,712.08	35,171.57	33,502.68	95.26
4866	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las Marias, Chinameca, San Miguel		77,726.52	77,726.52	30,963.33	39.84
4880	Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud El Espino, Jucuarán, Usulután		65,482.44	29,335.35	48,294.83	164.63
4884	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango		64,834.75	64,834.75	38,564.77	59.48
3345	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CHALATENANGO		58,342.44	58,342.44	7,892.57	13.53
4864	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Llano los Patos, Conchagua, La Unión		57,553.27	57,553.27	13,212.17	22.96
4924	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán		56,047.65	56,047.65	26,359.72	47.03
4881	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Cruz, Usulután		54,467.19	54,467.19	15,924.85	29.24
4882	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Dorado, Chalatenango		50,526.43	50,526.43	24,436.44	48.36
4929	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilobasco, Cabañas		49,852.51	49,664.16	1,318.56	2.65
4862	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Carlos, La Unión		48,434.98	48,434.98	5,254.37	10.85
4913	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Ahuachapán, Ahuachapán		47,191.82	47,191.82	9,213.44	19.52
4930	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Jutiapa, Cabañas		45,374.49	43,255.74	7,796.75	18.02
4661	Apoyo al Primer Nivel de Atención y Hospitales del MSPAS		43,971.68	41,894.00	21,059.92	50.27
4859	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Bobadilla, San Alejo, La Unión		43,126.36	43,126.36	2,019.22	4.68
5829	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO MEDICO Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR - PROYECTO SALUD MESOAMERICA 2015		41,146.23	27,430.84	-	-
4867	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Uluazapa, San Miguel		40,665.92	40,665.92	3,452.69	8.49
4912	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Salcoatitán, Sonsonate		39,640.18	39,640.18	9,776.28	24.66
4893	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Tamanique, La Libertad		39,598.18	39,598.18	3,118.34	7.87
3346	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA		38,948.22	38,948.22	15,023.57	38.57
4852	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Toncatepeque, San Salvador		38,442.77	38,442.77	9,191.88	23.91
4861	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Faro, Conchagua, La Unión		38,176.82	38,176.82	2,596.40	6.80



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE MAYO af
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO TOTAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
4858	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilopango, San Salvador		35,608.54	35,608.54	4,055.30	11.39
4874	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Rafael, San Miguel		35,216.19	25,046.19	11,869.97	47.39
4839	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes, San Salvador		35,047.51	33,352.51	3,859.62	11.57
4850	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador		32,704.82	32,704.82	6,841.35	20.92
4891	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Matías, La Libertad		31,263.76	31,263.76	1,541.51	4.93
4938	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guadalupe, San Vicente		30,626.14	30,626.14	3,769.54	12.31
4902	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San José Ingenio, Metapán, Santa Ana		28,359.54	28,359.54	4,302.46	15.17
4889	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad		27,656.76	27,656.76	9,093.61	32.88
4918	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Candelaria, Cuscatlán		25,539.65	25,539.65	5,037.89	19.73
4851	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Tonacatepeque, San Salvador		25,043.31	25,043.31	8,839.08	35.30
4826	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Sensuntepeque, Cabañas		24,452.76	24,452.76	4,403.90	18.01
4906	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Lucía, Santa Ana		23,362.53	23,290.88	6,383.73	27.45
4905	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana		22,908.64	22,908.64	360.42	1.57
4907	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Bárbara, Santa Ana		22,605.17	22,605.17	3,812.75	16.87
4897	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana		19,829.24	19,829.24	1,990.00	10.04
4868	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel		19,811.53	19,811.53	3,208.70	16.20
4925	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Perulapia, Cuscatlán		19,574.60	19,574.60	932.25	4.76
4920	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de Concepción, Cuscatlán		18,802.33	18,802.33	1,783.53	9.49
4837	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador		17,408.33	17,408.33	1,695.00	9.74
4847	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Ciudad Delgado, San Salvador		17,016.25	17,016.25	8.50	0.05
4919	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de El Carmen, Cuscatlán		16,521.06	16,521.06	3,864.86	23.39
4933	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía Orcoy, Oloquitta, La Paz		16,482.90	16,482.90	-	-
4865	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Piche, El Carmen, La Unión		16,438.57	16,438.57	32.95	0.20
4923	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Ramón, Cuscatlán		15,909.10	15,909.10	5,236.98	32.92
4855	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Paisnal, San Salvador		15,498.86	15,498.86	-	-
4873	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Silva, San Miguel		15,024.41	15,024.41	4,043.45	26.91
4917	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán		14,676.75	14,676.72	353.92	2.41
4932	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Mercedes La Ceiba, La Paz		14,477.99	14,477.99	7,287.98	50.34
4935	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Juan Talpa, La Paz		14,249.38	14,249.38	5,268.37	36.97
4898	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa Ana		13,816.25	13,477.25	-	-
4886	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Manuel Gallardo, Colón, La Libertad		13,764.24	13,764.24	759.79	5.52
4657	Programa de Extensión de Cobertura en la Zona Rural (periodo 2009-2011)		13,324.66	12,110.05	702.00	5.80
4854	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Guazapa, San Salvador		13,294.41	13,294.41	4.25	0.03
4859	Remodelación y equipamiento del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales		13,017.44	13,017.44	12,436.02	95.53
4937	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitán, San Vicente		12,652.12	12,652.12	136.62	1.08
4872	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Milagro de la Paz, San Miguel		12,369.55	12,369.55	7,075.50	57.20
4849	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Marcos, San Salvador		12,312.57	12,312.57	1,315.45	10.68
4903	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Juan las Miras, Metapán, Santa Ana		11,566.76	11,566.76	107.00	0.93
4922	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San José Guayabal, Cuscatlán		11,361.75	11,361.75	2,596.96	22.86
4846	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Villa Mariona, Cuscatancingo, San Salvador		10,979.44	10,979.44	8.50	0.08
4885	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Arrascaes, Nueva Concepción, Chelatenango		10,780.14	10,780.14	5,574.97	51.72
4845	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Popotlán, Apopa, San Salvador		10,453.81	8,912.33	1,311.20	14.71
4875	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Primavera, El Tránsito, San Miguel		10,190.34	10,190.34	-	-
4841	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador		9,541.88	9,541.88	4.25	0.04
4869	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Comacaran, San Miguel		9,470.05	9,470.05	4.25	0.04
4878	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután		7,976.77	7,976.77	4,776.80	59.88



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proye	PROGRAMADO TOTAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
4931	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyullitan, La Paz		7,974.48	7,974.48	2,701.83	33.88
4901	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Belen Guizal, Metapán, Santa Ana		7,756.12	7,756.12	1,219.92	15.73
4846	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador		7,138.66	7,138.66	-	-
4904	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Sebastián Salitrillo, Santa Ana		6,472.41	6,472.41	4.25	0.07
4900	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Congo, Santa Ana		5,334.63	5,334.63	1,405.84	26.35
4863	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Playa, La Unión		4,846.10	4,846.10	56.70	1.17
4916	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Chinamas, Ahuachapán		4,807.43	4,807.43	2,281.42	47.46
4871	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Cuco, Chirilagua, San Miguel		4,783.21	4,783.21	-	-
4936	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Rafael Obrajuelo, La Paz		4,663.73	4,663.73	156.96	3.37
4838	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Monserrat, San Salvador		4,518.00	4,435.86	-	-
4892	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad		4,443.03	4,443.03	296.78	6.68
4934	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz		4,279.96	4,279.96	-	-
4921	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Pedro Perutapán, Cuscatlán		4,138.20	4,138.20	-	-
4840	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador		3,795.06	3,795.06	-	-
4857	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador		3,436.76	3,350.35	1,311.20	39.14
4914	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Lorenzo, Ahuachapán		3,345.02	3,345.02	-	-
4909	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio Pajonal, Santa Ana		3,247.54	3,247.54	436.85	13.45
4915	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Jose Naranjo, Jujutla, Ahuachapán		2,955.30	2,955.30	63.96	2.16
4899	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Sabanetas, Chalchuapa, Santa Ana		2,946.14	2,946.14	-	-
4842	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Barrios, San Salvador		2,702.87	2,682.13	-	-
4843	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilares, San Salvador		2,476.65	2,476.65	1,315.45	53.11
4856	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador		2,064.78	2,064.78	1,311.20	63.50
4877	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Triunfo, Usulután		2,019.15	2,019.15	4.25	0.21
4896	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Planes de la Laguna, Santa Ana		1,891.92	1,891.92	13.92	0.74
4883	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Palma, Chalatenango		1,872.13	1,872.13	223.86	11.96
4870	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lototique, San Miguel		1,426.15	1,426.15	0.70	0.05
4844	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador		565.78	565.78	4.25	0.75
4858	Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Red de Establecimientos de Salud.		266.09	-	-	-
4886	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Azacualpa, Chalatenango		233.96	233.96	6.96	2.97
4660	Remodelación y equipamiento del Hospital Nacional de Chalchuapa		2.87	-	-	-
MOP		60	81,364,160.63	21,690,485.31	8,370,817.68	38.59
5492	PROGRAMA DE CONECTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO		17,139,712.00	569,933.00	-	-
5564	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RECONSTRUCCION DE LA RUTA CA04N TRAMO: QUITASOL (KM 48) - INTERSECCIÓN DV. AMAYO (CA03W-CA03E), MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPTO. DE CHALATENANGO		9,279,811.40	4,406,202.04	2,415,604.96	54.82
5098	PROGRAMA OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS		9,133,044.00	1,929,259.00	-	-
5004	CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RIO LEMPA (KM. 75.5 LIB31N), LA LIBERTAD - CHALATENANGO		8,737,842.47	940,901.82	170,710.46	18.14
5468	Programa de Conectividad Rural en Zonas Norte y Oriente		6,978,330.00	73,665.00	-	-
5806	Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca (USU07S) - Cantón California - San Hilario - Sitio El Corral - Salinas El Zompopero, Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután.		6,571,763.00	-	-	-
4639	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO SAV28S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE		4,531,614.45	2,455,827.07	748,945.34	30.50
3742	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO CAB18E, ENTRE CINQUERA - TEJUTEPEQUE, CABAÑAS		3,168,456.07	1,313,871.11	506,229.34	38.53
4638	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AHU16S TRAMO: APANECA - QUEZALAPA - HACIA SAN PEDRO PUXTLA, APANECA, AHUACHAPAN		2,028,526.82	1,000,000.00	-	-
5043	Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo		1,912,897.00	451,315.00	-	-
3443	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUS18E-CAB18E, TRAMO: SUCHITOTO-CINQUERA		1,612,629.61	1,219,673.93	1,068,674.80	89.26
4531	Ampliación de un Tramo del Camino Terciario LIB05W: Tramo CA04S-LIB15S. (Desvío a Comasagua), La Libertad		1,145,988.18	-	-	-
4629	CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN ARENAL MONSERRAT COLONIA MÁLAGA, 120.0 M. AGUAS ARRIBA DE LA 17a. AV. SUR. SAN SALVADOR		1,079,525.88	982,192.84	982,192.84	100.00
4640	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO: COMASAGUA HACIA BELLO HORIZONTE, LA LIBERTAD		1,063,575.16	1,063,575.16	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO TOTAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANC.
3603	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAM28N, TRAMO: CHAPELTIQUE - SESORI, SAN MIGUEL		572,006.59	572,006.59	-	-
6036	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE DERECHOS DE VÍA, COMPLEMENTARIO AL BOULEVARD MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO, ANTIGUO CUSCATLÁN TRAMO II-A		519,729.71	519,729.71	179,837.79	34.60
4530	Mejoramiento de Camino Rural LIB19N Tramo LIB22S - Jayaque. La Libertad		435,510.92	435,510.92	411,110.92	94.40
4179	Mejoramiento Camino Rural PAZ10S, Tramo: CA02E - Halo de Los Reyes		373,408.57	373,408.57	373,408.57	100.00
4642	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CON SU DESCARGA EN COLONIA EL MATAZANO, ILOPANGO, SAN SALVADOR		332,744.90	332,644.90	-	-
4559	PROYECTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A FAMILIAS EN ZONAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD NUEVO ISRAEL, SAN SALVADOR		271,636.26	122,888.25	-	-
5623	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2067		264,541.29	110,224.99	75,830.00	68.80
4529	Mejoramiento de Camino Rural LIB16S Tramo LIB22S - Tamanique. La Libertad		220,713.51	220,713.51	137,899.62	62.48
5511	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369		217,748.19	167,222.92	165,783.60	99.14
6051	Recarpeteo de Calle perimetral del Mercado de la Ciudad de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana		200,000.00	-	-	-
4565	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN 8a - 10a. Y CALLE PARAGUAY, SAN SALVADOR		194,444.25	194,444.25	-	-
5852	Construcción de Concreteo de calles hacia Cantones Carbonal y Cordoncillo y Adoquinado y Obra de Paso en calle, Caserio Los Zetinos, Cantón Cedros, Municipio de Anamorós, Departamento de la Unión.		190,796.00	190,796.00	89,686.02	47.01
3873	Mejoramiento Camino Rural CAB17N, Tramo: Entre Tejutepeque - Jutiapa. Cabañas		188,214.28	188,214.28	188,214.28	100.00
4624	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN COLONIA LAS MARGARITAS, BARRIO SAN JACINTO. SAN SALVADOR		176,958.00	176,958.00	-	-
4986	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN TALUD NORTE DE LA COLONIA BELLO SAN JUAN, PLANES DE RENDERO. SAN SALVADOR		170,000.00	170,000.00	-	-
5856	Construcción de Pavimento en calle al Cantón El Carrizal, Municipio de Rosario de Mora, Departamento de San Salvador		159,671.31	159,671.31	-	-
6046	Construcción de Obras de Mitigación de Cárcava en Colonia Alcaíne, Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador		150,000.00	-	-	-
5855	Construcción de Concreteo de calle Avenida El Paisnal, Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador		144,254.22	144,254.22	136,078.65	94.33
4562	OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA COLONIA LLANO VERDE, (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO, SAN SALVADOR		134,369.52	86,283.85	52,744.92	59.74
5860	Mejoramiento de calle principal del Municipio Cuscatancingo, Departamento de San Salvador		124,816.98	124,816.98	-	-
5857	Construcción de Pavimento en calle al Cantón Cerco de Piedra, Municipio de Rosario de Mora, Departamento de San Salvador		119,878.88	119,878.88	35,963.66	30.00
5838	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL AUXILIAR PARA LA SEGURIDAD VIAL DE CICLISTAS Y PEATONES, COMPLEMENTARIO AL BOULEVARD DIEGO DE HOLGUÍN, ANTIGUO CUSCATLÁN, TRAMO II-A, ETAPA II.		115,074.66	115,074.66	106,854.31	92.86
6048	Construcción de Obra de Paso en el Municipio de San Jorge, Departamento de San Miguel		100,000.00	-	-	-
6049	Reparación de Calle en el Municipio de San Agustín, Departamento de Usulután		100,000.00	-	-	-
6050	Construcción de Obra de Paso sobre Quebrada Chocolate, Cantón Tizate, Municipio de Anamorós, Departamento de la Unión		100,000.00	-	-	-
6052	Mejoramiento de Tramo de Calle al Cantón Tilapa Abajo, Municipio de El Rosario, Departamento de La Paz		100,000.00	-	-	-
6053	Pavimentación de Calle Antigua a San Pablo Tacachico, Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador		100,000.00	-	-	-
6054	Reparación de Tramo de Calle, Cantón Arenales, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador		100,000.00	-	-	-
6055	Construcción de Carpeta Asfáltica y Obras de Drenaje en Calle de Comunidad Chandante, Municipio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador		100,000.00	-	-	-
6056	Pavimentación de Tramo de Calle en Colonia Florencia, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador		100,000.00	-	-	-
6057	Pavimentación de Tramo de Camino Vecinal en Comunidades El Barío y El Cereto, Municipio de Suchitotó, Departamento de Cuscatlán		100,000.00	-	-	-
5861	Construcción de Pavimento de calle entre los Municipios de Santa Cruz Michapa y Tenancingo, Departamento de Cuscatlán		99,595.38	99,595.38	-	-
5865	Construcción de Pavimento en calle al Volcán, Final 75 Avenida Norte, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador		95,840.33	95,840.33	-	-
5737	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO COPAPAYO 1, RUTA CA: 08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD ? D.VIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE		90,310.00	90,310.00	90,309.19	100.00
5858	Construcción de Pavimento en calle al Cantón Plan del Mango, Municipio de Rosario de Mora, Departamento de San Salvador		89,671.50	89,671.50	26,901.45	30.00
5854	Construcción de Empedrado y Fraguado de 500 metros de calle, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán		81,941.59	81,941.59	58,175.65	71.00
5926	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2581		75,787.59	49,187.59	51,887.59	105.49
4557	OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUD EN COMUNIDAD EL TRIUNFO CONCEPCIÓN DE ATAGO, AHUACHAPÁN		70,976.42	70,976.42	70,976.42	100.00
5859	Construcción de Concreteo de calle principal de la Colonia San Fernando y Colonia Saprise, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador		69,822.00	69,822.00	20,946.60	30.00
5863	Construcción de Empedrado seco y Drenaje menor en calle a Colonia Santa Elena, Cantón El Cortes, San Pedro Puxtla		49,700.23	49,700.23	-	-
5864	Construcción de Empedrado seco y Drenaje menor en calle a Caserio Los Pérez, Cantón Puxtla, San Pedro Puxtla, Departamento de Ahuachapán		46,760.46	46,760.46	46,760.46	100.00
6047	Reparación de Calle Santa Gabriela, Colonias Santa Ana y Santa Rosa, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador		20,000.00	-	-	-
5368	Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Cárcava en Urbanización Los Naranjos, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador		5,971.00	5,971.00	-	-
4532	Mejoramiento de Camino Rural LIB18N: Tramo LIB22S - Chilitupan, La Libertad		3,701.45	3,701.45	-	-
3918	DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES		3,148.60	3,148.60	-	-



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DOLARES)**

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyac.	PROGRAMADO TOTAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
5653	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES S/ RIO COPAPAYO, RUTA CA:08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD - DVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.		700.00	700.00	700.00	100.00
	VMVDU	6	52,583,810.44	16,055,626.94	5,976,127.13	37.22
5132	PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS		29,318,744.94	8,542,311.44	5,165,534.88	60.47
5939	PROGRAMA DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMMS		15,000,000.00	3,844,175.00	48,027.25	1.25
5398	"PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS URBANOS-KFW (MIAPU-KFW) Canje de Deuda entre la República de Alemania y la República de El Salvador"		3,930,000.00	1,503,515.00	2,100.00	0.14
5100	DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA		2,841,927.59	915,352.59	-	-
5781	Programa de fortalecimiento de las capacidades asociativas para la generación de empleo intensivo en Comunidades Solidarias Urbanas, a nivel Nacional.		750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00
5769	Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios- PACSES, a nivel Nacional.		743,137.91	500,272.91	10,465.00	2.09
	MINED	14	43,080,486.08	13,483,685.69	9,232,958.83	68.48
5086	Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador		19,681,615.73	6,114,388.86	5,440,700.30	88.98
5813	Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.		19,031,596.19	5,526,945.16	2,758,650.22	49.91
5768	Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES) - Componente Educación.		3,122,351.97	1,572,874.05	438,647.84	27.89
5268	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESION SOCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO-EDUCA)		544,245.45	197,075.55	540,408.48	274.21
6017	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2014		236,400.00	13,230.00	-	-
4675	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR JORGE LARDE, JUAYUA, SONSONATE		119,700.60	-	-	-
4711	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR ANASTASIO AQUINO, SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ		116,181.39	-	-	-
4716	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE		69,842.26	-	-	-
4722	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE USULUTAN		46,192.73	-	-	-
4701	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON SAN CARLOS, J/ DOLORES, DI CABAÑAS		37,217.54	24,884.32	20,264.24	81.43
5843	DISEÑO, CONSTRUCCION DEL CENTRO ESCOLAR EL PENON DEL MUNICIPIO DE COMASAGUA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.		33,530.00	13,530.00	13,530.00	100.00
4690	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR		28,388.25	2,580.75	2,580.75	100.00
5844	Cerrando la Brecha del Conocimiento, segunda fase, San Miguel/Ahuachapán		22,388.67	18,177.00	18,177.00	100.00
4677	REHABILITACION Y MEJORAS CENTRO ESCOLAR HEROES DEL 11 DE ENERO, CHALATENANGO		825.30	-	-	-
	MAG	11	36,920,493.89	12,724,515.70	4,888,256.04	38.40
5562	Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF)		20,720,985.00	6,133,848.35	1,568,091.19	25.56
5385	PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL RURAL (AMANECER RURAL)		4,935,530.00	1,452,340.00	88,500.00	6.09
4377	PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LA REGION CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR-Central)		4,457,980.00	1,317,909.85	1,284,937.96	97.50
3752	Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO)		3,918,935.00	1,268,502.48	1,285,837.03	99.79
5725	CONSTRUCCION Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA REGION ORIENTAL CEDAF MORAZAN		1,296,466.88	1,296,466.88	291.96	0.02
5783	Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de Riego del Bajo Lempa, en los Departamentos de San Vicente, La Paz y Usulután		925,373.41	773,234.00	405,306.82	52.42
4643	Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador		379,654.83	208,620.83	112,323.03	53.84
5729	Construcción y Equipamiento de Infraestructura para la Producción de Camarón Marino y Cultivo de Tilapia, como Apoyo a Organizaciones Acuicolas en el Departamento de Usulután.		143,323.07	143,323.07	72,643.67	50.69
5764	Fortalecimiento Institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológicas en Sanidad Animal, Análisis de Riesgo de Plagas y Sistema de Inteligencia de Mercados Agropecuarios en El Salvador		79,980.24	79,980.24	38,424.38	48.04
5763	Remodelación y Equipamiento del Laboratorio de Microbiología de Alimentos sede El Malazano para la Inspección Sanitaria de la Carne		55,271.57	50,280.00	49,900.00	99.22
4646	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de Control de Inundaciones		6,993.89	-	-	-
	CSJ	11	35,650,068.23	17,354,748.12	3,888,539.40	22.29
4344	Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador		11,834,537.51	4,303,425.27	908,713.65	21.14
3243	Construcción Centro Judicial Integrado de Santa Tecla		6,328,818.70	3,939,249.60	2,666,390.41	67.69
3831	Construcción Centro Judicial Integrado de La Unión		6,000,000.00	2,137,297.00	-	-
4225	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR		5,000,000.00	3,197,241.00	-	-
3385	Construcción Centro Judicial Integrado de Apopa, San Salvador		4,000,000.00	2,477,399.72	-	-
6019	REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, AÑO 2014.		1,245,565.00	687,167.00	152,646.57	22.21
3466	Construcción Centro Judicial Integrado de Ahuachapán		232,000.00	102,080.00	-	-
3830	Construcción del Centro Judicial Integrado de Usulután		232,000.00	102,080.00	-	-
3245	Construcción Centro Judicial Integrado de Chalatenango		232,000.00	102,080.10	-	-
5157	Construcción y Equipamiento del Centro Judicial Integrado en Materia Penal de Santa Ana.		232,000.00	102,080.00	-	-



PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2014, EJECUCIÓN AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DÓLARES)

CODIGO	INSTITUCIÓN / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO TOTAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
5828	Remodelaciones, Ampliaciones y Mejoras de la Infraestructura Institucional del Órgano Judicial a Nivel Nacional, Año 2013.		213,127.02	204,648.43	139,788.77	68.31
MARN		7	18,780,682.68	7,471,780.87	1,139,614.46	15.25
5391	Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador		12,357,593.03	3,923,064.32	44,480.45	1.13
5102	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL		3,338,607.45	2,190,607.45	386,607.45	17.65
5563	Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias - Programa de Agua y Saneamiento Rural		1,383,207.43	674,074.33	650,535.90	96.51
6024	Evaluación y Remediación de Sitios Contaminados por Desechos Peligrosos Conteniendo Plaguicidas y Metales Pesados a Nivel Nacional.		750,000.00	177,615.00	-	-
6023	Fortalecimiento de Capacidades del MARN y Municipalidades Vulnerables para la Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático a Nivel Nacional.		500,000.00	168,125.00	-	-
6087	Construcción y equipamiento del Salón de Usos Múltiples del MARN		380,000.00	247,000.00	-	-
5978	Proyecto Fortalecimiento de la Red de Monitoreo Sísmico a nivel nacional		71,274.77	71,274.77	57,990.66	81.36
VMT		1	17,455,343.79	14,085,853.83	5,854,507.63	41.62
5478	Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador		17,455,343.79	14,085,853.83	5,854,507.63	41.62
PNC - MJSP		3	13,005,811.03	3,122,644.97	-	-
4766	Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil		5,510,781.03	3,122,644.97	-	-
4747	Construcción y Equipamiento Básico Delegación Centro PNC		4,317,680.00	-	-	-
5673	Reemplazo de la Flota Vehicular de la Policía Nacional Civil		3,177,450.00	-	-	-
MINEC		1	6,342,473.86	2,006,657.53	378,967.81	18.89
6025	PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- COMPONENTES I, III, y V (SID 2583/OC-ESL1057)		6,342,473.86	2,006,657.53	378,967.81	18.89
SE - MJSP		1	5,826,138.20	2,330,455.28	2,330,455.28	100.00
6028	Suministro e Instalación de un Sistema de Vigilancia Electrónica para el Área Metropolitana de San Salvador.		5,826,138.20	2,330,455.28	2,330,455.28	100.00
MH		3	5,279,818.86	1,465,163.86	616,332.16	42.07
4958	Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV.		4,279,818.86	1,465,163.86	616,332.16	42.07
4204	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TRIBUTARIA		959,870.00	-	-	-
6026	REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA		40,130.00	-	-	-
DGCP - MJSP		8	5,266,434.12	2,280,983.12	528,989.24	23.19
4445	AMPLIACION DEL CENTRO PENITENCIARIO DE QUEZALTEPEQUE		1,240,881.12	1,240,881.12	488,001.50	39.33
5748	Obras Complementarias para finalización del Complejo Penitenciario de Seguridad Izalco FASE III		1,022,070.00	-	-	-
4444	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MODULAR EN EL CENTRO DE MUJERES, ILOPANGO		863,493.00	464,882.00	40,987.74	8.82
5896	Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos		794,815.00	-	-	-
5899	Readecuación de Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, Departamento de La Paz		423,790.00	-	-	-
5897	Ampliación de Centro Penal de Izalco		346,165.00	-	-	-
5903	Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco, Departamento de Sonsonate		287,610.00	287,610.00	-	-
5904	Readecuación de Granja Penitenciaria en el Departamento de Santa Ana		287,610.00	287,610.00	-	-
SIS - CAPRES		3	4,969,020.37	1,829,752.69	998,871.81	54.59
5644	PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL, PROMOCION COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CIUDAD MUJER		2,027,171.75	387,904.07	334,744.93	86.30
5785	Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer Usulután, Santa Ana y San Martín		1,500,000.00	-	-	-
5824	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A AGUA SEGURA, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO BASICO EN CENTROS ESCOLARES DEL SECTOR PUBLICO DE LAS REGIONES CENTRAL Y OCCIDENTAL, CON UN ENFOQUE INTEGRAL E INTERSECTORIAL.		1,441,848.62	1,441,848.62	664,126.88	46.06
AL		4	3,923,234.26	3,734,338.52	1,184,265.17	31.71
5222	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANISMO LEGISLATIVO II		2,334,054.60	2,145,158.87	560,491.95	26.13
6038	RESTAURACIÓN DE INMUEBLE PATRIMONIAL CONOCIDO COMO VILLA DUEÑAS, UBICADO EN ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR		1,399,508.36	1,399,508.36	508,681.36	36.35
6095	REMDELACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL EDIFICIO DE COMISIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, SAN SALVADOR		137,060.15	137,060.15	62,480.72	45.59
6094	CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO EN PLAZA CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, SAN SALVADOR		52,611.14	52,611.14	52,611.14	100.00
MTYPS		1	3,372,695.00	2,020,145.00	211,993.73	10.49
6032	Protección de Ingresos y Empleabilidad, Parte B Fortalecimiento de los Sistemas de Intermediación, Información y Formación Profesional.		3,372,695.00	2,020,145.00	211,993.73	10.49
CONAMYPE		2	1,200,200.00	570,721.00	168,808.46	27.79
5834	Fortalecimiento y Promoción del Emprendedurismo Social en Municipios de Pobreza Extrema a nivel nacional		700,000.00	250,032.00	108,451.46	43.38
5780	Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa productores de Calzado, Uniformes y Útiles Escolares a Nivel Nacional.		500,200.00	320,689.00	50,155.00	15.64



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	No. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO TOTAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
FGR		1	1,000,000.00	294,618.60	294,618.60	100.00
6166	Modernización del Sistema de Información y Gestión Automatizado del Proceso Fiscal (SIGAP), de la FGR.		1,000,000.00	294,618.60	294,618.60	100.00
INJUVE		1	1,300,000.00	-	-	-
5770	Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias - FOCAPI		1,300,000.00	-	-	-
CI - MJSP		1	230,261.45	230,261.45	107,777.84	46.81
5137	Granja de Rehabilitación para Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil de Ilobasco, Departamento de Cabañas		230,261.45	230,261.45	107,777.84	46.81
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES						
FISDL		12	82,734,416.17	33,369,214.58	15,891,243.84	47.62
4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL		39,530,476.83	12,966,667.54	3,531,155.81	27.23
5627	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR, COMPONENTE I		10,737,380.06	5,168,930.00	1,546,840.46	29.93
5384	PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS		10,000,000.00	3,530,000.00	2,066,647.78	59.11
5629	PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y EMPLEABILIDAD		9,324,535.88	5,816,821.75	3,652,793.61	62.80
2660	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL		3,597,400.00	1,230,851.00	1,093,771.65	88.86
5630	COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN EDUCACIÓN		3,466,254.76	983,135.00	250,093.38	25.44
5628	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER		2,835,737.33	2,451,789.29	2,314,026.11	94.38
4472	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV		1,459,555.23	231,595.00	171,026.48	73.85
4460	FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNANZA (FISDL / KFW IV)		1,431,037.68	894,400.00	1,160,377.68	129.74
4996	PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FISDL V)		152,037.40	95,025.00	84,510.88	88.94
6059	Concreto de calle en el sector sur del Cantón Primavera, Municipio El Tránsito, Departamento de San Miguel		100,000.00	-	-	-
6060	Adoquinado de la Calle Principal de Colonia Santa Rosa, Barrio El Calvario, Municipio de Lolotique, Departamento de San Miguel		100,000.00	-	-	-
FOVIAL		10	69,220,588.13	20,419,437.89	20,506,640.02	100.43
4785	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2013		32,967,929.56	14,450,467.63	15,275,977.80	105.71
4786	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2014		18,000,000.00	23,253.95	-	-
5845	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN16N: TRAMO RN13W-CANTON LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		5,711,360.00	-	-	-
4776	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2014		5,000,000.00	936,190.00	1,529.74	0.16
5860	MEJORAMIENTO DE VIAS E INTERSECCIONES A NIVEL NACIONAL		4,665,944.84	3,011,444.58	4,378,458.19	145.39
4781	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2014		1,961,300.00	1,188,055.00	331,625.42	27.91
4775	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2013		602,183.53	602,183.53	363,304.14	60.33
4488	Administración del Programa (Unidad Ejecutora)		196,510.62	92,485.62	40,387.16	43.67
4780	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2013		69,002.34	69,002.34	69,002.33	100.00
4795	Mejoramiento Camino Rural UNIO2S, Tramo: El Jaguey - El Tamarindo, Departamento de La Unión		46,355.24	46,355.24	46,355.22	100.00
CNR		1	14,346,419.45	5,635,525.13	4,646,619.99	82.45
3541	PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II		14,346,419.45	5,635,525.13	4,646,619.99	82.45
UES		13	9,760,686.80	3,714,469.29	524,182.64	14.11
3762	CONSTRUCCION DE BOVEDA		6,500,000.00	1,950,000.00	-	-
5025	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA JÓVENES TALENTO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR		1,183,393.80	413,294.78	128,532.18	31.10
5015	Construcción de Edificio para Instituto de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas		653,846.00	391,153.80	179,719.07	45.95
5012	Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente		434,755.57	-	-	-
5013	Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias Economicas		377,919.07	377,919.07	185,126.50	51.63
5016	Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias y Humanidades		272,587.99	272,587.99	-	-
5014	Construcción de Edificio de Usos Múltiples para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales		178,985.10	178,985.10	15,585.32	8.71
5018	Construcción de Edificio de Posgrados en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente		85,734.00	85,734.00	4,600.60	5.37
5019	Construcción de Muro Perimetral en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente		44,184.10	44,184.10	-	-
5017	Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la Facultad de Medicina		14,960.80	-	-	-
5024	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES GENERANDO OPORTUNIDADES DE ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CON PERSPECTIVAS HACIA EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL		2,888.10	-	-	-
5009	Fortalecimiento de los Laboratorios del área Básica de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas		811.82	-	-	-
5022	Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia		620.45	620.45	618.97	99.76
ISSS		6	7,300,000.00	464,009.00	489,987.56	105.60
3585	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE APOPA		5,500,000.00	-	-	-
5739	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ISSS, PARA ATENCIÓN DE ESPECIALIDADES, SAN SALVADOR.		755,835.00	-	-	-
5326	MEJORAMIENTO DE FARMACIAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL		491,405.00	325,000.00	370,528.34	114.01
862	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ZACAMIL		341,410.00	105,410.00	85,859.94	81.45



**PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2014, EJECUCIÓN AL MES DE MAYO a/
(MONTOS EN DÓLARES)**

CODIGO	INSTITUCIÓN / NOMBRE PROYECTO	Nº. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO TOTAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJEC. FINANCI.
5820	MEJORAMIENTO DE SALAS DE EMERGENCIAS DE UNIDADES MÉDICAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR.		150,000.00	-	-	-
5325	REMODELACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA ATACATL, SAN SALVADOR.		61,350.00	33,599.00	33,599.28	100.00
CENTA		2	4,688,939.14	3,208,610.01	2,486,430.88	76.92
5868	Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologías Sostenibles Ante el Cambio Climático en El Salvador		2,387,574.93	1,072,654.00	517,482.07	48.24
5979	APOYO INTEGRAL PARA LA REACTIVACIÓN DEL SUB SECTOR CAFÉ DEL EL SALVADOR		2,301,364.21	2,133,956.01	1,948,948.81	91.33
ISTU		3	3,950,000.00	1,603,117.25	1,059,152.30	70.46
5676	Construcción de Cancha de Fútbol Playa en Centro Recreativo Apulo, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador		1,500,000.00	519,946.93	519,946.93	100.00
5677	Construcción de Cancha de Fútbol Playa en Centro Recreativo Costa del Sol, Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de la Paz.		1,500,000.00	731,170.32	539,205.37	73.75
3565	REPARACIÓN TURICENTRO ATECOZOL ETAPA III		950,000.00	252,000.00	-	-
ISDEMU		4	877,895.00	29,590.00	11,742.50	39.68
5619	Equipamiento de Seis Centros de Atención del ISDEMU para la Efectiva Territorialización de la Política Nacional de la Mujer		375,380.00	-	-	-
5765	Adecuación de Centros de Atención para la Gestión Territorial para la Igualdad y la Prevención social de la violencia de Género en 11 Municipios de Comunidades Solidarias Urbanas		300,000.00	29,590.00	11,742.50	39.68
5893	Construcción de obras de mejoramiento de la Infraestructura de la oficina de ISDEMU Santa Ana.		145,000.00	-	-	-
5617	Adecuación de la Escuela de formación para la Igualdad sustantiva del ISDEMU, San Salvador		57,515.00	-	-	-
ISRI		3	725,880.00	-	-	-
5945	Instalación de Sistemas de Energía Solar en el Centro del Aparato Locomotor de S.S. y Centros de Rehabilitación Integral de Oriente y Occidente del ISRI.		340,880.00	-	-	-
4764	Instalación de un sistema fotovoltaico para la generación de electricidad en el Centro de Atención para Ancianos Sara Zaldívar, San Salvador		200,000.00	-	-	-
4102	DIAGNÓSTICO Y SUSTITUCIÓN DE LINEAS HIDROSANITARIAS EN EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN DE INVALIDOS, ETAPA I, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.		185,000.00	-	-	-
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS						
CEL		8	159,148,905.00	82,168,045.00	16,866,030.88	20.53
4400	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.		82,463,340.00	18,015,040.00	10,363,754.16	57.53
3119	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL		47,999,595.00	38,021,995.00	4,061,105.48	10.68
5821	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre		36,482,175.00	19,923,460.00	98,336.33	0.49
5818	Reparación y Mantenimiento de Bordas en el Bajo Lempa-CEL		4,462,145.00	4,124,145.00	2,283,608.96	55.37
5570	Construcción del Parque Eólico Melapán, Departamento de Santa Ana.		3,480,140.00	1,327,200.00	-	-
622	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON		558,815.00	437,095.00	13,086.50	2.99
373	3A. UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CERRON GRANDE (MUNICIPIO DE JUTIAPA)		406,795.00	166,335.00	-	-
5801	Programa de eficiencia energética en Instalaciones de CEL		295,800.00	152,775.00	46,139.45	30.20
CEPA		2	22,972,675.00	12,760,000.00	4,359,064.73	34.19
5790	Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional El Salvador		21,972,675.00	12,000,000.00	4,250,000.00	35.42
4193	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL PUERTO DE ACAJUTLA		1,000,000.00	750,000.00	109,064.73	14.54
ANDA		14	10,519,362.80	6,634,020.88	3,514,282.80	62.38
5034	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR		3,641,783.79	703,263.88	97,536.12	13.87
5134	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.		2,543,118.78	1,895,593.70	1,085,463.41	57.57
5584	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.		1,918,960.97	884,331.53	597,773.69	67.60
5982	RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 10ª CALLE PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE AGUILARES, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		1,280,115.10	1,280,115.10	1,174,337.99	91.74
5651	INTRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SONSONATE Y SESORI EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL		262,820.95	262,820.95	135,273.07	51.47
4586	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		230,547.62	230,547.62	193,786.78	84.05
4612	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARAN, MUNICIPIO DE JUCUARAN DEPARTAMENTO DE USulután.		169,686.09	169,347.47	169,347.47	100.00
5643	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PARA URBANIZACIÓN LAS VICTORIAS Y COMUNIDAD CASTILLA DE LA MANCHA, JURISDICCIÓN DE APOPA, SAN SALVADOR.		128,226.90	128,226.90	39,798.18	31.04
6045	Modificación y Ampliación del Sistema de distribución de Agua Potable, Fase I, Municipio de Sonzacate, Departamento de Sonsonate		119,065.00	-	-	-
4576	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA a 10 HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCIÓN DE SANTA ANA		68,807.34	68,807.34	-	-
4611	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.		67,717.85	-	-	-
6044	Ampliación de Tanques de Agua Potable, Barrio El Calvario, Municipio de Jutiapa, Departamento de Cabañas		40,000.00	-	-	-



PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014, EJECUCION AL MES DE MAYO ^{a/}
(MONTOS EN DOLARES)

CODIGO	INSTITUCION / NOMBRE PROYECTO	Nº. Prog. y Proyec.	PROGRAMADO TOTAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	% EJE. FINANC.
4574	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO GEMELO EN ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA-LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE.		27,548.22	-	-	-
5963	Perforación de pozo de producción en cantón La Isleta, municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz		20,966.19	20,966.19	20,966.19	100.00
OTRAS						
	FSV	2	2,090,638.92	1,103,022.75	586,745.28	53.19
4513	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RECURSOS LOGISTICOS, COMEDOR DEL PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV, SAN SALVADOR.		1,715,638.92	1,103,022.75	586,745.28	53.19
5881	Programa de Fortalecimiento Institucional y Financiero del FSV, Fase II		375,000.00	-	-	-
	FONAES	2	1,522,298.24	776,228.24	447,903.18	57.70
5050	PROGRAMA TECHO Y AGUA 2014		1,000,000.00	253,930.00	-	-
5777	Programa Techo y Agua 2012-2013		522,298.24	522,298.24	447,903.18	85.76
	FONAVIPO	7	2,254,733.11	445,338.45	212,171.78	47.64
5371	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de San Vicente		1,186,872.78	18,400.00	-	-
5085	CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		353,210.85	160,703.77	63,810.61	39.71
5503	CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		294,518.21	106,525.59	88,571.89	83.15
5192	CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION PROCAVIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA		194,179.75	97,972.56	37,306.81	38.08
5245	CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.		124,290.02	4,150.00	106.49	2.57
5396	CONSTRUCCIÓN DE 308 VIVIENDAS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LOS MANANTIALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE		96,961.50	43,955.40	8,744.84	19.89
5370	Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Nuevo Verapaz, Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente		14,700.00	13,631.14	13,631.14	100.00
	SUB - TOTAL	361	823,697,014.56	344,806,078.68	113,546,715.20	32.93
	FODES		250,751,096.25	104,479,623.90	104,479,623.90	100.00
5090	Inversión Municipal a través del FODES 2014		250,751,096.25	104,479,623.90	104,479,623.90	100.00
	TOTAL GENERAL		1,074,448,110.80	447,724,381.44	240,568,238.41	53.73

^{a/} Información registrada por las Ejecutoras en los Sistemas SAFI y SIIP, reporte generado el 11 de junio de 2014.
